



1. Cronograma meta. Proyecto Valle Blanco 1.

SEMANAS	Edificio 1 y 2		Edificio 7 y 8		Edificio 3 y 4		Edificio 5 y 6	
	0	5	5	10	10	15	15	20
Pórticos	6	10	10	13	13	17	17	21
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	7	10	10	14	14	17	17	21
Curado de losa	7	10	10	14	14	17	17	21
Picado - encuentro muro / losa	7	10	10	14	14	17	18	21
Corrección IISS/IIIEE	7	10	10	14	14	17	18	21
Limpieza gruesa general de departamento (contratas)	7	10	10	14	14	17	18	21
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	7	10	10	14	14	17	18	21
Tarrajeo de derrames	7	10	10	14	14	17	18	21
Tabiques	7	11	11	14	14	18	18	22
Rectificación de cajas de válvulas	8	11	11	14	15	18	18	22
Hacer sardinel de ducha prefab.	8	11	11	14	15	18	18	22
Enchape baño y cocinas	8	11	11	15	15	18	19	22
Enchape de terrazas	8	11	11	15	15	18	19	22
Instalación de baranda metálica en terraza	8	11	12	15	15	18	19	22
Desapuntalamiento de losa	8	11	12	15	15	18	19	22
Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados	8	12	12	15	16	19	19	22
Imprimante en muros y techos (PINTURA - MURALCO)	8	12	12	15	16	19	19	23
Empaste grueso	9	12	12	16	16	19	19	23
Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto.	9	12	12	16	16	19	20	23
Empaste fino	9	13	13	16	16	20	20	23
Escarchado de techos	9	13	13	16	17	20	20	24
Lijado y sellado cocinas + baños	10	13	13	16	17	20	21	24
Pintura 1era mano cocinas + baños	10	13	13	17	17	20	21	24
Marcos y hojas	10	14	14	18	17	22	21	25
Presentar puertas + hueco en chapa	10	13	14	17	17	21	21	24
Colgado de puerta principal con chapa y tope	11	14	15	18	18	22	22	25
Limpieza gruesa general de departamento (contratas)	11	15	15	18	19	22	22	25
Cambio de cerámicos	12	15	15	19	19	22	23	26
Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas	12	15	16	19	19	23	23	26
Pintado y forrado de barandas	12	15	16	19	19	23	23	26
Instalación de mamparas + protección tripley o plástico	12	16	16	20	20	23	23	27
Instalación de marcos y ventanas + protección tripley o plástico (VENTANAS - HPD)	13	16	16	19	20	23	23	27
Colowall	13	16	17	20	20	24	24	27
Instalación de placas y tablero general	13	17	17	20	21	24	24	27
Colocación de muebles básicos de cocina y tablero pos formado	14	17	17	21	21	24	24	28
Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado	14	17	17	21	21	24	25	28
Remasillado muros y techos	14	17	18	21	21	25	25	28
Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y balcones)	14	17	18	21	22	25	25	28
Colgado de puertas interiores (chapa + tope)	14	18	18	21	22	25	25	29
Limpieza de vidrios y marcos	15	18	18	22	22	25	25	29
Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas	15	18	18	22	22	25	26	29
Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros / sellado y fraguado de salidas)	15	18	19	22	22	25	26	29
Colocación de laminado	15	18	19	22	22	26	26	30
Colocación de contrazócalo	15	19	19	23	23	26	26	30
Entrega de llaves	18	22	22	25	26	29	30	33
	0	5	5	10	10	15	15	20
Solaqueado exterior con andamio colgante	22	19	26	22	29	26	33	30
Imprimación	22	19	26	23	30	26	33	30
Empaste	22	19	26	23	30	26	33	30
Lijado	22	19	26	23	30	26	33	30
Sellado	23	19	26	23	30	27	34	30
Texturado	23	19	26	23	30	27	34	31

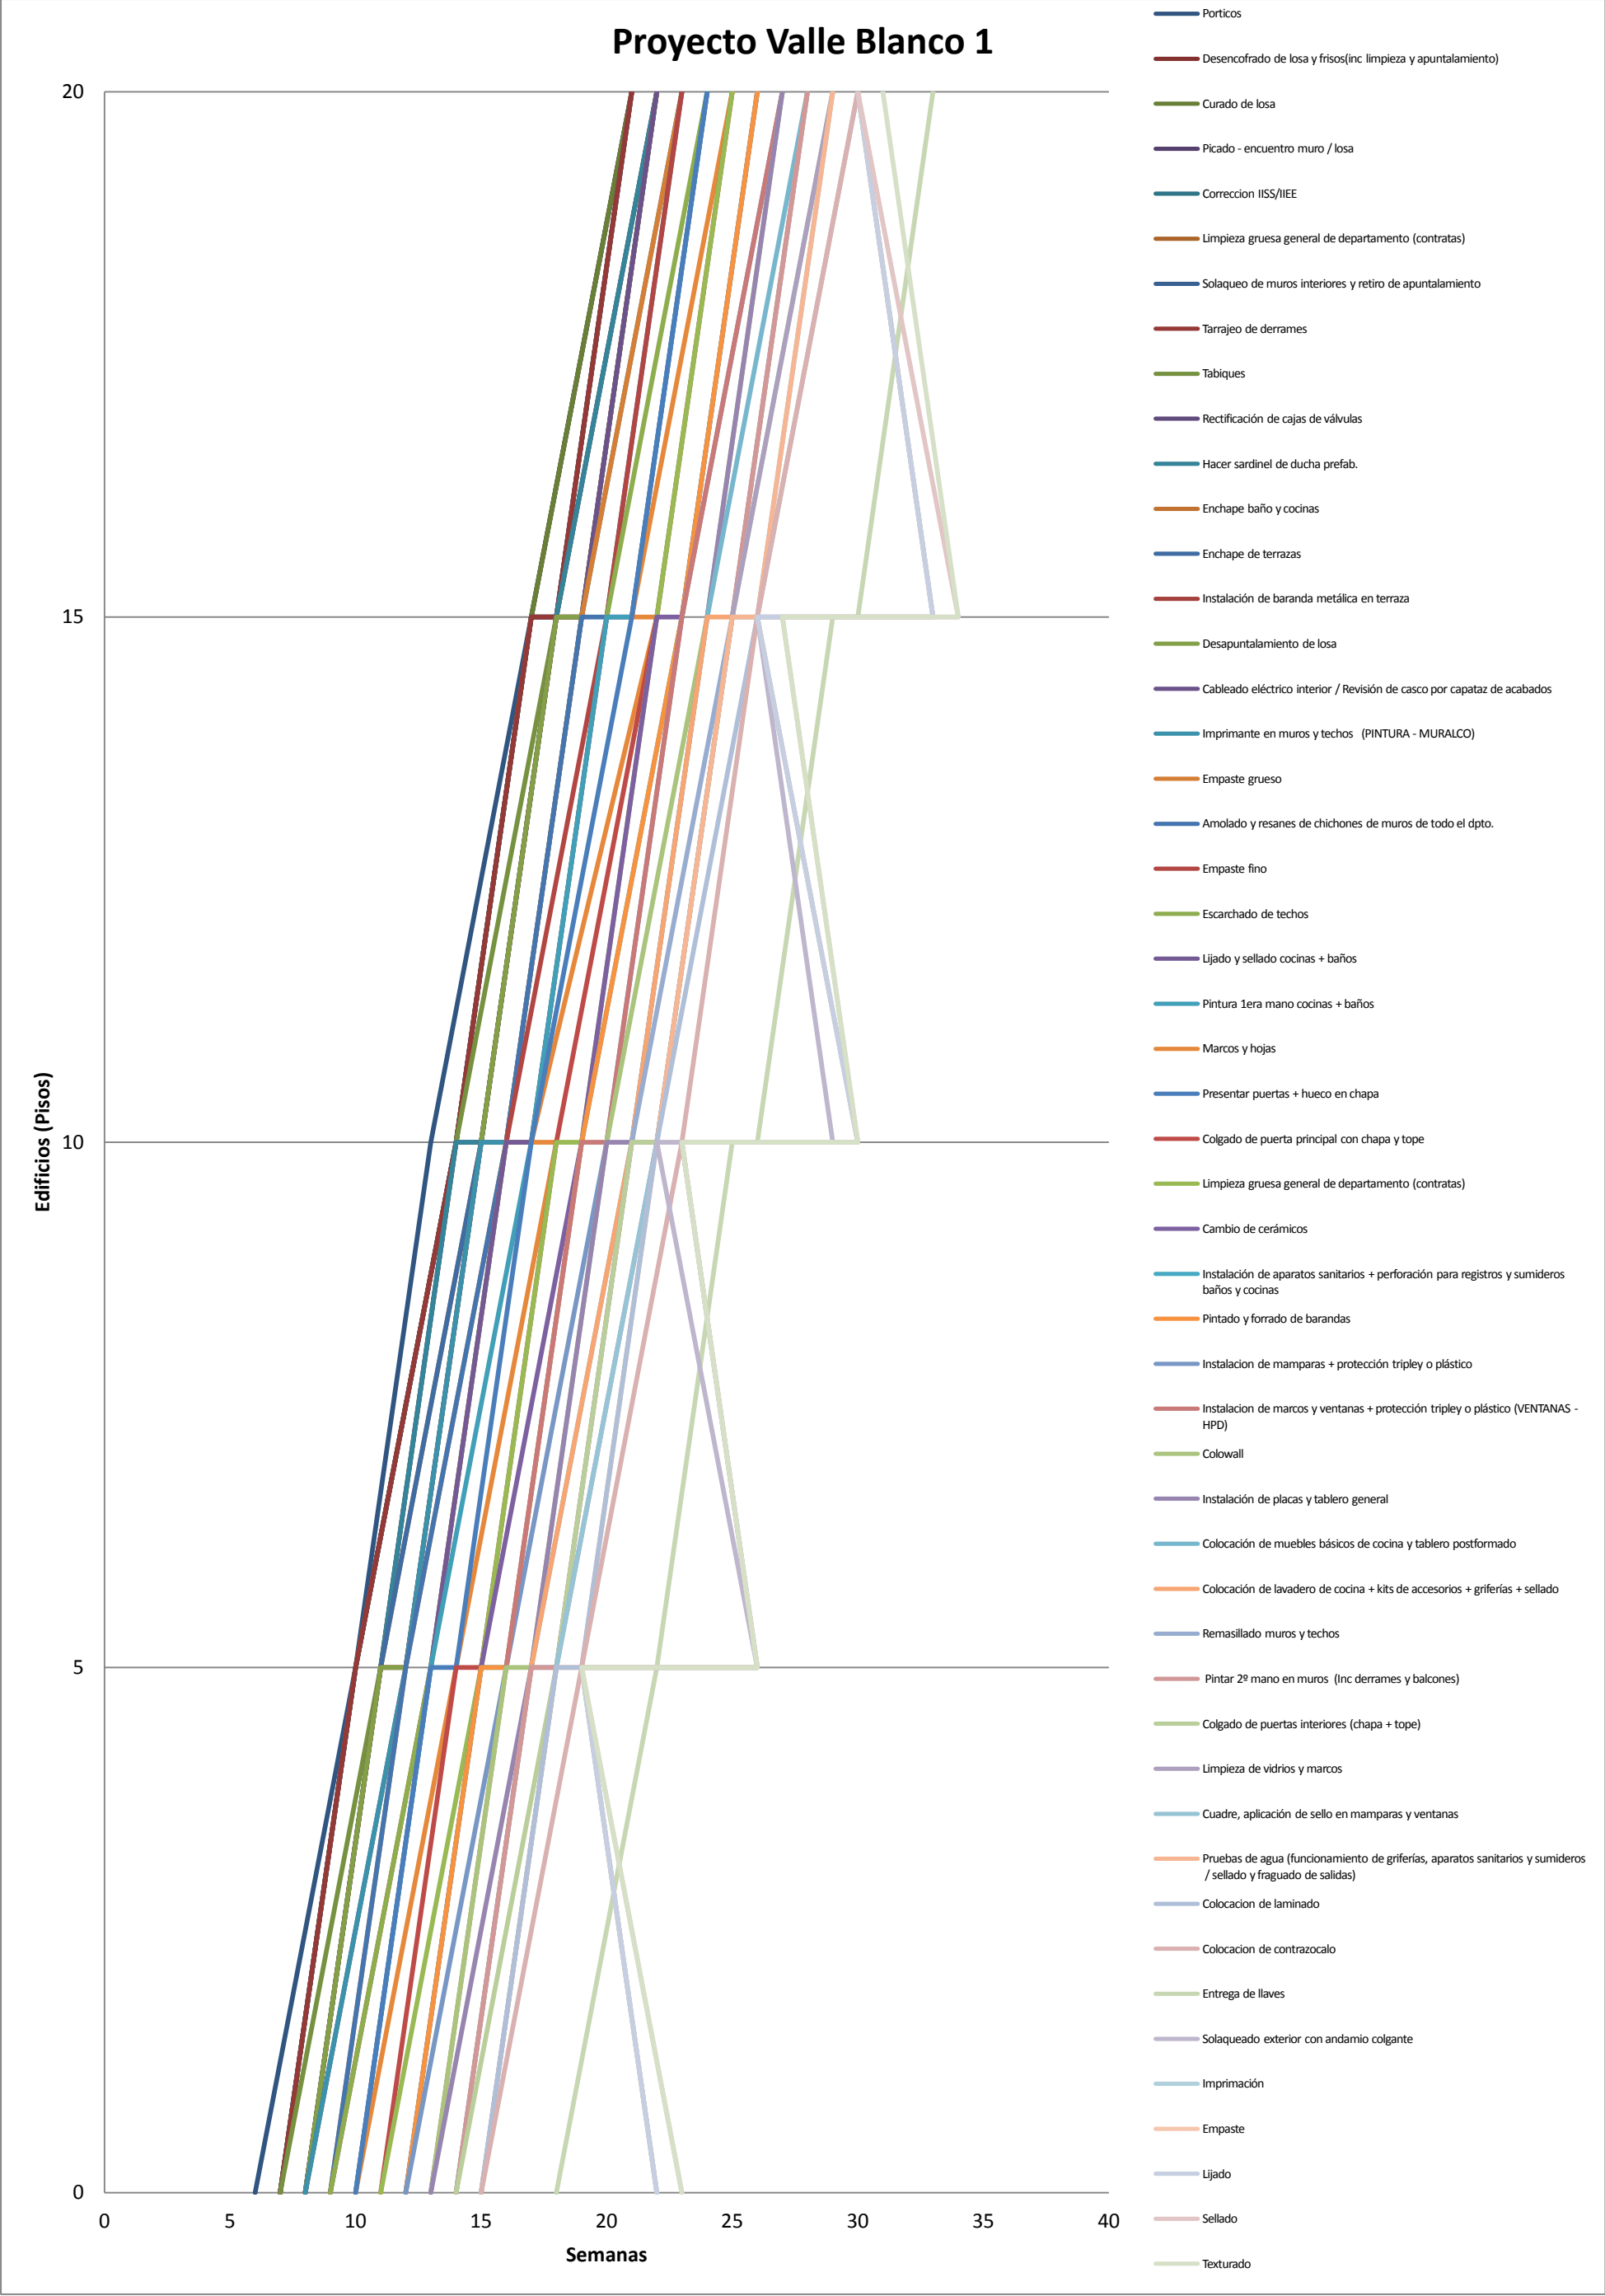


2. Cronograma meta. Proyecto Tomas Valle 2.

SEMANAS	0	8	8	16	16	24	24	32	32	40	40	48	48	56
Pórticos	-6	4	3	9	9	15	15	21	22	28	28	33	33	39
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	-3	4	4	9	9	15	16	21	23	28	28	33	34	39
Curado de losa	-3	4	4	9	9	15	16	21	24	28	29	33	34	39
Armado de andamios exteriores	-3	4	4	9	9	15	16	21	24	28	29	33	34	39
Alfeizar	-3	4	4	10	9	15	16	21	24	28	29	34	34	39
Solaqueo de muros exteriores	-3	4	4	10	10	15	16	21	23	28	29	34	34	39
Retiro de fenólico piso anterior encofrado de losa	-3	4	4	10	10	15	16	21	23	28	29	34	34	39
Picado - encuentro muro / losa	-2	5	5	10	11	16	17	22	24	29	29	34	35	40
Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder)	-2	5	5	10	11	16	17	22	24	29	30	34	35	40
SEMANAS	1	8	9	16	17	24	25	32	33	40	41	48	49	56
Corrección IISS/IIEE	0	5	5	10	11	16	17	22	24	29	30	34	35	40
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	0	5	6	10	11	16	17	22	24	29	30	34	35	40
Tarrajeo de derrames	0	5	6	10	11	16	17	22	25	29	30	34	36	40
Tabiques	0	6	6	11	11	16	17	22	25	29	30	35	36	40
Rectificación de derrames y balcones	0	6	6	10	11	16	17	22	25	29	30	34	36	40
Hacer sardinel de ducha prefab.	0	6	6	10	11	16	17	22	25	29	30	35	36	40
Instalación de baranda metálica en terraza	0	6	6	11	12	16	18	22	25	29	30	35	36	40
Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / IISS	1	6	6	11	12	17	18	23	25	30	30	35	36	40
Nivelación de pisos	1	6	6	11	12	17	18	23	25	30	30	35	36	41
Enchape baño y cocinas	1	7	7	11	12	17	18	23	25	30	31	36	36	41
Enchape de terrazas	1	6	7	11	12	17	18	23	25	30	31	36	36	41
Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados	2	7	8	12	13	18	19	24	26	31	32	37	37	42
Imprimante en muros y techos	2	7	8	12	13	18	19	24	27	31	32	37	38	42
Empaste grueso	2	7	8	13	14	18	20	25	27	31	32	37	38	42
Empaste fino	3	7	8	13	14	19	20	25	27	32	32	37	38	42
Escarchado de techos	3	8	8	13	14	19	20	25	27	32	33	37	38	42
Lijado y sellado cocinas + baños	3	8	9	13	14	19	20	25	27	32	33	38	38	42
Pintura 1era mano cocinas + baños	3	8	9	14	15	19	20	25	28	32	33	38	39	43
Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto.	3	8	9	14	15	19	21	25	28	32	33	38	39	43
Pintado y forrado de barandas	4	8	9	14	15	20	21	26	28	32	33	38	39	43
Marcos y hojas	4	10	10	15	15	21	21	27	28	34	33	40	39	44
Presentar puertas + hueco en chapa	4	9	9	14	15	20	21	26	28	33	34	38	39	43
Limpieza gruesa general de departamento (contratas)	4	10	11	16	16	21	22	27	29	34	35	40	40	44
Cambio de cerámicos	4	10	11	16	17	21	23	27	30	34	35	40	40	44
Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas	6	10	11	16	17	22	23	28	30	34	36	40	41	45
Instalación de marcos y ventanas + protección triplex o plástico (VENTANAS - HPD)	6	10	11	16	17	22	23	28	30	35	36	40	41	45
Instalación de mamparas + protección triplex o plástico	6	11	12	16	17	22	24	28	30	35	36	40	41	45
Colowall	6	11	12	17	17	23	24	28	30	36	36	41	41	45
Instalación de placas y tablero general	7	11	12	17	18	23	24	29	31	36	37	41	42	45
Colocación de muebles básicos de cocina y tablero pos formado	7	12	12	17	18	23	24	29	31	36	37	41	42	46
Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado	7	12	13	17	18	23	24	29	31	36	37	41	42	46
Remasillado muros y techos	7	12	13	18	18	24	25	29	31	36	37	41	42	46
Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y balcones)	8	12	13	18	19	24	25	29	32	37	37	42	42	46
Colocación de alfombra	8	13	13	18	19	24	25	30	32	37	38	42	42	46
Colgado de puertas interiores (chapa + tope)	8	13	14	18	19	24	25	30	32	37	38	42	43	47
Limpieza de vidrios y marcos	8	13	14	19	20	24	26	30	32	37	38	42	43	47
Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas	8	13	14	19	20	25	26	30	33	37	38	42	43	47
Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros / sellado y fraguado de salidas)	9	13	14	19	20	25	26	30	33	38	38	42	43	47
Colocación de laminado	9	14	15	19	20	25	26	31	33	38	39	43	43	47
Colocación de contrazócalo	9	14	15	19	20	25	26	31	33	38	39	43	43	47
Entrega de llaves	10	15	16	21	22	27	28	32	35	39	40	44	45	49
	0	8	8	16	16	24	24	32						
Solaqueo de fachadas	9	6	11	14	16	18	22	32						
Imprimación	10	9	15	14	19	18	26	25						
Empaste	12	11	17	15	21	19	27	26						
Texturado	14	12	19	18	23	21	29	28						

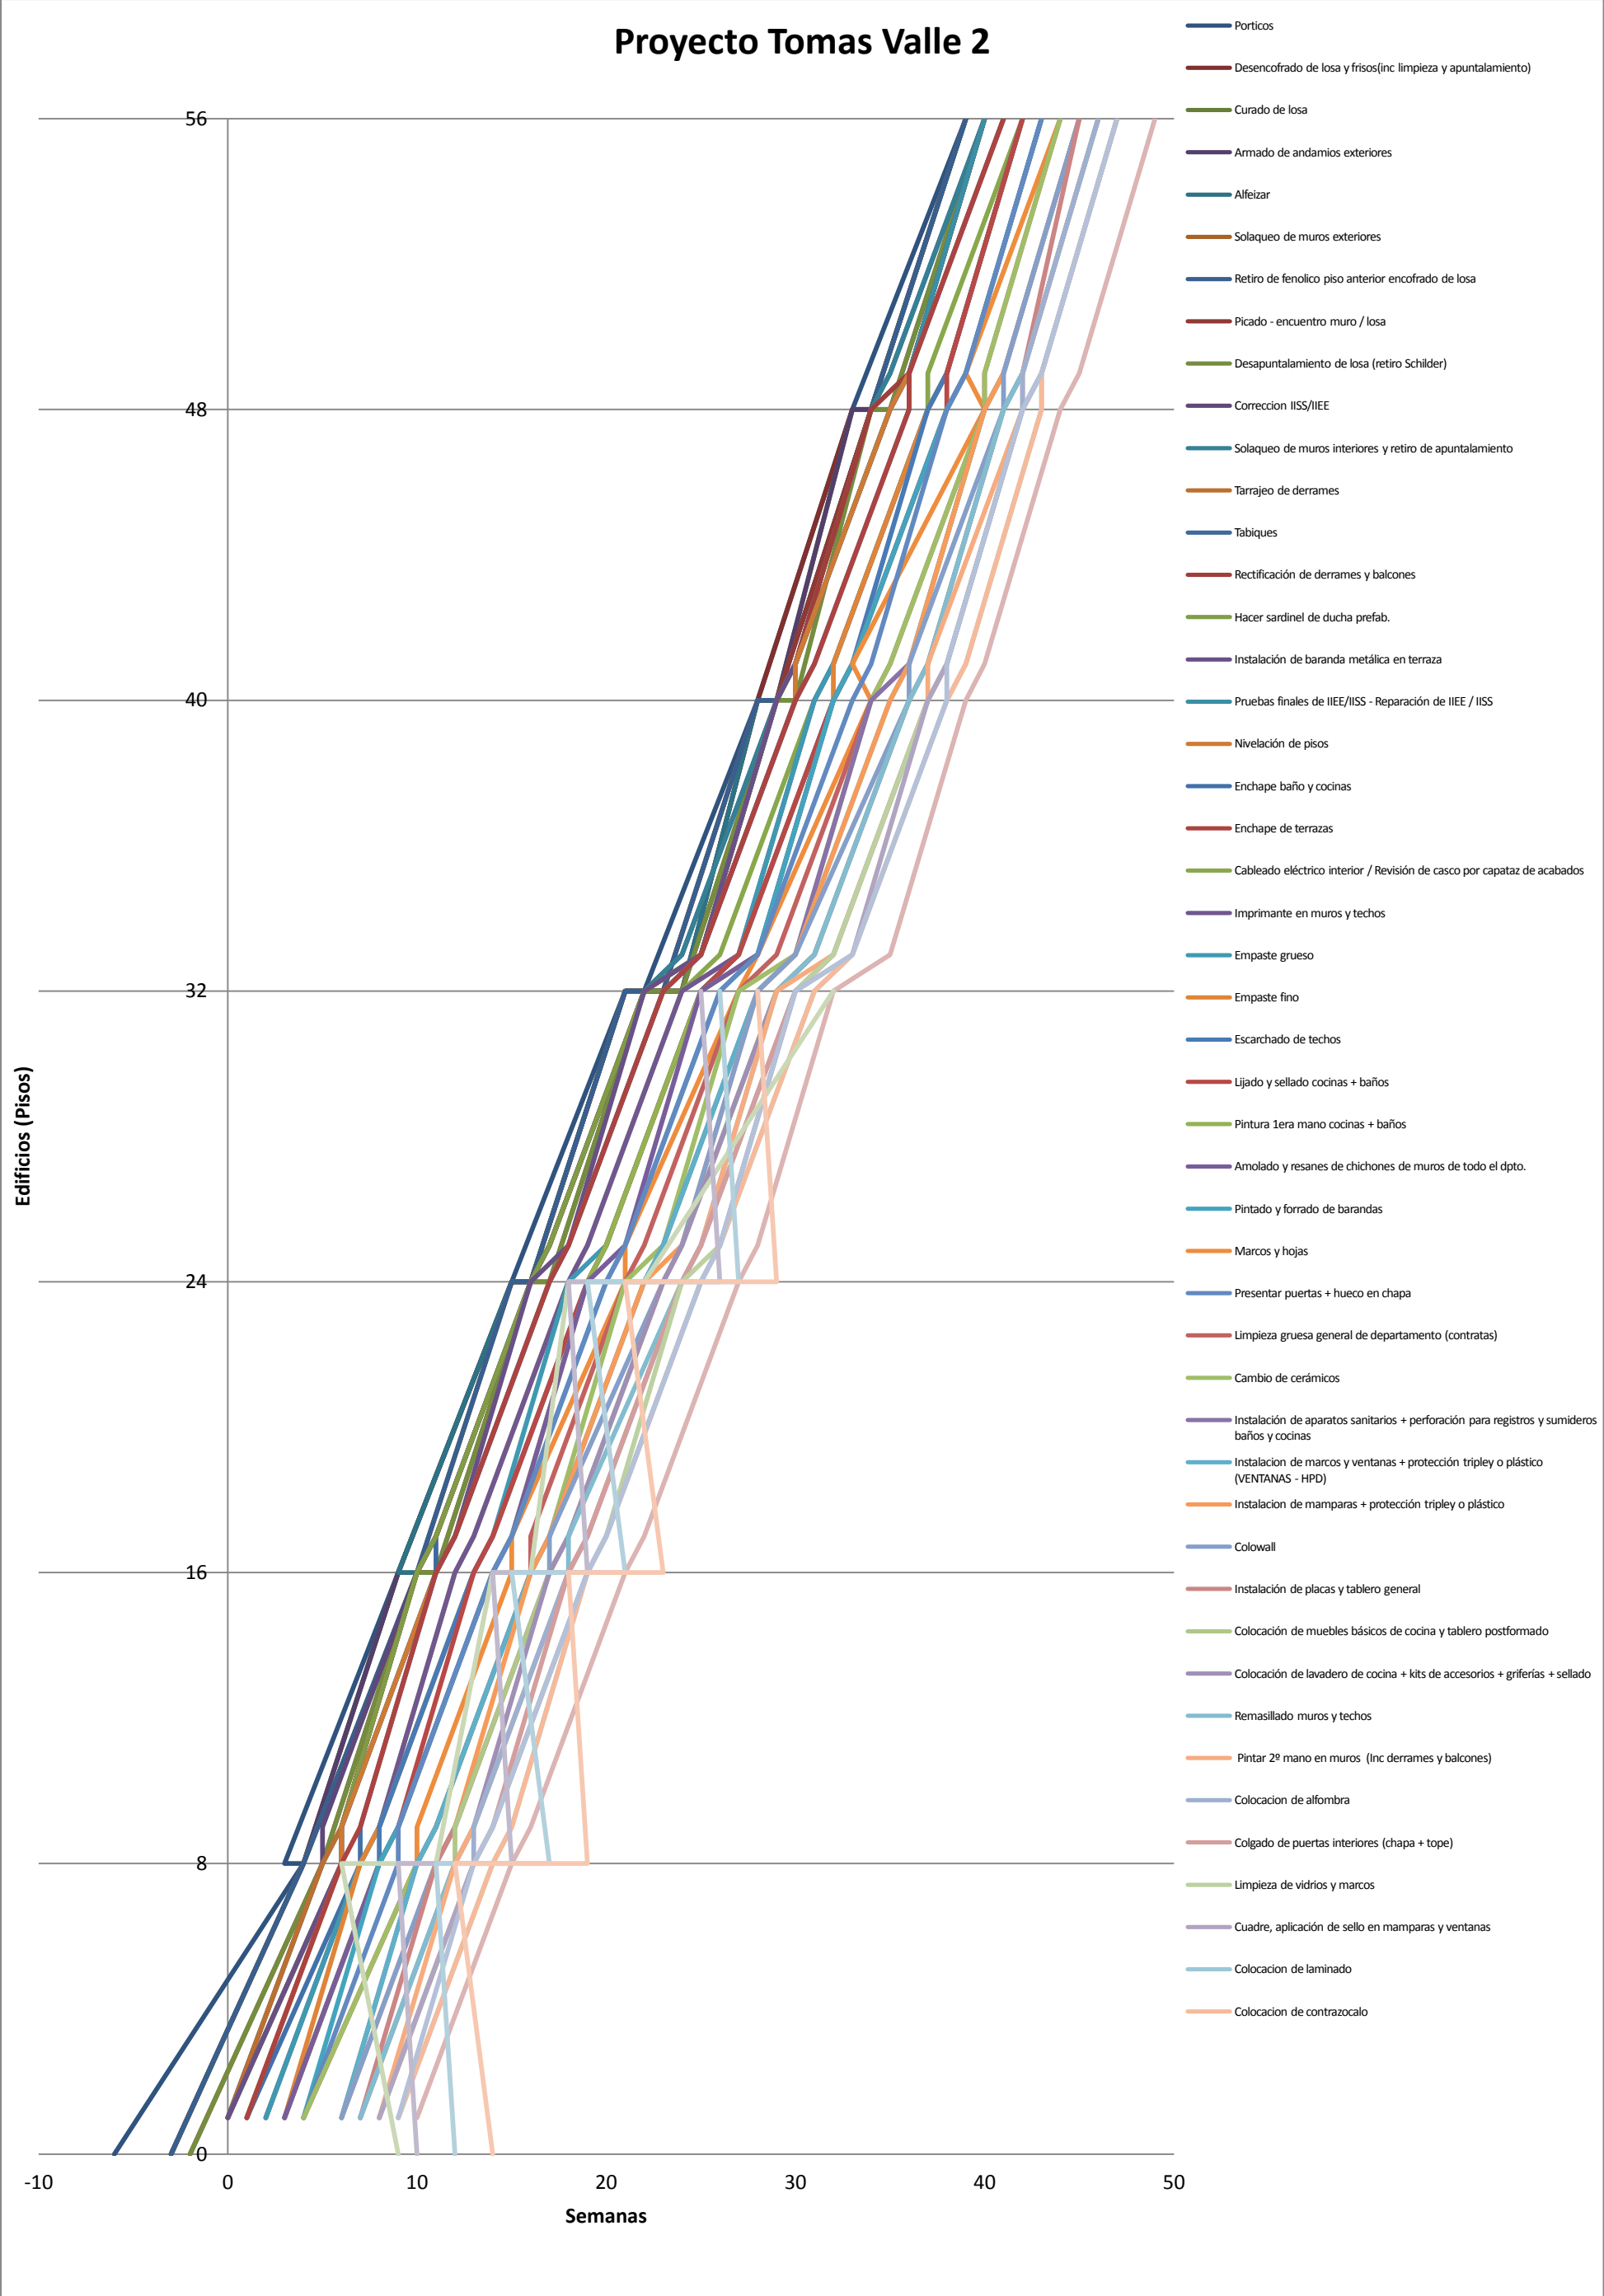

3. Cronograma real. Proyecto Tomas Valle 2.

SEMANAS	0	8	8	16	16	24	24	32	32	40	40	48	48	56
Pórticos	-6	4	3	9	9	15	15	22	22	28	28	34	35	41
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	-3	4	4	9	9	15	16	22	23	28	29	34	36	41
Curado de losa	-3	4	4	9	9	15	16	22	24	28	30	34	36	41
Armado de andamios exteriores	-3	4	4	9	9	15	16	22	24	28	30	34	36	41
Alfeizar	-3	4	4	10	9	16	16	23	24	29	30	35	36	42
Solaqueo de muros exteriores	-3	4	4	10	10	16	16	23	23	29	30	35	36	42
Retiro de fenólico piso anterior encofrado de losa	-3	4	4	10	10	16	16	23	23	29	30	35	36	42
Picado - encuentro muro / losa	-2	5	5	10	11	16	17	23	25	30	30	36	37	42
Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder)	-1	5	5	10	11	16	17	23	25	30	31	36	37	42
SEMANAS	1	8	9	16	17	24	25	32	33	40	41	48	49	56
Corrección IISS/IIEE	0	5	5	10	11	16	17	23	25	30	31	36	37	42
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	0	5	6	10	11	16	17	23	25	30	31	36	38	42
Tarrajeo de derrames	0	5	6	11	12	16	17	23	25	30	31	36	38	42
Tabiques	0	6	6	11	12	17	17	24	25	30	31	37	38	43
Rectificación de derrames y balcones	0	6	6	11	12	16	17	24	25	30	31	36	38	42
Hacer sardinel de ducha prefab.	0	6	6	11	12	17	18	24	25	30	31	36	38	42
Instalación de baranda metálica en terraza	0	6	6	11	12	17	18	24	25	30	31	37	38	43
Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / IISS	0	6	6	11	12	17	18	24	26	31	31	37	38	43
Nivelación de pisos	1	6	6	11	12	17	18	24	26	31	31	37	38	43
Enchape baño y cocinas	1	6	7	12	12	17	18	25	26	31	33	39	38	43
Enchape de terrazas	1	6	7	12	12	17	18	24	26	31	33	39	38	43
Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados	2	7	8	13	25	27	19	25	27	32	34	40	39	44
Imprimante en muros y techos	2	7	8	13	25	30	19	25	27	32	35	40	39	44
Empaste grueso	2	7	8	13	25	30	20	26	27	32	35	40	40	44
Empaste fino	3	7	8	13	25	30	20	26	27	32	36	40	40	45
Escarchado de techos	3	8	8	14	26	31	20	26	28	33	36	41	40	45
Lijado y sellado cocinas + baños	3	8	9	14	26	31	20	26	28	33	36	41	40	45
Pintura 1era mano cocinas + baños	3	8	9	14	26	31	20	26	28	33	36	41	41	45
Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto.	3	8	9	14	26	31	21	27	28	33	36	41	41	45
Pintado y forrado de barandas	4	8	9	14	26	31	21	27	28	33	37	41	41	45
Marcos y hojas	4	10	10	16	27	33	21	28	28	35	37	43	41	47
Presentar puertas + hueco en chapa	4	9	9	15	27	32	21	27	29	34	37	42	41	46
Limpieza gruesa general de departamento (contratas)	5	10	11	16	28	33	22	28	30	35	38	43	42	47
Cambio de cerámicos	5	10	11	16	28	33	23	29	30	36	38	43	43	47
Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas	6	11	12	16	29	33	27	29	31	36	39	43	43	47
Instalación de marcos y ventanas + protección triplex o plástico (VENTANAS - HPD)	8	13	13	16	29	34	28	30	31	36	39	43	43	48
Instalación de mamparas + protección triplex o plástico	11	13	13	18	29	34	28	30	31	36	39	44	43	48
Colowall	12	15	14	18	29	32	28	31	31	37	39	44	43	48
Instalación de placas y tablero general	13	15	16	18	30	32	28	31	32	37	40	44	44	49
Colocación de muebles básicos de cocina y tablero pos formado	13	15	16	18	30	32	28	31	32	37	40	44	44	49
Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado	13	16	16	18	30	32	29	31	32	37	40	45	44	49
Remasillado muros y techos	13	16	16	18	30	33	29	32	32	38	40	45	44	49
Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y balcones)	14	16	16	19	31	33	30	32	33	38	41	45	45	49
Colocación de alfombra	14	16	17	19	31	33	30	32	33	38	41	45	45	50
Colgado de puertas interiores (chapa + tope)	14	17	17	19	31	33	30	32	33	38	41	46	45	50
Limpieza de vidrios y marcos	15	17	17	19	31	34	30	32	33	39	41	46	45	50
Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas	15	17	17	20	32	34	30	33	33	39	41	46	46	50
Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros / sellado y fraguado de salidas)	15	17	17	20	32	34	31	33	34	39	42	46	46	50
Colocación de laminado	15	17	18	20	32	34	31	33	34	39	42	46	46	51
Colocación de contrazócalo	15	18	18	20	32	35	31	33	34	39	42	47	46	51
Entrega de llaves	17	20	19	22	34	37	32	39	36	41	43	48	48	52
SEMANAS	0	8	8	16	16	24	24	32	32	40	40	48	48	56
Solaqueo de fachadas	9	6	14	11	18	16	26	22	31	28	37	34	43	41
Imprimación	10	9	15	14	19	18	26	25	32	31	38	37	44	43
Empaste	12	11	17	15	21	19	27	26	33	31	39	38	45	43
Texturado	14	12	19	18	23	21	30	28	34	32	40	38	46	44

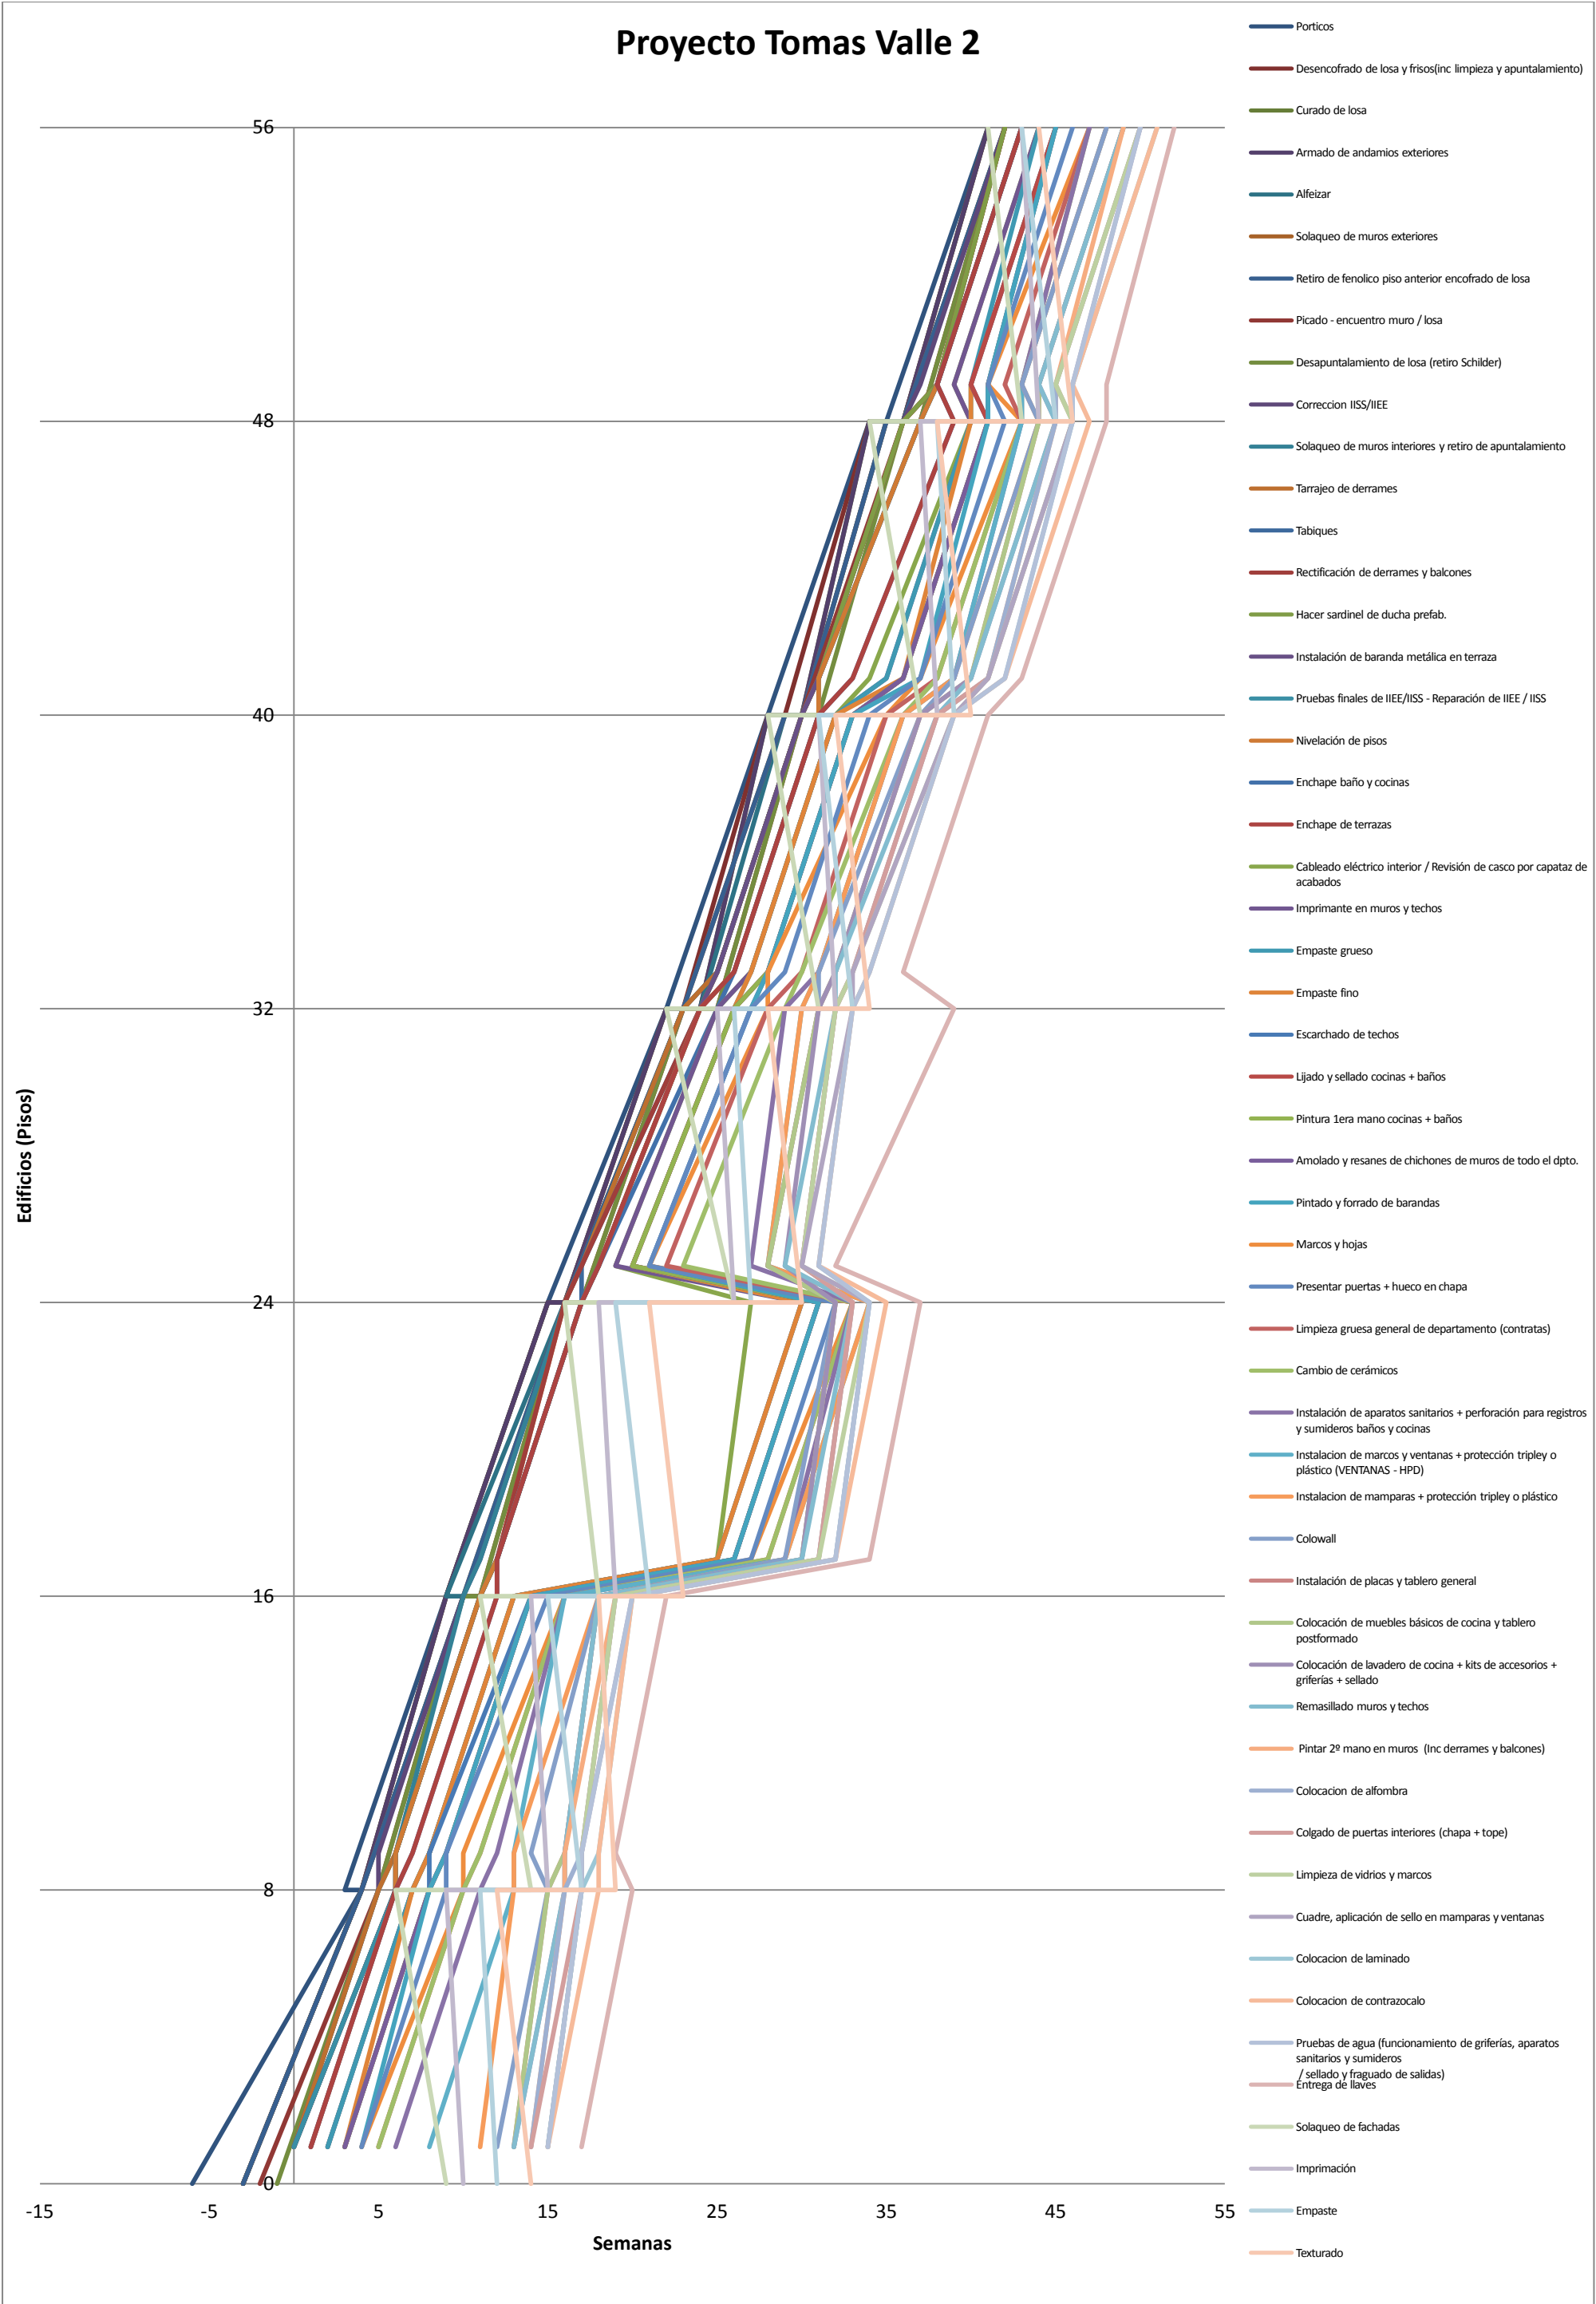


4. Cronograma meta. Proyecto Canta Callao.

Frente 1:

SEMANAS	A-B 0	15 15	R-S 15	5 20	T-U 20	5 25	V-W 25	5 30	G-H 30	8 38	E-F 38	15 53	C-D 53	15 68
Pórticos	17	28	28	32	31	35	35	39	38	45	44	56	55	67
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	17	28	29	32	32	35	36	39	39	45	45	56	56	67
Curado de losa	17	28	29	32	32	35	36	39	39	45	45	56	56	67
Alfeizar	17	29	29	32	32	36	36	39	39	45	45	56	56	67
Solaqueo de muros exteriores	17	28	29	32	32	35	36	39	39	45	45	56	56	67
Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder)	21	32	32	35	35	39	39	42	42	48	48	59	59	70
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	18	29	29	33	33	36	36	39	40	45	46	57	57	68
Tabiques	19	31	31	34	34	37	37	41	41	47	47	58	58	69
Enchape baño y cocinas	20	32	31	35	34	38	38	42	41	48	47	59	58	70
Empaste grueso	21	32	33	36	36	39	39	43	43	49	49	60	60	71
Empaste fino	22	33	33	36	36	40	40	43	43	49	49	60	60	71
Escarchado de techos	22	33	33	37	37	40	40	44	44	49	49	60	61	72
Pintura 1era mano cocinas + baños	23	33	34	37	37	40	40	44	44	50	50	61	61	72
Marcos y hojas	23	36	34	39	38	42	41	46	45	52	50	63	62	74
Presentar puertas + hueco en chapa	23	34	34	37	37	41	41	45	45	50	50	61	61	73
Colowall	26	37	37	41	41	45	45	48	48	54	54	64	64	76
Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y balcones)	26	37	37	40	40	44	44	47	47	53	53	64	64	75
Colocación de alfombra	27	38	38	41	42	45	45	49	49	54	55	65	66	77
Colocación de laminado	27	38	38	41	41	45	45	48	48	54	54	65	65	76
Entrega de llaves	28	39	39	43	43	47	47	50	50	56	56	67	67	78


Frente 2:

SEMANAS	P-Q-O 100	8 108	N-Ñ 108	8 116	LL-M 116	8 124	X-Y-Z 124	5 129	K-L 129	8 137	I-J 137	8 145
Pórticos	19	29	29	35	35	42	42	47	47	53	53	60
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	20	30	30	35	35	42	42	48	48	54	54	60
Curado de losa	20	30	30	35	35	42	42	48	48	54	54	60
Alfeizar	20	30	30	36	35	42	42	48	48	54	54	60
Solaqueo de muros exteriores	20	30	30	35	35	42	42	48	48	54	54	60
Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder)	24	33	33	38	38	46	46	51	51	56	56	63
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	21	30	31	36	36	43	43	48	48	54	54	61
Tabiques	22	32	32	37	37	45	45	50	49	55	55	62
Enchape baño y cocinas	23	33	32	38	38	45	45	51	50	56	56	63
Empaste grueso	24	34	33	39	39	46	47	51	51	57	57	64
Empaste fino	24	34	34	39	39	47	47	52	51	57	57	64
Escarchado de techos	25	34	34	39	40	47	47	52	52	58	58	64
Pintura 1era mano cocinas + baños	25	35	34	40	40	47	48	53	53	58	58	65
Marcos y hojas	26	37	36	42	41	50	49	55	54	60	59	67
Presentar puertas + hueco en chapa	26	36	35	41	41	48	48	54	53	59	59	66
Colowall	29	39	38	44	45	51	51	57	57	62	62	69
Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y balcones)	29	38	38	44	44	51	51	56	56	61	61	68
Colocación de alfombra	30	39	39	45	45	52	52	57	57	62	63	69
Colocación de laminado	30	39	39	45	45	52	52	57	57	62	62	69
Entrega de llaves	31	41	40	46	47	54	54	59	59	64	64	71

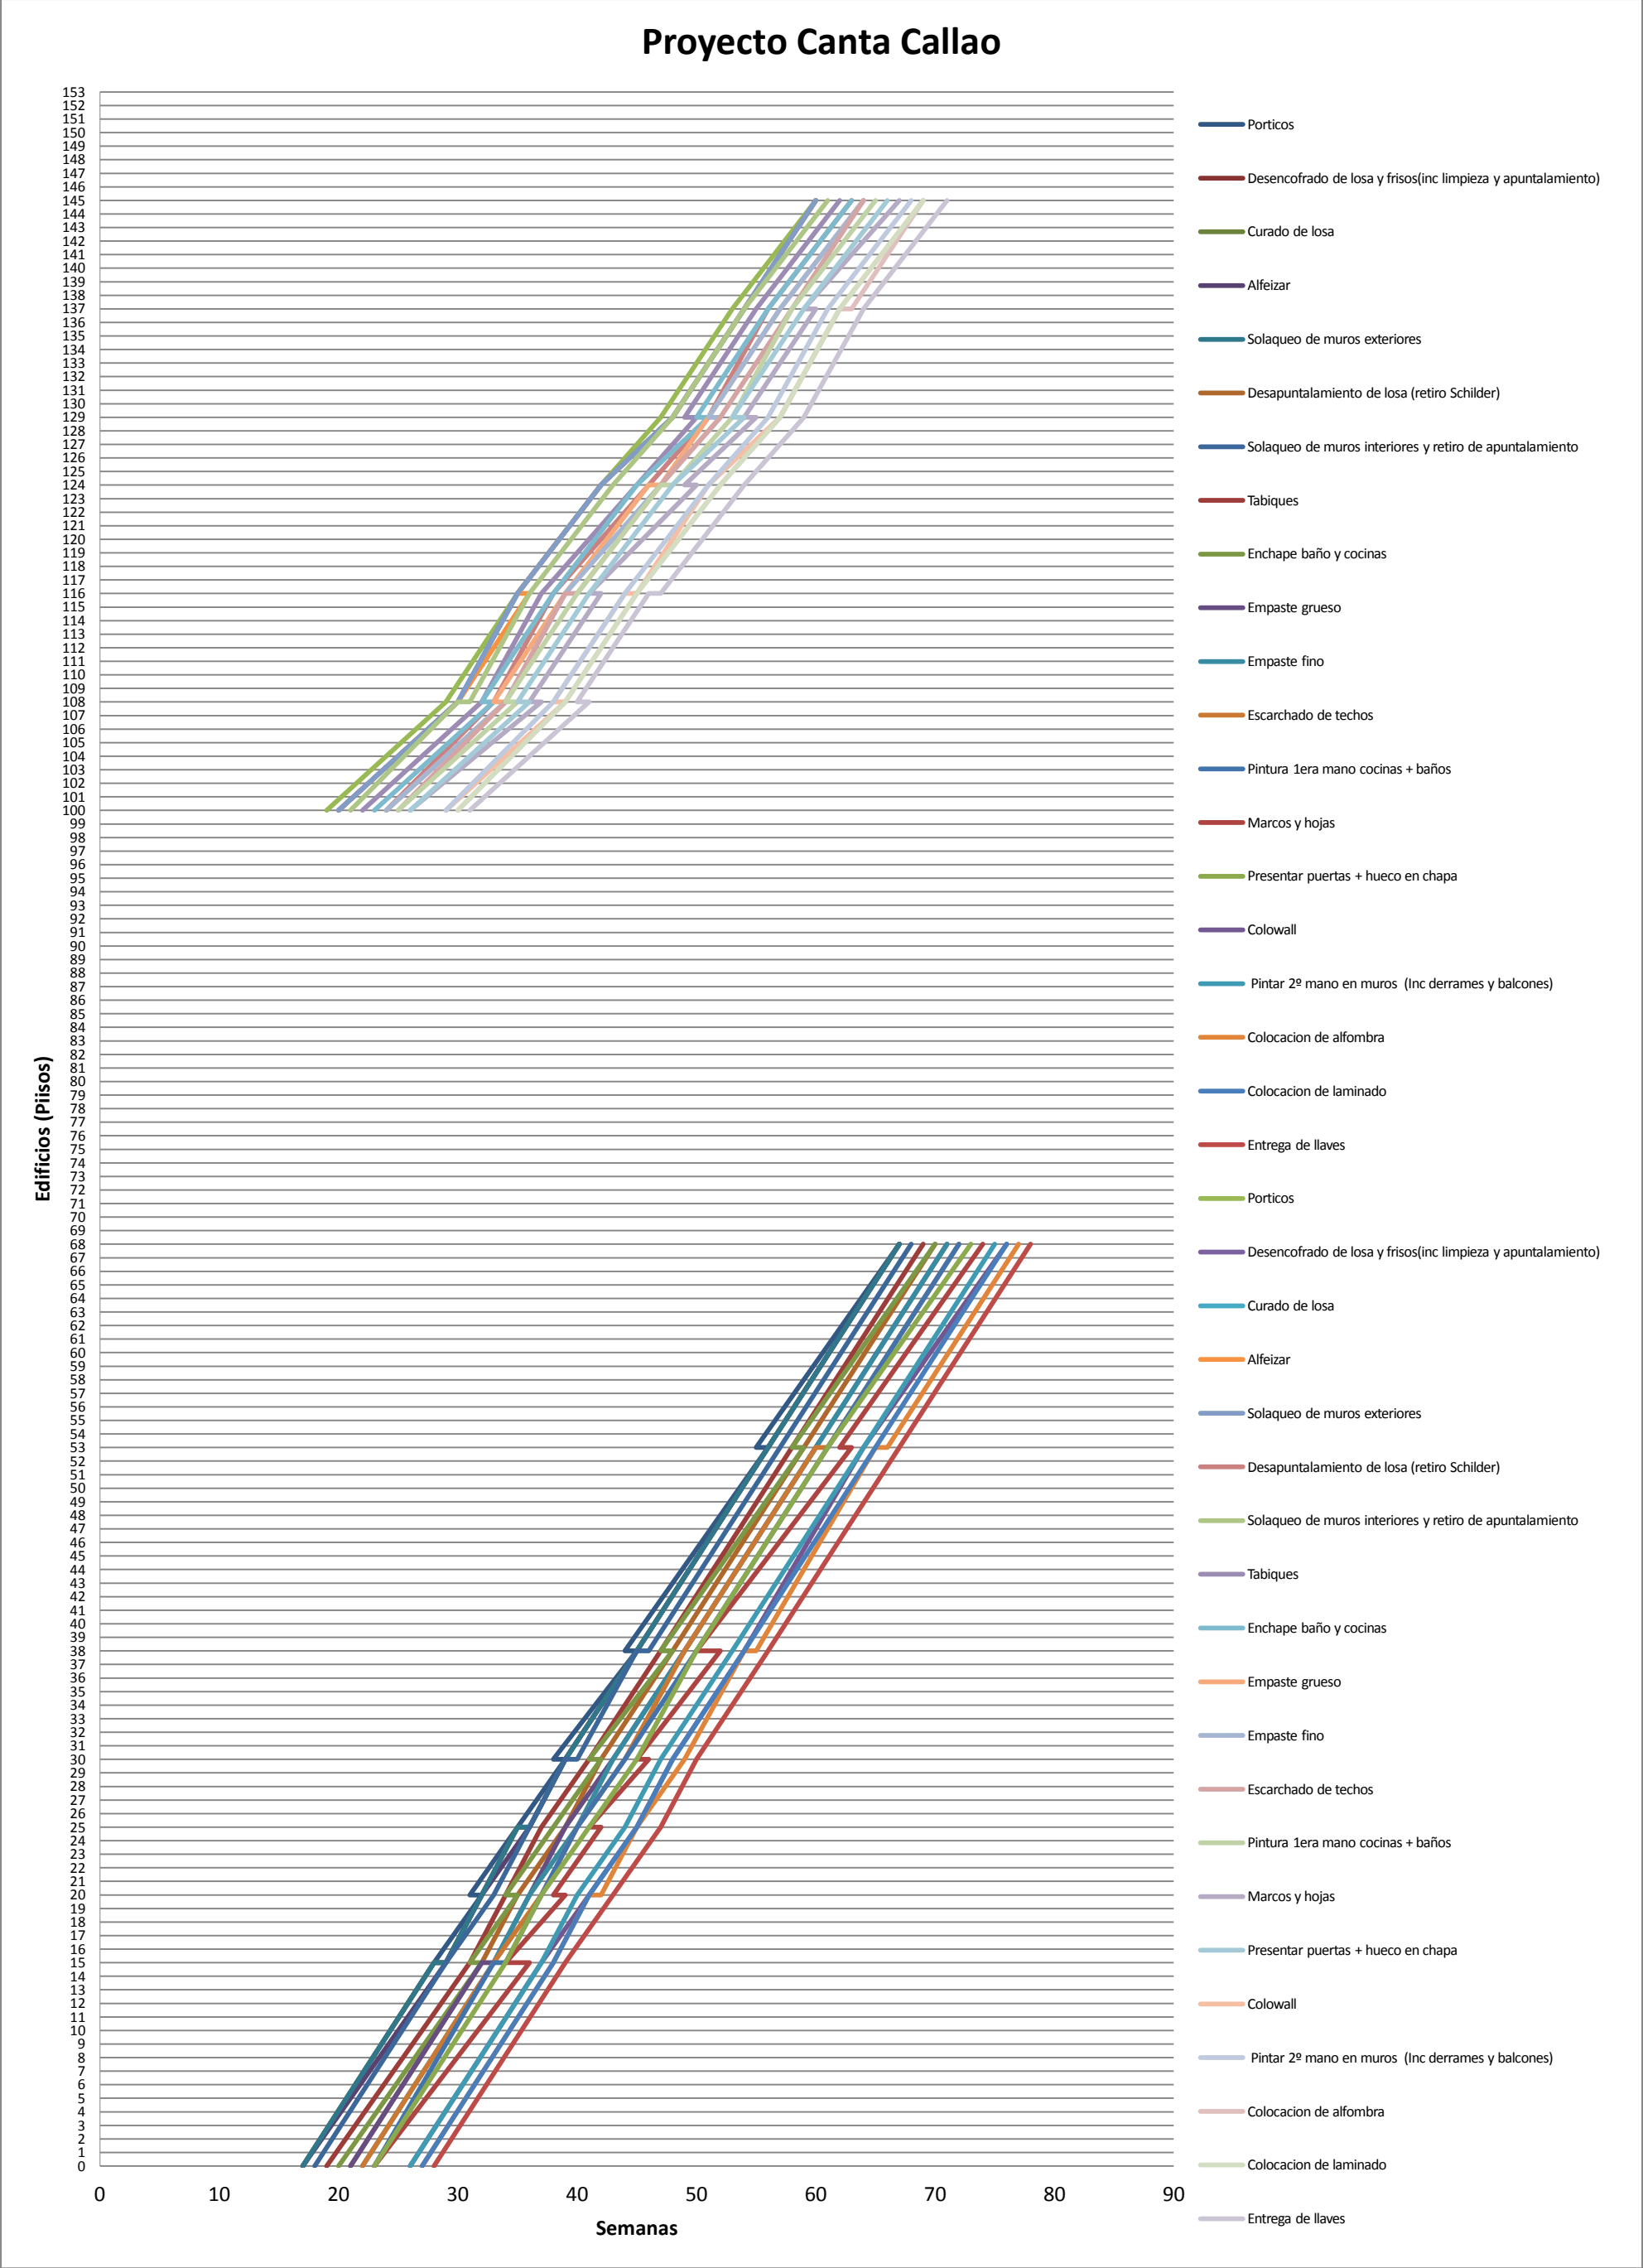


5. Cronograma real. Proyecto Canta Callao. Edificio C

DIAS LABORALES	#	0	15	v
Pórticos	15	55	69	1.00
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	15	57	69	1.15
Mapeo de techo	15	59	70	1.25
Lijado y desbaste de placas	15	59	70	1.25
Picado - encuentro muro / losa	15	59	70	1.25
		1	15	
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	14	61	71	1.27
Instalación de montante de desagüe	14	61	71	1.27
Corrección IISS/IIIE	14	63	71	1.56
Tabiques	14	61	73	1.08
Rectificación de cajas de válvulas	14	62	73	1.17
Tarrajeo de derrames	14	64	73	1.40
Solaqueo de muros exteriores	14	64	73	1.40
Nivelación de pisos	14	64	73	1.40
Corrección IISS/IIIE	14	64	73	1.40
Enchape baño y cocinas	14	64	74	1.27
Imprimante en muros y techos (PINTURA - MURALCO)	14	65	74	1.40
Empaste grueso	14	65	74	1.40
Empaste fino	14	66	74	1.56
Escarchado de techos	14	66	74	1.56
Marcos y hojas	14	66	75	1.40
Presentar puertas + hueco en chapa	14	66	74	1.56
Colgado de puerta principal con chapa y tope	14	69	74	2.33
Colgado de puertas interiores (chapa + tope)	14	70	75	2.33
Colowall	14	70	78	1.56
Instalación de placas eléctricas + tablero general	14	71	78	1.75
Colocación de muebles básicos de cocina y tablero pos formado	14	71	78	1.75
Enchape baño y cocinas	14	71	78	1.75
Remasillado muros y techos	14	71	78	1.75
Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado	14	72	78	2.00
Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros / sellado y fraguado de salidas)	14	72	79	1.75
Piso vinílico	14	72	79	1.75
Colocación de contrazócalo	14	72	79	1.75
Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y balcones)	14	73	79	2.00
Entrega de llaves	14	75	81	2.00

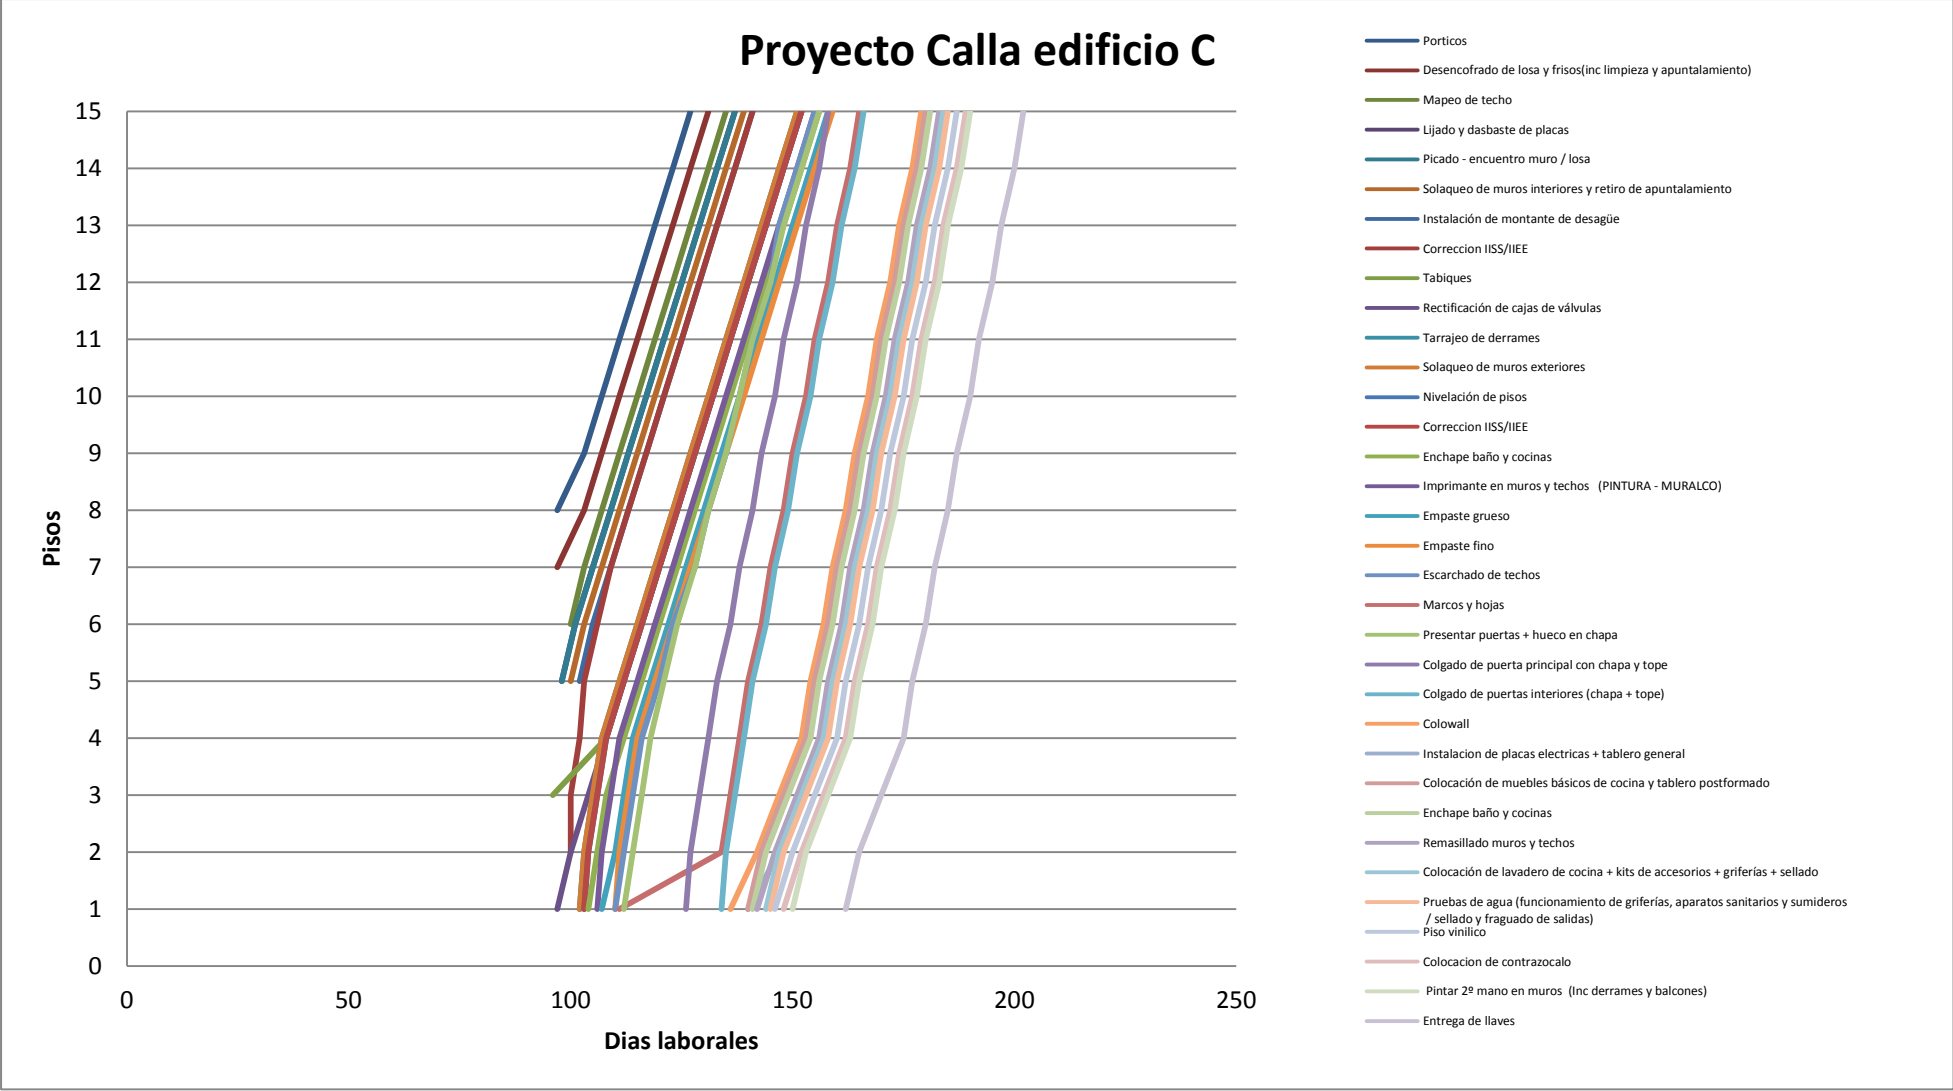


Cronograma real con rectas:

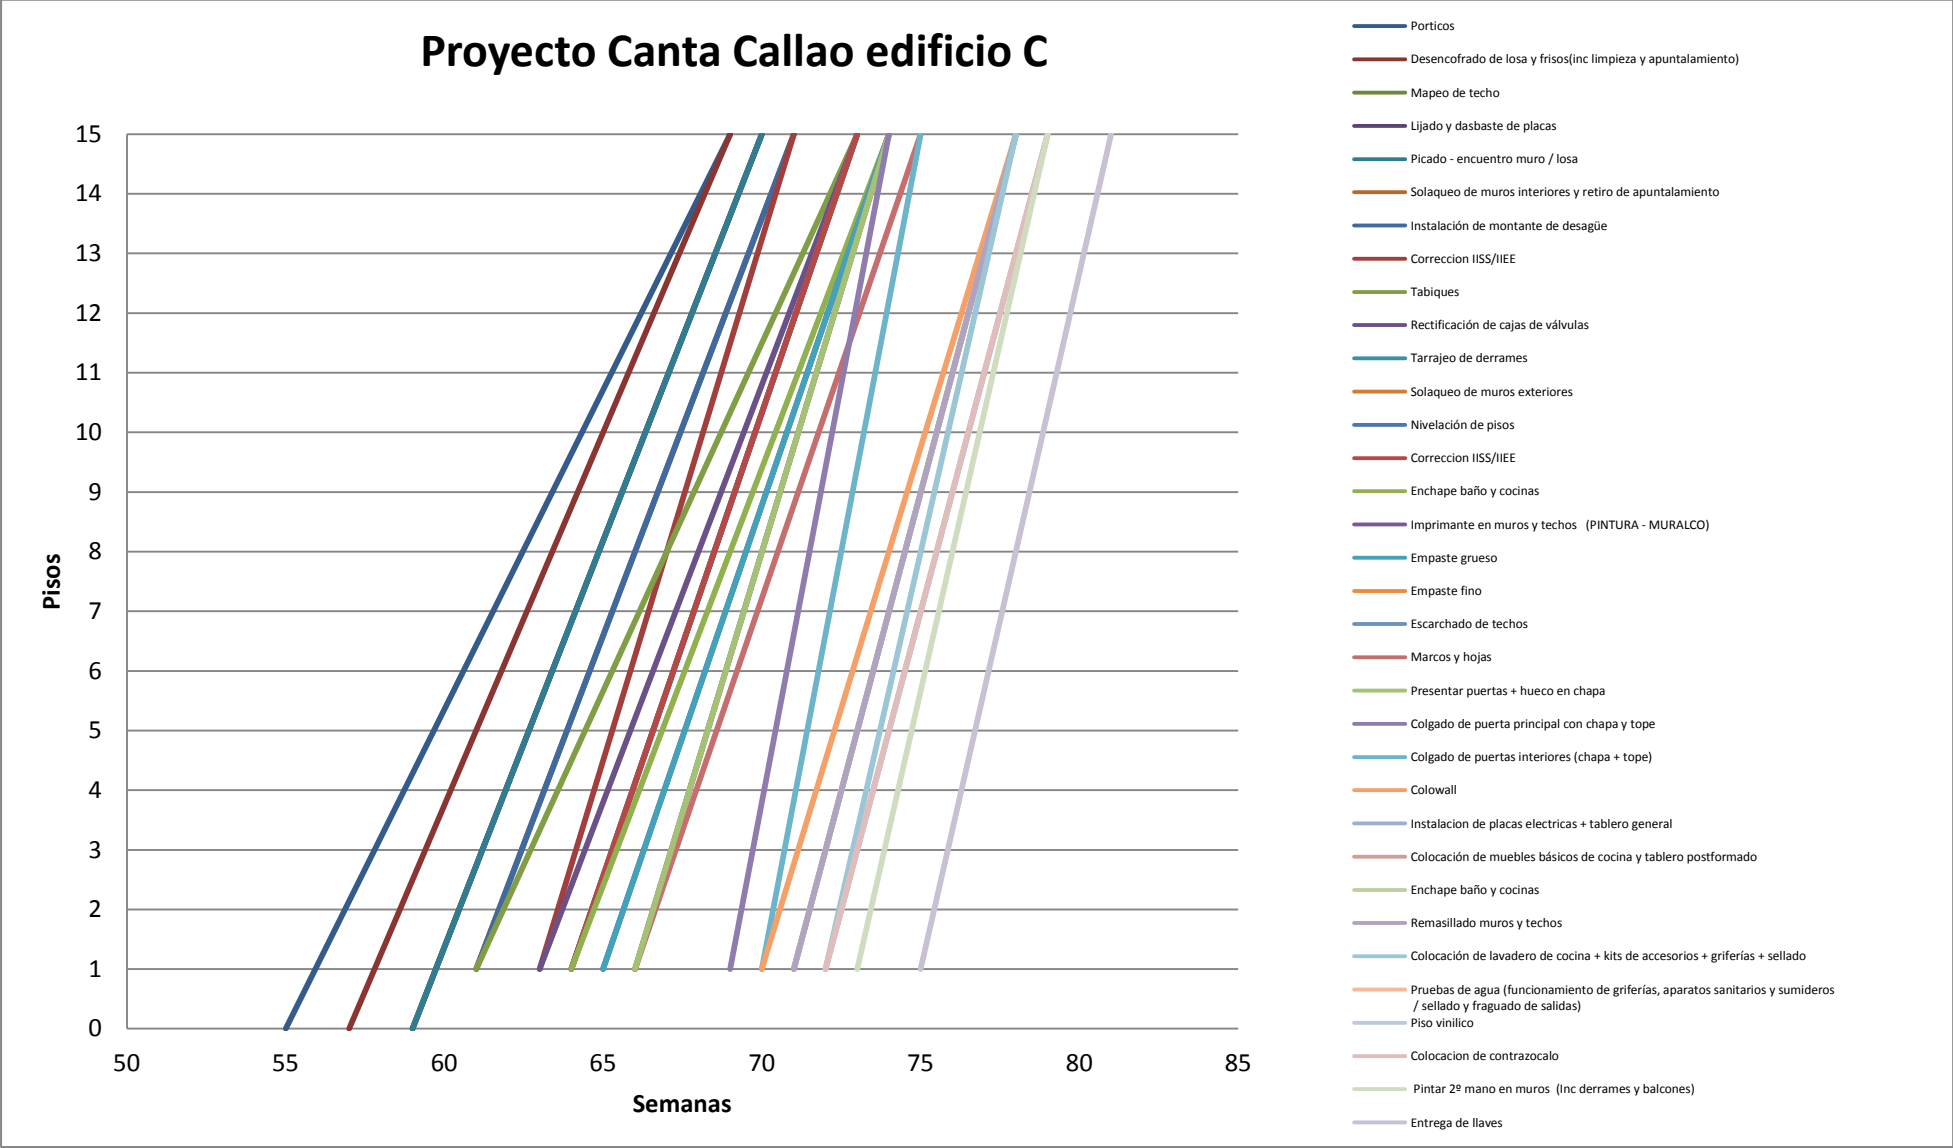

6. Cronograma meta. Proyecto Santa Clara.

SEMANAS	J-I			G-H			D-E-F			A-B-C		
	0	1	∇	1	2	∇	2	3	∇	3	4	∇
Movimiento de tierras	1	4	2.00	9	12	2.00	14	16	2.67	23	26	2.00
Estructura	4	14	0.73	12	25	0.57	17	31	0.53	26	40	0.53
Cimentación	4	6	2.67	12	14	2.67	17	18	4.00	26	29	2.00
Arquitectura y acabados	12	27	0.50	18	32	0.53	28	41	0.57	33	47	0.53

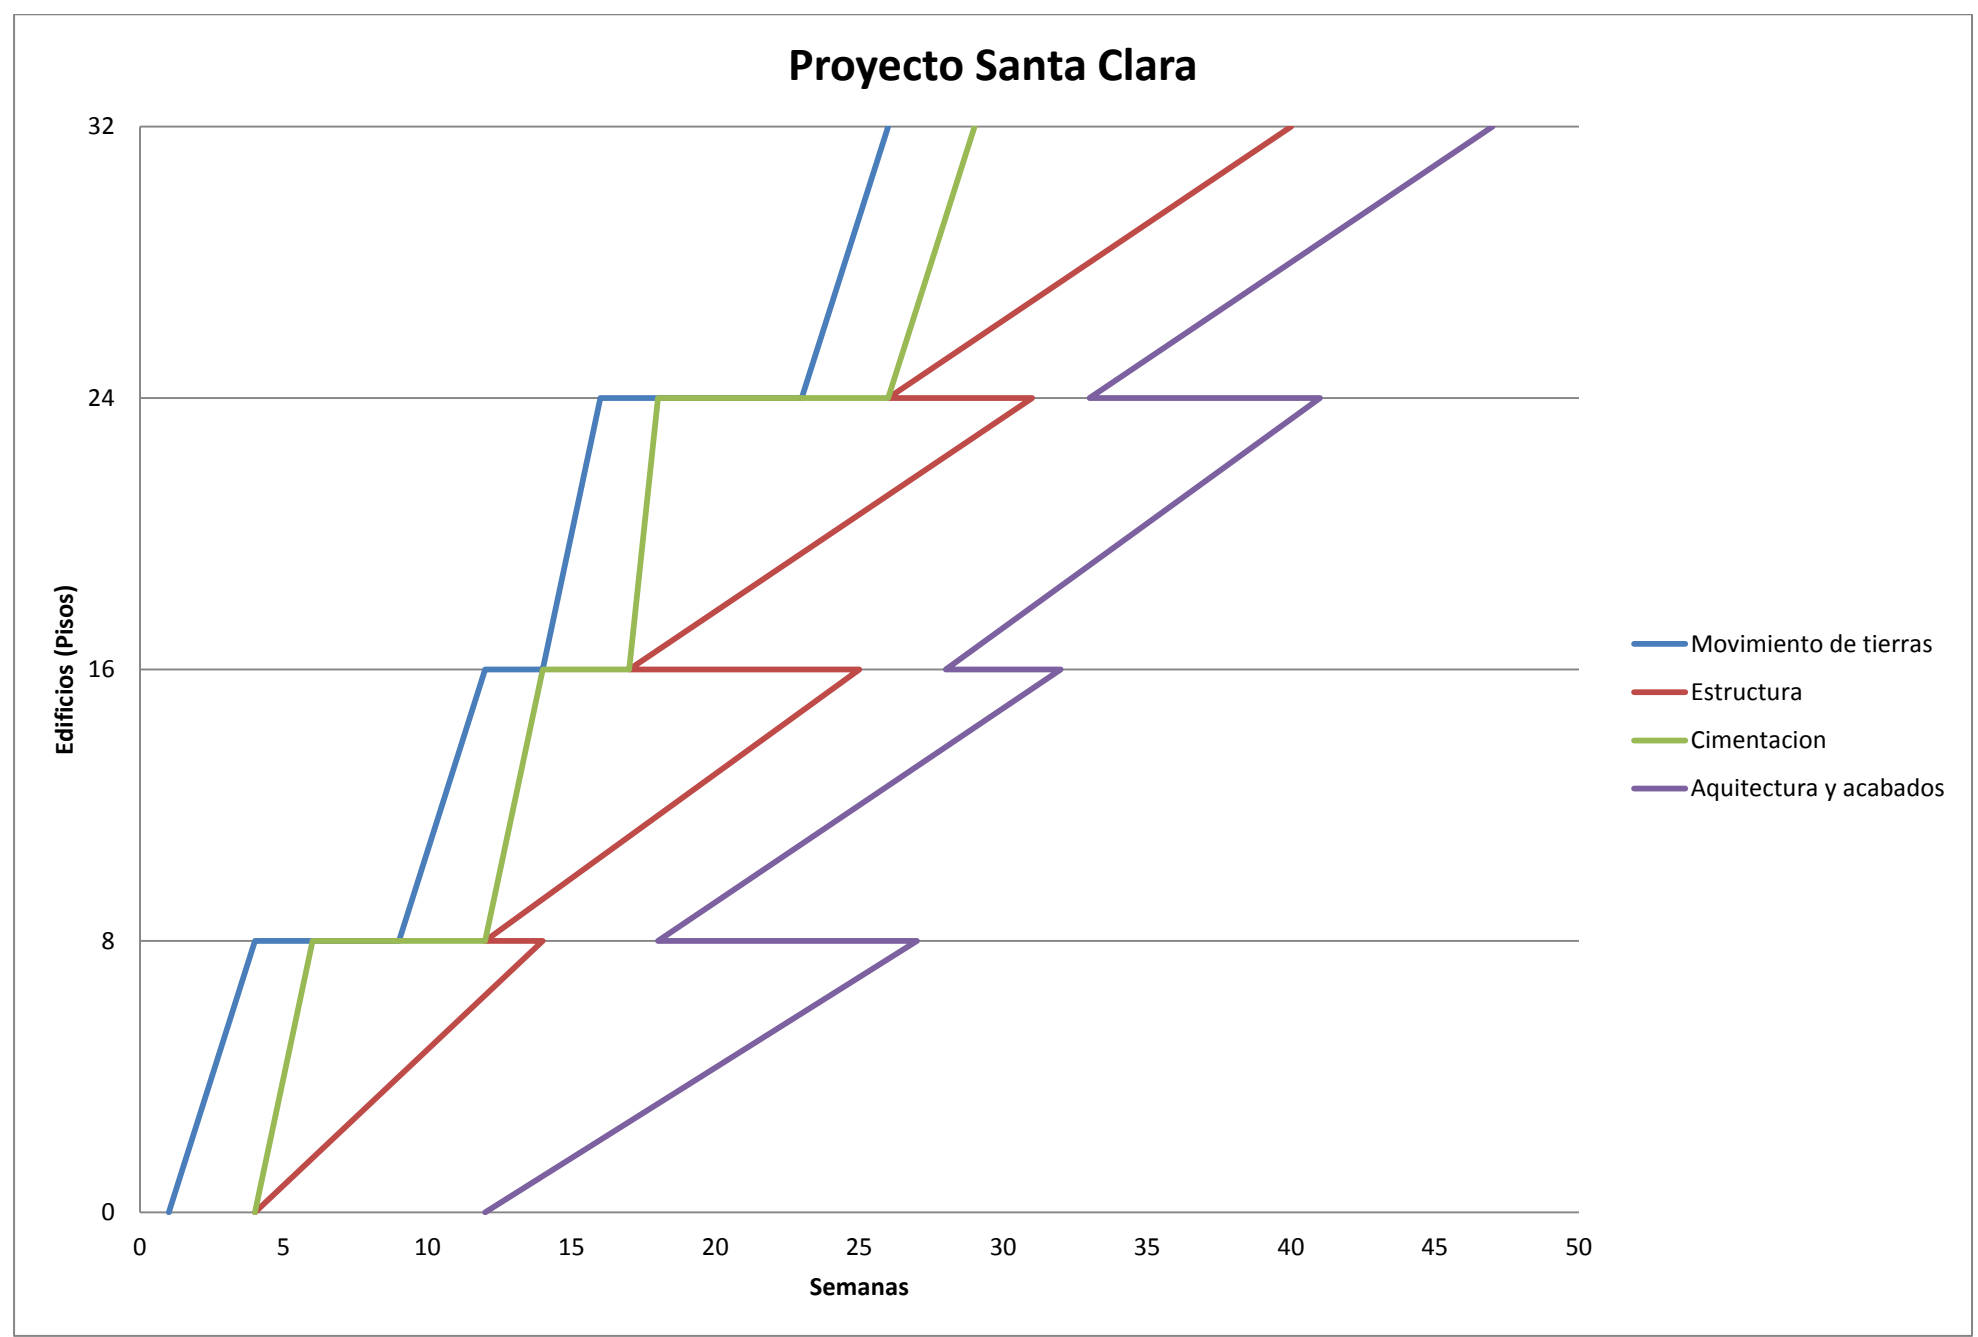


7. Cronograma real. Proyecto Santa Clara.

	J								I								G								H								D												
Numero de piso/Edificio	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Numero de piso para graficar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	25	26	27	28	29	30	31	32	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Pórticos	16	22	26	30	34	38	42	46	50	18	24	28	32	36	40	44	48	52	48	54	58	62	66	70	74	78	82	50	56	60	64	68	72	76	80	84	80	88	94	100	106	112	118	124	130
Solaqueo de muros exteriores	20	25	29	33	37	41	45	49	53	22	27	31	35	39	43	47	51	55	52	57	61	65	69	73	77	81	85	54	59	63	67	71	75	79	83	87	84	91	97	103	109	115	121	127	133
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	20	23	27	31	35	39	43	47	51	22	25	29	33	37	41	45	49	53	52	55	59	63	67	71	75	79	83	54	57	61	65	69	73	77	81	85	84	89	95	101	107	113	119	125	131
Curado de losa	20	23	27	31	35	39	43	47	51	22	25	29	33	37	41	45	49	53	52	55	59	63	67	71	75	79	83	54	57	61	65	69	73	77	81	85	84	89	95	101	107	113	119	125	131
Alfeizar	20	25	29	33	37	41	45	49	53	22	27	31	35	39	43	47	51	55	52	57	61	65	69	73	77	81	85	54	59	63	67	71	75	79	83	87	84	91	97	103	109	115	121	127	133
Lijado y desbaste de placas	24	27	31	35	39	43	47	51	55	26	29	33	37	41	45	49	53	57	56	59	63	67	71	75	79	83	87	58	61	65	69	73	77	81	85	89	88	93	99	105	111	117	123	129	135
Picado - encuentro muro / losa	24	27	31	35	39	43	47	51	55	26	29	33	37	41	45	49	53	57	56	59	63	67	71	75	79	83	87	58	61	65	69	73	77	81	85	89	88	93	99	105	111	117	123	129	135
Corrección IISS/IIEE	24	27	31	35	39	43	47	51	55	26	29	33	37	41	45	49	53	57	56	59	63	67	71	75	79	83	87	58	61	65	69	73	77	81	85	89	88	93	99	105	111	117	123	129	135
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	25	28	32	36	40	44	48	52	56	27	30	34	38	42	46	50	54	58	57	60	64	68	72	76	80	84	88	59	62	66	70	74	78	82	86	90	89	94	100	106	112	118	124	130	136
Tarrajeo de derrames	26	30	36	40	44	48	52	56	60	28	32	38	42	46	50	54	58	62	58	62	68	72	76	80	84	88	92	60	64	70	74	78	82	86	90	94	90	96	102	108	114	120	126	132	138

	J								I								G								H								D								E				
Numero de piso/Edificio	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5
Numero de piso para graficar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Tabiques	31	37	41	45	49	53	57	61	33	39	43	47	51	55	59	63	63	69	73	77	81	85	89	93	65	71	75	79	83	87	91	95	95	103	109	115	121	127	133	139	97	105	111	117	123
Rectificación de cajas de válvulas	35	38	42	46	50	54	58	62	37	40	44	48	52	56	60	64	67	70	74	78	82	86	90	94	69	72	76	80	84	88	92	96	99	104	110	116	122	128	134	140	101	106	112	118	124
Hacer sardinel de ducha prefab.	36	39	43	47	51	55	59	63	38	41	45	49	53	57	61	65	68	71	75	79	83	87	91	95	70	73	77	81	85	89	93	97	100	105	111	117	123	129	135	141	102	107	113	119	125
Enchape baño y cocinas	37	44	48	52	56	60	64	68	39	46	50	54	58	62	66	70	69	76	80	84	88	92	96	100	71	78	82	86	90	94	98	102	101	110	116	122	128	134	140	146	103	112	118	124	130
Instalación de baranda metálica en terraza	39	42	46	50	54	58	62	66	41	44	48	52	56	60	64	68	71	74	78	82	86	90	94	98	73	76	80	84	88	92	96	100	103	108	114	120	126	132	138	144	105	110	116	122	128
Enchape de terrazas	40	43	47	51	55	59	63	67	42	45	49	53	57	61	65	69	72	75	79	83	87	91	95	99	74	77	81	85	89	93	97	101	104	109	115	121	127	133	139	145	106	111	117	123	129
Desapuntalamiento de losa	42	45	48	52	56	60	64	68	44	47	50	54	58	62	66	70	74	77	80	84	88	92	96	100	76	79	82	86	90	94	98	102	106	111	116	122	128	134	140	146	108	113	118	124	130
Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados	43	46	50	54	58	62	66	70	45	48	52	56	60	64	68	72	75	78	82	86	90	94	98	102	77	80	84	88	92	96	100	104	107	112	118	124	130	136	142	148	109	114	120	126	132
Imprimante en muros y techos (PINTURA - MURALCO)	44	47	51	55	59	63	67	71	46	49	53	57	61	65	69	73	76	79	83	87	91	95	99	103	78	81	85	89	93	97	101	105	108	113	119	125	131	137	143	149	110	115	121	127	133
Empaste grueso	45	49	53	57	61	65	69	73	47	51	55	59	63	67	71	75	77	81	85	89	93	97	101	105	79	83	87	91	95	99	103	107	109	115	121	127	133	139	145	151	111	117	123	129	135
Empaste fino	47	50	54	58	62	66	70	74	49	52	56	60	64	68	72	76	79	82	86	90	94	98	102	106	81	84	88	92	96	100	104	108	111	116	122	128	134	140	146	152	113	118	124	130	136
Escarchado de techos	48	52	56	60	64	68	72	76	50	54	58	62	66	70	74	78	80	84	88	92	96	100	104	108	82	86	90	94	98	102	106	110	112	118	124	130	136	142	148	154	114	120	126	132	138
Lijado y sellado cocinas + baños	50	53	57	61	65	69	73	77	52	55	59	63	67	71	7																														

Pintado y forrado de barandas	153	159	165	126	131	137	143	149	155	161	167	170	175	181	187	193	199	205	211	172	177	183	189	195	201	207	213	174	179	185	191	197	203	209	215
Cambio de cerámicos	155	161	167	127	133	139	145	151	157	163	169	171	177	183	189	195	201	207	213	173	179	185	191	197	203	209	215	175	181	187	193	199	205	211	217
Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto.	157	163	169	129	135	141	147	153	159	165	171	173	179	185	191	197	203	209	215	175	181	187	193	199	205	211	217	177	183	189	195	201	207	213	219
Limpieza gruesa general de departamento (contratas)	158	164	170	131	136	142	148	154	160	166	172	175	180	186	192	198	204	210	216	177	182	188	194	200	206	212	218	179	184	190	196	202	208	214	220
Colgado de puerta principal con chapa y tope	159	165	171	132	137	143	149	155	161	167	173	176	181	187	193	199	205	211	217	178	183	189	195	201	207	213	219	180	185	191	197	203	209	215	221
Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas	161	167	173	133	139	145	151	157	163	169	175	177	183	189	195	201	207	213	219	179	185	191	197	203	209	215	221	181	187	193	199	205	211	217	223
Instalación de mamparas + protección tripley o plástico	164	170	176	135	142	148	154	160	166	172	178	179	186	192	198	204	210	216	222	181	188	194	200	206	212	218	224	183	190	196	202	208	214	220	226
Instalación de marcos y ventanas + protección tripley o plástico (VENTANAS - HPD)	163	169	175	136	141	147	153	159	165	171	177	180	185	191	197	203	209	215	221	182	187	193	199	205	211	217	223	184	189	195	201	207	213	219	225
Colgado de puertas interiores (chapa + tope)	165	171	177	138	143	149	155	161	167	173	179	182	187	193	199	205	211	217	223	184	189	195	201	207	213	219	225	186	191	197	203	209	215	221	227
Colowall	168	174	180	139	146	152	158	164	170	176	182	183	190	196	202	208	214	220	226	185	192	198	204	210	216	222	228	187	194	200	206	212	218	224	230
Instalación de placas y tablero general	169	175	181	142	147	153	159	165	171	177	183	186	191	197	203	209	215	221	227	188	193	199	205	211	217	223	229	190	195	201	207	213	219	225	231
Colocación de muebles básicos de cocina y tablero post-formado	170	176	182	143	148	154	160	166	172	178	184	187	192	198	204	210	216	222	228	189	194	200	206	212	218	224	230	191	196	202	208	214	220	226	232
Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado	171	177	183	144	149	155	161	167	173	179	185	188	193	199	205	211	217	223	229	190	195	201	207	213	219	225	231	192	197	203	209	215	221	227	233
Rectificación de derrames y balcones	172	178	184	145	150	156	162	168	174	180	186	189	194	200	206	212	218	224	230	191	196	202	208	214	220	226	232	193	198	204	210	216	222	228	234
Remasillado muros y techos	174	180	186	146	152	158	164	170	176	182	188	190	196	202	208	214	220	226	232	192	198	204	210	216	222	228	234	194	200	206	212	218	224	230	236
Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y balcones)	176	182	188	148	154	160	166	172	178	184	190	192	198	204	210	216	222	228	234	194	200	206	212	218	224	230	236	196	202	208	214	220	226	232	238
Limpieza de vidrios y marcos	177	183	189	150	155	161	167	173	179	185	191	194	199	205	211	217	223	229	235	196	201	207	213	219	225	231	237	198	203	209	215	221	227	233	239
Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas	178	184	190	151	156	162	168	174	180	186	192	195	200	206	212	218	224	230	236	197	202	208	214	220	226	232	238	199	204	210	216	222	228	234	240
Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros/sellado y fraguado de salidas)	179	185	191	152	157	163	169	175	181	187	193	196	201	207	213	219	225	231	237	198	203	209	215	221	227	233	239	200	205	211	217	223	229	235	241
Piso vinílico	183	189	195	153	161	167	173	179	185	191	197	197	205	211	217	223	229	235	241	199	207	213	219	225	231	237	243	201	209	215	221	227	233	239	245
Colocación de contrazócalo	185	191	197	157	163	169	175	181	187	193	199	201	207	213	219	225	231	237	243	203	209	215	221	227	233	239	245	205	211	217	223	229	235	241	247
Aplicación de silicona en perímetro de puerta y contrazócalos encuentro con muro / sellado de muebles de melamine	186	192	198	159	164	170	176	182	188	194	200	203	208	214	220	226	232	238	244	205	210	216	222	228	234	240	246	207	212	218	224	230	236	242	248
Entrega de llaves	196	202	208	169	174	180	186	192	198	204	210	213	218	224	230	236	242	248	254	215	220	226	232	238	244	250	256	217	222	228	234	240	246	252	258

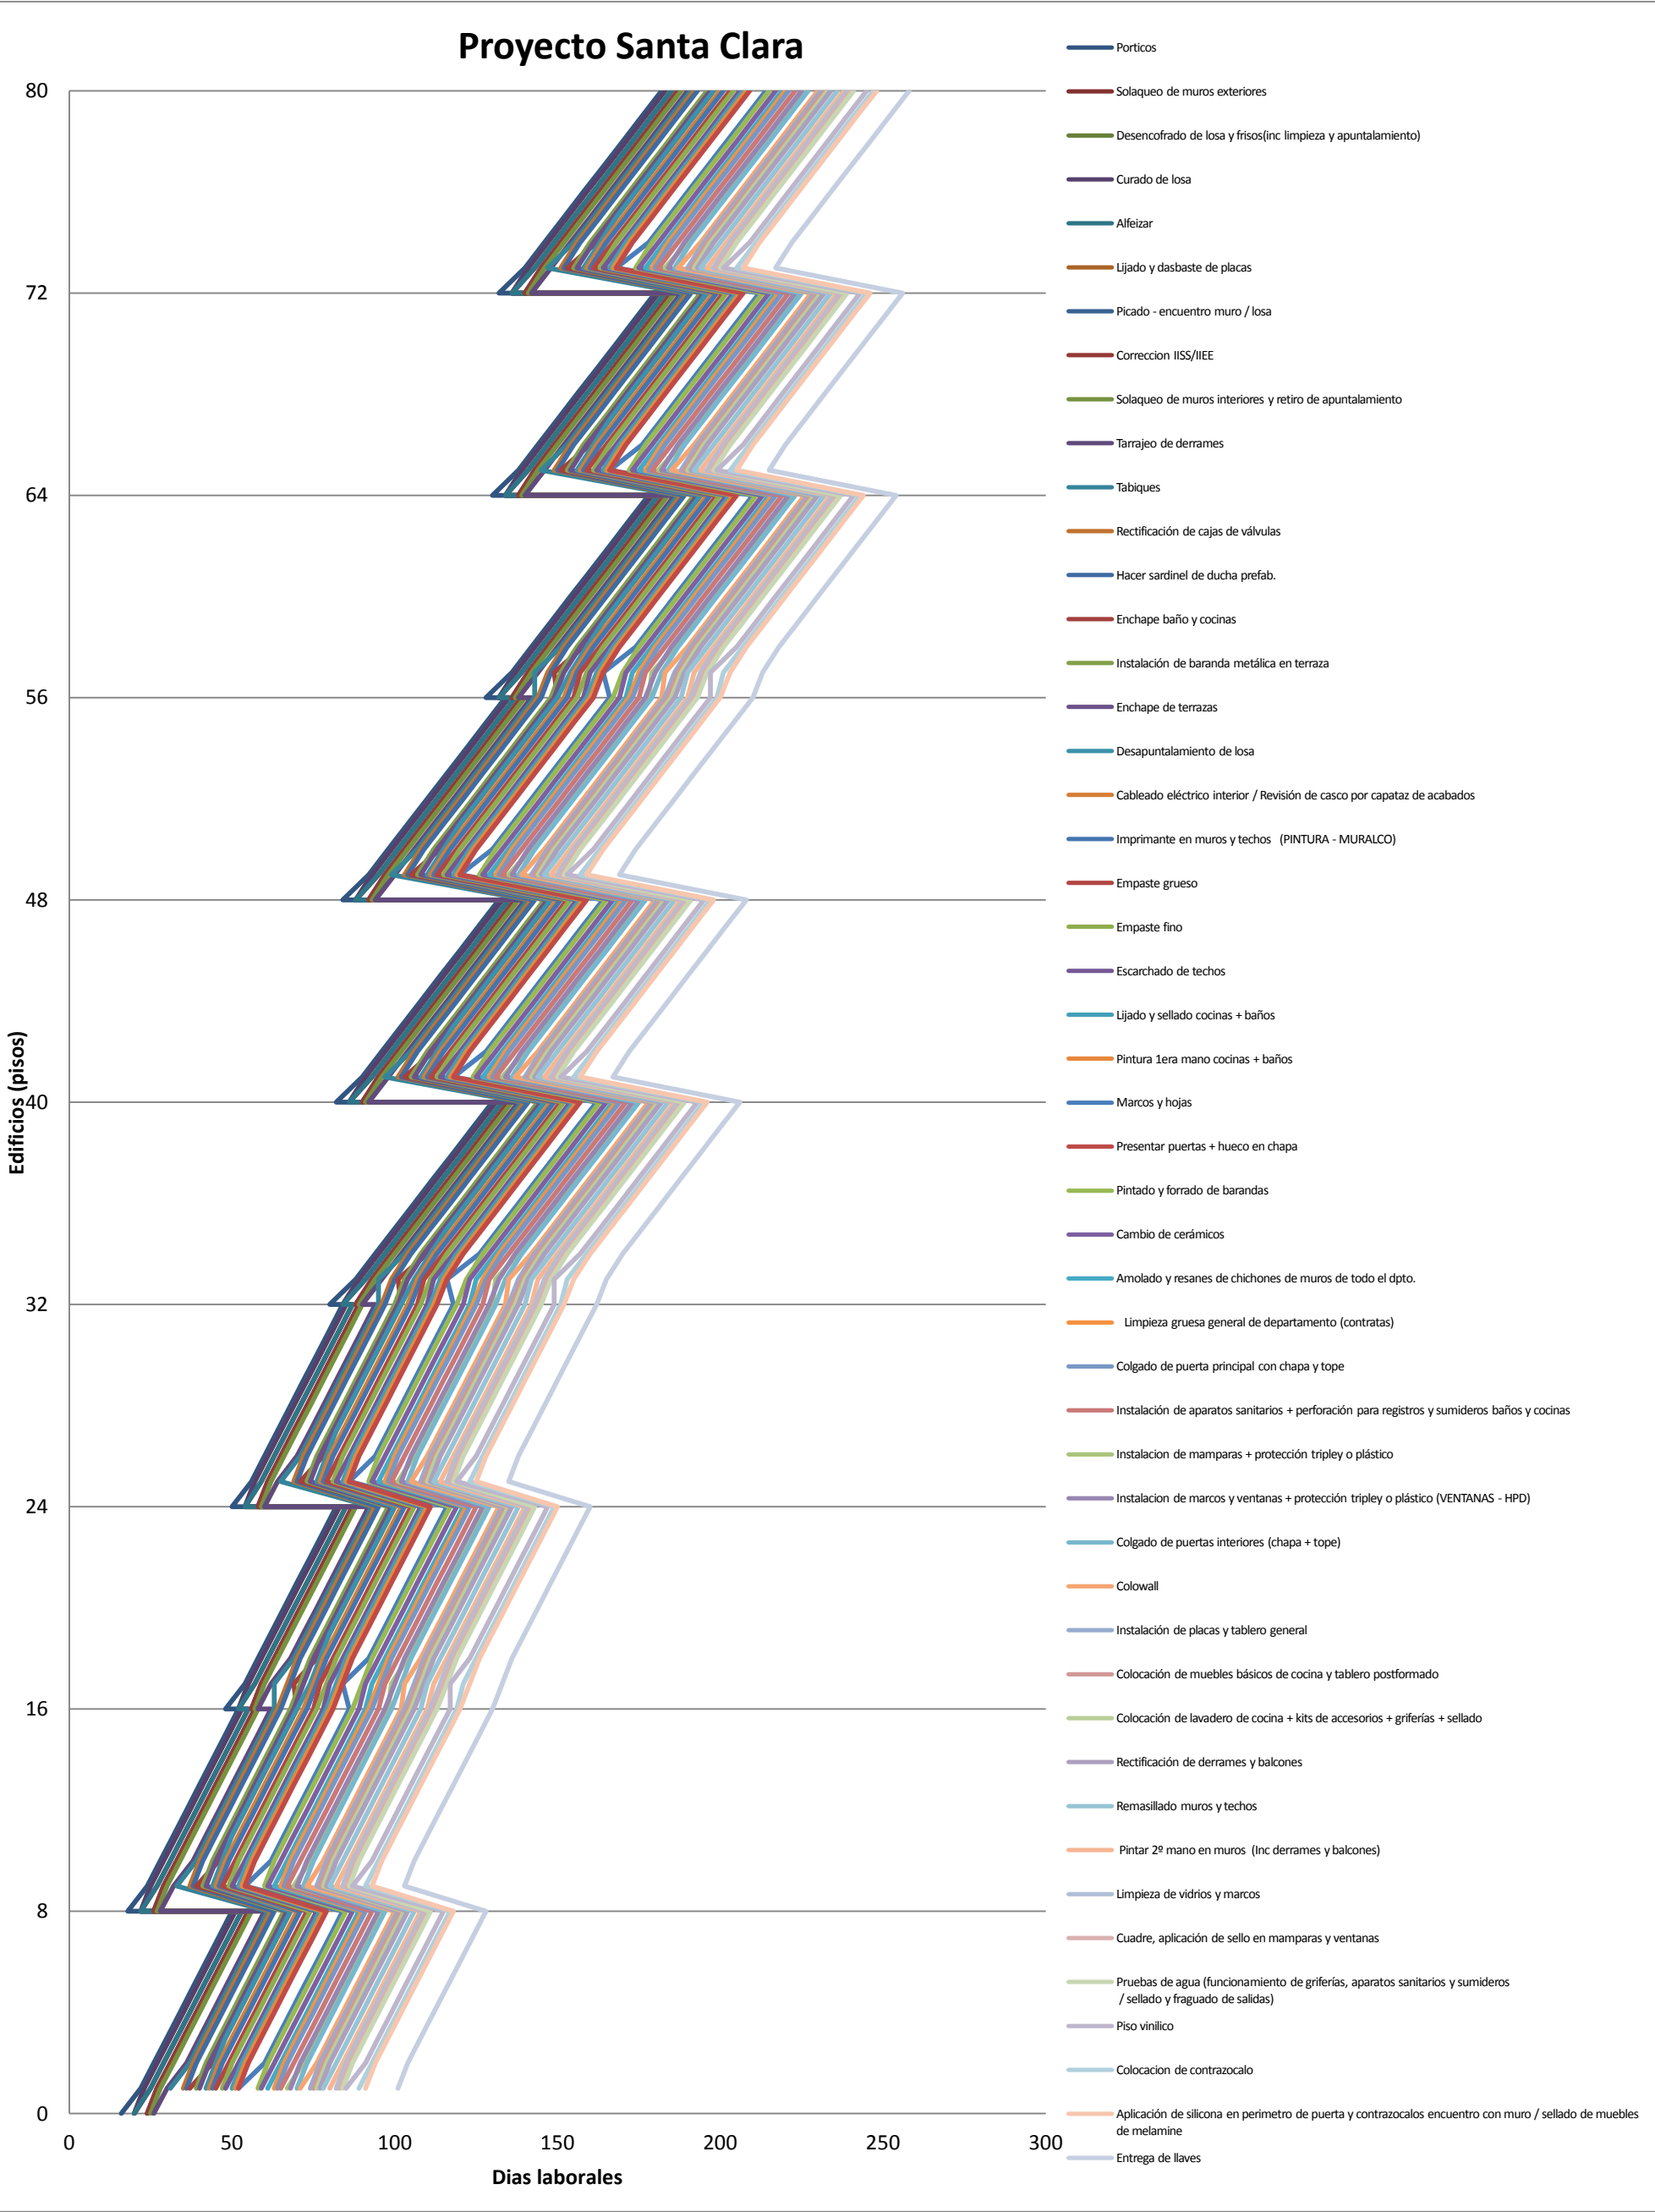


C. Real con líneas rectas

SEMANAS	A	B			C	D			E	F			G	H			I	J		
	0	8	8	16	16	24	24	32	32	40	40	48	48	56	56	64	64	72	72	80
Pórticos	22	31	23	32	23	32	14	23	14	23	15	23	9	14	9	15	3	9	3	9
Solaqueo de muros exteriores	23	32	23	32	24	32	15	23	15	24	15	24	9	15	10	15	4	10	4	9
Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	23	31	23	32	24	32	15	23	15	23	15	24	9	15	10	15	4	9	4	9
Curado de losa	23	31	23	32	24	32	15	23	15	23	15	24	9	15	10	15	4	9	4	9
Alfeizar	23	32	23	32	24	32	15	23	15	24	15	24	9	15	10	15	4	10	4	9
Lijado y desbaste de placas	24	32	24	32	25	33	15	24	16	24	16	24	10	15	10	16	5	10	4	10
Picado - encuentro muro / losa	24	32	24	32	25	33	15	24	16	24	16	24	10	15	10	16	5	10	4	10
Corrección IISS/IIIEE	24	32	24	32	25	33	15	24	16	24	16	24	10	15	10	16	5	10	4	10
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	24	32	24	33	25	33	16	24	16	24	16	25	10	15	10	16	5	10	5	10
Tarrajeo de derrames	24	33	25	33	25	33	16	24	16	25	17	25	10	16	11	17	5	11	5	11


SEMANAS	1	8	9	16	17	24	25	32	33	40	41	48	49	56	57	64	65	72	73	80
Tabiques	25	33	26	33	26	33	17	24	17	25	17	25	11	16	12	17	6	11	6	11
Rectificación de cajas de válvulas	26	33	26	33	27	34	17	25	18	25	18	25	12	17	12	17	7	11	6	11
Hacer sardinel de ducha prefab.	26	33	26	33	27	34	18	25	18	25	18	26	12	17	12	17	7	12	6	11
Enchape baño y cocinas	26	34	27	34	27	35	18	26	18	26	18	26	12	18	13	18	7	12	7	12
Instalación de baranda metálica en terraza	27	34	27	34	27	34	18	25	18	26	19	26	13	17	13	18	7	12	7	12
Enchape de terrazas	27	34	27	34	27	34	18	26	19	26	19	26	13	17	13	18	8	12	7	12
Desapuntalamiento de losa	27	34	27	34	28	35	19	26	19	26	19	26	13	18	13	18	8	12	8	12
Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados	27	34	28	35	28	35	19	26	19	26	19	27	13	18	14	18	8	13	8	12
Imprimante en muros y techos (PINTURA - MURALCO)	27	34	28	35	28	35	19	26	19	27	20	27	13	18	14	18	8	13	8	13
Empaste grueso	28	35	28	35	28	35	19	27	19	27	20	27	14	18	14	19	8	13	8	13
Empaste fino	28	35	28	35	29	36	19	27	20	27	20	27	14	19	14	19	9	13	8	13
Escarchado de techos	28	35	28	36	29	36	20	27	20	27	20	28	14	19	14	19	9	14	9	13
Lijado y sellado cocinas + baños	28	35	29	36	29	36	20	27	20	28	21	28	14	19	15	19	9	14	9	14
Pintura 1era mano cocinas + baños	29	36	29	36	29	36	20	27	20	28	21	28	15	19	15	20	9	14	9	14
Marcos y hojas	29	37	29	37	29	37	20	28	21	29	21	29	15	20	15	21	10	15	9	15
Presentar puertas + hueco en chapa	29	36	29	36	29	36	20	28	21	28	21	28	15	19	15	20	10	14	9	14
Pintado y forrado de barandas	30	37	30	37	31	37	21	29	22	29	22	29	16	20	16	21	11	15	10	15
Cambio de cerámicos	30	37	30	37	31	38	21	29	22	29	22	30	16	21	16	21	11	16	10	15
Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto.	30	37	31	38	31	38	22	29	22	30	23	30	16	21	17	21	11	16	11	16
Limpieza gruesa general de departamento (contratas)	31	38	31	38	31	38	22	29	23	30	23	30	17	21	17	22	12	16	11	16
Colgado de puerta principal con chapa y tope	31	38	31	38	32	38	22	30	23	30	23	30	17	21	17	22	12	16	11	16
Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas	31	38	31	38	32	39	23	30	23	30	23	31	17	22	17	22	12	17	12	16
Instalación de mamparas + protección triplex o plástico	31	39	32	39	32	39	23	31	23	31	24	31	17	22	18	23	12	17	12	17
Instalación de marcos y ventanas + protección triplex o plástico	32	38	32	39	32	39	23	30	23	31	24	31	18	22	18	23	12	17	12	17

(VENTANAS - HPD)

Colgado de puertas interiores (chapa + tope)	32	39	32	39	33	39	23	31	24	31	24	31	18	23	18	23	13	17	12	17
Colowall	32	39	32	40	33	40	24	31	24	32	24	32	18	23	18	23	13	18	13	18
Instalación de placas y tablero general	33	39	33	40	33	40	24	31	25	32	25	32	19	23	19	24	13	18	13	18
Colocación de muebles básicos de cocina y tablero post-formado	33	40	33	40	33	40	24	32	25	32	25	32	19	23	19	24	14	18	13	18
Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado	33	40	33	40	34	40	25	32	25	32	25	32	19	24	19	24	14	18	13	18
Rectificación de derrames y balcones	33	40	33	40	34	41	25	32	25	32	26	33	19	24	19	24	14	19	14	18
Remasillado muros y techos	33	40	34	41	34	41	25	32	25	33	26	33	19	24	20	25	14	19	14	19
Pintar 2º mano en muros (Inc. derrames y balcones)	34	41	34	41	34	41	25	33	26	33	26	33	20	25	20	25	14	19	14	19
Limpieza de vidrios y marcos	34	41	34	41	35	41	26	33	26	33	26	33	20	25	20	25	15	19	14	19
Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas	34	41	34	41	35	42	26	33	26	33	27	34	20	25	20	25	15	20	15	19
Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros/ sellado y fraguado de salidas)	34	41	35	41	35	42	26	33	26	33	27	34	20	25	21	26	15	20	15	19
Piso vinílico	34	42	35	42	35	42	26	34	27	34	27	34	20	26	21	26	15	20	15	20
Colocación de contrazócalo	35	42	35	42	36	43	27	34	27	34	28	35	21	26	21	27	16	21	16	20
Aplicación de silicona en perímetro de puerta y contrazócalos encuentro con muro / sellado de muebles de melamine	35	42	36	43	36	43	27	34	28	35	28	35	21	26	22	27	16	21	16	21
Entrega de llaves	37	44	37	44	38	44	29	36	29	36	30	37	23	28	24	28	18	23	18	22

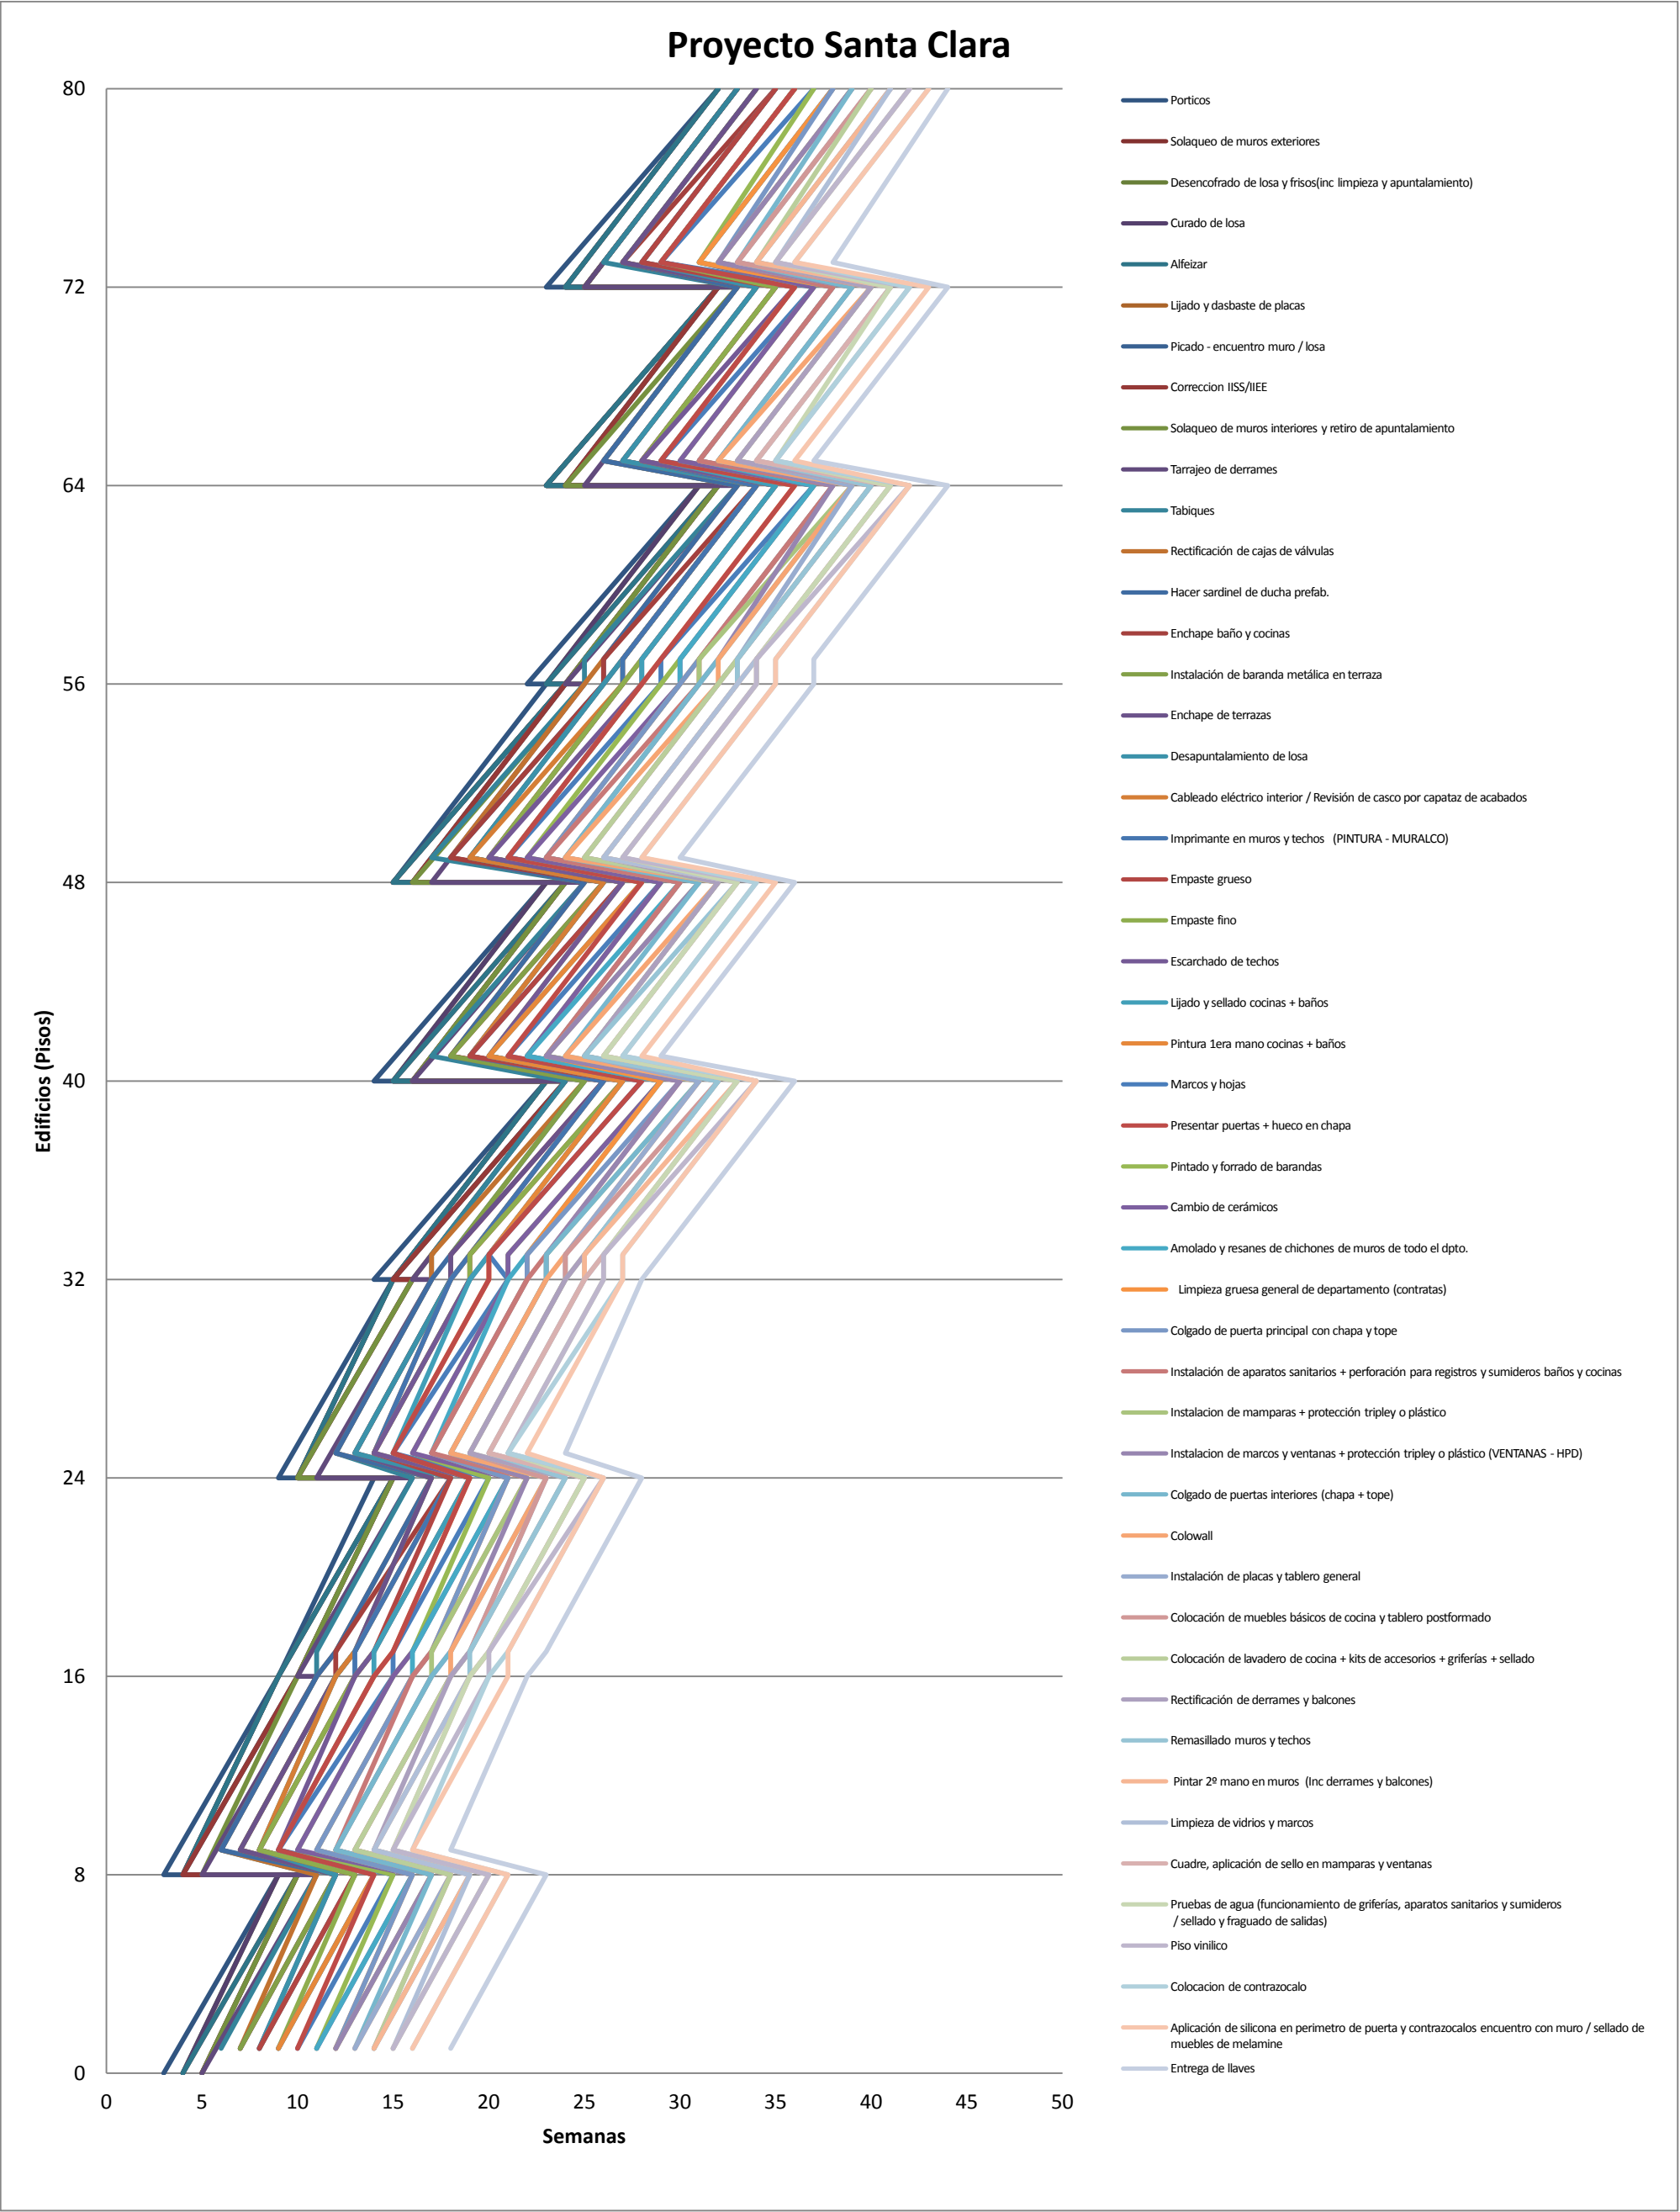


8. Cronograma real. Proyecto Villa Bonita 4.

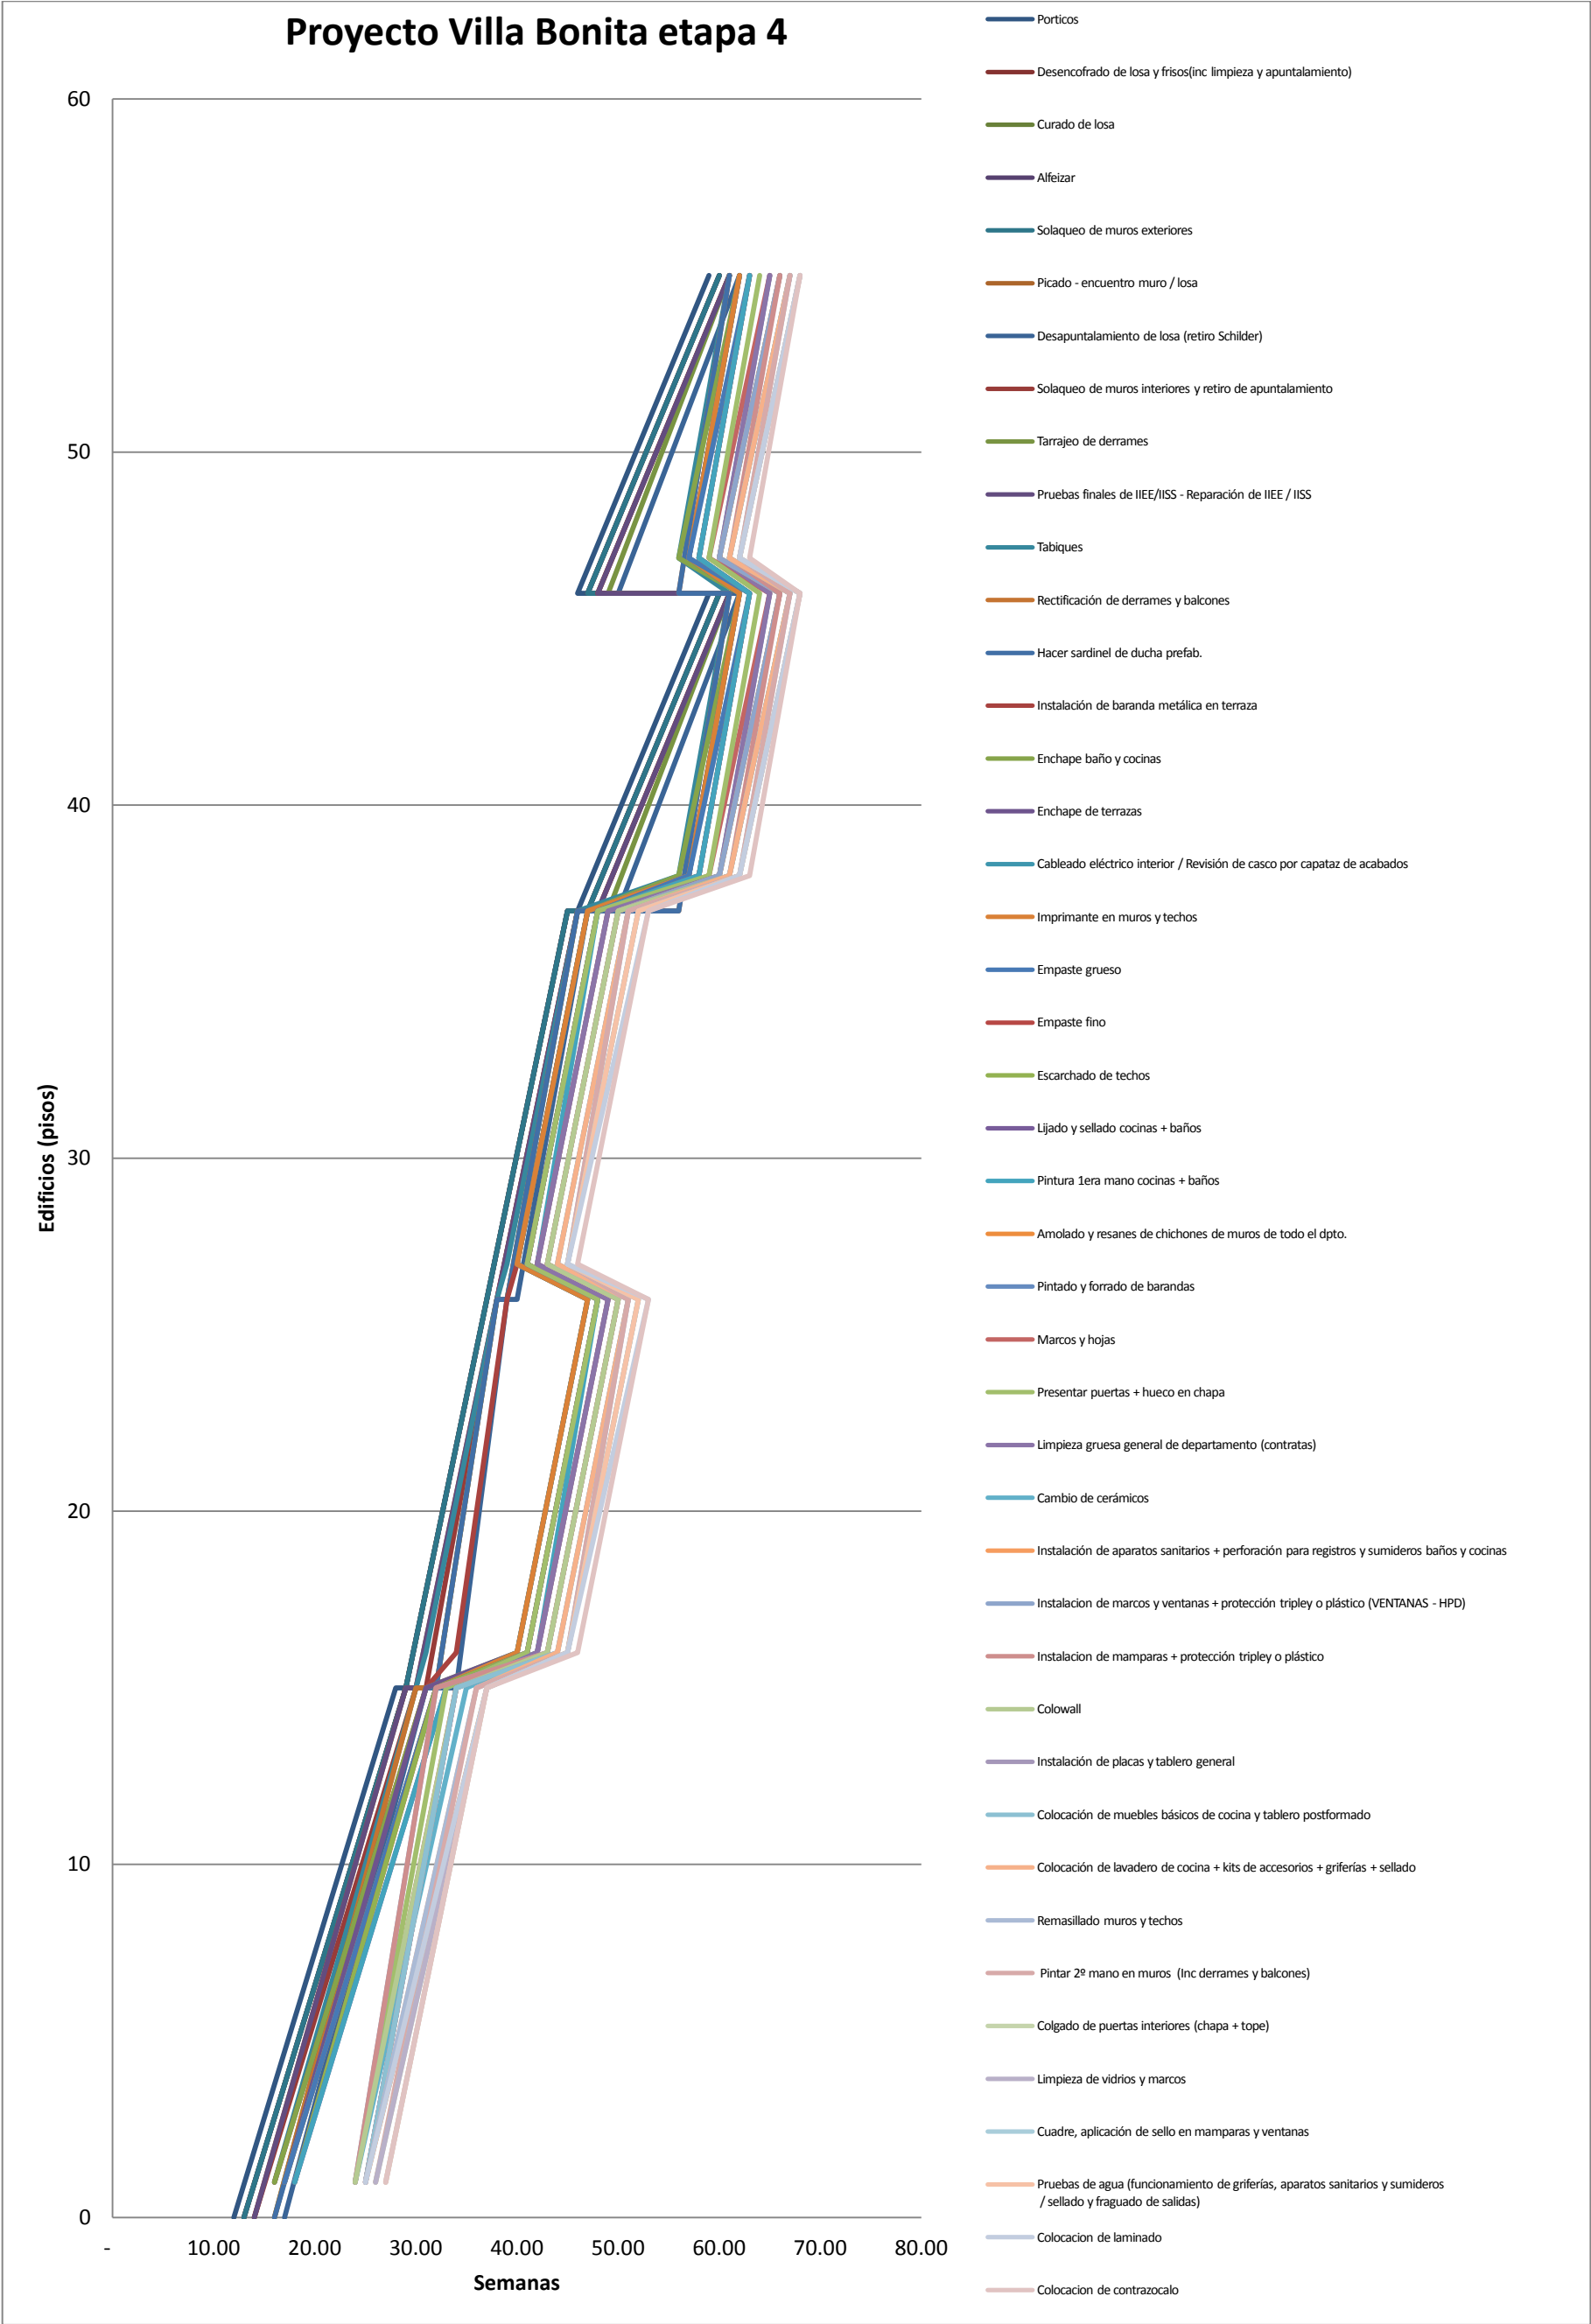

9. Cronograma meta. Proyecto Muros Anclados – Salaverry.


Frente 1:

DIAS CALENDARIO	Anillo 4.0	Anillo 3.5	Anillo 3.0	Anillo 2.5	Anillo 2.0	Anillo 1.5	Anillo 1.0	Anillo 0.5	Anillo 0.0	V
Anclaje	03/09/2012	15/09/2012	26/09/2012	09/10/2012	22/10/2012	03/11/2012	15/11/2012	28/11/2012	12/12/2012	0.04
Perfilado	08/09/2012	18/09/2012	28/09/2012	11/10/2012	24/10/2012	06/11/2012	17/11/2012	30/11/2012	14/12/2012	0.05
Acero	10/09/2012	19/09/2012	29/09/2012	12/10/2012	25/10/2012	07/11/2012	19/11/2012	01/12/2012	15/12/2012	0.05
Encofrado	11/09/2012	20/09/2012	01/10/2012	13/10/2012	26/10/2012	08/11/2012	20/11/2012	03/12/2012	17/12/2012	0.04
Concreto	12/09/2012	21/09/2012	02/10/2012	15/10/2012	27/10/2012	09/11/2012	21/11/2012	04/12/2012	18/12/2012	0.04
Tensado	17/09/2012	26/09/2012	06/10/2012	19/10/2012	02/11/2012	14/11/2012	26/11/2012	10/12/2012	22/12/2012	0.05

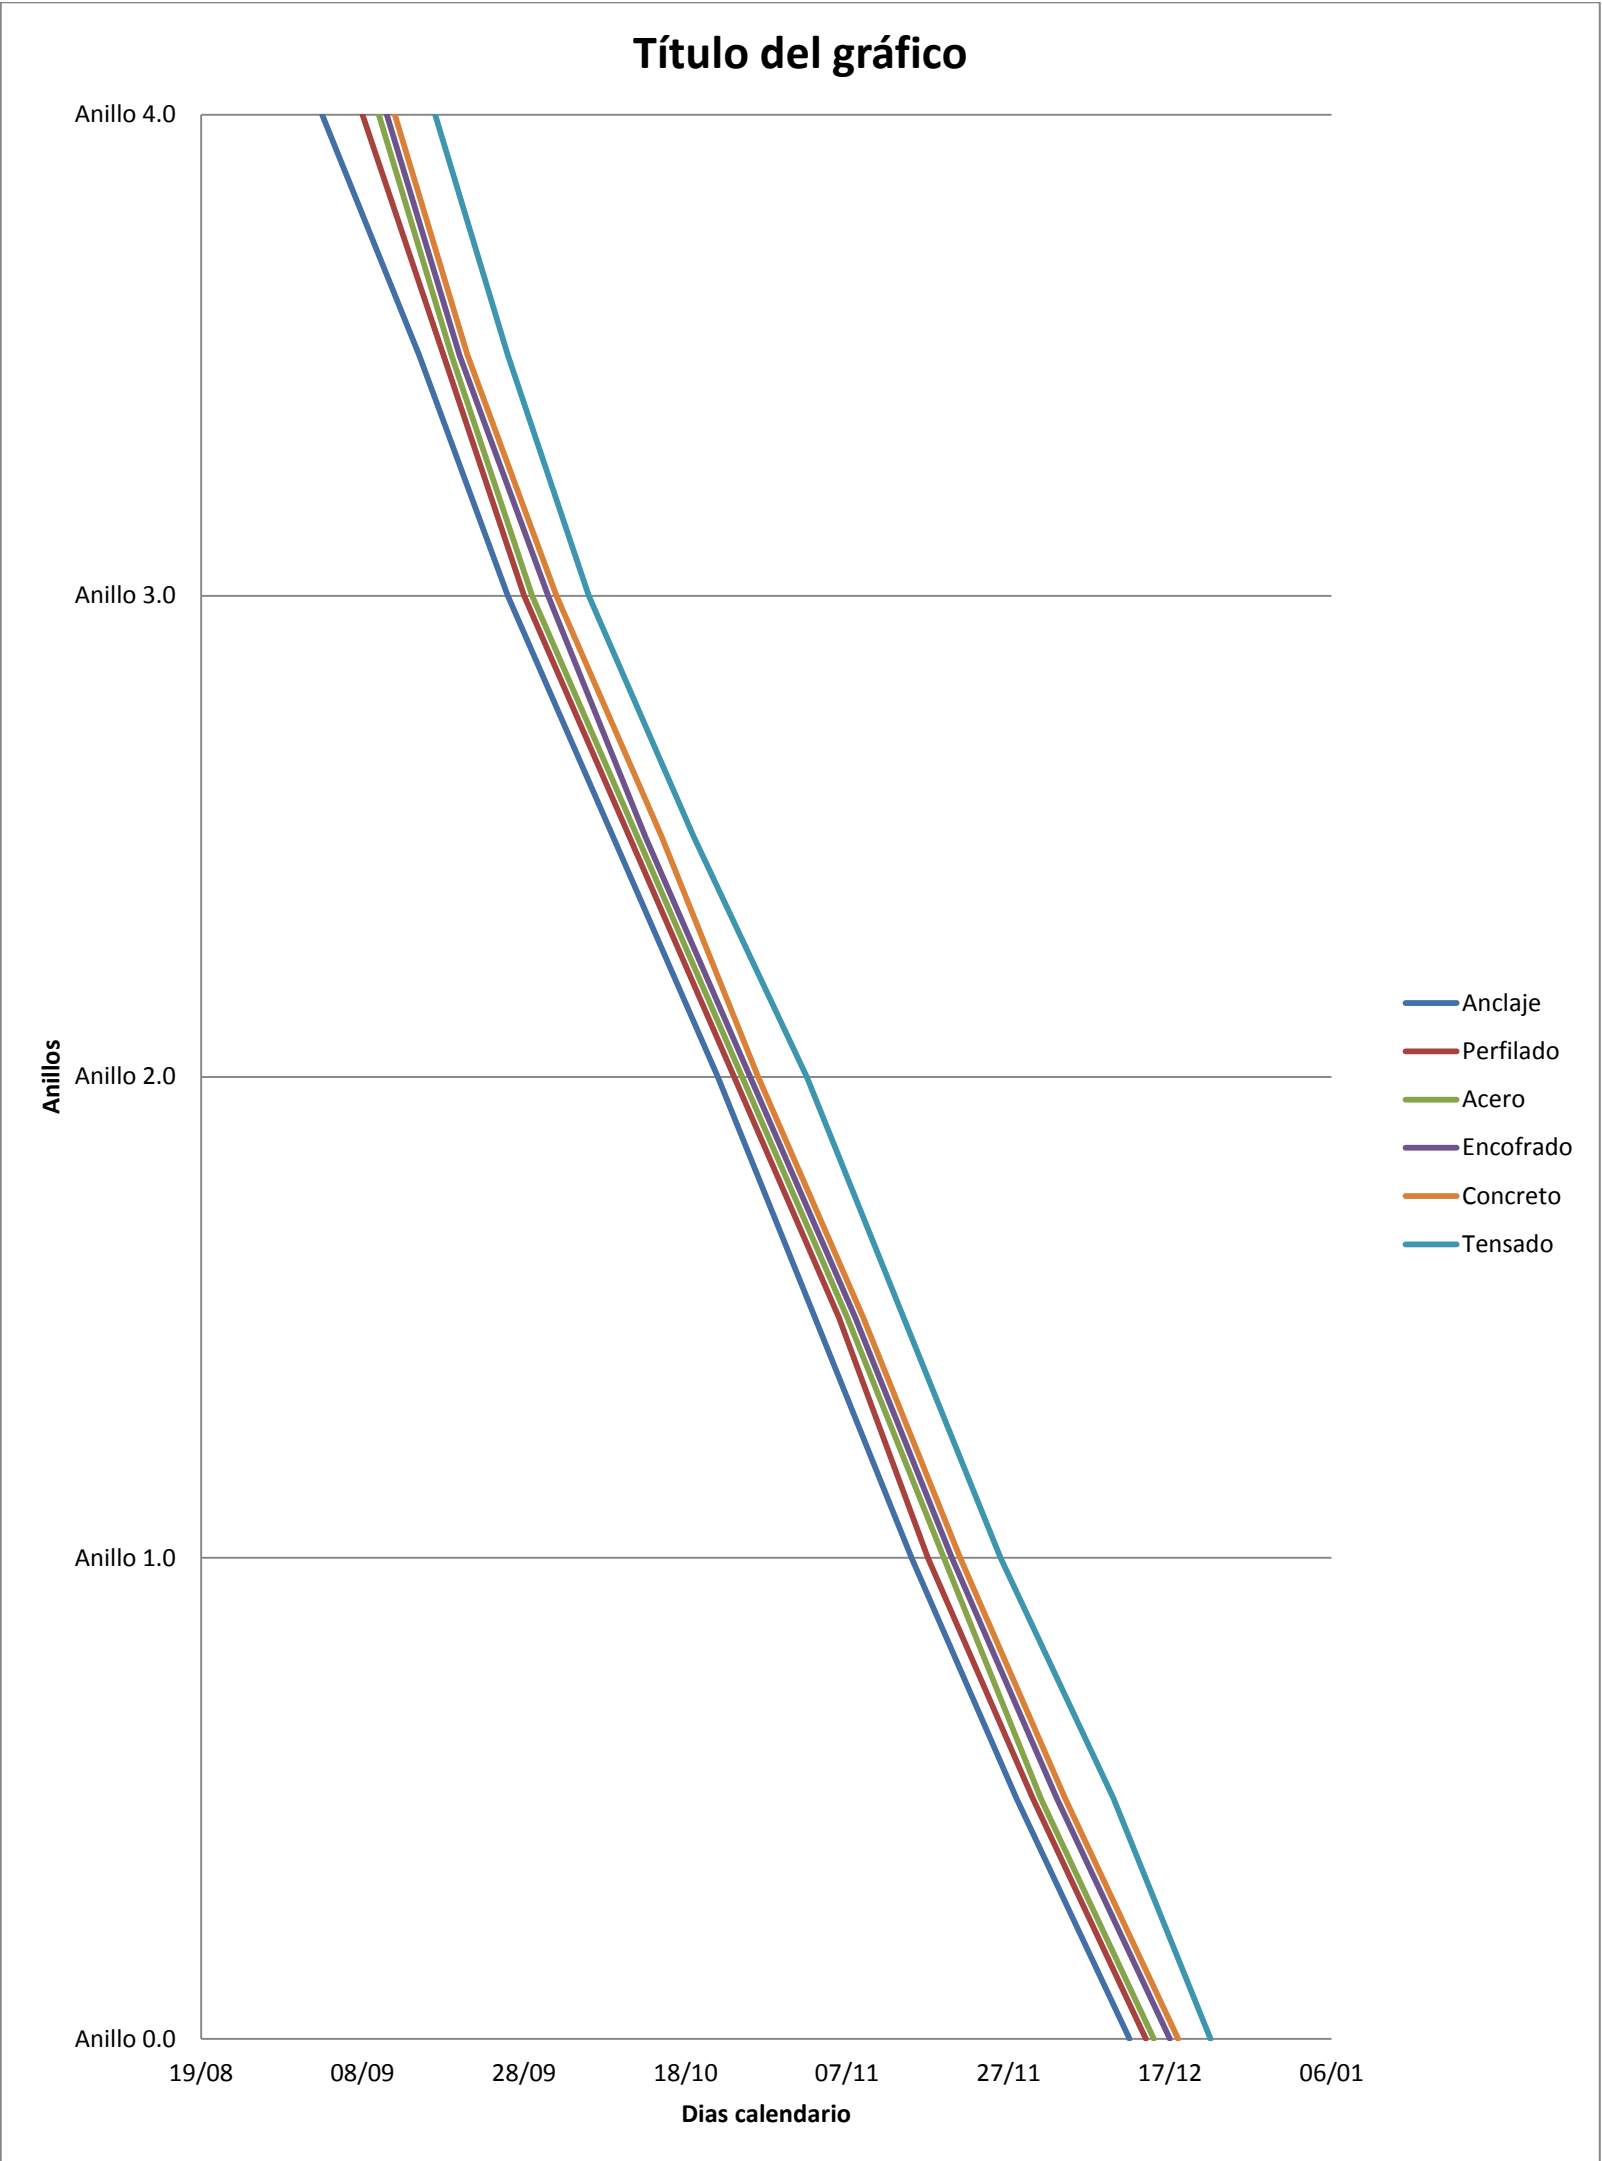

Frente 2:

DIAS CALENDARIO	Anillo 3.0	Anillo 2.5	Anillo 2.0	Anillo 1.5	Anillo 1.0	Anillo 0.5	Anillo 0.0	V
Anclaje	03/09/2012	12/10/2012	23/10/2012	05/11/2012	17/11/2012	29/11/2012	12/12/2012	0.05
Perfilado	04/10/2012	15/10/2012	25/10/2012	07/11/2012	20/11/2012	01/12/2012	14/12/2012	0.05
Acero	05/10/2012	16/10/2012	26/10/2012	08/11/2012	21/11/2012	03/12/2012	15/12/2012	0.05
Encofrado	06/10/2012	17/10/2012	27/10/2012	09/11/2012	22/11/2012	04/12/2012	17/12/2012	0.05
Concreto	09/10/2012	18/10/2012	29/10/2012	10/11/2012	23/11/2012	05/12/2012	18/12/2012	0.05
Tensado	13/10/2012	23/10/2012	03/11/2012	15/11/2012	28/11/2012	11/12/2012	22/12/2012	0.05

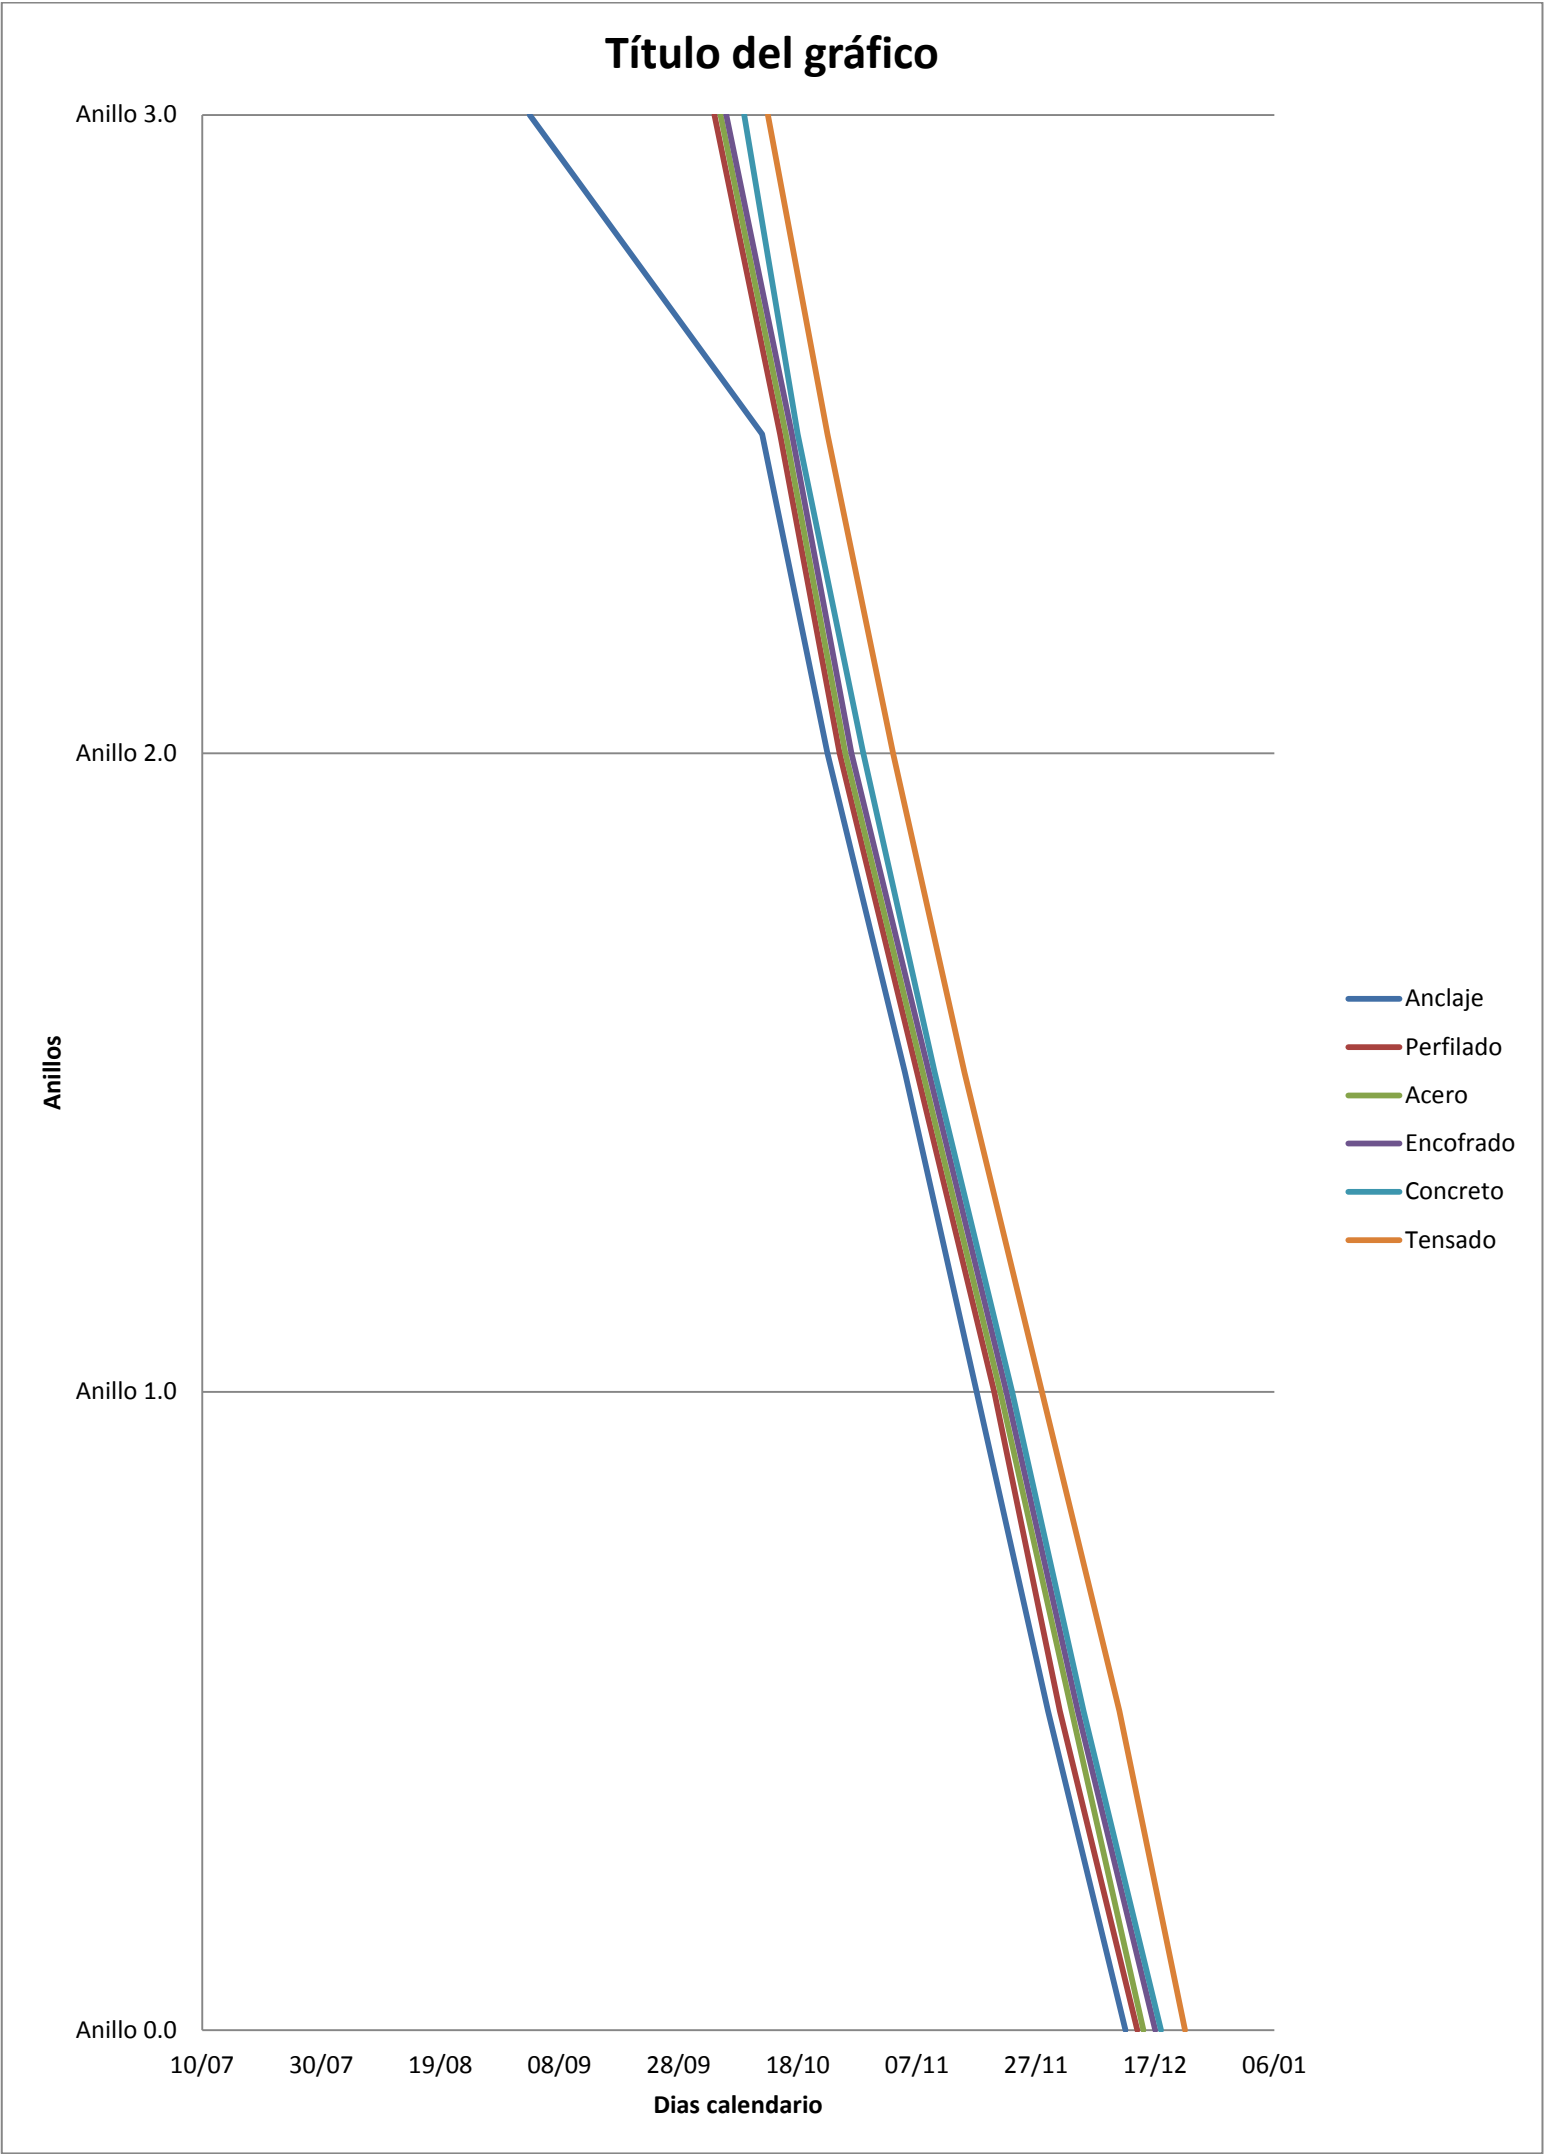

10. Datos para el análisis del C. meta versus el C. venta del proyecto Canta Callao.

			META			VENTA			Diferencia		
N°	Nombre de tarea	Duración		Start	Finish	Duración		Start	Finish	D	%
1	CONDominio CIUDAD NUEVA- CANTA CALLAO	380 days	380	Mon 3/19/12	Thu 6/27/13	441 days	441	Mon 3/26/12	Tue 9/17/13	61	16%
2	4. FRENTE_1	374 days	374	Mon 3/26/12	Thu 6/27/13	441 days	441	Mon 3/26/12	Tue 9/17/13	67	18%
3	EDIFICIO AB (E17-E18)	154 days	154	Mon 3/26/12	Sat 9/29/12	167 days	167	Mon 3/26/12	Tue 10/16/12	13	8%
4	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO AB	70 days	70	Mon 4/23/12	Tue 7/17/12	86 days	86	Thu 4/19/12	Thu 8/2/12	16	23%
5	Trazar muros	64 days	64	Mon 4/23/12	Tue 7/10/12	80 days	80	Thu 4/19/12	Wed 7/25/12	16	25%
6	Colocar acero vertical	64 days	64	Mon 4/23/12	Tue 7/10/12	80 days	80	Thu 4/19/12	Wed 7/25/12	16	25%
7	Instalaciones en muros - IISS	64 days	64	Mon 4/23/12	Tue 7/10/12	80 days	80	Thu 4/19/12	Wed 7/25/12	16	25%
8	Instalaciones en muros - IIEE	64 days	64	Mon 4/23/12	Tue 7/10/12	80 days	80	Thu 4/19/12	Wed 7/25/12	16	25%
9	Encofrado de muros	64 days	64	Tue 4/24/12	Wed 7/11/12	80 days	80	Fri 4/20/12	Thu 7/26/12	16	25%
10	Vaciado de muros	64 days	64	Tue 4/24/12	Wed 7/11/12	80 days	80	Fri 4/20/12	Thu 7/26/12	16	25%
11	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	64 days	64	Wed 4/25/12	Thu 7/12/12	80 days	80	Sat 4/21/12	Fri 7/27/12	16	25%
12	Curado y resane de muros	64 days	64	Wed 4/25/12	Thu 7/12/12	80 days	80	Sat 4/21/12	Fri 7/27/12	16	25%
13	Encofrado de losa (inc. friso)	64 days	64	Wed 4/25/12	Thu 7/12/12	80 days	80	Sat 4/21/12	Fri 7/27/12	16	25%
14	Acero de losa	64 days	64	Wed 4/25/12	Thu 7/12/12	80 days	80	Sat 4/21/12	Fri 7/27/12	16	25%
15	Armado de baterías de desagüe e inicio de pruebas	64 days	64	Wed 4/25/12	Thu 7/12/12	80 days	80	Sat 4/21/12	Fri 7/27/12	16	25%
16	Instalaciones en losa - IISS	64 days	64	Thu 4/26/12	Fri 7/13/12	80 days	80	Mon 4/23/12	Mon 7/30/12	16	25%
17	Instalaciones en losa - IIEE	64 days	64	Thu 4/26/12	Fri 7/13/12	80 days	80	Mon 4/23/12	Mon 7/30/12	16	25%
18	Vaciado de losa	64 days	64	Thu 4/26/12	Fri 7/13/12	80 days	80	Mon 4/23/12	Mon 7/30/12	16	25%
19	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	64 days	64	Fri 4/27/12	Sat 7/14/12	80 days	80	Tue 4/24/12	Tue 7/31/12	16	25%
20	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	64 days	64	Fri 4/27/12	Sat 7/14/12	80 days	80	Tue 4/24/12	Tue 7/31/12	16	25%
21	Curado de losa	64 days	64	Fri 4/27/12	Sat 7/14/12	80 days	80	Tue 4/24/12	Tue 7/31/12	16	25%
22	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	64 days	64	Fri 4/27/12	Sat 7/14/12	80 days	80	Tue 4/24/12	Tue 7/31/12	16	25%
23	Encofrado de alfeizar (8 und)	64 days	64	Sat 4/28/12	Mon 7/16/12	80 days	80	Wed 4/25/12	Wed 8/1/12	16	25%
24	Vaciado de alfeizar	64 days	64	Sat 4/28/12	Mon 7/16/12	80 days	80	Wed 4/25/12	Wed 8/1/12	16	25%
25	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	64 days	64	Mon 4/30/12	Tue 7/17/12	80 days	80	Thu 4/26/12	Thu 8/2/12	16	25%
26	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	64 days	64	Mon 4/30/12	Tue 7/17/12	80 days	80	Thu 4/26/12	Thu 8/2/12	16	25%
27	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO AB	81 days	81	Wed 5/2/12	Wed 8/8/12	97 days	97	Fri 4/27/12	Thu 8/23/12	16	20%
28	Lijado y desbaste de placas	64 days	64	Wed 5/2/12	Wed 7/18/12	80 days	80	Fri 4/27/12	Fri 8/3/12	16	25%
29	Entrega de picado de muros y techo	64 days	64	Wed 5/2/12	Wed 7/18/12	80 days	80	Fri 4/27/12	Fri 8/3/12	16	25%
30	Entrega de pruebas de presión de IISS y winchado de IIEE	64 days	64	Wed 5/2/12	Wed 7/18/12	80 days	80	Fri 4/27/12	Fri 8/3/12	16	25%
31	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	64 days	64	Thu 5/3/12	Thu 7/19/12	80 days	80	Sat 4/28/12	Sat 8/4/12	16	25%
32	Tarrajeo de derrames	64 days	64	Sat 5/5/12	Sat 7/21/12	80 days	80	Wed 5/2/12	Tue 8/7/12	16	25%
33	Trazo para tabiques	64 days	64	Fri 5/11/12	Fri 7/27/12	80 days	80	Tue 5/8/12	Mon 8/13/12	16	25%
34	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	64 days	64	Fri 5/11/12	Fri 7/27/12	80 days	80	Tue 5/8/12	Mon 8/13/12	16	25%
35	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	64 days	64	Fri 5/11/12	Fri 7/27/12	80 days	80	Tue 5/8/12	Mon 8/13/12	16	25%
36	Anclajes y emplentillado para tabiques - La Casa	64 days	64	Fri 5/11/12	Fri 7/27/12	80 days	80	Tue 5/8/12	Mon 8/13/12	16	25%
37	Levantar tabiques - La Casa	64 days	64	Mon 5/14/12	Mon 7/30/12	80 days	80	Wed 5/9/12	Tue 8/14/12	16	25%
38	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	64 days	64	Mon 5/14/12	Mon 7/30/12	80 days	80	Wed 5/9/12	Tue 8/14/12	16	25%
39	Solaqueo de tabiques	64 days	64	Mon 5/14/12	Mon 7/30/12	80 days	80	Wed 5/9/12	Tue 8/14/12	16	25%
40	Rectificación de cajas de válvulas	64 days	64	Mon 5/14/12	Mon 7/30/12	80 days	80	Wed 5/9/12	Tue 8/14/12	16	25%
41	Hacer sardinel de ducha	64 days	64	Tue 5/15/12	Tue 7/31/12	80 days	80	Thu 5/10/12	Wed 8/15/12	16	25%
42	Colocar zócalo de cerámica en baños y cocinas	64 days	64	Wed 5/16/12	Wed 8/1/12	80 days	80	Fri 5/11/12	Thu 8/16/12	16	25%
43	Enchapar piso cerámico baño y cocina	64 days	64	Thu 5/17/12	Thu 8/2/12	80 days	80	Mon 5/14/12	Fri 8/17/12	16	25%
44	Enchapar contrazócalo cerámico baño y cocina	64 days	64	Fri 5/18/12	Fri 8/3/12	80 days	80	Tue 5/15/12	Sat 8/18/12	16	25%
45	Instalación de baranda metálica en terraza	64 days	64	Fri 5/18/12	Fri 8/3/12	80 days	80	Wed 5/16/12	Mon 8/20/12	16	25%
46	Enchape de terrazas	64 days	64	Sat 5/19/12	Sat 8/4/12	80 days	80	Thu 5/17/12	Tue 8/21/12	16	25%
47	Fraguar zócalos y pisos de cerámico en cocinas y baños	64 days	64	Mon 5/21/12	Mon 8/6/12	80 days	80	Fri 5/18/12	Wed 8/22/12	16	25%
48	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	64 days	64	Tue 5/22/12	Tue 8/7/12	80 days	80	Sat 5/19/12	Thu 8/23/12	16	25%
49	Reparación y nivelación de piso para instalación de Vinílico	64 days	64	Wed 5/23/12	Wed 8/8/12						
50	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO AB	92 days	92	Thu 5/24/12	Wed 9/12/12	110 days	110	Mon 5/21/12	Sat 9/29/12	18	20%
51	Cableado eléctrico interior / REVISION CAPATAZ	64 days	64	Thu 5/24/12	Thu 8/9/12	80 days	80	Mon 5/21/12	Fri 8/24/12	16	25%
52	Imprimación y empaste de muros interiores Colomural	64 days	64	Fri 5/25/12	Fri 8/10/12	80 days	80	Tue 5/22/12	Sat 8/25/12	16	25%
53	Empaste grueso techos+cocinas+baños	64 days	64	Sat 5/26/12	Sat 8/11/12	80 days	80	Wed 5/23/12	Mon 8/27/12	16	25%
54	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + baños	64 days	64	Mon 5/28/12	Mon 8/13/12	80 days	80	Thu 5/24/12	Tue 8/28/12	16	25%
55	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baños	64 days	64	Tue 5/29/12	Tue 8/14/12	80 days	80	Fri 5/25/12	Wed 8/29/12	16	25%
56	Preparación de techos	64 days	64	Wed 5/30/12	Wed 8/15/12	80 days	80	Sat 5/26/12	Fri 8/31/12	16	25%
57	Escarchado de techos	64 days	64	Thu 5/31/12	Thu 8/16/12	80 days	80	Mon 5/28/12	Sat 9/1/12	16	25%
58	Lijado y sellado cocinas + baños	64 days	64	Fri 6/1/12	Fri 8/17/12	80 days	80	Tue 5/29/12	Mon 9/3/12	16	25%
59	Pintura 1era. Mano cocinas + baños	64 days	64	Mon 6/4/12	Sat 8/18/12	80 days	80	Wed 5/30/12	Tue 9/4/12	16	25%
60	Instalar marcos de ventana + cristales	64 days	64	Tue 6/5/12	Mon 8/20/12	80 days	80	Thu 5/31/12	Wed 9/5/12	16	25%
61	Instalar mamparas	64 days	64	Tue 6/5/12	Mon 8/20/12	80 days	80	Fri 6/1/12	Thu 9/6/12	16	25%
62	Colocar marcos sellados y empastados	64 days	64	Tue 6/5/12	Mon 8/20/12	80 days	80	Mon 6/4/12	Fri 9/7/12	16	25%

63	Presentar puertas + hueco en chapa	64 days	64	Wed 6/6/12	Tue 8/21/12	80 days	80	Tue 6/5/12	Sat 9/8/12	16	25%
64	Presentaci3n de jambas	64 days	64	Thu 6/7/12	Wed 8/22/12	80 days	80	Wed 6/6/12	Mon 9/10/12	16	25%
65	Masillar y Lijar Marcos	64 days	64	Fri 6/8/12	Thu 8/23/12	80 days	80	Thu 6/7/12	Tue 9/11/12	16	25%
66	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	64 days	64	Sat 6/9/12	Fri 8/24/12	80 days	80	Fri 6/8/12	Wed 9/12/12	16	25%
67	Instalar Muebles de Cocina	64 days	64	Mon 6/11/12	Sat 8/25/12	80 days	80	Sat 6/9/12	Thu 9/13/12	16	25%
68	Revisi3n General de Acabados	64 days	64	Tue 6/12/12	Mon 8/27/12	80 days	80	Mon 6/11/12	Fri 9/14/12	16	25%
69	Instalaci2n de opcionales (closets, espejos)	64 days	64	Wed 6/13/12	Tue 8/28/12	80 days	80	Tue 6/12/12	Sat 9/15/12	16	25%
70	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaci2n en ba1os	64 days	64	Thu 6/14/12	Wed 8/29/12	80 days	80	Wed 6/13/12	Mon 9/17/12	16	25%
71	Remasillado de marcos	64 days	64	Fri 6/15/12	Fri 8/31/12	80 days	80	Thu 6/14/12	Tue 9/18/12	16	25%
72	Lijado del Masillado de Marcos	64 days	64	Sat 6/16/12	Sat 9/1/12	80 days	80	Fri 6/15/12	Wed 9/19/12	16	25%
73	Pintar 2º mano marcos y hojas de puerta	64 days	64	Mon 6/18/12	Mon 9/3/12	80 days	80	Sat 6/16/12	Thu 9/20/12	16	25%
74	Colgado de puertas (principal con chapa)	64 days	64	Tue 6/19/12	Tue 9/4/12	80 days	80	Mon 6/18/12	Fri 9/21/12	16	25%
75	Instalar aparatos sanitarios + griferías	64 days	64	Wed 6/20/12	Wed 9/5/12	80 days	80	Tue 6/19/12	Sat 9/22/12	16	25%
76	Instalar placas eléctricas e intercomunicadores	64 days	64	Thu 6/21/12	Thu 9/6/12	80 days	80	Wed 6/20/12	Mon 9/24/12	16	25%
77	Macillado de Muros y techos	64 days	64	Fri 6/22/12	Fri 9/7/12	80 days	80	Thu 6/21/12	Tue 9/25/12	16	25%
78	Lijado de Muros y techos	64 days	64	Sat 6/23/12	Sat 9/8/12	80 days	80	Fri 6/22/12	Wed 9/26/12	16	25%
79	Pintar 2º mano en muros y techos	64 days	64	Mon 6/25/12	Mon 9/10/12	80 days	80	Sat 6/23/12	Thu 9/27/12	16	25%
80	Limpieza gruesa de departamentos	64 days	64	Tue 6/26/12	Tue 9/11/12	80 days	80	Mon 6/25/12	Fri 9/28/12	16	25%
81	Limpieza Final para revisi3n	64 days	64	Wed 6/27/12	Wed 9/12/12	80 days	80	Tue 6/26/12	Sat 9/29/12	16	25%
82	CHECK LIST FINAL EDIFICIO AB	78 days	78	Thu 6/28/12	Sat 9/29/12	92 days	92	Wed 6/27/12	Tue 10/16/12	14	18%
83	Sellado para Colowall	64 days	64	Thu 6/28/12	Thu 9/13/12	80 days	80	Wed 6/27/12	Mon 10/1/12	16	25%
84	Colocaci3n de Colowall	64 days	64	Sat 6/30/12	Fri 9/14/12	80 days	80	Thu 6/28/12	Tue 10/2/12	16	25%
85	Limpieza y lijado de piso para colocaci3n de vinílico	64 days	64	Mon 7/2/12	Sat 9/15/12						
86	Colocaci3n de Vinílico	64 days	64	Wed 7/4/12	Tue 9/18/12	80 days	80	Mon 7/2/12	Thu 10/4/12	16	25%
87	Instalaci2n de alfombras y tapajuntas	64 days	64	Thu 7/5/12	Wed 9/19/12	80 days	80	Tue 7/3/12	Fri 10/5/12	16	25%
88	Colocaci3n de contraz3calo	64 days	64	Fri 7/6/12	Thu 9/20/12	80 days	80	Wed 7/4/12	Sat 10/6/12	16	25%
89	acabado de contraz3calo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	64 days	64	Sat 7/7/12	Fri 9/21/12	80 days	80	Thu 7/5/12	Tue 10/9/12	16	25%
90	Observaciones de inmobiliaria	64 days	64	Mon 7/9/12	Sat 9/22/12	80 days	80	Fri 7/6/12	Wed 10/10/12	16	25%
91	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 1	64 days	64	Tue 7/10/12	Mon 9/24/12	80 days	80	Sat 7/7/12	Thu 10/11/12	16	25%
92	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 2	64 days	64	Wed 7/11/12	Tue 9/25/12	80 days	80	Mon 7/9/12	Fri 10/12/12	16	25%
93	Levantamiento de observaciones inmobiliaria día 3	64 days	64	Thu 7/12/12	Wed 9/26/12						
94	Limpieza final	64 days	64	Fri 7/13/12	Thu 9/27/12	80 days	80	Tue 7/10/12	Sat 10/13/12	16	25%
95	Entrega a inmobiliaria	64 days	64	Sat 7/14/12	Fri 9/28/12	80 days	80	Wed 7/11/12	Mon 10/15/12	16	25%
96	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	64 days	64	Mon 7/16/12	Sat 9/29/12	80 days	80	Thu 7/12/12	Tue 10/16/12	16	25%
97	EDIFICIO RS (E12)	122 days	122	Wed 5/30/12	Fri 10/26/12	158 days	158	Tue 6/26/12	Mon 1/7/13	36	30%
98	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO RS	26 days	26	Wed 7/11/12	Fri 8/10/12	36 days	36	Fri 7/27/12	Sat 9/8/12	10	38%
99	Trazar muros	20 days	20	Wed 7/11/12	Fri 8/3/12	30 days	30	Fri 7/27/12	Sat 9/1/12	10	50%
100	Colocar acero vertical	20 days	20	Wed 7/11/12	Fri 8/3/12	30 days	30	Fri 7/27/12	Sat 9/1/12	10	50%
101	Instalaciones en muros - IISS	20 days	20	Wed 7/11/12	Fri 8/3/12	30 days	30	Fri 7/27/12	Sat 9/1/12	10	50%
102	Instalaciones en muros - IIEE	20 days	20	Wed 7/11/12	Fri 8/3/12	30 days	30	Fri 7/27/12	Sat 9/1/12	10	50%
103	Encofrado de muros	20 days	20	Thu 7/12/12	Sat 8/4/12	30 days	30	Mon 7/30/12	Mon 9/3/12	10	50%
104	Vaciado de muros	20 days	20	Thu 7/12/12	Sat 8/4/12	30 days	30	Mon 7/30/12	Mon 9/3/12	10	50%
105	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	20 days	20	Fri 7/13/12	Mon 8/6/12	30 days	30	Tue 7/31/12	Tue 9/4/12	10	50%
106	Curado y resane de muros	20 days	20	Fri 7/13/12	Mon 8/6/12	30 days	30	Tue 7/31/12	Tue 9/4/12	10	50%
107	Encofrado de losa (inc. friso)	20 days	20	Fri 7/13/12	Mon 8/6/12	30 days	30	Tue 7/31/12	Tue 9/4/12	10	50%
108	Acero de losa	20 days	20	Fri 7/13/12	Mon 8/6/12	30 days	30	Tue 7/31/12	Tue 9/4/12	10	50%
109	Armado de baterías de desagüe e inicio de pruebas	20 days	20	Fri 7/13/12	Mon 8/6/12	30 days	30	Tue 7/31/12	Tue 9/4/12	10	50%
110	Instalaciones en losa - IISS	20 days	20	Sat 7/14/12	Tue 8/7/12	30 days	30	Wed 8/1/12	Wed 9/5/12	10	50%
111	Instalaciones en losa - IIEE	20 days	20	Sat 7/14/12	Tue 8/7/12	30 days	30	Wed 8/1/12	Wed 9/5/12	10	50%
112	Vaciado de losa	20 days	20	Sat 7/14/12	Tue 8/7/12	30 days	30	Wed 8/1/12	Wed 9/5/12	10	50%
113	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	20 days	20	Mon 7/16/12	Wed 8/8/12	30 days	30	Thu 8/2/12	Thu 9/6/12	10	50%
114	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	20 days	20	Mon 7/16/12	Wed 8/8/12	30 days	30	Thu 8/2/12	Thu 9/6/12	10	50%
115	Curado de losa	20 days	20	Mon 7/16/12	Wed 8/8/12	30 days	30	Thu 8/2/12	Thu 9/6/12	10	50%
116	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	20 days	20	Mon 7/16/12	Wed 8/8/12	30 days	30	Thu 8/2/12	Thu 9/6/12	10	50%
117	Encofrado de alfeizar (8 und)	20 days	20	Tue 7/17/12	Thu 8/9/12	30 days	30	Fri 8/3/12	Fri 9/7/12	10	50%
118	Vaciado de alfeizar	20 days	20	Tue 7/17/12	Thu 8/9/12	30 days	30	Fri 8/3/12	Fri 9/7/12	10	50%
119	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	20 days	20	Wed 7/18/12	Fri 8/10/12	30 days	30	Sat 8/4/12	Sat 9/8/12	10	50%
120	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	20 days	20	Wed 7/18/12	Fri 8/10/12	30 days	30	Sat 8/4/12	Sat 9/8/12	10	50%
121	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO RS	37 days	37	Thu 7/19/12	Sat 9/1/12	69 days	69	Mon 8/6/12	Mon 10/29/12	32	86%
122	Lijado y desbaste de placas	20 days	20	Thu 7/19/12	Sat 8/11/12	30 days	30	Mon 8/6/12	Mon 9/10/12	10	50%
123	Entrega de picado de muros y techo	20 days	20	Thu 7/19/12	Sat 8/11/12	30 days	30	Tue 8/7/12	Tue 9/11/12	10	50%
124	Entrega de pruebas de presi2n de IISS y winchado de IIEE	20 days	20	Thu 7/19/12	Sat 8/11/12	30 days	30	Wed 8/8/12	Wed 9/12/12	10	50%
125	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	20 days	20	Fri 7/20/12	Mon 8/13/12	30 days	30	Fri 8/10/12	Fri 9/14/12	10	50%
126	Tarrajeo de derrames	20 days	20	Mon 7/23/12	Wed 8/15/12	30 days	30	Wed 8/15/12	Wed 9/19/12	10	50%
127	Trazo para tabiques	20 days	20	Mon 7/30/12	Tue 8/21/12	30 days	30	Fri 8/24/12	Fri 9/28/12	10	50%
128	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	20 days	20	Mon 7/30/12	Tue 8/21/12	30 days	30	Tue 8/28/12	Tue 10/2/12	10	50%
129	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	20 days	20	Mon 7/30/12	Tue 8/21/12	30 days	30	Wed 8/29/12	Wed 10/3/12	10	50%
130	Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa	20 days	20	Mon 7/30/12	Tue 8/21/12	30 days	30	Sat 9/1/12	Fri 10/5/12	10	50%
131	Levantar tabiques - La Casa	20 days	20	Tue 7/31/12	Wed 8/22/12	30 days	30	Mon 9/3/12	Sat 10/6/12	10	50%

132	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	20 days	20	Tue 7/31/12	Wed 8/22/12	30 days	30	Tue 9/4/12	Tue 10/9/12	10	50%
133	Solaqueo de tabiques	20 days	20	Tue 7/31/12	Wed 8/22/12	30 days	30	Wed 9/5/12	Wed 10/10/12	10	50%
134	Rectificaci3n de cajas de v3lvulas	20 days	20	Tue 7/31/12	Wed 8/22/12	30 days	30	Thu 9/6/12	Thu 10/11/12	10	50%
135	Hacer sardinel de ducha	20 days	20	Wed 8/1/12	Thu 8/23/12	30 days	30	Fri 9/7/12	Fri 10/12/12	10	50%
136	Colocar z3calo de cer3mica en ba1os y cocinas	20 days	20	Thu 8/2/12	Fri 8/24/12	30 days	30	Sat 9/8/12	Sat 10/13/12	10	50%
137	Enchapar piso cer3mico ba1o y cocina	20 days	20	Fri 8/3/12	Sat 8/25/12	30 days	30	Tue 9/11/12	Tue 10/16/12	10	50%
138	Enchapar contraz3calo cer3mico ba1o y cocina	20 days	20	Sat 8/4/12	Mon 8/27/12	30 days	30	Wed 9/12/12	Wed 10/17/12	10	50%
139	Instalaci2n de baranda met3lica en terraza	20 days	20	Sat 8/4/12	Mon 8/27/12	30 days	30	Fri 9/14/12	Fri 10/19/12	10	50%
140	Enchape de terrazas	20 days	20	Mon 8/6/12	Tue 8/28/12	30 days	30	Tue 9/18/12	Tue 10/23/12	10	50%
141	Fraguar z3calos y pisos de cer3mico en cocinas y ba1os	20 days	20	Tue 8/7/12	Wed 8/29/12	30 days	30	Wed 9/19/12	Fri 10/26/12	10	50%
142	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	20 days	20	Wed 8/8/12	Fri 8/31/12	30 days	30	Fri 9/21/12	Mon 10/29/12	10	50%
143	Reparaci3n y nivelaci3n de piso para instalaci3n de Vin3lico	20 days	20	Thu 8/9/12	Sat 9/1/12						
144	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO RS	48 days	48	Fri 8/10/12	Fri 10/5/12	68 days	68	Sat 9/22/12	Fri 12/14/12	20	42%
145	Cableado el3ctrico interior / REVISION CAPATAZ	20 days	20	Fri 8/10/12	Mon 9/3/12	30 days	30	Sat 9/22/12	Tue 10/30/12	10	50%
146	Imprimaci3n y empaste de muros interiores Colomural	20 days	20	Sat 8/11/12	Tue 9/4/12	30 days	30	Tue 9/25/12	Fri 11/2/12	10	50%
147	Empaste grueso techos+cocinas+ba1os	20 days	20	Mon 8/13/12	Wed 9/5/12	30 days	30	Wed 9/26/12	Sat 11/3/12	10	50%
148	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + ba1os	20 days	20	Tue 8/14/12	Thu 9/6/12	30 days	30	Thu 9/27/12	Mon 11/5/12	10	50%
149	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + ba1os	20 days	20	Wed 8/15/12	Fri 9/7/12	30 days	30	Sat 9/29/12	Wed 11/7/12	10	50%
150	Preparaci3n de techos	20 days	20	Thu 8/16/12	Sat 9/8/12	30 days	30	Mon 10/1/12	Thu 11/8/12	10	50%
151	Escarchado de techos	20 days	20	Fri 8/17/12	Mon 9/10/12	30 days	30	Tue 10/2/12	Fri 11/9/12	10	50%
152	Lijado y sellado cocinas + ba1os	20 days	20	Sat 8/18/12	Tue 9/11/12	30 days	30	Wed 10/3/12	Sat 11/10/12	10	50%
153	Pintura 1era. Mano cocinas + ba1os	20 days	20	Mon 8/20/12	Wed 9/12/12	30 days	30	Fri 10/5/12	Tue 11/13/12	10	50%
154	Instalar marcos de ventana + cristales	20 days	20	Tue 8/21/12	Thu 9/13/12	30 days	30	Sat 10/6/12	Wed 11/14/12	10	50%
155	Instalar mamparas	20 days	20	Tue 8/21/12	Thu 9/13/12	30 days	30	Tue 10/9/12	Thu 11/15/12	10	50%
156	Colocar marcos sellados y empastados	20 days	20	Tue 8/21/12	Thu 9/13/12	30 days	30	Wed 10/10/12	Fri 11/16/12	10	50%
157	Presentar puertas + hueco en chapa	20 days	20	Wed 8/22/12	Fri 9/14/12	30 days	30	Thu 10/11/12	Sat 11/17/12	10	50%
158	Presentaci3n de jambas	20 days	20	Thu 8/23/12	Sat 9/15/12	30 days	30	Fri 10/12/12	Mon 11/19/12	10	50%
159	Masillar y Lijar Marcos	20 days	20	Fri 8/24/12	Mon 9/17/12	30 days	30	Sat 10/13/12	Tue 11/20/12	10	50%
160	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	20 days	20	Sat 8/25/12	Tue 9/18/12	30 days	30	Tue 10/16/12	Thu 11/22/12	10	50%
161	Instalar Muebles de Cocina	20 days	20	Mon 8/27/12	Wed 9/19/12	30 days	30	Wed 10/17/12	Fri 11/23/12	10	50%
162	Revisi3n General de Acabados	20 days	20	Tue 8/28/12	Thu 9/20/12	30 days	30	Fri 10/19/12	Mon 11/26/12	10	50%
163	Instalaci2n de opcionales (closets, espejos)	20 days	20	Wed 8/29/12	Fri 9/21/12	30 days	30	Sat 10/20/12	Tue 11/27/12	10	50%
164	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaci2n en ba1os	20 days	20	Fri 8/31/12	Sat 9/22/12	30 days	30	Mon 10/22/12	Wed 11/28/12	10	50%
165	Remasillado de marcos	20 days	20	Sat 9/1/12	Mon 9/24/12	30 days	30	Tue 10/23/12	Thu 11/29/12	10	50%
166	Lijado del Masillado de Marcos	20 days	20	Mon 9/3/12	Tue 9/25/12	30 days	30	Fri 10/26/12	Fri 11/30/12	10	50%
167	Pintar 2º mano marcos y hojas de puerta	20 days	20	Tue 9/4/12	Wed 9/26/12	30 days	30	Tue 10/30/12	Tue 12/4/12	10	50%
168	Colgado de puertas (principal con chapa)	20 days	20	Wed 9/5/12	Thu 9/27/12	30 days	30	Wed 10/31/12	Wed 12/5/12	10	50%
169	Instalar aparatos sanitarios + grifer3as	20 days	20	Thu 9/6/12	Fri 9/28/12	30 days	30	Fri 11/2/12	Thu 12/6/12	10	50%
170	Instalar placas el3ctricas e intercomunicadores	20 days	20	Fri 9/7/12	Sat 9/29/12	30 days	30	Sat 11/3/12	Fri 12/7/12	10	50%
171	Macillado de Muros y techos	20 days	20	Sat 9/8/12	Mon 10/1/12	30 days	30	Mon 11/5/12	Sat 12/8/12	10	50%
172	Lijado de Muros y techos	20 days	20	Mon 9/10/12	Tue 10/2/12	30 days	30	Tue 11/6/12	Mon 12/10/12	10	50%
173	Pintar 2º mano en muros y techos	20 days	20	Tue 9/11/12	Wed 10/3/12	30 days	30	Wed 11/7/12	Tue 12/11/12	10	50%
174	Limpieza gruesa de departamentos	20 days	20	Wed 9/12/12	Thu 10/4/12	30 days	30	Fri 11/9/12	Thu 12/13/12	10	50%
175	Limpieza Final para revisi3n	20 days	20	Thu 9/13/12	Fri 10/5/12	30 days	30	Sat 11/10/12	Fri 12/14/12	10	50%
176	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO RS	34 days	34	Fri 9/14/12	Fri 10/26/12	45 days	45	Tue 11/13/12	Mon 1/7/13	11	32%
177	Sellado para Colowall	20 days	20	Fri 9/14/12	Sat 10/6/12	30 days	30	Tue 11/13/12	Mon 12/17/12	10	50%
178	Colocaci3n de Colowall	20 days	20	Sat 9/15/12	Tue 10/9/12	30 days	30	Thu 11/15/12	Wed 12/19/12	10	50%
179	Limpieza y lijado de piso para colocaci3n de vin3lico	20 days	20	Mon 9/17/12	Wed 10/10/12						
180	Colocaci3n de Vin3lico	20 days	20	Wed 9/19/12	Fri 10/12/12	30 days	30	Sat 11/17/12	Fri 12/21/12	10	50%
181	Instalaci2n de alfombras y tapajuntas	20 days	20	Thu 9/20/12	Sat 10/13/12	30 days	30	Mon 11/19/12	Sat 12/22/12	10	50%
182	Colocaci3n de contraz3calo	20 days	20	Fri 9/21/12	Mon 10/15/12	30 days	30	Tue 11/20/12	Wed 12/26/12	10	50%
183	Acabado de contraz3calo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	20 days	20	Sat 9/22/12	Tue 10/16/12	30 days	30	Wed 11/21/12	Thu 12/27/12	10	50%
184	Observaciones de inmobiliaria	20 days	20	Mon 9/24/12	Wed 10/17/12	30 days	30	Thu 11/22/12	Fri 12/28/12	10	50%
185	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria d3a 1	20 days	20	Tue 9/25/12	Thu 10/18/12	30 days	30	Fri 11/23/12	Sat 12/29/12	10	50%
186	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria d3a 2	20 days	20	Wed 9/26/12	Fri 10/19/12	30 days	30	Mon 11/26/12	Wed 1/2/13	10	50%
187	Levantamiento de observaciones inmobiliaria d3a 3	20 days	20	Thu 9/27/12	Sat 10/20/12						
188	Limpieza final	20 days	20	Fri 9/28/12	Mon 10/22/12	30 days	30	Wed 11/28/12	Fri 1/4/13	10	50%
189	Entrega a inmobiliaria	20 days	20	Sat 9/29/12	Tue 10/23/12	30 days	30	Thu 11/29/12	Sat 1/5/13	10	50%
190	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	20 days	20	Mon 10/1/12	Fri 10/26/12	30 days	30	Fri 11/30/12	Mon 1/7/13	10	50%
191	EDIFICIO TU (E11)	122 days	122	Sat 6/23/12	Tue 11/20/12	129 days	129	Tue 7/24/12	Sat 12/29/12	7	6%
192	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO TU	26 days	26	Sat 8/4/12	Tue 9/4/12	36 days	36	Mon 9/3/12	Mon 10/15/12	10	38%
193	Trazar muros	20 days	20	Sat 8/4/12	Mon 8/27/12	30 days	30	Mon 9/3/12	Sat 10/6/12	10	50%
194	Colocar acero vertical	20 days	20	Sat 8/4/12	Mon 8/27/12	30 days	30	Mon 9/3/12	Sat 10/6/12	10	50%
195	Instalaciones en muros - IISS	20 days	20	Sat 8/4/12	Mon 8/27/12	30 days	30	Mon 9/3/12	Sat 10/6/12	10	50%
196	Instalaciones en muros - IIEE	20 days	20	Sat 8/4/12	Mon 8/27/12	30 days	30	Mon 9/3/12	Sat 10/6/12	10	50%
197	Encofrado de muros	20 days	20	Mon 8/6/12	Tue 8/28/12	30 days	30	Tue 9/4/12	Tue 10/9/12	10	50%
198	Vaciado de muros	20 days	20	Mon 8/6/12	Tue 8/28/12	30 days	30	Tue 9/4/12	Tue 10/9/12	10	50%
199	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	20 days	20	Tue 8/7/12	Wed 8/29/12	30 days	30	Wed 9/5/12	Wed 10/10/12	10	50%
200	Curado y resane de muros	20 days	20	Tue 8/7/12	Wed 8/29/12	30 days	30	Wed 9/5/12	Wed 10/10/12	10	50%

201	Encofrado de losa (inc. friso)	20 days	20	Tue 8/7/12	Wed 8/29/12	30 days	30	Wed 9/5/12	Wed 10/10/12	10	50%
202	Acero de losa	20 days	20	Tue 8/7/12	Wed 8/29/12	30 days	30	Wed 9/5/12	Wed 10/10/12	10	50%
203	Armado de baterías de desagüe e inicio de pruebas	20 days	20	Tue 8/7/12	Wed 8/29/12	30 days	30	Wed 9/5/12	Wed 10/10/12	10	50%
204	Instalaciones en losa - IISS	20 days	20	Wed 8/8/12	Fri 8/31/12	30 days	30	Thu 9/6/12	Thu 10/11/12	10	50%
205	Instalaciones en losa - IIEE	20 days	20	Wed 8/8/12	Fri 8/31/12	30 days	30	Thu 9/6/12	Thu 10/11/12	10	50%
206	Vaciado de losa	20 days	20	Wed 8/8/12	Fri 8/31/12	30 days	30	Thu 9/6/12	Thu 10/11/12	10	50%
207	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	20 days	20	Thu 8/9/12	Sat 9/1/12	30 days	30	Fri 9/7/12	Fri 10/12/12	10	50%
208	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	20 days	20	Thu 8/9/12	Sat 9/1/12	30 days	30	Fri 9/7/12	Fri 10/12/12	10	50%
209	Curado de losa	20 days	20	Thu 8/9/12	Sat 9/1/12	30 days	30	Fri 9/7/12	Fri 10/12/12	10	50%
210	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	20 days	20	Thu 8/9/12	Sat 9/1/12	30 days	30	Fri 9/7/12	Fri 10/12/12	10	50%
211	Encofrado de alfeizar (8 und)	20 days	20	Fri 8/10/12	Mon 9/3/12	30 days	30	Sat 9/8/12	Sat 10/13/12	10	50%
212	Vaciado de alfeizar	20 days	20	Fri 8/10/12	Mon 9/3/12	30 days	30	Sat 9/8/12	Sat 10/13/12	10	50%
213	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	20 days	20	Sat 8/11/12	Tue 9/4/12	30 days	30	Mon 9/10/12	Mon 10/15/12	10	50%
214	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	20 days	20	Sat 8/11/12	Tue 9/4/12	30 days	30	Mon 9/10/12	Mon 10/15/12	10	50%
215	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO TU	37 days	37	Mon 8/13/12	Tue 9/25/12	46 days	46	Tue 9/11/12	Wed 11/7/12	9	24%
216	Lijado y desbaste de placas	20 days	20	Mon 8/13/12	Wed 9/5/12	30 days	30	Tue 9/11/12	Tue 10/16/12	10	50%
217	Entrega de picado de muros y techo	20 days	20	Mon 8/13/12	Wed 9/5/12	30 days	30	Tue 9/11/12	Tue 10/16/12	10	50%
218	Entrega de pruebas de presiÃ²n de IISS y winchado de IIEE	20 days	20	Mon 8/13/12	Wed 9/5/12	30 days	30	Tue 9/11/12	Tue 10/16/12	10	50%
219	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	20 days	20	Tue 8/14/12	Thu 9/6/12	30 days	30	Wed 9/12/12	Wed 10/17/12	10	50%
220	Tarrajeo de derrames	20 days	20	Thu 8/16/12	Sat 9/8/12	30 days	30	Fri 9/14/12	Fri 10/19/12	10	50%
221	Trazo para tabiques	20 days	20	Wed 8/22/12	Fri 9/14/12	30 days	30	Fri 9/21/12	Mon 10/29/12	10	50%
222	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	20 days	20	Wed 8/22/12	Fri 9/14/12	30 days	30	Fri 9/21/12	Mon 10/29/12	10	50%
223	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	20 days	20	Wed 8/22/12	Fri 9/14/12	30 days	30	Fri 9/21/12	Mon 10/29/12	10	50%
224	Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa	20 days	20	Wed 8/22/12	Fri 9/14/12	30 days	30	Fri 9/21/12	Mon 10/29/12	10	50%
225	Levantar tabiques - La Casa	20 days	20	Thu 8/23/12	Sat 9/15/12	30 days	30	Sat 9/22/12	Tue 10/30/12	10	50%
226	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	20 days	20	Thu 8/23/12	Sat 9/15/12	30 days	30	Sat 9/22/12	Tue 10/30/12	10	50%
227	Solaqueo de tabiques	20 days	20	Thu 8/23/12	Sat 9/15/12	30 days	30	Sat 9/22/12	Tue 10/30/12	10	50%
228	RectificaciÃ³n de cajas de vÃ¡lvulas	20 days	20	Thu 8/23/12	Sat 9/15/12	30 days	30	Sat 9/22/12	Tue 10/30/12	10	50%
229	Hacer sardinel de ducha	20 days	20	Fri 8/24/12	Mon 9/17/12	30 days	30	Mon 9/24/12	Wed 10/31/12	10	50%
230	Colocar zÃ³calo de cerÃ¡mica en baÃ±os y cocinas	20 days	20	Sat 8/25/12	Tue 9/18/12	30 days	30	Tue 9/25/12	Fri 11/2/12	10	50%
231	Enchapar piso cerÃ¡mico baÃ±o y cocina	20 days	20	Mon 8/27/12	Wed 9/19/12	30 days	30	Tue 9/25/12	Fri 11/2/12	10	50%
232	Enchapar contrazÃ³calo cerÃ¡mico baÃ±o y cocina	20 days	20	Tue 8/28/12	Thu 9/20/12	30 days	30	Wed 9/26/12	Sat 11/3/12	10	50%
233	InstalaciÃ³n de baranda metÃ¡lica en terraza	20 days	20	Tue 8/28/12	Thu 9/20/12	30 days	30	Wed 9/26/12	Sat 11/3/12	10	50%
234	Enchape de terrazas	20 days	20	Wed 8/29/12	Fri 9/21/12	30 days	30	Thu 9/27/12	Mon 11/5/12	10	50%
235	Fraguar zÃ³calos y pisos de cerÃ¡mico en cocinas y baÃ±os	20 days	20	Fri 8/31/12	Sat 9/22/12	30 days	30	Fri 9/28/12	Tue 11/6/12	10	50%
236	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	20 days	20	Sat 9/1/12	Mon 9/24/12	30 days	30	Sat 9/29/12	Wed 11/7/12	10	50%
237	ReparaciÃ³n y nivelaciÃ³n de piso para instalaciÃ³n de VinÃ­lico	20 days	20	Mon 9/3/12	Tue 9/25/12						
238	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO TU	48 days	48	Tue 9/4/12	Fri 11/2/12	60 days	60	Mon 10/1/12	Thu 12/13/12	12	25%
239	Cableado elÃ©ctrico interior / REVISION CAPATAZ	20 days	20	Tue 9/4/12	Wed 9/26/12	30 days	30	Mon 10/1/12	Thu 11/8/12	10	50%
240	ImprimaciÃ³n y empaste de muros interiores Colomural	20 days	20	Wed 9/5/12	Thu 9/27/12	30 days	30	Tue 10/2/12	Fri 11/9/12	10	50%
241	Empaste grueso techos+cocinas+baÃ±os	20 days	20	Thu 9/6/12	Fri 9/28/12	30 days	30	Wed 10/3/12	Sat 11/10/12	10	50%
242	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + baÃ±os	20 days	20	Fri 9/7/12	Sat 9/29/12	30 days	30	Thu 10/4/12	Mon 11/12/12	10	50%
243	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baÃ±os	20 days	20	Sat 9/8/12	Mon 10/1/12	30 days	30	Fri 10/5/12	Tue 11/13/12	10	50%
244	PreparaciÃ³n de techos	20 days	20	Mon 9/10/12	Tue 10/2/12	30 days	30	Sat 10/6/12	Wed 11/14/12	10	50%
245	Escarchado de techos	20 days	20	Tue 9/11/12	Wed 10/3/12	30 days	30	Tue 10/9/12	Thu 11/15/12	10	50%
246	Lijado y sellado cocinas + baÃ±os	20 days	20	Wed 9/12/12	Thu 10/4/12	30 days	30	Wed 10/10/12	Fri 11/16/12	10	50%
247	Pintura 1era. Mano cocinas + baÃ±os	20 days	20	Thu 9/13/12	Fri 10/5/12	30 days	30	Thu 10/11/12	Sat 11/17/12	10	50%
248	Instalar marcos de ventana + cristales	20 days	20	Fri 9/14/12	Sat 10/6/12	30 days	30	Fri 10/12/12	Mon 11/19/12	10	50%
249	Instalar mamparas	20 days	20	Fri 9/14/12	Sat 10/6/12	30 days	30	Sat 10/13/12	Tue 11/20/12	10	50%
250	Colocar marcos sellados y empastados	20 days	20	Fri 9/14/12	Sat 10/6/12	30 days	30	Mon 10/15/12	Wed 11/21/12	10	50%
251	Presentar puertas + hueco en chapa	20 days	20	Sat 9/15/12	Tue 10/9/12	30 days	30	Tue 10/16/12	Thu 11/22/12	10	50%
252	PresentaciÃ³n de jambas	20 days	20	Mon 9/17/12	Wed 10/10/12	30 days	30	Wed 10/17/12	Fri 11/23/12	10	50%
253	Masillar y Lijar Marcos	20 days	20	Tue 9/18/12	Thu 10/11/12	30 days	30	Thu 10/18/12	Sat 11/24/12	10	50%
254	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	20 days	20	Wed 9/19/12	Fri 10/12/12	30 days	30	Fri 10/19/12	Mon 11/26/12	10	50%
255	Instalar Muebles de Cocina	20 days	20	Thu 9/20/12	Sat 10/13/12	30 days	30	Sat 10/20/12	Tue 11/27/12	10	50%
256	RevisiÃ³n General de Acabados	20 days	20	Fri 9/21/12	Mon 10/15/12	30 days	30	Mon 10/22/12	Wed 11/28/12	10	50%
257	InstalaciÃ³n de opcionales (closets, espejos)	20 days	20	Sat 9/22/12	Tue 10/16/12	30 days	30	Tue 10/23/12	Thu 11/29/12	10	50%
258	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaciÃ³n en baÃ±os	20 days	20	Mon 9/24/12	Wed 10/17/12	30 days	30	Fri 10/26/12	Fri 11/30/12	10	50%
259	Remasillado de marcos	20 days	20	Tue 9/25/12	Thu 10/18/12	30 days	30	Sat 10/27/12	Sat 12/1/12	10	50%
260	Lijado del Masillado de Marcos	20 days	20	Wed 9/26/12	Fri 10/19/12	30 days	30	Mon 10/29/12	Mon 12/3/12	10	50%
261	Pintar 2Ãº mano marcos y hojas de puerta	20 days	20	Thu 9/27/12	Sat 10/20/12	30 days	30	Tue 10/30/12	Tue 12/4/12	10	50%
262	Colgado de puertas (principal con chapa)	20 days	20	Fri 9/28/12	Mon 10/22/12	30 days	30	Wed 10/31/12	Wed 12/5/12	10	50%
263	Instalar aparatos sanitarios + griferÃ­as	20 days	20	Sat 9/29/12	Tue 10/23/12	30 days	30	Fri 11/2/12	Thu 12/6/12	10	50%
264	Instalar placas elÃ©ctricas e intercomunicadores	20 days	20	Mon 10/1/12	Fri 10/26/12	30 days	30	Sat 11/3/12	Fri 12/7/12	10	50%
265	Macillado de Muros y techos	20 days	20	Tue 10/2/12	Sat 10/27/12	30 days	30	Mon 11/5/12	Sat 12/8/12	10	50%
266	Lijado de Muros y techos	20 days	20	Wed 10/3/12	Mon 10/29/12	30 days	30	Tue 11/6/12	Mon 12/10/12	10	50%
267	Pintar 2Ãº mano en muros y techos	20 days	20	Thu 10/4/12	Tue 10/30/12	30 days	30	Wed 11/7/12	Tue 12/11/12	10	50%
268	Limpieza gruesa de departamentos	20 days	20	Fri 10/5/12	Wed 10/31/12	30 days	30	Thu 11/8/12	Wed 12/12/12	10	50%
269	Limpieza Final para revisiÃ³n	20 days	20	Sat 10/6/12	Fri 11/2/12	30 days	30	Fri 11/9/12	Thu 12/13/12	10	50%

270	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO TU	34 days	34	Tue 10/9/12	Tue 11/20/12	41 days	41	Sat 11/10/12	Sat 12/29/12	7	21%
271	Sellado para Colowall	20 days	20	Tue 10/9/12	Sat 11/3/12	30 days	30	Sat 11/10/12	Fri 12/14/12	10	50%
272	Colocación de Colowall	20 days	20	Wed 10/10/12	Mon 11/5/12	30 days	30	Mon 11/12/12	Sat 12/15/12	10	50%
273	Limpieza y lijado de piso para colocación de vinílico	20 days	20	Thu 10/11/12	Tue 11/6/12						
274	Colocación de Vinílico	20 days	20	Sat 10/13/12	Thu 11/8/12						
275	InstalaciÃ³n de alfombras y tapajuntas	20 days	20	Mon 10/15/12	Fri 11/9/12	30 days	30	Wed 11/14/12	Tue 12/18/12	10	50%
276	Colocación de contrazócalo	20 days	20	Tue 10/16/12	Sat 11/10/12	30 days	30	Thu 11/15/12	Wed 12/19/12	10	50%
277	acabado de contrazócalo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	20 days	20	Wed 10/17/12	Mon 11/12/12	30 days	30	Fri 11/16/12	Thu 12/20/12	10	50%
278	Observaciones de inmobiliaria	20 days	20	Thu 10/18/12	Tue 11/13/12	30 days	30	Sat 11/17/12	Fri 12/21/12	10	50%
279	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 1	20 days	20	Fri 10/19/12	Wed 11/14/12	30 days	30	Mon 11/19/12	Sat 12/22/12	10	50%
280	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 2	20 days	20	Sat 10/20/12	Thu 11/15/12	30 days	30	Tue 11/20/12	Wed 12/26/12	10	50%
281	Levantamiento de observaciones inmobiliaria día 3	20 days	20	Mon 10/22/12	Fri 11/16/12						
282	Limpieza final	20 days	20	Tue 10/23/12	Sat 11/17/12	30 days	30	Wed 11/21/12	Thu 12/27/12	10	50%
283	Entrega a inmobiliaria	20 days	20	Fri 10/26/12	Mon 11/19/12	30 days	30	Thu 11/22/12	Fri 12/28/12	10	50%
284	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	20 days	20	Sat 10/27/12	Tue 11/20/12	30 days	30	Fri 11/23/12	Sat 12/29/12	10	50%
285	EDIFICIO VW (E10)	112 days	112	Tue 7/31/12	Thu 12/13/12	102 days	102	Wed 9/19/12	Wed 1/23/13	-10	-9%
286	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO VW	26 days	26	Tue 8/28/12	Thu 9/27/12	26 days	26	Tue 10/9/12	Sat 11/10/12	0	0%
287	Trazar muros	20 days	20	Tue 8/28/12	Thu 9/20/12	20 days	20	Tue 10/9/12	Sat 11/3/12	0	0%
288	Colocar acero vertical	20 days	20	Tue 8/28/12	Thu 9/20/12	20 days	20	Tue 10/9/12	Sat 11/3/12	0	0%
289	Instalaciones en muros - IISS	20 days	20	Tue 8/28/12	Thu 9/20/12	20 days	20	Tue 10/9/12	Sat 11/3/12	0	0%
290	Instalaciones en muros - IIEE	20 days	20	Tue 8/28/12	Thu 9/20/12	20 days	20	Tue 10/9/12	Sat 11/3/12	0	0%
291	Encofrado de muros	20 days	20	Wed 8/29/12	Fri 9/21/12	20 days	20	Wed 10/10/12	Mon 11/5/12	0	0%
292	Vaciado de muros	20 days	20	Wed 8/29/12	Fri 9/21/12	20 days	20	Wed 10/10/12	Mon 11/5/12	0	0%
293	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	20 days	20	Fri 8/31/12	Sat 9/22/12	20 days	20	Thu 10/11/12	Tue 11/6/12	0	0%
294	Curado y resane de muros	20 days	20	Fri 8/31/12	Sat 9/22/12	20 days	20	Thu 10/11/12	Tue 11/6/12	0	0%
295	Encofrado de losa (inc. friso)	20 days	20	Fri 8/31/12	Sat 9/22/12	20 days	20	Thu 10/11/12	Tue 11/6/12	0	0%
296	Acero de losa	20 days	20	Fri 8/31/12	Sat 9/22/12	20 days	20	Thu 10/11/12	Tue 11/6/12	0	0%
297	Armado de baterías de desagüe e inicio de pruebas	20 days	20	Fri 8/31/12	Sat 9/22/12	20 days	20	Thu 10/11/12	Tue 11/6/12	0	0%
298	Instalaciones en losa - IISS	20 days	20	Sat 9/1/12	Mon 9/24/12	20 days	20	Fri 10/12/12	Wed 11/7/12	0	0%
299	Instalaciones en losa - IIEE	20 days	20	Sat 9/1/12	Mon 9/24/12	20 days	20	Fri 10/12/12	Wed 11/7/12	0	0%
300	Vaciado de losa	20 days	20	Sat 9/1/12	Mon 9/24/12	20 days	20	Fri 10/12/12	Wed 11/7/12	0	0%
301	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	20 days	20	Mon 9/3/12	Tue 9/25/12	20 days	20	Sat 10/13/12	Thu 11/8/12	0	0%
302	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	20 days	20	Mon 9/3/12	Tue 9/25/12	20 days	20	Sat 10/13/12	Thu 11/8/12	0	0%
303	Curado de losa	20 days	20	Mon 9/3/12	Tue 9/25/12	20 days	20	Sat 10/13/12	Thu 11/8/12	0	0%
304	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	20 days	20	Mon 9/3/12	Tue 9/25/12	20 days	20	Sat 10/13/12	Thu 11/8/12	0	0%
305	Encofrado de alfeizar (8 und)	20 days	20	Tue 9/4/12	Wed 9/26/12	20 days	20	Mon 10/15/12	Fri 11/9/12	0	0%
306	Vaciado de alfeizar	20 days	20	Tue 9/4/12	Wed 9/26/12	20 days	20	Mon 10/15/12	Fri 11/9/12	0	0%
307	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	20 days	20	Wed 9/5/12	Thu 9/27/12	20 days	20	Tue 10/16/12	Sat 11/10/12	0	0%
308	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	20 days	20	Wed 9/5/12	Thu 9/27/12	20 days	20	Tue 10/16/12	Sat 11/10/12	0	0%
309	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO VW	37 days	37	Thu 9/6/12	Fri 10/19/12	36 days	36	Wed 10/17/12	Fri 11/30/12	-1	-3%
310	Lijado y desbaste de placas	20 days	20	Thu 9/6/12	Fri 9/28/12	20 days	20	Wed 10/17/12	Mon 11/12/12	0	0%
311	Entrega de picado de muros y techo	20 days	20	Thu 9/6/12	Fri 9/28/12	20 days	20	Wed 10/17/12	Mon 11/12/12	0	0%
312	Entrega de pruebas de presiÃ³n de IISS y winchado de IIEE	20 days	20	Thu 9/6/12	Fri 9/28/12	20 days	20	Wed 10/17/12	Mon 11/12/12	0	0%
313	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	20 days	20	Fri 9/7/12	Sat 9/29/12	20 days	20	Thu 10/18/12	Tue 11/13/12	0	0%
314	Tarrajeo de derrames	20 days	20	Mon 9/10/12	Tue 10/2/12	20 days	20	Sat 10/20/12	Thu 11/15/12	0	0%
315	Trazo para tabiques	20 days	20	Sat 9/15/12	Tue 10/9/12	20 days	20	Tue 10/30/12	Thu 11/22/12	0	0%
316	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	20 days	20	Sat 9/15/12	Tue 10/9/12	20 days	20	Tue 10/30/12	Thu 11/22/12	0	0%
317	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	20 days	20	Sat 9/15/12	Tue 10/9/12	20 days	20	Tue 10/30/12	Thu 11/22/12	0	0%
318	Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa	20 days	20	Sat 9/15/12	Tue 10/9/12	20 days	20	Tue 10/30/12	Thu 11/22/12	0	0%
319	Levantar tabiques - La Casa	20 days	20	Mon 9/17/12	Wed 10/10/12	20 days	20	Wed 10/31/12	Fri 11/23/12	0	0%
320	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	20 days	20	Mon 9/17/12	Wed 10/10/12	20 days	20	Wed 10/31/12	Fri 11/23/12	0	0%
321	Solaqueo de tabiques	20 days	20	Mon 9/17/12	Wed 10/10/12	20 days	20	Wed 10/31/12	Fri 11/23/12	0	0%
322	RectificaciÃ³n de cajas de válvulas	20 days	20	Mon 9/17/12	Wed 10/10/12	20 days	20	Wed 10/31/12	Fri 11/23/12	0	0%
323	Hacer sardinel de ducha	20 days	20	Tue 9/18/12	Thu 10/11/12	20 days	20	Fri 11/2/12	Sat 11/24/12	0	0%
324	Colocar zÃ³calo de cerámica en baños y cocinas	20 days	20	Wed 9/19/12	Fri 10/12/12	20 days	20	Sat 11/3/12	Mon 11/26/12	0	0%
325	Enchapar piso cerámico baño y cocina	20 days	20	Thu 9/20/12	Sat 10/13/12	20 days	20	Sat 11/3/12	Mon 11/26/12	0	0%
326	Enchapar contrazÃ³calo cerámico baño y cocina	20 days	20	Fri 9/21/12	Mon 10/15/12	20 days	20	Mon 11/5/12	Tue 11/27/12	0	0%
327	InstalaciÃ³n de baranda metálica en terraza	20 days	20	Fri 9/21/12	Mon 10/15/12	20 days	20	Mon 11/5/12	Tue 11/27/12	0	0%
328	Enchape de terrazas	20 days	20	Sat 9/22/12	Tue 10/16/12	20 days	20	Tue 11/6/12	Wed 11/28/12	0	0%
329	Fraguar zÃ³calos y pisos de cerámico en cocinas y baños	20 days	20	Mon 9/24/12	Wed 10/17/12	20 days	20	Wed 11/7/12	Thu 11/29/12	0	0%
330	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	20 days	20	Tue 9/25/12	Thu 10/18/12	20 days	20	Thu 11/8/12	Fri 11/30/12	0	0%
331	Reparación y nivelación de piso para instalación de Vinílico	20 days	20	Wed 9/26/12	Fri 10/19/12						
332	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO VW	48 days	48	Thu 9/27/12	Mon 11/26/12	50 days	50	Fri 11/9/12	Wed 1/9/13	2	4%
333	Cableado eléctrico interior / REVISION CAPATAZ	20 days	20	Thu 9/27/12	Sat 10/20/12	20 days	20	Fri 11/9/12	Sat 12/1/12	0	0%
334	ImprimaciÃ³n y empaste de muros interiores Colomural	20 days	20	Fri 9/28/12	Mon 10/22/12	20 days	20	Sat 11/10/12	Mon 12/3/12	0	0%
335	Empaste grueso techos+cocinas+baÃ±os	20 days	20	Sat 9/29/12	Tue 10/23/12	20 days	20	Mon 11/12/12	Tue 12/4/12	0	0%
336	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + baños	20 days	20	Mon 10/1/12	Fri 10/26/12	20 days	20	Tue 11/13/12	Wed 12/5/12	0	0%
337	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baños	20 days	20	Tue 10/2/12	Sat 10/27/12	20 days	20	Wed 11/14/12	Thu 12/6/12	0	0%
338	PreparaciÃ³n de techos	20 days	20	Wed 10/3/12	Mon 10/29/12	20 days	20	Thu 11/15/12	Fri 12/7/12	0	0%

339	Escarchado de techos	20 days	20	Thu 10/4/12	Tue 10/30/12	20 days	20	Fri 11/16/12	Sat 12/8/12	0	0%
340	Lijado y sellado cocinas + baños	20 days	20	Fri 10/5/12	Wed 10/31/12	20 days	20	Sat 11/17/12	Mon 12/10/12	0	0%
341	Pintura 1era. Mano cocinas + baños	20 days	20	Sat 10/6/12	Fri 11/2/12	20 days	20	Mon 11/19/12	Tue 12/11/12	0	0%
342	Instalar marcos de ventana + cristales	20 days	20	Tue 10/9/12	Sat 11/3/12	20 days	20	Tue 11/20/12	Wed 12/12/12	0	0%
343	Instalar mamparas	20 days	20	Tue 10/9/12	Sat 11/3/12	20 days	20	Wed 11/21/12	Thu 12/13/12	0	0%
344	Colocar marcos sellados y empastados	20 days	20	Tue 10/9/12	Sat 11/3/12	20 days	20	Thu 11/22/12	Fri 12/14/12	0	0%
345	Presentar puertas + hueco en chapa	20 days	20	Wed 10/10/12	Mon 11/5/12	20 days	20	Fri 11/23/12	Sat 12/15/12	0	0%
346	PresentaciÃ³n de jambas	20 days	20	Thu 10/11/12	Tue 11/6/12	20 days	20	Sat 11/24/12	Mon 12/17/12	0	0%
347	Masillar y Lijar Marcos	20 days	20	Fri 10/12/12	Wed 11/7/12	20 days	20	Mon 11/26/12	Tue 12/18/12	0	0%
348	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	20 days	20	Sat 10/13/12	Thu 11/8/12	20 days	20	Tue 11/27/12	Wed 12/19/12	0	0%
349	Instalar Muebles de Cocina	20 days	20	Mon 10/15/12	Fri 11/9/12	20 days	20	Wed 11/28/12	Thu 12/20/12	0	0%
350	RevisiÃ³n General de Acabados	20 days	20	Tue 10/16/12	Sat 11/10/12	20 days	20	Thu 11/29/12	Fri 12/21/12	0	0%
351	InstalaciÃ³n de opcionales (closets, espejos)	20 days	20	Wed 10/17/12	Mon 11/12/12	20 days	20	Fri 11/30/12	Sat 12/22/12	0	0%
352	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaciÃ³n en baÃ±os	20 days	20	Thu 10/18/12	Tue 11/13/12	20 days	20	Sat 12/1/12	Wed 12/26/12	0	0%
353	Remasillado de marcos	20 days	20	Fri 10/19/12	Wed 11/14/12	20 days	20	Mon 12/3/12	Thu 12/27/12	0	0%
354	Lijado del Masillado de Marcos	20 days	20	Sat 10/20/12	Thu 11/15/12	20 days	20	Tue 12/4/12	Fri 12/28/12	0	0%
355	Pintar 2Âº mano marcos y hojas de puerta	20 days	20	Mon 10/22/12	Fri 11/16/12	20 days	20	Wed 12/5/12	Sat 12/29/12	0	0%
356	Colgado de puertas (principal con chapa)	20 days	20	Tue 10/23/12	Sat 11/17/12	20 days	20	Thu 12/6/12	Mon 12/31/12	0	0%
357	Instalar aparatos sanitarios + griferías	20 days	20	Fri 10/26/12	Mon 11/19/12	20 days	20	Fri 12/7/12	Wed 1/2/13	0	0%
358	Instalar placas eléctricas e intercomunicadores	20 days	20	Sat 10/27/12	Tue 11/20/12	20 days	20	Sat 12/8/12	Thu 1/3/13	0	0%
359	Macillado de Muros y techos	20 days	20	Mon 10/29/12	Wed 11/21/12	20 days	20	Mon 12/10/12	Fri 1/4/13	0	0%
360	Lijado de Muros y techos	20 days	20	Tue 10/30/12	Thu 11/22/12	20 days	20	Tue 12/11/12	Sat 1/5/13	0	0%
361	Pintar 2Âº mano en muros y techos	20 days	20	Wed 10/31/12	Fri 11/23/12	20 days	20	Wed 12/12/12	Mon 1/7/13	0	0%
362	Limpieza gruesa de departamentos	20 days	20	Fri 11/2/12	Sat 11/24/12	20 days	20	Thu 12/13/12	Tue 1/8/13	0	0%
363	Limpieza Final para revisiÃ³n	20 days	20	Sat 11/3/12	Mon 11/26/12	20 days	20	Fri 12/14/12	Wed 1/9/13	0	0%
364	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO VW	34 days	34	Mon 11/5/12	Thu 12/13/12	31 days	31	Sat 12/15/12	Wed 1/23/13	-3	-9%
365	Sellado para Colowall	20 days	20	Mon 11/5/12	Tue 11/27/12	20 days	20	Sat 12/15/12	Thu 1/10/13	0	0%
366	Colocaci3n de Colowall	20 days	20	Tue 11/6/12	Wed 11/28/12	20 days	20	Mon 12/17/12	Fri 1/11/13	0	0%
367	Limpieza y lijado de piso para colocaci3n de vinílico	20 days	20	Wed 11/7/12	Thu 11/29/12						
368	Colocaci3n de Vinílico	20 days	20	Fri 11/9/12	Sat 12/1/12						
369	InstalaciÃ³n de alfombras y tapajuntas	20 days	20	Sat 11/10/12	Mon 12/3/12	20 days	20	Wed 12/19/12	Mon 1/14/13	0	0%
370	Colocaci3n de contraz3calo	20 days	20	Mon 11/12/12	Tue 12/4/12	20 days	20	Thu 12/20/12	Tue 1/15/13	0	0%
371	acabado de contraz3calo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	20 days	20	Tue 11/13/12	Wed 12/5/12	20 days	20	Fri 12/21/12	Wed 1/16/13	0	0%
372	Observaciones de inmobiliaria	20 days	20	Wed 11/14/12	Thu 12/6/12	20 days	20	Sat 12/22/12	Thu 1/17/13	0	0%
373	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 1	20 days	20	Thu 11/15/12	Fri 12/7/12	20 days	20	Wed 12/26/12	Fri 1/18/13	0	0%
374	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 2	20 days	20	Fri 11/16/12	Sat 12/8/12	20 days	20	Thu 12/27/12	Sat 1/19/13	0	0%
375	Levantamiento de observaciones inmobiliaria día 3	20 days	20	Sat 11/17/12	Mon 12/10/12						
376	Limpieza final	20 days	20	Mon 11/19/12	Tue 12/11/12	20 days	20	Fri 12/28/12	Mon 1/21/13	0	0%
377	Entrega a inmobiliaria	20 days	20	Tue 11/20/12	Wed 12/12/12	20 days	20	Sat 12/29/12	Tue 1/22/13	0	0%
378	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	20 days	20	Wed 11/21/12	Thu 12/13/12	20 days	20	Mon 12/31/12	Wed 1/23/13	0	0%
379	EDIFICIO GH (E1)	136 days	136	Thu 8/9/12	Wed 1/23/13	148 days	148	Fri 9/21/12	Wed 3/20/13	12	9%
380	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO GH	38 days	38	Fri 9/21/12	Thu 11/8/12	54 days	54	Mon 11/5/12	Wed 1/9/13	16	42%
381	Trazar muros	32 days	32	Fri 9/21/12	Wed 10/31/12	48 days	48	Mon 11/5/12	Wed 1/2/13	16	50%
382	Colocar acero vertical	32 days	32	Fri 9/21/12	Wed 10/31/12	48 days	48	Mon 11/5/12	Wed 1/2/13	16	50%
383	Instalaciones en muros - IISS	32 days	32	Fri 9/21/12	Wed 10/31/12	48 days	48	Mon 11/5/12	Wed 1/2/13	16	50%
384	Instalaciones en muros - IIEE	32 days	32	Fri 9/21/12	Wed 10/31/12	48 days	48	Mon 11/5/12	Wed 1/2/13	16	50%
385	Encofrado de muros	32 days	32	Sat 9/22/12	Fri 11/2/12	48 days	48	Tue 11/6/12	Thu 1/3/13	16	50%
386	Vaciado de muros	32 days	32	Sat 9/22/12	Fri 11/2/12	48 days	48	Tue 11/6/12	Thu 1/3/13	16	50%
387	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	32 days	32	Mon 9/24/12	Sat 11/3/12	48 days	48	Tue 11/6/12	Thu 1/3/13	16	50%
388	Curado y resane de muros	32 days	32	Mon 9/24/12	Sat 11/3/12	48 days	48	Tue 11/6/12	Thu 1/3/13	16	50%
389	Encofrado de losa (inc. friso)	32 days	32	Mon 9/24/12	Sat 11/3/12	48 days	48	Wed 11/7/12	Fri 1/4/13	16	50%
390	Acero de losa	32 days	32	Mon 9/24/12	Sat 11/3/12	48 days	48	Wed 11/7/12	Fri 1/4/13	16	50%
391	Armado de baterías de desagüe e inicio de pruebas	32 days	32	Mon 9/24/12	Sat 11/3/12	48 days	48	Wed 11/7/12	Fri 1/4/13	16	50%
392	Instalaciones en losa - IISS	32 days	32	Tue 9/25/12	Mon 11/5/12	48 days	48	Thu 11/8/12	Sat 1/5/13	16	50%
393	Instalaciones en losa - IIEE	32 days	32	Tue 9/25/12	Mon 11/5/12	48 days	48	Thu 11/8/12	Sat 1/5/13	16	50%
394	Vaciado de losa	32 days	32	Tue 9/25/12	Mon 11/5/12	48 days	48	Thu 11/8/12	Sat 1/5/13	16	50%
395	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	32 days	32	Wed 9/26/12	Tue 11/6/12	48 days	48	Fri 11/9/12	Mon 1/7/13	16	50%
396	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	32 days	32	Wed 9/26/12	Tue 11/6/12	48 days	48	Fri 11/9/12	Mon 1/7/13	16	50%
397	Curado de losa	32 days	32	Wed 9/26/12	Tue 11/6/12	48 days	48	Fri 11/9/12	Mon 1/7/13	16	50%
398	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	32 days	32	Wed 9/26/12	Tue 11/6/12	48 days	48	Fri 11/9/12	Mon 1/7/13	16	50%
399	Encofrado de alfeizar (8 und)	32 days	32	Thu 9/27/12	Wed 11/7/12	48 days	48	Sat 11/10/12	Tue 1/8/13	16	50%
400	Vaciado de alfeizar	32 days	32	Thu 9/27/12	Wed 11/7/12	48 days	48	Sat 11/10/12	Tue 1/8/13	16	50%
401	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	32 days	32	Fri 9/28/12	Thu 11/8/12	48 days	48	Mon 11/12/12	Wed 1/9/13	16	50%
402	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	32 days	32	Fri 9/28/12	Thu 11/8/12	48 days	48	Mon 11/12/12	Wed 1/9/13	16	50%
403	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO GH	49 days	49	Sat 9/29/12	Thu 11/29/12	64 days	64	Tue 11/13/12	Tue 1/29/13	15	31%
404	Lijado y desbaste de placas	32 days	32	Sat 9/29/12	Fri 11/9/12	48 days	48	Tue 11/13/12	Thu 1/10/13	16	50%
405	Entrega de picado de muros y techo	32 days	32	Sat 9/29/12	Fri 11/9/12	48 days	48	Tue 11/13/12	Thu 1/10/13	16	50%
406	Entrega de pruebas de presi3n de IISS y winchado de IIEE	32 days	32	Sat 9/29/12	Fri 11/9/12	48 days	48	Tue 11/13/12	Thu 1/10/13	16	50%
407	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	32 days	32	Mon 10/1/12	Sat 11/10/12	48 days	48	Wed 11/14/12	Fri 1/11/13	16	50%

408	Tarrajeo de derrames	32 days	32	Wed 10/3/12	Tue 11/13/12	48 days	48	Fri 11/16/12	Mon 1/14/13	16	50%
409	Trazo para tabiques	32 days	32	Wed 10/10/12	Mon 11/19/12	48 days	48	Fri 11/23/12	Mon 1/21/13	16	50%
410	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	32 days	32	Wed 10/10/12	Mon 11/19/12	48 days	48	Fri 11/23/12	Mon 1/21/13	16	50%
411	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	32 days	32	Wed 10/10/12	Mon 11/19/12	48 days	48	Fri 11/23/12	Mon 1/21/13	16	50%
412	Anclajes y emplastillado para tabiques - La Casa	32 days	32	Wed 10/10/12	Mon 11/19/12	48 days	48	Fri 11/23/12	Mon 1/21/13	16	50%
413	Levantar tabiques - La Casa	32 days	32	Thu 10/11/12	Tue 11/20/12	48 days	48	Sat 11/24/12	Tue 1/22/13	16	50%
414	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	32 days	32	Thu 10/11/12	Tue 11/20/12	48 days	48	Sat 11/24/12	Tue 1/22/13	16	50%
415	Solaqueo de tabiques	32 days	32	Thu 10/11/12	Tue 11/20/12	48 days	48	Sat 11/24/12	Tue 1/22/13	16	50%
416	Rectificaci3n de cajas de v3lvulas	32 days	32	Thu 10/11/12	Tue 11/20/12	48 days	48	Sat 11/24/12	Tue 1/22/13	16	50%
417	Hacer sardinel de ducha	32 days	32	Fri 10/12/12	Wed 11/21/12	48 days	48	Mon 11/26/12	Wed 1/23/13	16	50%
418	Colocar z3calo de cer3mica en ba1os y cocinas	32 days	32	Sat 10/13/12	Thu 11/22/12	48 days	48	Tue 11/27/12	Thu 1/24/13	16	50%
419	Enchapar piso cer3mico ba1o y cocina	32 days	32	Mon 10/15/12	Fri 11/23/12	48 days	48	Tue 11/27/12	Thu 1/24/13	16	50%
420	Enchapar contraz3calo cer3mico ba1o y cocina	32 days	32	Tue 10/16/12	Sat 11/24/12	48 days	48	Wed 11/28/12	Fri 1/25/13	16	50%
421	Instalaci3n de baranda met3lica en terraza	32 days	32	Tue 10/16/12	Sat 11/24/12	48 days	48	Wed 11/28/12	Fri 1/25/13	16	50%
422	Enchape de terrazas	32 days	32	Wed 10/17/12	Mon 11/26/12	48 days	48	Thu 11/29/12	Sat 1/26/13	16	50%
423	Fraguar z3calos y pisos de cer3mico en cocinas y ba1os	32 days	32	Thu 10/18/12	Tue 11/27/12	48 days	48	Fri 11/30/12	Mon 1/28/13	16	50%
424	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	32 days	32	Fri 10/19/12	Wed 11/28/12	48 days	48	Sat 12/1/12	Tue 1/29/13	16	50%
425	Reparaci3n y nivelaci3n de piso para instalaci3n de Vin3lico	32 days	32	Sat 10/20/12	Thu 11/29/12						
426	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO GH	60 days	60	Mon 10/22/12	Sat 1/5/13	78 days	78	Mon 12/3/12	Wed 3/6/13	18	30%
427	Cableado el3ctrico interior / REVISION CAPATAZ	32 days	32	Mon 10/22/12	Fri 11/30/12	48 days	48	Mon 12/3/12	Wed 1/30/13	16	50%
428	Imprimaci3n y empaste de muros interiores Colomural	32 days	32	Tue 10/23/12	Sat 12/1/12	48 days	48	Tue 12/4/12	Thu 1/31/13	16	50%
429	Empaste grueso techos+cocinas+ba1os	32 days	32	Fri 10/26/12	Mon 12/3/12	48 days	48	Wed 12/5/12	Fri 2/1/13	16	50%
430	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + ba1os	32 days	32	Sat 10/27/12	Tue 12/4/12	48 days	48	Thu 12/6/12	Sat 2/2/13	16	50%
431	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + ba1os	32 days	32	Mon 10/29/12	Wed 12/5/12	48 days	48	Fri 12/7/12	Mon 2/4/13	16	50%
432	Preparaci3n de techos	32 days	32	Tue 10/30/12	Thu 12/6/12	48 days	48	Sat 12/8/12	Tue 2/5/13	16	50%
433	Escarchado de techos	32 days	32	Wed 10/31/12	Fri 12/7/12	48 days	48	Mon 12/10/12	Wed 2/6/13	16	50%
434	Lijado y sellado cocinas + ba1os	32 days	32	Fri 11/2/12	Sat 12/8/12	48 days	48	Tue 12/11/12	Thu 2/7/13	16	50%
435	Pintura 1era. Mano cocinas + ba1os	32 days	32	Sat 11/3/12	Mon 12/10/12	48 days	48	Wed 12/12/12	Fri 2/8/13	16	50%
436	Instalar marcos de ventana + cristales	32 days	32	Mon 11/5/12	Tue 12/11/12	48 days	48	Thu 12/13/12	Sat 2/9/13	16	50%
437	Instalar mamparas	32 days	32	Mon 11/5/12	Tue 12/11/12	48 days	48	Fri 12/14/12	Mon 2/11/13	16	50%
438	Colocar marcos sellados y empastados	32 days	32	Mon 11/5/12	Tue 12/11/12	48 days	48	Sat 12/15/12	Tue 2/12/13	16	50%
439	Presentar puertas + hueco en chapa	32 days	32	Tue 11/6/12	Wed 12/12/12	48 days	48	Mon 12/17/12	Wed 2/13/13	16	50%
440	Presentaci3n de jambas	32 days	32	Wed 11/7/12	Thu 12/13/12	48 days	48	Tue 12/18/12	Thu 2/14/13	16	50%
441	Masillar y Lijar Marcos	32 days	32	Thu 11/8/12	Fri 12/14/12	48 days	48	Wed 12/19/12	Fri 2/15/13	16	50%
442	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	32 days	32	Fri 11/9/12	Sat 12/15/12	48 days	48	Thu 12/20/12	Sat 2/16/13	16	50%
443	Instalar Muebles de Cocina	32 days	32	Sat 11/10/12	Mon 12/17/12	48 days	48	Fri 12/21/12	Mon 2/18/13	16	50%
444	Revisi3n General de Acabados	32 days	32	Mon 11/12/12	Tue 12/18/12	48 days	48	Sat 12/22/12	Tue 2/19/13	16	50%
445	Instalaci3n de opcionales (closets, espejos)	32 days	32	Tue 11/13/12	Wed 12/19/12	48 days	48	Wed 12/26/12	Wed 2/20/13	16	50%
446	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaci3n en ba1os	32 days	32	Wed 11/14/12	Thu 12/20/12	48 days	48	Thu 12/27/12	Thu 2/21/13	16	50%
447	Remasillado de marcos	32 days	32	Thu 11/15/12	Fri 12/21/12	48 days	48	Fri 12/28/12	Fri 2/22/13	16	50%
448	Lijado del Masillado de Marcos	32 days	32	Fri 11/16/12	Sat 12/22/12	48 days	48	Sat 12/29/12	Sat 2/23/13	16	50%
449	Pintar 2º mano marcos y hojas de puerta	32 days	32	Sat 11/17/12	Wed 12/26/12	48 days	48	Mon 12/31/12	Mon 2/25/13	16	50%
450	Colgado de puertas (principal con chapa)	32 days	32	Mon 11/19/12	Thu 12/27/12	48 days	48	Wed 1/2/13	Tue 2/26/13	16	50%
451	Instalar aparatos sanitarios + grifer3as	32 days	32	Tue 11/20/12	Fri 12/28/12	48 days	48	Thu 1/3/13	Wed 2/27/13	16	50%
452	Instalar placas el3ctricas e intercomunicadores	32 days	32	Wed 11/21/12	Sat 12/29/12	48 days	48	Fri 1/4/13	Thu 2/28/13	16	50%
453	Macillado de Muros y techos	32 days	32	Thu 11/22/12	Mon 12/31/12	48 days	48	Sat 1/5/13	Fri 3/1/13	16	50%
454	Lijado de Muros y techos	32 days	32	Fri 11/23/12	Wed 1/2/13	48 days	48	Mon 1/7/13	Sat 3/2/13	16	50%
455	Pintar 2º mano en muros y techos	32 days	32	Sat 11/24/12	Thu 1/3/13	48 days	48	Tue 1/8/13	Mon 3/4/13	16	50%
456	Limpieza gruesa de departamentos	32 days	32	Mon 11/26/12	Fri 1/4/13	48 days	48	Wed 1/9/13	Tue 3/5/13	16	50%
457	Limpieza Final para revisi3n	32 days	32	Tue 11/27/12	Sat 1/5/13	48 days	48	Thu 1/10/13	Wed 3/6/13	16	50%
458	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO GH	46 days	46	Wed 11/28/12	Wed 1/23/13	59 days	59	Fri 1/11/13	Wed 3/20/13	13	28%
459	Sellado para Colowall	32 days	32	Wed 11/28/12	Mon 1/7/13	48 days	48	Fri 1/11/13	Thu 3/7/13	16	50%
460	Colocaci3n de Colowall	32 days	32	Thu 11/29/12	Tue 1/8/13	48 days	48	Sat 1/12/13	Fri 3/8/13	16	50%
461	Limpieza y lijado de piso para colocaci3n de vin3lico	32 days	32	Fri 11/30/12	Wed 1/9/13						
462	Colocaci3n de Vin3lico	32 days	32	Mon 12/3/12	Fri 1/11/13						
463	Instalaci3n de alfombras y tapajuntas	32 days	32	Tue 12/4/12	Sat 1/12/13	48 days	48	Tue 1/15/13	Mon 3/11/13	16	50%
464	Colocaci3n de contraz3calo	32 days	32	Wed 12/5/12	Mon 1/14/13	48 days	48	Wed 1/16/13	Tue 3/12/13	16	50%
465	acabado de contraz3calo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	32 days	32	Thu 12/6/12	Tue 1/15/13	48 days	48	Thu 1/17/13	Wed 3/13/13	16	50%
466	Observaciones de inmobiliaria	32 days	32	Fri 12/7/12	Wed 1/16/13	48 days	48	Fri 1/18/13	Thu 3/14/13	16	50%
467	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria d3a 1	32 days	32	Sat 12/8/12	Thu 1/17/13	48 days	48	Sat 1/19/13	Fri 3/15/13	16	50%
468	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria d3a 2	32 days	32	Mon 12/10/12	Fri 1/18/13	48 days	48	Mon 1/21/13	Sat 3/16/13	16	50%
469	Levantamiento de observaciones inmobiliaria d3a 3	32 days	32	Tue 12/11/12	Sat 1/19/13						
470	Limpieza final	32 days	32	Wed 12/12/12	Mon 1/21/13	48 days	48	Tue 1/22/13	Mon 3/18/13	16	50%
471	Entrega a inmobiliaria	32 days	32	Thu 12/13/12	Tue 1/22/13	48 days	48	Wed 1/23/13	Tue 3/19/13	16	50%
472	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	32 days	32	Fri 12/14/12	Wed 1/23/13	48 days	48	Thu 1/24/13	Wed 3/20/13	16	50%
473	EDIFICIO EF (E13-E14)	167 days	167	Tue 9/18/12	Wed 4/10/13	179 days	179	Sat 11/24/12	Mon 7/1/13	12	7%
474	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO EF	70 days	70	Fri 11/2/12	Fri 1/25/13	86 days	86	Sat 1/5/13	Wed 4/17/13	16	23%
475	Trazar muros	64 days	64	Fri 11/2/12	Fri 1/18/13	80 days	80	Sat 1/5/13	Wed 4/10/13	16	25%
476	Colocar acero vertical	64 days	64	Fri 11/2/12	Fri 1/18/13	80 days	80	Sat 1/5/13	Wed 4/10/13	16	25%

477	Instalaciones en muros - IISS	64 days	64	Fri 11/2/12	Fri 1/18/13	80 days	80	Sat 1/5/13	Wed 4/10/13	16	25%
478	Instalaciones en muros - IIEE	64 days	64	Fri 11/2/12	Fri 1/18/13	80 days	80	Sat 1/5/13	Wed 4/10/13	16	25%
479	Encofrado de muros	64 days	64	Sat 11/3/12	Sat 1/19/13	80 days	80	Mon 1/7/13	Thu 4/11/13	16	25%
480	Vaciado de muros	64 days	64	Sat 11/3/12	Sat 1/19/13	80 days	80	Mon 1/7/13	Thu 4/11/13	16	25%
481	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	64 days	64	Mon 11/5/12	Mon 1/21/13	80 days	80	Tue 1/8/13	Fri 4/12/13	16	25%
482	Curado y resane de muros	64 days	64	Mon 11/5/12	Mon 1/21/13	80 days	80	Tue 1/8/13	Fri 4/12/13	16	25%
483	Encofrado de losa (inc. friso)	64 days	64	Mon 11/5/12	Mon 1/21/13	80 days	80	Tue 1/8/13	Fri 4/12/13	16	25%
484	Acero de losa	64 days	64	Mon 11/5/12	Mon 1/21/13	80 days	80	Tue 1/8/13	Fri 4/12/13	16	25%
485	Armado de baterías de desagüe e inicio de pruebas	64 days	64	Mon 11/5/12	Mon 1/21/13	80 days	80	Tue 1/8/13	Fri 4/12/13	16	25%
486	Instalaciones en losa - IISS	64 days	64	Tue 11/6/12	Tue 1/22/13	80 days	80	Wed 1/9/13	Sat 4/13/13	16	25%
487	Instalaciones en losa - IIEE	64 days	64	Tue 11/6/12	Tue 1/22/13	80 days	80	Wed 1/9/13	Sat 4/13/13	16	25%
488	Vaciado de losa	64 days	64	Tue 11/6/12	Tue 1/22/13	80 days	80	Wed 1/9/13	Sat 4/13/13	16	25%
489	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	64 days	64	Wed 11/7/12	Wed 1/23/13	80 days	80	Thu 1/10/13	Mon 4/15/13	16	25%
490	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	64 days	64	Wed 11/7/12	Wed 1/23/13	80 days	80	Thu 1/10/13	Mon 4/15/13	16	25%
491	Curado de losa	64 days	64	Wed 11/7/12	Wed 1/23/13	80 days	80	Thu 1/10/13	Mon 4/15/13	16	25%
492	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	64 days	64	Wed 11/7/12	Wed 1/23/13	80 days	80	Thu 1/10/13	Mon 4/15/13	16	25%
493	Encofrado de alfeizar (8 und)	64 days	64	Thu 11/8/12	Thu 1/24/13	80 days	80	Fri 1/11/13	Tue 4/16/13	16	25%
494	Vaciado de alfeizar	64 days	64	Thu 11/8/12	Thu 1/24/13	80 days	80	Fri 1/11/13	Tue 4/16/13	16	25%
495	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	64 days	64	Fri 11/9/12	Fri 1/25/13	80 days	80	Sat 1/12/13	Wed 4/17/13	16	25%
496	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	64 days	64	Fri 11/9/12	Fri 1/25/13	80 days	80	Sat 1/12/13	Wed 4/17/13	16	25%
497	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO EF	81 days	81	Sat 11/10/12	Fri 2/15/13	96 days	96	Mon 1/14/13	Wed 5/8/13	15	19%
498	Lijado y desbaste de placas	64 days	64	Sat 11/10/12	Sat 1/26/13	80 days	80	Mon 1/14/13	Thu 4/18/13	16	25%
499	Entrega de picado de muros y techo	64 days	64	Sat 11/10/12	Sat 1/26/13	80 days	80	Mon 1/14/13	Thu 4/18/13	16	25%
500	Entrega de pruebas de presiÃ³n de IISS y winchado de IIEE	64 days	64	Sat 11/10/12	Sat 1/26/13	80 days	80	Mon 1/14/13	Thu 4/18/13	16	25%
501	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	64 days	64	Mon 11/12/12	Mon 1/28/13	80 days	80	Tue 1/15/13	Fri 4/19/13	16	25%
502	Tarrajeo de derrames	64 days	64	Wed 11/14/12	Wed 1/30/13	80 days	80	Thu 1/17/13	Mon 4/22/13	16	25%
503	Trazo para tabiques	64 days	64	Tue 11/20/12	Tue 2/5/13	80 days	80	Thu 1/24/13	Mon 4/29/13	16	25%
504	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	64 days	64	Tue 11/20/12	Tue 2/5/13	80 days	80	Thu 1/24/13	Mon 4/29/13	16	25%
505	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	64 days	64	Tue 11/20/12	Tue 2/5/13	80 days	80	Thu 1/24/13	Mon 4/29/13	16	25%
506	Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa	64 days	64	Tue 11/20/12	Tue 2/5/13	80 days	80	Thu 1/24/13	Mon 4/29/13	16	25%
507	Levantar tabiques - La Casa	64 days	64	Wed 11/21/12	Wed 2/6/13	80 days	80	Fri 1/25/13	Tue 4/30/13	16	25%
508	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	64 days	64	Wed 11/21/12	Wed 2/6/13	80 days	80	Fri 1/25/13	Tue 4/30/13	16	25%
509	Solaqueo de tabiques	64 days	64	Wed 11/21/12	Wed 2/6/13	80 days	80	Fri 1/25/13	Tue 4/30/13	16	25%
510	RectificaciÃ³n de cajas de válvulas	64 days	64	Wed 11/21/12	Wed 2/6/13	80 days	80	Fri 1/25/13	Tue 4/30/13	16	25%
511	Hacer sardinel de ducha	64 days	64	Thu 11/22/12	Thu 2/7/13	80 days	80	Sat 1/26/13	Thu 5/2/13	16	25%
512	Colocar zÃ³calo de cerámica en baños y cocinas	64 days	64	Fri 11/23/12	Fri 2/8/13	80 days	80	Mon 1/28/13	Fri 5/3/13	16	25%
513	Enchapar piso cerámico baño y cocina	64 days	64	Sat 11/24/12	Sat 2/9/13	80 days	80	Mon 1/28/13	Fri 5/3/13	16	25%
514	Enchapar contrazÃ³calo cerámico baño y cocina	64 days	64	Mon 11/26/12	Mon 2/11/13	80 days	80	Tue 1/29/13	Sat 5/4/13	16	25%
515	InstalaciÃ³n de baranda metálica en terraza	64 days	64	Mon 11/26/12	Mon 2/11/13	80 days	80	Tue 1/29/13	Sat 5/4/13	16	25%
516	Enchape de terrazas	64 days	64	Tue 11/27/12	Tue 2/12/13	80 days	80	Wed 1/30/13	Mon 5/6/13	16	25%
517	Fraguar zÃ³calos y pisos de cerámico en cocinas y baños	64 days	64	Wed 11/28/12	Wed 2/13/13	80 days	80	Thu 1/31/13	Tue 5/7/13	16	25%
518	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	64 days	64	Thu 11/29/12	Thu 2/14/13	80 days	80	Fri 2/1/13	Wed 5/8/13	16	25%
519	Reparación y nivelación de piso para instalación de Vinílico	64 days	64	Fri 11/30/12	Fri 2/15/13						
520	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO EF	92 days	92	Sat 12/1/12	Thu 3/21/13	110 days	110	Sat 2/2/13	Sat 6/15/13	18	20%
521	Cableado eléctrico interior / REVISION CAPATAZ	64 days	64	Sat 12/1/12	Sat 2/16/13	80 days	80	Sat 2/2/13	Thu 5/9/13	16	25%
522	ImprimaciÃ³n y empaste de muros interiores Colomural	64 days	64	Mon 12/3/12	Mon 2/18/13	80 days	80	Mon 2/4/13	Fri 5/10/13	16	25%
523	Empaste grueso techos+cocinas+baÃ±os	64 days	64	Tue 12/4/12	Tue 2/19/13	80 days	80	Tue 2/5/13	Mon 5/13/13	16	25%
524	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + baños	64 days	64	Wed 12/5/12	Wed 2/20/13	80 days	80	Wed 2/6/13	Tue 5/14/13	16	25%
525	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baños	64 days	64	Thu 12/6/12	Thu 2/21/13	80 days	80	Thu 2/7/13	Wed 5/15/13	16	25%
526	PreparaciÃ³n de techos	64 days	64	Fri 12/7/12	Fri 2/22/13	80 days	80	Fri 2/8/13	Thu 5/16/13	16	25%
527	Escarchado de techos	64 days	64	Sat 12/8/12	Sat 2/23/13	80 days	80	Sat 2/9/13	Fri 5/17/13	16	25%
528	Lijado y sellado cocinas + baños	64 days	64	Mon 12/10/12	Mon 2/25/13	80 days	80	Mon 2/11/13	Sat 5/18/13	16	25%
529	Pintura 1era. Mano cocinas + baños	64 days	64	Tue 12/11/12	Tue 2/26/13	80 days	80	Tue 2/12/13	Mon 5/20/13	16	25%
530	Instalar marcos de ventana + cristales	64 days	64	Wed 12/12/12	Wed 2/27/13	80 days	80	Wed 2/13/13	Tue 5/21/13	16	25%
531	Instalar mamparas	64 days	64	Wed 12/12/12	Wed 2/27/13	80 days	80	Thu 2/14/13	Wed 5/22/13	16	25%
532	Colocar marcos sellados y empastados	64 days	64	Wed 12/12/12	Wed 2/27/13	80 days	80	Fri 2/15/13	Thu 5/23/13	16	25%
533	Presentar puertas + hueco en chapa	64 days	64	Thu 12/13/12	Thu 2/28/13	80 days	80	Sat 2/16/13	Fri 5/24/13	16	25%
534	PresentaciÃ³n de jambas	64 days	64	Fri 12/14/12	Fri 3/1/13	80 days	80	Mon 2/18/13	Sat 5/25/13	16	25%
535	Masillar y Lijar Marcos	64 days	64	Sat 12/15/12	Sat 3/2/13	80 days	80	Tue 2/19/13	Mon 5/27/13	16	25%
536	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	64 days	64	Mon 12/17/12	Mon 3/4/13	80 days	80	Wed 2/20/13	Tue 5/28/13	16	25%
537	Instalar Muebles de Cocina	64 days	64	Tue 12/18/12	Tue 3/5/13	80 days	80	Thu 2/21/13	Wed 5/29/13	16	25%
538	RevisiÃ³n General de Acabados	64 days	64	Wed 12/19/12	Wed 3/6/13	80 days	80	Fri 2/22/13	Thu 5/30/13	16	25%
539	InstalaciÃ³n de opcionales (closets, espejos)	64 days	64	Thu 12/20/12	Thu 3/7/13	80 days	80	Sat 2/23/13	Fri 5/31/13	16	25%
540	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaciÃ³n en baños	64 days	64	Fri 12/21/12	Fri 3/8/13	80 days	80	Mon 2/25/13	Mon 6/3/13	16	25%
541	Remasillado de marcos	64 days	64	Sat 12/22/12	Sat 3/9/13	80 days	80	Tue 2/26/13	Tue 6/4/13	16	25%
542	Lijado del Masillado de Marcos	64 days	64	Wed 12/26/12	Mon 3/11/13	80 days	80	Wed 2/27/13	Wed 6/5/13	16	25%
543	Pintar 2Ãº mano marcos y hojas de puerta	64 days	64	Thu 12/27/12	Tue 3/12/13	80 days	80	Thu 2/28/13	Thu 6/6/13	16	25%
544	Colgado de puertas (principal con chapa)	64 days	64	Fri 12/28/12	Wed 3/13/13	80 days	80	Fri 3/1/13	Fri 6/7/13	16	25%
545	Instalar aparatos sanitarios + griferías	64 days	64	Sat 12/29/12	Thu 3/14/13	80 days	80	Sat 3/2/13	Sat 6/8/13	16	25%

546	Instalar placas eléctricas e intercomunicadores	64 days	64	Mon 12/31/12	Fri 3/15/13	80 days	80	Mon 3/4/13	Mon 6/10/13	16	25%
547	Macillado de Muros y techos	64 days	64	Wed 1/2/13	Sat 3/16/13	80 days	80	Tue 3/5/13	Tue 6/11/13	16	25%
548	Lijado de Muros y techos	64 days	64	Thu 1/3/13	Mon 3/18/13	80 days	80	Wed 3/6/13	Wed 6/12/13	16	25%
549	Pintar 2 ^º mano en muros y techos	64 days	64	Fri 1/4/13	Tue 3/19/13	80 days	80	Thu 3/7/13	Thu 6/13/13	16	25%
550	Limpieza gruesa de departamentos	64 days	64	Sat 1/5/13	Wed 3/20/13	80 days	80	Fri 3/8/13	Fri 6/14/13	16	25%
551	Limpieza Final para revisi ³ n	64 days	64	Mon 1/7/13	Thu 3/21/13	80 days	80	Sat 3/9/13	Sat 6/15/13	16	25%
552	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO EF	78 days	78	Tue 1/8/13	Wed 4/10/13	91 days	91	Mon 3/11/13	Mon 7/1/13	13	17%
553	Sellado para Colowall	64 days	64	Tue 1/8/13	Fri 3/22/13	80 days	80	Mon 3/11/13	Mon 6/17/13	16	25%
554	Colocación de Colowall	64 days	64	Wed 1/9/13	Sat 3/23/13	80 days	80	Tue 3/12/13	Tue 6/18/13	16	25%
555	Limpieza y lijado de piso para colocación de vinílico	64 days	64	Thu 1/10/13	Mon 3/25/13						
556	Colocación de Vinílico	64 days	64	Sat 1/12/13	Wed 3/27/13						
557	Instalaci ² n de alfombras y tapajuntas	64 days	64	Mon 1/14/13	Sat 3/30/13	80 days	80	Thu 3/14/13	Thu 6/20/13	16	25%
558	Colocación de contrazócalo	64 days	64	Tue 1/15/13	Mon 4/1/13	80 days	80	Fri 3/15/13	Fri 6/21/13	16	25%
559	acabado de contrazócalo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	64 days	64	Wed 1/16/13	Tue 4/2/13	80 days	80	Sat 3/16/13	Sat 6/22/13	16	25%
560	Observaciones de inmobiliaria	64 days	64	Thu 1/17/13	Wed 4/3/13	80 days	80	Mon 3/18/13	Mon 6/24/13	16	25%
561	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 1	64 days	64	Fri 1/18/13	Thu 4/4/13	80 days	80	Tue 3/19/13	Tue 6/25/13	16	25%
562	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 2	64 days	64	Sat 1/19/13	Fri 4/5/13	80 days	80	Wed 3/20/13	Wed 6/26/13	16	25%
563	Levantamiento de observaciones inmobiliaria día 3	64 days	64	Mon 1/21/13	Sat 4/6/13						
564	Limpieza final	64 days	64	Tue 1/22/13	Mon 4/8/13	80 days	80	Thu 3/21/13	Thu 6/27/13	16	25%
565	Entrega a inmobiliaria	64 days	64	Wed 1/23/13	Tue 4/9/13	80 days	80	Fri 3/22/13	Fri 6/28/13	16	25%
566	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	64 days	64	Thu 1/24/13	Wed 4/10/13	80 days	80	Sat 3/23/13	Mon 7/1/13	16	25%
567	EDIFICIO CD (E15-E16)	161 days	161	Thu 12/13/12	Thu 6/27/13	159 days	159	Thu 3/7/13	Tue 9/17/13	-2	-1%
568	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO CD	70 days	70	Sat 1/19/13	Fri 4/12/13	86 days	86	Thu 4/11/13	Wed 7/24/13	16	23%
569	Trazar muros	64 days	64	Sat 1/19/13	Fri 4/5/13	80 days	80	Thu 4/11/13	Wed 7/17/13	16	25%
570	Colocar acero vertical	64 days	64	Sat 1/19/13	Fri 4/5/13	80 days	80	Thu 4/11/13	Wed 7/17/13	16	25%
571	Instalaciones en muros - IISS	64 days	64	Sat 1/19/13	Fri 4/5/13	80 days	80	Thu 4/11/13	Wed 7/17/13	16	25%
572	Instalaciones en muros - IIEE	64 days	64	Sat 1/19/13	Fri 4/5/13	80 days	80	Thu 4/11/13	Wed 7/17/13	16	25%
573	Encofrado de muros	64 days	64	Mon 1/21/13	Sat 4/6/13	80 days	80	Fri 4/12/13	Thu 7/18/13	16	25%
574	Vaciado de muros	64 days	64	Mon 1/21/13	Sat 4/6/13	80 days	80	Fri 4/12/13	Thu 7/18/13	16	25%
575	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	64 days	64	Tue 1/22/13	Mon 4/8/13	80 days	80	Sat 4/13/13	Fri 7/19/13	16	25%
576	Curado y resane de muros	64 days	64	Tue 1/22/13	Mon 4/8/13	80 days	80	Sat 4/13/13	Fri 7/19/13	16	25%
577	Encofrado de losa (inc. friso)	64 days	64	Tue 1/22/13	Mon 4/8/13	80 days	80	Sat 4/13/13	Fri 7/19/13	16	25%
578	Acero de losa	64 days	64	Tue 1/22/13	Mon 4/8/13	80 days	80	Sat 4/13/13	Fri 7/19/13	16	25%
579	Armado de baterías de desagüe e inicio de pruebas	64 days	64	Tue 1/22/13	Mon 4/8/13	80 days	80	Sat 4/13/13	Fri 7/19/13	16	25%
580	Instalaciones en losa - IISS	64 days	64	Wed 1/23/13	Tue 4/9/13	80 days	80	Mon 4/15/13	Sat 7/20/13	16	25%
581	Instalaciones en losa - IIEE	64 days	64	Wed 1/23/13	Tue 4/9/13	80 days	80	Mon 4/15/13	Sat 7/20/13	16	25%
582	Vaciado de losa	64 days	64	Wed 1/23/13	Tue 4/9/13	80 days	80	Mon 4/15/13	Sat 7/20/13	16	25%
583	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	64 days	64	Thu 1/24/13	Wed 4/10/13	80 days	80	Tue 4/16/13	Mon 7/22/13	16	25%
584	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	64 days	64	Thu 1/24/13	Wed 4/10/13	80 days	80	Tue 4/16/13	Mon 7/22/13	16	25%
585	Curado de losa	64 days	64	Thu 1/24/13	Wed 4/10/13	80 days	80	Tue 4/16/13	Mon 7/22/13	16	25%
586	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	64 days	64	Thu 1/24/13	Wed 4/10/13	80 days	80	Tue 4/16/13	Mon 7/22/13	16	25%
587	Encofrado de alfeizar (8 und)	64 days	64	Fri 1/25/13	Thu 4/11/13	80 days	80	Wed 4/17/13	Tue 7/23/13	16	25%
588	Vaciado de alfeizar	64 days	64	Fri 1/25/13	Thu 4/11/13	80 days	80	Wed 4/17/13	Tue 7/23/13	16	25%
589	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	64 days	64	Sat 1/26/13	Fri 4/12/13	80 days	80	Thu 4/18/13	Wed 7/24/13	16	25%
590	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	64 days	64	Sat 1/26/13	Fri 4/12/13	80 days	80	Thu 4/18/13	Wed 7/24/13	16	25%
591	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO CD	81 days	81	Mon 1/28/13	Sat 5/4/13	93 days	93	Fri 4/19/13	Sat 8/10/13	12	15%
592	Lijado y desbaste de placas	64 days	64	Mon 1/28/13	Sat 4/13/13	80 days	80	Fri 4/19/13	Thu 7/25/13	16	25%
593	Entrega de picado de muros y techo	64 days	64	Mon 1/28/13	Sat 4/13/13	80 days	80	Fri 4/19/13	Thu 7/25/13	16	25%
594	Entrega de pruebas de presi ² n de IISS y winchado de IIEE	64 days	64	Mon 1/28/13	Sat 4/13/13	80 days	80	Fri 4/19/13	Thu 7/25/13	16	25%
595	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	64 days	64	Tue 1/29/13	Mon 4/15/13	80 days	80	Sat 4/20/13	Fri 7/26/13	16	25%
596	Tarrajeo de derrames	64 days	64	Thu 1/31/13	Wed 4/17/13	80 days	80	Mon 4/22/13	Sat 7/27/13	16	25%
597	Trazo para tabiques	64 days	64	Wed 2/6/13	Tue 4/23/13	80 days	80	Mon 4/29/13	Mon 8/5/13	16	25%
598	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	64 days	64	Wed 2/6/13	Tue 4/23/13	80 days	80	Mon 4/29/13	Mon 8/5/13	16	25%
599	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	64 days	64	Wed 2/6/13	Tue 4/23/13	80 days	80	Mon 4/29/13	Mon 8/5/13	16	25%
600	Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa	64 days	64	Wed 2/6/13	Tue 4/23/13	80 days	80	Mon 4/29/13	Mon 8/5/13	16	25%
601	Levantar tabiques - La Casa	64 days	64	Thu 2/7/13	Wed 4/24/13	80 days	80	Tue 4/30/13	Tue 8/6/13	16	25%
602	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	64 days	64	Thu 2/7/13	Wed 4/24/13	80 days	80	Tue 4/30/13	Tue 8/6/13	16	25%
603	Solaqueo de tabiques	64 days	64	Thu 2/7/13	Wed 4/24/13	80 days	80	Tue 4/30/13	Tue 8/6/13	16	25%
604	Rectificaci ³ n de cajas de válvulas	64 days	64	Thu 2/7/13	Wed 4/24/13	80 days	80	Tue 4/30/13	Tue 8/6/13	16	25%
605	Hacer sardinel de ducha	64 days	64	Fri 2/8/13	Thu 4/25/13	80 days	80	Thu 5/2/13	Wed 8/7/13	16	25%
606	Colocar z ³ calo de cerámica en baños y cocinas	64 days	64	Sat 2/9/13	Fri 4/26/13	80 days	80	Thu 5/2/13	Wed 8/7/13	16	25%
607	Enchapar piso cerámico baño y cocina	64 days	64	Mon 2/11/13	Sat 4/27/13	80 days	80	Fri 5/3/13	Thu 8/8/13	16	25%
608	Enchapar contraz ³ calo cerámico baño y cocina	64 days	64	Tue 2/12/13	Mon 4/29/13	80 days	80	Fri 5/3/13	Thu 8/8/13	16	25%
609	Instalaci ² n de baranda meta rica en terraza	64 days	64	Tue 2/12/13	Mon 4/29/13	80 days	80	Fri 5/3/13	Thu 8/8/13	16	25%
610	Enchape de terrazas	64 days	64	Wed 2/13/13	Tue 4/30/13	80 days	80	Sat 5/4/13	Fri 8/9/13	16	25%
611	Fraguar z ³ calos y pisos de cerámico en cocinas y baños	64 days	64	Thu 2/14/13	Thu 5/2/13	80 days	80	Mon 5/6/13	Sat 8/10/13	16	25%
612	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	64 days	64	Fri 2/15/13	Fri 5/3/13	80 days	80	Mon 5/6/13	Sat 8/10/13	16	25%
613	Reparación y nivelación de piso para instalación de Vinílico	64 days	64	Sat 2/16/13	Sat 5/4/13						
614	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO CD	92 days	92	Mon 2/18/13	Mon 6/10/13	98 days	98	Tue 5/7/13	Tue 9/3/13	6	7%

615	Cableado eléctrico interior / REVISION CAPATAZ	64 days	64	Mon 2/18/13	Mon 5/6/13	80 days	80	Tue 5/7/13	Mon 8/12/13	16	25%
616	ImprimaciÃ³n y empaste de muros interiores Colomural	64 days	64	Tue 2/19/13	Tue 5/7/13	80 days	80	Wed 5/8/13	Tue 8/13/13	16	25%
617	Empaste grueso techos+cocinas+baÃ±os	64 days	64	Wed 2/20/13	Wed 5/8/13	80 days	80	Thu 5/9/13	Wed 8/14/13	16	25%
618	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + baÃ±os	64 days	64	Thu 2/21/13	Thu 5/9/13	80 days	80	Fri 5/10/13	Thu 8/15/13	16	25%
619	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baÃ±os	64 days	64	Fri 2/22/13	Fri 5/10/13	80 days	80	Mon 5/13/13	Fri 8/16/13	16	25%
620	PreparaciÃ³n de techos	64 days	64	Sat 2/23/13	Mon 5/13/13	80 days	80	Tue 5/14/13	Sat 8/17/13	16	25%
621	Escarchado de techos	64 days	64	Mon 2/25/13	Tue 5/14/13	80 days	80	Tue 5/14/13	Sat 8/17/13	16	25%
622	Lijado y sellado cocinas + baÃ±os	64 days	64	Tue 2/26/13	Wed 5/15/13	80 days	80	Wed 5/15/13	Mon 8/19/13	16	25%
623	Pintura 1era. Mano cocinas + baÃ±os	64 days	64	Wed 2/27/13	Thu 5/16/13	80 days	80	Thu 5/16/13	Tue 8/20/13	16	25%
624	Instalar marcos de ventana + cristales	64 days	64	Thu 2/28/13	Fri 5/17/13	80 days	80	Fri 5/17/13	Wed 8/21/13	16	25%
625	Instalar mamparas	64 days	64	Thu 2/28/13	Fri 5/17/13	80 days	80	Fri 5/17/13	Wed 8/21/13	16	25%
626	Colocar marcos sellados y empastados	64 days	64	Thu 2/28/13	Fri 5/17/13	80 days	80	Fri 5/17/13	Wed 8/21/13	16	25%
627	Presentar puertas + hueco en chapa	64 days	64	Fri 3/1/13	Sat 5/18/13	80 days	80	Sat 5/18/13	Thu 8/22/13	16	25%
628	PresentaciÃ³n de jambas	64 days	64	Sat 3/2/13	Mon 5/20/13	80 days	80	Mon 5/20/13	Fri 8/23/13	16	25%
629	Masillar y Lijar Marcos	64 days	64	Mon 3/4/13	Tue 5/21/13	80 days	80	Mon 5/20/13	Fri 8/23/13	16	25%
630	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	64 days	64	Tue 3/5/13	Wed 5/22/13	80 days	80	Mon 5/20/13	Fri 8/23/13	16	25%
631	Instalar Muebles de Cocina	64 days	64	Wed 3/6/13	Thu 5/23/13	80 days	80	Mon 5/20/13	Fri 8/23/13	16	25%
632	RevisiÃ³n General de Acabados	64 days	64	Thu 3/7/13	Fri 5/24/13	80 days	80	Tue 5/21/13	Sat 8/24/13	16	25%
633	InstalaciÃ³n de opcionales (closets, espejos)	64 days	64	Fri 3/8/13	Sat 5/25/13	80 days	80	Tue 5/21/13	Sat 8/24/13	16	25%
634	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaciÃ³n en baÃ±os	64 days	64	Sat 3/9/13	Mon 5/27/13	80 days	80	Wed 5/22/13	Mon 8/26/13	16	25%
635	Remasillado de marcos	64 days	64	Mon 3/11/13	Tue 5/28/13	80 days	80	Wed 5/22/13	Mon 8/26/13	16	25%
636	Lijado del Masillado de Marcos	64 days	64	Tue 3/12/13	Wed 5/29/13	80 days	80	Thu 5/23/13	Tue 8/27/13	16	25%
637	Pintar 2Ãº mano marcos y hojas de puerta	64 days	64	Wed 3/13/13	Thu 5/30/13	80 days	80	Thu 5/23/13	Tue 8/27/13	16	25%
638	Colgado de puertas (principal con chapa)	64 days	64	Thu 3/14/13	Fri 5/31/13	80 days	80	Fri 5/24/13	Wed 8/28/13	16	25%
639	Instalar aparatos sanitarios + griferías	64 days	64	Fri 3/15/13	Mon 6/3/13	80 days	80	Fri 5/24/13	Wed 8/28/13	16	25%
640	Instalar placas eléctricas e intercomunicadores	64 days	64	Sat 3/16/13	Tue 6/4/13	80 days	80	Fri 5/24/13	Wed 8/28/13	16	25%
641	Macillado de Muros y techos	64 days	64	Mon 3/18/13	Wed 6/5/13	80 days	80	Sat 5/25/13	Thu 8/29/13	16	25%
642	Lijado de Muros y techos	64 days	64	Tue 3/19/13	Thu 6/6/13	80 days	80	Sat 5/25/13	Thu 8/29/13	16	25%
643	Pintar 2Ãº mano en muros y techos	64 days	64	Wed 3/20/13	Fri 6/7/13	80 days	80	Mon 5/27/13	Sat 8/31/13	16	25%
644	Limpieza gruesa de departamentos	64 days	64	Thu 3/21/13	Sat 6/8/13	80 days	80	Tue 5/28/13	Mon 9/2/13	16	25%
645	Limpieza Final para revisiÃ³n	64 days	64	Fri 3/22/13	Mon 6/10/13	80 days	80	Wed 5/29/13	Tue 9/3/13	16	25%
646	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO CD	78 days	78	Sat 3/23/13	Thu 6/27/13	91 days	91	Thu 5/30/13	Tue 9/17/13	13	17%
647	Sellado para Colowall	64 days	64	Sat 3/23/13	Tue 6/11/13	80 days	80	Thu 5/30/13	Wed 9/4/13	16	25%
648	Colocaci3n de Colowall	64 days	64	Mon 3/25/13	Wed 6/12/13	80 days	80	Fri 5/31/13	Thu 9/5/13	16	25%
649	Limpieza y lijado de piso para colocaci3n de vinílico	64 days	64	Tue 3/26/13	Thu 6/13/13						
650	Colocaci3n de Vinílico	64 days	64	Sat 3/30/13	Sat 6/15/13						
651	InstalaciÃ³n de alfombras y tapajuntas	64 days	64	Mon 4/1/13	Mon 6/17/13	80 days	80	Tue 6/4/13	Sat 9/7/13	16	25%
652	Colocaci3n de contraz3calo	64 days	64	Tue 4/2/13	Tue 6/18/13	80 days	80	Wed 6/5/13	Mon 9/9/13	16	25%
653	acabado de contraz3calo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	64 days	64	Wed 4/3/13	Wed 6/19/13	80 days	80	Thu 6/6/13	Tue 9/10/13	16	25%
654	Observaciones de inmobiliaria	64 days	64	Thu 4/4/13	Thu 6/20/13	80 days	80	Fri 6/7/13	Wed 9/11/13	16	25%
655	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dÍa 1	64 days	64	Fri 4/5/13	Fri 6/21/13	80 days	80	Sat 6/8/13	Thu 9/12/13	16	25%
656	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dÍa 2	64 days	64	Sat 4/6/13	Sat 6/22/13	80 days	80	Mon 6/10/13	Fri 9/13/13	16	25%
657	Levantamiento de observaciones inmobiliaria dÍa 3	64 days	64	Mon 4/8/13	Mon 6/24/13						
658	Limpieza final	64 days	64	Tue 4/9/13	Tue 6/25/13	80 days	80	Tue 6/11/13	Sat 9/14/13	16	25%
659	Entrega a inmobiliaria	64 days	64	Wed 4/10/13	Wed 6/26/13	80 days	80	Wed 6/12/13	Mon 9/16/13	16	25%
660	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	64 days	64	Thu 4/11/13	Thu 6/27/13	80 days	80	Thu 6/13/13	Tue 9/17/13	16	25%
661	5. FRENTE 2	333 days	333	Tue 3/27/12	Thu 5/9/13	438 days	438	Mon 3/26/12	Fri 9/13/13	105	32%
662	EDIFICIO PQO	162 days	162	Tue 3/27/12	Thu 10/11/12	166 days	166	Mon 3/26/12	Mon 10/15/12	4	2%
663	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO PQO	62 days	62	Fri 5/11/12	Wed 7/25/12	86 days	86	Mon 4/16/12	Mon 7/30/12	24	39%
664	Trazar muros	56 days	56	Fri 5/11/12	Wed 7/18/12	80 days	80	Mon 4/16/12	Sat 7/21/12	24	43%
665	Colocar acero vertical	56 days	56	Fri 5/11/12	Wed 7/18/12	80 days	80	Mon 4/16/12	Sat 7/21/12	24	43%
666	Instalaciones en muros - IISS	56 days	56	Fri 5/11/12	Wed 7/18/12	80 days	80	Mon 4/16/12	Sat 7/21/12	24	43%
667	Instalaciones en muros - IIEE	56 days	56	Fri 5/11/12	Wed 7/18/12	80 days	80	Mon 4/16/12	Sat 7/21/12	24	43%
668	Encofrado de muros	56 days	56	Mon 5/14/12	Thu 7/19/12	80 days	80	Tue 4/17/12	Mon 7/23/12	24	43%
669	Vaciado de muros	56 days	56	Mon 5/14/12	Thu 7/19/12	80 days	80	Tue 4/17/12	Mon 7/23/12	24	43%
670	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	56 days	56	Tue 5/15/12	Fri 7/20/12	80 days	80	Wed 4/18/12	Tue 7/24/12	24	43%
671	Curado y resane de muros	56 days	56	Tue 5/15/12	Fri 7/20/12	80 days	80	Wed 4/18/12	Tue 7/24/12	24	43%
672	Encofrado de losa (inc. friso)	56 days	56	Tue 5/15/12	Fri 7/20/12	80 days	80	Wed 4/18/12	Tue 7/24/12	24	43%
673	Acero de losa	56 days	56	Tue 5/15/12	Fri 7/20/12	80 days	80	Wed 4/18/12	Tue 7/24/12	24	43%
674	Armado de baterías de desagüe e inicio de pruebas	56 days	56	Tue 5/15/12	Fri 7/20/12	80 days	80	Wed 4/18/12	Tue 7/24/12	24	43%
675	Instalaciones en losa - IISS	56 days	56	Wed 5/16/12	Sat 7/21/12	80 days	80	Thu 4/19/12	Wed 7/25/12	24	43%
676	Instalaciones en losa - IIEE	56 days	56	Wed 5/16/12	Sat 7/21/12	80 days	80	Thu 4/19/12	Wed 7/25/12	24	43%
677	Vaciado de losa	56 days	56	Wed 5/16/12	Sat 7/21/12	80 days	80	Thu 4/19/12	Wed 7/25/12	24	43%
678	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	56 days	56	Thu 5/17/12	Mon 7/23/12	80 days	80	Fri 4/20/12	Thu 7/26/12	24	43%
679	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	56 days	56	Thu 5/17/12	Mon 7/23/12	80 days	80	Fri 4/20/12	Thu 7/26/12	24	43%
680	Curado de losa	56 days	56	Thu 5/17/12	Mon 7/23/12	80 days	80	Fri 4/20/12	Thu 7/26/12	24	43%
681	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	56 days	56	Thu 5/17/12	Mon 7/23/12	80 days	80	Fri 4/20/12	Thu 7/26/12	24	43%
682	Encofrado de alfeizar (8 und)	56 days	56	Fri 5/18/12	Tue 7/24/12	80 days	80	Sat 4/21/12	Fri 7/27/12	24	43%
683	Vaciado de alfeizar	56 days	56	Fri 5/18/12	Tue 7/24/12	80 days	80	Sat 4/21/12	Fri 7/27/12	24	43%

684	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	56 days	56	Sat 5/19/12	Wed 7/25/12	80 days	80	Mon 4/23/12	Mon 7/30/12	24	43%
685	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	56 days	56	Sat 5/19/12	Wed 7/25/12	80 days	80	Mon 4/23/12	Mon 7/30/12	24	43%
686	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO PQO	74 days	74	Mon 5/21/12	Fri 8/17/12	100 days	100	Tue 4/24/12	Thu 8/23/12	26	35%
687	Lijado y desbaste de placas	56 days	56	Mon 5/21/12	Thu 7/26/12	80 days	80	Tue 4/24/12	Tue 7/31/12	24	43%
688	Entrega de picado de muros y techo	56 days	56	Mon 5/21/12	Thu 7/26/12	80 days	80	Tue 4/24/12	Tue 7/31/12	24	43%
689	Entrega de pruebas de presiÃ³n de IISS y winchado de IIEE	56 days	56	Mon 5/21/12	Thu 7/26/12	80 days	80	Tue 4/24/12	Tue 7/31/12	24	43%
690	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	56 days	56	Tue 5/22/12	Fri 7/27/12	80 days	80	Wed 4/25/12	Wed 8/1/12	24	43%
691	Tarrajeo de derrames	56 days	56	Thu 5/24/12	Tue 7/31/12	80 days	80	Fri 4/27/12	Fri 8/3/12	24	43%
692	Trazo para tabiques	56 days	56	Fri 6/1/12	Wed 8/8/12	80 days	80	Thu 5/10/12	Wed 8/15/12	24	43%
693	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	56 days	56	Fri 6/1/12	Wed 8/8/12	80 days	80	Thu 5/10/12	Wed 8/15/12	24	43%
694	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	56 days	56	Fri 6/1/12	Wed 8/8/12	80 days	80	Thu 5/10/12	Wed 8/15/12	24	43%
695	Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa	56 days	56	Fri 6/1/12	Wed 8/8/12	80 days	80	Thu 5/10/12	Wed 8/15/12	24	43%
696	Levantar tabiques - La Casa	56 days	56	Mon 6/4/12	Thu 8/9/12	80 days	80	Fri 5/11/12	Thu 8/16/12	24	43%
697	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	56 days	56	Mon 6/4/12	Thu 8/9/12	80 days	80	Fri 5/11/12	Thu 8/16/12	24	43%
698	Solaqueo de tabiques	56 days	56	Mon 6/4/12	Thu 8/9/12	80 days	80	Fri 5/11/12	Thu 8/16/12	24	43%
699	RectificaciÃ³n de cajas de vÃ¡lvulas	56 days	56	Mon 6/4/12	Thu 8/9/12	80 days	80	Fri 5/11/12	Thu 8/16/12	24	43%
700	Hacer sardinel de ducha	56 days	56	Tue 6/5/12	Fri 8/10/12	80 days	80	Mon 5/14/12	Fri 8/17/12	24	43%
701	Colocar zÃ³calo de cerÃ¡mica en baÃ±os y cocinas	56 days	56	Wed 6/6/12	Sat 8/11/12	80 days	80	Tue 5/15/12	Sat 8/18/12	24	43%
702	Enchapar piso cerÃ¡mico baÃ±o y cocina	56 days	56	Wed 6/6/12	Sat 8/11/12	80 days	80	Tue 5/15/12	Sat 8/18/12	24	43%
703	Enchapar contrazÃ³calo cerÃ¡mico baÃ±o y cocina	56 days	56	Thu 6/7/12	Mon 8/13/12	80 days	80	Wed 5/16/12	Mon 8/20/12	24	43%
704	InstalaciÃ³n de baranda meta rica en terraza	56 days	56	Thu 6/7/12	Mon 8/13/12	80 days	80	Wed 5/16/12	Mon 8/20/12	24	43%
705	Enchape de terrazas	56 days	56	Fri 6/8/12	Tue 8/14/12	80 days	80	Thu 5/17/12	Tue 8/21/12	24	43%
706	Fraguar zÃ³calos y pisos de cerÃ¡mico en cocinas y baÃ±os	56 days	56	Sat 6/9/12	Wed 8/15/12	80 days	80	Fri 5/18/12	Wed 8/22/12	24	43%
707	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	56 days	56	Mon 6/11/12	Thu 8/16/12	80 days	80	Sat 5/19/12	Thu 8/23/12	24	43%
708	Capa Nivel ante	56 days	56	Tue 6/12/12	Fri 8/17/12						
709	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO PQO	86 days	86	Wed 6/13/12	Mon 9/24/12	110 days	110	Mon 5/21/12	Sat 9/29/12	24	28%
710	Cableado elÃ©ctrico interior / REVISION CAPATAZ	56 days	56	Wed 6/13/12	Sat 8/18/12	80 days	80	Mon 5/21/12	Fri 8/24/12	24	43%
711	ImprimaciÃ³n y empaste de muros interiores Colomural	56 days	56	Thu 6/14/12	Mon 8/20/12	80 days	80	Tue 5/22/12	Sat 8/25/12	24	43%
712	Empaste grueso techos+cocinas+baÃ±os	56 days	56	Fri 6/15/12	Tue 8/21/12	80 days	80	Wed 5/23/12	Mon 8/27/12	24	43%
713	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + baÃ±os	56 days	56	Sat 6/16/12	Wed 8/22/12	80 days	80	Thu 5/24/12	Tue 8/28/12	24	43%
714	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baÃ±os	56 days	56	Mon 6/18/12	Thu 8/23/12	80 days	80	Fri 5/25/12	Wed 8/29/12	24	43%
715	PreparaciÃ³n de techos	56 days	56	Tue 6/19/12	Fri 8/24/12	80 days	80	Sat 5/26/12	Fri 8/31/12	24	43%
716	Escarchado de techos	56 days	56	Wed 6/20/12	Sat 8/25/12	80 days	80	Mon 5/28/12	Sat 9/1/12	24	43%
717	Lijado y sellado cocinas + baÃ±os	56 days	56	Thu 6/21/12	Mon 8/27/12	80 days	80	Tue 5/29/12	Mon 9/3/12	24	43%
718	Pintura 1era. Mano cocinas + baÃ±os	56 days	56	Fri 6/22/12	Tue 8/28/12	80 days	80	Wed 5/30/12	Tue 9/4/12	24	43%
719	Instalar marcos de ventana + cristales	56 days	56	Sat 6/23/12	Wed 8/29/12	80 days	80	Thu 5/31/12	Wed 9/5/12	24	43%
720	Instalar mamparas	56 days	56	Mon 6/25/12	Fri 8/31/12	80 days	80	Fri 6/1/12	Thu 9/6/12	24	43%
721	Colocar marcos sellados y empastados	56 days	56	Tue 6/26/12	Sat 9/1/12	80 days	80	Mon 6/4/12	Fri 9/7/12	24	43%
722	Presentar puertas + hueco en chapa	56 days	56	Wed 6/27/12	Mon 9/3/12	80 days	80	Tue 6/5/12	Sat 9/8/12	24	43%
723	PresentaciÃ³n de jambas	56 days	56	Thu 6/28/12	Tue 9/4/12	80 days	80	Wed 6/6/12	Mon 9/10/12	24	43%
724	Masillar y Lijar Marcos	56 days	56	Sat 6/30/12	Wed 9/5/12	80 days	80	Thu 6/7/12	Tue 9/11/12	24	43%
725	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	56 days	56	Mon 7/2/12	Thu 9/6/12	80 days	80	Fri 6/8/12	Wed 9/12/12	24	43%
726	Instalar Muebles de Cocina	56 days	56	Tue 7/3/12	Fri 9/7/12	80 days	80	Sat 6/9/12	Thu 9/13/12	24	43%
727	RevisiÃ³n General de Acabados	56 days	56	Wed 7/4/12	Sat 9/8/12	80 days	80	Mon 6/11/12	Fri 9/14/12	24	43%
728	InstalaciÃ³n de opcionales (closets, espejos)	56 days	56	Thu 7/5/12	Mon 9/10/12	80 days	80	Tue 6/12/12	Sat 9/15/12	24	43%
729	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaciÃ³n en baÃ±os	56 days	56	Fri 7/6/12	Tue 9/11/12	80 days	80	Wed 6/13/12	Mon 9/17/12	24	43%
730	Remasillado de marcos	56 days	56	Sat 7/7/12	Wed 9/12/12	80 days	80	Thu 6/14/12	Tue 9/18/12	24	43%
731	Lijado del Masillado de Marcos	56 days	56	Mon 7/9/12	Thu 9/13/12	80 days	80	Fri 6/15/12	Wed 9/19/12	24	43%
732	Pintar 2Ãº mano marcos y hojas de puerta	56 days	56	Tue 7/10/12	Fri 9/14/12	80 days	80	Sat 6/16/12	Thu 9/20/12	24	43%
733	Colgado de puertas (principal con chapa)	56 days	56	Wed 7/11/12	Sat 9/15/12	80 days	80	Mon 6/18/12	Fri 9/21/12	24	43%
734	Instalar aparatos sanitarios + griferÃ­as	56 days	56	Thu 7/12/12	Mon 9/17/12	80 days	80	Tue 6/19/12	Sat 9/22/12	24	43%
735	Instalar placas elÃ©ctricas e intercomunicadores	56 days	56	Fri 7/13/12	Tue 9/18/12	80 days	80	Wed 6/20/12	Mon 9/24/12	24	43%
736	Macillado de Muros y techos	56 days	56	Sat 7/14/12	Wed 9/19/12	80 days	80	Thu 6/21/12	Tue 9/25/12	24	43%
737	Lijado de Muros y techos	56 days	56	Mon 7/16/12	Thu 9/20/12	80 days	80	Fri 6/22/12	Wed 9/26/12	24	43%
738	Pintar 2Ãº mano en muros y techos	56 days	56	Tue 7/17/12	Fri 9/21/12	80 days	80	Sat 6/23/12	Thu 9/27/12	24	43%
739	Limpieza gruesa de departamentos	56 days	56	Wed 7/18/12	Sat 9/22/12	80 days	80	Mon 6/25/12	Fri 9/28/12	24	43%
740	Limpieza Final para revisiÃ³n	56 days	56	Thu 7/19/12	Mon 9/24/12	80 days	80	Tue 6/26/12	Sat 9/29/12	24	43%
741	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO PQO	69 days	69	Fri 7/20/12	Thu 10/11/12	91 days	91	Wed 6/27/12	Mon 10/15/12	22	32%
742	Sellado para Colowall	56 days	56	Fri 7/20/12	Tue 9/25/12	80 days	80	Wed 6/27/12	Mon 10/1/12	24	43%
743	Colocaci3n de Colowall	56 days	56	Sat 7/21/12	Wed 9/26/12	80 days	80	Thu 6/28/12	Tue 10/2/12	24	43%
744	Lijado Final de Pisos	56 days	56	Mon 7/23/12	Thu 9/27/12						
745	Colocaci3n de piso vinÃ­lico	56 days	56	Tue 7/24/12	Fri 9/28/12						
746	Instalaci3n de alfombras y tapajuntas	56 days	56	Wed 7/25/12	Sat 9/29/12	80 days	80	Mon 7/2/12	Thu 10/4/12	24	43%
747	Colocaci3n de contraz3calo	56 days	56	Thu 7/26/12	Mon 10/1/12	80 days	80	Tue 7/3/12	Fri 10/5/12	24	43%
748	acabado de contraz3calo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	56 days	56	Fri 7/27/12	Tue 10/2/12	80 days	80	Wed 7/4/12	Sat 10/6/12	24	43%
749	Observaciones de inmobiliaria	56 days	56	Mon 7/30/12	Wed 10/3/12	80 days	80	Thu 7/5/12	Tue 10/9/12	24	43%
750	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dÃ­a 1	56 days	56	Tue 7/31/12	Thu 10/4/12	80 days	80	Fri 7/6/12	Wed 10/10/12	24	43%
751	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dÃ­a 2	56 days	56	Wed 8/1/12	Fri 10/5/12	80 days	80	Sat 7/7/12	Thu 10/11/12	24	43%
752	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dÃ­a 3	56 days	56	Thu 8/2/12	Sat 10/6/12						

753	Limpieza final	56 days	56	Fri 8/3/12	Tue 10/9/12	80 days	80	Mon 7/9/12	Fri 10/12/12	24	43%
754	Entrega a inmobiliaria	56 days	56	Sat 8/4/12	Wed 10/10/12	80 days	80	Tue 7/10/12	Sat 10/13/12	24	43%
755	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	56 days	56	Mon 8/6/12	Thu 10/11/12	80 days	80	Wed 7/11/12	Mon 10/15/12	24	43%
756	EDIFICIO NÃ’	189 days	189	Thu 3/29/12	Sat 11/17/12	138 days	138	Sat 6/23/12	Sat 12/8/12	-51	-27%
757	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO NÃ’	38 days	38	Thu 7/19/12	Mon 9/3/12	54 days	54	Mon 7/23/12	Tue 9/25/12	16	42%
758	Trazar muros	32 days	32	Thu 7/19/12	Sat 8/25/12	48 days	48	Mon 7/23/12	Tue 9/18/12	16	50%
759	Colocar acero vertical	32 days	32	Thu 7/19/12	Sat 8/25/12	48 days	48	Mon 7/23/12	Tue 9/18/12	16	50%
760	Instalaciones en muros - IISS	32 days	32	Thu 7/19/12	Sat 8/25/12	48 days	48	Mon 7/23/12	Tue 9/18/12	16	50%
761	Instalaciones en muros - IIEE	32 days	32	Thu 7/19/12	Sat 8/25/12	48 days	48	Mon 7/23/12	Tue 9/18/12	16	50%
762	Encofrado de muros	32 days	32	Fri 7/20/12	Mon 8/27/12	48 days	48	Tue 7/24/12	Wed 9/19/12	16	50%
763	Vaciado de muros	32 days	32	Fri 7/20/12	Mon 8/27/12	48 days	48	Tue 7/24/12	Wed 9/19/12	16	50%
764	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	32 days	32	Sat 7/21/12	Tue 8/28/12	48 days	48	Wed 7/25/12	Thu 9/20/12	16	50%
765	Curado y resane de muros	32 days	32	Sat 7/21/12	Tue 8/28/12	48 days	48	Wed 7/25/12	Thu 9/20/12	16	50%
766	Encofrado de losa (inc. friso)	32 days	32	Sat 7/21/12	Tue 8/28/12	48 days	48	Wed 7/25/12	Thu 9/20/12	16	50%
767	Acero de losa	32 days	32	Sat 7/21/12	Tue 8/28/12	48 days	48	Wed 7/25/12	Thu 9/20/12	16	50%
768	Armado de baterías de desagüe e inicio de pruebas	32 days	32	Sat 7/21/12	Tue 8/28/12	48 days	48	Wed 7/25/12	Thu 9/20/12	16	50%
769	Instalaciones en losa - IISS	32 days	32	Mon 7/23/12	Wed 8/29/12	48 days	48	Thu 7/26/12	Fri 9/21/12	16	50%
770	Instalaciones en losa - IIEE	32 days	32	Mon 7/23/12	Wed 8/29/12	48 days	48	Thu 7/26/12	Fri 9/21/12	16	50%
771	Vaciado de losa	32 days	32	Mon 7/23/12	Wed 8/29/12	48 days	48	Thu 7/26/12	Fri 9/21/12	16	50%
772	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	32 days	32	Tue 7/24/12	Fri 8/31/12	48 days	48	Fri 7/27/12	Sat 9/22/12	16	50%
773	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	32 days	32	Tue 7/24/12	Fri 8/31/12	48 days	48	Fri 7/27/12	Sat 9/22/12	16	50%
774	Curado de losa	32 days	32	Tue 7/24/12	Fri 8/31/12	48 days	48	Fri 7/27/12	Sat 9/22/12	16	50%
775	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	32 days	32	Tue 7/24/12	Fri 8/31/12	48 days	48	Fri 7/27/12	Sat 9/22/12	16	50%
776	Encofrado de alfeizar (8 und)	32 days	32	Wed 7/25/12	Sat 9/1/12	48 days	48	Mon 7/30/12	Mon 9/24/12	16	50%
777	Vaciado de alfeizar	32 days	32	Wed 7/25/12	Sat 9/1/12	48 days	48	Mon 7/30/12	Mon 9/24/12	16	50%
778	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	32 days	32	Thu 7/26/12	Mon 9/3/12	48 days	48	Tue 7/31/12	Tue 9/25/12	16	50%
779	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	32 days	32	Thu 7/26/12	Mon 9/3/12	48 days	48	Tue 7/31/12	Tue 9/25/12	16	50%
780	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO NÃ’	47 days	47	Fri 7/27/12	Fri 9/21/12	64 days	64	Wed 8/1/12	Tue 10/16/12	17	36%
781	Lijado y desbaste de placas	32 days	32	Fri 7/27/12	Tue 9/4/12	48 days	48	Wed 8/1/12	Wed 9/26/12	16	50%
782	Entrega de picado de muros y techo	32 days	32	Fri 7/27/12	Tue 9/4/12	48 days	48	Wed 8/1/12	Wed 9/26/12	16	50%
783	Entrega de pruebas de presiÃ²n de IISS y winchado de IIEE	32 days	32	Fri 7/27/12	Tue 9/4/12	48 days	48	Wed 8/1/12	Wed 9/26/12	16	50%
784	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	32 days	32	Mon 7/30/12	Wed 9/5/12	48 days	48	Thu 8/2/12	Thu 9/27/12	16	50%
785	Tarrajeo de derrames	32 days	32	Wed 8/1/12	Fri 9/7/12	48 days	48	Sat 8/4/12	Sat 9/29/12	16	50%
786	Trazo para tabiques	32 days	32	Mon 8/6/12	Wed 9/12/12	48 days	48	Sat 8/11/12	Sat 10/6/12	16	50%
787	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	32 days	32	Mon 8/6/12	Wed 9/12/12	48 days	48	Sat 8/11/12	Sat 10/6/12	16	50%
788	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	32 days	32	Mon 8/6/12	Wed 9/12/12	48 days	48	Sat 8/11/12	Sat 10/6/12	16	50%
789	Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa	32 days	32	Mon 8/6/12	Wed 9/12/12	48 days	48	Sat 8/11/12	Sat 10/6/12	16	50%
790	Levantar tabiques - La Casa	32 days	32	Tue 8/7/12	Thu 9/13/12	48 days	48	Mon 8/13/12	Tue 10/9/12	16	50%
791	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	32 days	32	Tue 8/7/12	Thu 9/13/12	48 days	48	Mon 8/13/12	Tue 10/9/12	16	50%
792	Solaqueo de tabiques	32 days	32	Tue 8/7/12	Thu 9/13/12	48 days	48	Mon 8/13/12	Tue 10/9/12	16	50%
793	RectificaciÃ³n de cajas de válvulas	32 days	32	Tue 8/7/12	Thu 9/13/12	48 days	48	Mon 8/13/12	Tue 10/9/12	16	50%
794	Hacer sardinel de ducha	32 days	32	Wed 8/8/12	Fri 9/14/12	48 days	48	Tue 8/14/12	Wed 10/10/12	16	50%
795	Colocar zÃ³calo de cerámica en baños y cocinas	32 days	32	Thu 8/9/12	Sat 9/15/12	48 days	48	Wed 8/15/12	Thu 10/11/12	16	50%
796	Enchapar piso cerámico baño y cocina	32 days	32	Thu 8/9/12	Sat 9/15/12	48 days	48	Wed 8/15/12	Thu 10/11/12	16	50%
797	Enchapar contrazÃ³calo cerámico baño y cocina	32 days	32	Fri 8/10/12	Mon 9/17/12	48 days	48	Thu 8/16/12	Fri 10/12/12	16	50%
798	InstalaciÃ²n de baranda meta rica en terraza	32 days	32	Fri 8/10/12	Mon 9/17/12	48 days	48	Thu 8/16/12	Fri 10/12/12	16	50%
799	Enchape de terrazas	32 days	32	Sat 8/11/12	Tue 9/18/12	48 days	48	Fri 8/17/12	Sat 10/13/12	16	50%
800	Fraguar zÃ³calos y pisos de cerámico en cocinas y baños	32 days	32	Mon 8/13/12	Wed 9/19/12	48 days	48	Sat 8/18/12	Mon 10/15/12	16	50%
801	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	32 days	32	Tue 8/14/12	Thu 9/20/12	48 days	48	Mon 8/20/12	Tue 10/16/12	16	50%
802	Capa Nivel ante	32 days	32	Wed 8/15/12	Fri 9/21/12						
803	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO NÃ’	62 days	62	Thu 8/16/12	Wed 10/31/12	78 days	78	Tue 8/21/12	Sat 11/24/12	16	26%
804	Cableado eléctrico interior / REVISION CAPATAZ	32 days	32	Thu 8/16/12	Sat 9/22/12	48 days	48	Tue 8/21/12	Wed 10/17/12	16	50%
805	ImprimaciÃ³n y empaste de muros interiores Colomural	32 days	32	Fri 8/17/12	Mon 9/24/12	48 days	48	Wed 8/22/12	Thu 10/18/12	16	50%
806	Empaste grueso techos+cocinas+baÃ±os	32 days	32	Sat 8/18/12	Tue 9/25/12	48 days	48	Thu 8/23/12	Fri 10/19/12	16	50%
807	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + baños	32 days	32	Mon 8/20/12	Wed 9/26/12	48 days	48	Fri 8/24/12	Sat 10/20/12	16	50%
808	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baños	32 days	32	Tue 8/21/12	Thu 9/27/12	48 days	48	Sat 8/25/12	Mon 10/22/12	16	50%
809	PreparaciÃ³n de techos	32 days	32	Wed 8/22/12	Fri 9/28/12	48 days	48	Mon 8/27/12	Tue 10/23/12	16	50%
810	Escarchado de techos	32 days	32	Thu 8/23/12	Sat 9/29/12	48 days	48	Tue 8/28/12	Fri 10/26/12	16	50%
811	Lijado y sellado cocinas + baños	32 days	32	Fri 8/24/12	Mon 10/1/12	48 days	48	Wed 8/29/12	Sat 10/27/12	16	50%
812	Pintura 1era. Mano cocinas + baños	32 days	32	Sat 8/25/12	Tue 10/2/12	48 days	48	Fri 8/31/12	Mon 10/29/12	16	50%
813	Instalar marcos de ventana + cristales	32 days	32	Mon 8/27/12	Wed 10/3/12	48 days	48	Sat 9/1/12	Tue 10/30/12	16	50%
814	Instalar mamparas	32 days	32	Tue 8/28/12	Thu 10/4/12	48 days	48	Mon 9/3/12	Wed 10/31/12	16	50%
815	Colocar marcos sellados y empastados	32 days	32	Wed 8/29/12	Fri 10/5/12	48 days	48	Tue 9/4/12	Fri 11/2/12	16	50%
816	Presentar puertas + hueco en chapa	32 days	32	Fri 8/31/12	Sat 10/6/12	48 days	48	Wed 9/5/12	Sat 11/3/12	16	50%
817	PresentaciÃ³n de jambas	32 days	32	Sat 9/1/12	Tue 10/9/12	48 days	48	Thu 9/6/12	Mon 11/5/12	16	50%
818	Masillar y Lijar Marcos	32 days	32	Mon 9/3/12	Wed 10/10/12	48 days	48	Fri 9/7/12	Tue 11/6/12	16	50%
819	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	32 days	32	Tue 9/4/12	Thu 10/11/12	48 days	48	Sat 9/8/12	Wed 11/7/12	16	50%
820	Instalar Muebles de Cocina	32 days	32	Wed 9/5/12	Fri 10/12/12	48 days	48	Mon 9/10/12	Thu 11/8/12	16	50%
821	RevisiÃ³n General de Acabados	32 days	32	Thu 9/6/12	Sat 10/13/12	48 days	48	Tue 9/11/12	Fri 11/9/12	16	50%

822	InstalaciÃ³n de opcionales (closets, espejos)	32 days	32	Fri 9/7/12	Mon 10/15/12	48 days	48	Wed 9/12/12	Sat 11/10/12	16	50%
823	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaciÃ³n en baÃ±os	32 days	32	Sat 9/8/12	Tue 10/16/12	48 days	48	Thu 9/13/12	Mon 11/12/12	16	50%
824	Remasillado de marcos	32 days	32	Mon 9/10/12	Wed 10/17/12	48 days	48	Fri 9/14/12	Tue 11/13/12	16	50%
825	Lijado del Masillado de Marcos	32 days	32	Tue 9/11/12	Thu 10/18/12	48 days	48	Sat 9/15/12	Wed 11/14/12	16	50%
826	Pintar 2Ãº mano marcos y hojas de puerta	32 days	32	Wed 9/12/12	Fri 10/19/12	48 days	48	Mon 9/17/12	Thu 11/15/12	16	50%
827	Colgado de puertas (principal con chapa)	32 days	32	Thu 9/13/12	Sat 10/20/12	48 days	48	Tue 9/18/12	Fri 11/16/12	16	50%
828	Instalar aparatos sanitarios + griferÃ­as	32 days	32	Fri 9/14/12	Mon 10/22/12	48 days	48	Wed 9/19/12	Sat 11/17/12	16	50%
829	Instalar placas elÃ©ctricas e intercomunicadores	32 days	32	Sat 9/15/12	Tue 10/23/12	48 days	48	Thu 9/20/12	Mon 11/19/12	16	50%
830	Macillado de Muros y techos	32 days	32	Mon 9/17/12	Fri 10/26/12	48 days	48	Fri 9/21/12	Tue 11/20/12	16	50%
831	Lijado de Muros y techos	32 days	32	Tue 9/18/12	Sat 10/27/12	48 days	48	Sat 9/22/12	Wed 11/21/12	16	50%
832	Pintar 2Ãº mano en muros y techos	32 days	32	Wed 9/19/12	Mon 10/29/12	48 days	48	Mon 9/24/12	Thu 11/22/12	16	50%
833	Limpieza gruesa de departamentos	32 days	32	Thu 9/20/12	Tue 10/30/12	48 days	48	Tue 9/25/12	Fri 11/23/12	16	50%
834	Limpieza Final para revisiÃ³n	32 days	32	Fri 9/21/12	Wed 10/31/12	48 days	48	Wed 9/26/12	Sat 11/24/12	16	50%
835	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO NÃ'	45 days	45	Sat 9/22/12	Sat 11/17/12	59 days	59	Thu 9/27/12	Sat 12/8/12	14	31%
836	Sellado para Colowall	32 days	32	Sat 9/22/12	Fri 11/2/12	48 days	48	Thu 9/27/12	Mon 11/26/12	16	50%
837	Colocaci3n de Colowall	32 days	32	Mon 9/24/12	Sat 11/3/12	48 days	48	Fri 9/28/12	Tue 11/27/12	16	50%
838	Lijado Final de Pisos	32 days	32	Tue 9/25/12	Mon 11/5/12						
839	Colocaci3n de vinÃ­lico	32 days	32	Wed 9/26/12	Tue 11/6/12						
840	InstalaciÃ³n de alfombras y tapajuntas	32 days	32	Thu 9/27/12	Wed 11/7/12	48 days	48	Mon 10/1/12	Thu 11/29/12	16	50%
841	Colocaci3n de contraz3calo	32 days	32	Fri 9/28/12	Thu 11/8/12	48 days	48	Tue 10/2/12	Fri 11/30/12	16	50%
842	acabado de contraz3calo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	32 days	32	Sat 9/29/12	Fri 11/9/12	48 days	48	Wed 10/3/12	Sat 12/1/12	16	50%
843	Observaciones de inmobiliaria	32 days	32	Mon 10/1/12	Sat 11/10/12	48 days	48	Thu 10/4/12	Mon 12/3/12	16	50%
844	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dÃ­a 1	32 days	32	Tue 10/2/12	Mon 11/12/12	48 days	48	Fri 10/5/12	Tue 12/4/12	16	50%
845	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dÃ­a 2	32 days	32	Wed 10/3/12	Tue 11/13/12	48 days	48	Sat 10/6/12	Wed 12/5/12	16	50%
846	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dÃ­a 3	32 days	32	Thu 10/4/12	Wed 11/14/12						
847	Limpieza final	32 days	32	Fri 10/5/12	Thu 11/15/12	48 days	48	Tue 10/9/12	Thu 12/6/12	16	50%
848	Entrega a inmobiliaria	32 days	32	Sat 10/6/12	Fri 11/16/12	48 days	48	Wed 10/10/12	Fri 12/7/12	16	50%
849	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	32 days	32	Tue 10/9/12	Sat 11/17/12	48 days	48	Thu 10/11/12	Sat 12/8/12	16	50%
850	EDIFICIO LL M	224 days	224	Sat 4/7/12	Tue 1/8/13	165 days	165	Fri 8/10/12	Wed 2/27/13	-59	-26%
851	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO LLM	46 days	46	Mon 8/27/12	Sat 10/20/12	70 days	70	Wed 9/19/12	Thu 12/13/12	24	52%
852	Trazar muros	40 days	40	Mon 8/27/12	Sat 10/13/12	64 days	64	Wed 9/19/12	Thu 12/6/12	24	60%
853	Colocar acero vertical	40 days	40	Mon 8/27/12	Sat 10/13/12	64 days	64	Wed 9/19/12	Thu 12/6/12	24	60%
854	Instalaciones en muros - IISS	40 days	40	Mon 8/27/12	Sat 10/13/12	64 days	64	Wed 9/19/12	Thu 12/6/12	24	60%
855	Instalaciones en muros - IIEE	40 days	40	Mon 8/27/12	Sat 10/13/12	64 days	64	Wed 9/19/12	Thu 12/6/12	24	60%
856	Encofrado de muros	40 days	40	Tue 8/28/12	Mon 10/15/12	64 days	64	Thu 9/20/12	Fri 12/7/12	24	60%
857	Vaciado de muros	40 days	40	Tue 8/28/12	Mon 10/15/12	64 days	64	Thu 9/20/12	Fri 12/7/12	24	60%
858	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	40 days	40	Wed 8/29/12	Tue 10/16/12	64 days	64	Fri 9/21/12	Sat 12/8/12	24	60%
859	Curado y resane de muros	40 days	40	Wed 8/29/12	Tue 10/16/12	64 days	64	Fri 9/21/12	Sat 12/8/12	24	60%
860	Encofrado de losa (inc. friso)	40 days	40	Wed 8/29/12	Tue 10/16/12	64 days	64	Fri 9/21/12	Sat 12/8/12	24	60%
861	Acero de losa	40 days	40	Wed 8/29/12	Tue 10/16/12	64 days	64	Fri 9/21/12	Sat 12/8/12	24	60%
862	Armado de baterÃ­as de desag3e e inicio de pruebas	40 days	40	Wed 8/29/12	Tue 10/16/12	64 days	64	Fri 9/21/12	Sat 12/8/12	24	60%
863	Instalaciones en losa - IISS	40 days	40	Fri 8/31/12	Wed 10/17/12	64 days	64	Sat 9/22/12	Mon 12/10/12	24	60%
864	Instalaciones en losa - IIEE	40 days	40	Fri 8/31/12	Wed 10/17/12	64 days	64	Sat 9/22/12	Mon 12/10/12	24	60%
865	Vaciado de losa	40 days	40	Fri 8/31/12	Wed 10/17/12	64 days	64	Sat 9/22/12	Mon 12/10/12	24	60%
866	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	40 days	40	Sat 9/1/12	Thu 10/18/12	64 days	64	Mon 9/24/12	Tue 12/11/12	24	60%
867	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	40 days	40	Sat 9/1/12	Thu 10/18/12	64 days	64	Mon 9/24/12	Tue 12/11/12	24	60%
868	Curado de losa	40 days	40	Sat 9/1/12	Thu 10/18/12	64 days	64	Mon 9/24/12	Tue 12/11/12	24	60%
869	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	40 days	40	Sat 9/1/12	Thu 10/18/12	64 days	64	Mon 9/24/12	Tue 12/11/12	24	60%
870	Encofrado de alfeizar (8 und)	40 days	40	Mon 9/3/12	Fri 10/19/12	64 days	64	Tue 9/25/12	Wed 12/12/12	24	60%
871	Vaciado de alfeizar	40 days	40	Mon 9/3/12	Fri 10/19/12	64 days	64	Tue 9/25/12	Wed 12/12/12	24	60%
872	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	40 days	40	Tue 9/4/12	Sat 10/20/12	64 days	64	Wed 9/26/12	Thu 12/13/12	24	60%
873	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	40 days	40	Tue 9/4/12	Sat 10/20/12	64 days	64	Wed 9/26/12	Thu 12/13/12	24	60%
874	TREN ARQUITECTURA (Acabados h3medos) EDIFICIO LLM	56 days	56	Wed 9/5/12	Tue 11/13/12	82 days	82	Thu 9/27/12	Tue 1/8/13	26	46%
875	Lijado y desbaste de placas	40 days	40	Wed 9/5/12	Mon 10/22/12	64 days	64	Thu 9/27/12	Fri 12/14/12	24	60%
876	Entrega de picado de muros y techo	40 days	40	Wed 9/5/12	Mon 10/22/12	64 days	64	Thu 9/27/12	Fri 12/14/12	24	60%
877	Entrega de pruebas de presi3n de IISS y winchado de IIEE	40 days	40	Wed 9/5/12	Mon 10/22/12	64 days	64	Thu 9/27/12	Fri 12/14/12	24	60%
878	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	40 days	40	Thu 9/6/12	Tue 10/23/12	64 days	64	Fri 9/28/12	Sat 12/15/12	24	60%
879	Tarrajeo de derrames	40 days	40	Sat 9/8/12	Sat 10/27/12	64 days	64	Mon 10/1/12	Tue 12/18/12	24	60%
880	Trazo para tabiques	40 days	40	Fri 9/14/12	Sat 11/3/12	64 days	64	Thu 10/11/12	Sat 12/29/12	24	60%
881	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	40 days	40	Fri 9/14/12	Sat 11/3/12	64 days	64	Thu 10/11/12	Sat 12/29/12	24	60%
882	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	40 days	40	Fri 9/14/12	Sat 11/3/12	64 days	64	Thu 10/11/12	Sat 12/29/12	24	60%
883	Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa	40 days	40	Fri 9/14/12	Sat 11/3/12	64 days	64	Thu 10/11/12	Sat 12/29/12	24	60%
884	Levantar tabiques - La Casa	40 days	40	Sat 9/15/12	Mon 11/5/12	64 days	64	Fri 10/12/12	Mon 12/31/12	24	60%
885	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	40 days	40	Sat 9/15/12	Mon 11/5/12	64 days	64	Fri 10/12/12	Mon 12/31/12	24	60%
886	Solaqueo de tabiques	40 days	40	Sat 9/15/12	Mon 11/5/12	64 days	64	Fri 10/12/12	Mon 12/31/12	24	60%
887	Rectificaci3n de cajas de v3lvulas	40 days	40	Sat 9/15/12	Mon 11/5/12	64 days	64	Fri 10/12/12	Mon 12/31/12	24	60%
888	Hacer sardinel de ducha	40 days	40	Mon 9/17/12	Tue 11/6/12	64 days	64	Sat 10/13/12	Wed 1/2/13	24	60%
889	Colocar z3calo de cer3mica en baÃ±os y cocinas	40 days	40	Tue 9/18/12	Wed 11/7/12	64 days	64	Mon 10/15/12	Thu 1/3/13	24	60%
890	Enchapar piso cer3mico baÃ±o y cocina	40 days	40	Tue 9/18/12	Wed 11/7/12	64 days	64	Mon 10/15/12	Thu 1/3/13	24	60%

891	Enchapar contrazÃ³calo cerÃ¡mico baÃ±o y cocina	40 days	40	Wed 9/19/12	Thu 11/8/12	64 days	64	Tue 10/16/12	Fri 1/4/13	24	60%
892	InstalaciÃ³n de baranda meta rica en terraza	40 days	40	Wed 9/19/12	Thu 11/8/12	64 days	64	Tue 10/16/12	Fri 1/4/13	24	60%
893	Enchape de terrazas	40 days	40	Thu 9/20/12	Fri 11/9/12	64 days	64	Wed 10/17/12	Sat 1/5/13	24	60%
894	Fraguar zÃ³calos y pisos de cerÃ¡mico en cocinas y baÃ±os	40 days	40	Fri 9/21/12	Sat 11/10/12	64 days	64	Thu 10/18/12	Mon 1/7/13	24	60%
895	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	40 days	40	Sat 9/22/12	Mon 11/12/12	64 days	64	Fri 10/19/12	Tue 1/8/13	24	60%
896	Capa Nivel ante	40 days	40	Mon 9/24/12	Tue 11/13/12						
897	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO LLM	70 days	70	Tue 9/25/12	Wed 12/19/12	94 days	94	Sat 10/20/12	Wed 2/13/13	24	34%
898	Cableado elÃ©ctrico interior / REVISION CAPATAZ	40 days	40	Tue 9/25/12	Wed 11/14/12	64 days	64	Sat 10/20/12	Wed 1/9/13	24	60%
899	ImprimaciÃ³n y empaste de muros interiores Colomural	40 days	40	Wed 9/26/12	Thu 11/15/12	64 days	64	Mon 10/22/12	Thu 1/10/13	24	60%
900	Empaste grueso techos+cocinas+baÃ±os	40 days	40	Thu 9/27/12	Fri 11/16/12	64 days	64	Tue 10/23/12	Fri 1/11/13	24	60%
901	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + baÃ±os	40 days	40	Fri 9/28/12	Sat 11/17/12	64 days	64	Fri 10/26/12	Sat 1/12/13	24	60%
902	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baÃ±os	40 days	40	Sat 9/29/12	Mon 11/19/12	64 days	64	Sat 10/27/12	Mon 1/14/13	24	60%
903	PreparaciÃ³n de techos	40 days	40	Mon 10/1/12	Tue 11/20/12	64 days	64	Mon 10/29/12	Tue 1/15/13	24	60%
904	Escarchado de techos	40 days	40	Tue 10/2/12	Wed 11/21/12	64 days	64	Tue 10/30/12	Wed 1/16/13	24	60%
905	Lijado y sellado cocinas + baÃ±os	40 days	40	Wed 10/3/12	Thu 11/22/12	64 days	64	Wed 10/31/12	Thu 1/17/13	24	60%
906	Pintura 1era. Mano cocinas + baÃ±os	40 days	40	Thu 10/4/12	Fri 11/23/12	64 days	64	Fri 11/2/12	Fri 1/18/13	24	60%
907	Instalar marcos de ventana + cristales	40 days	40	Fri 10/5/12	Sat 11/24/12	64 days	64	Sat 11/3/12	Sat 1/19/13	24	60%
908	Instalar mamparas	40 days	40	Sat 10/6/12	Mon 11/26/12	64 days	64	Mon 11/5/12	Mon 1/21/13	24	60%
909	Colocar marcos sellados y empastados	40 days	40	Tue 10/9/12	Tue 11/27/12	64 days	64	Tue 11/6/12	Tue 1/22/13	24	60%
910	Presentar puertas + hueco en chapa	40 days	40	Wed 10/10/12	Wed 11/28/12	64 days	64	Wed 11/7/12	Wed 1/23/13	24	60%
911	PresentaciÃ³n de jambas	40 days	40	Thu 10/11/12	Thu 11/29/12	64 days	64	Thu 11/8/12	Thu 1/24/13	24	60%
912	Masillar y Lijar Marcos	40 days	40	Fri 10/12/12	Fri 11/30/12	64 days	64	Fri 11/9/12	Fri 1/25/13	24	60%
913	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	40 days	40	Sat 10/13/12	Sat 12/1/12	64 days	64	Sat 11/10/12	Sat 1/26/13	24	60%
914	Instalar Muebles de Cocina	40 days	40	Mon 10/15/12	Mon 12/3/12	64 days	64	Mon 11/12/12	Mon 1/28/13	24	60%
915	RevisiÃ³n General de Acabados	40 days	40	Tue 10/16/12	Tue 12/4/12	64 days	64	Tue 11/13/12	Tue 1/29/13	24	60%
916	InstalaciÃ³n de opcionales (closets, espejos)	40 days	40	Wed 10/17/12	Wed 12/5/12	64 days	64	Wed 11/14/12	Wed 1/30/13	24	60%
917	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaciÃ³n en baÃ±os	40 days	40	Thu 10/18/12	Thu 12/6/12	64 days	64	Thu 11/15/12	Thu 1/31/13	24	60%
918	Remasillado de marcos	40 days	40	Fri 10/19/12	Fri 12/7/12	64 days	64	Fri 11/16/12	Fri 2/1/13	24	60%
919	Lijado del Masillado de Marcos	40 days	40	Sat 10/20/12	Sat 12/8/12	64 days	64	Sat 11/17/12	Sat 2/2/13	24	60%
920	Pintar 2Âº mano marcos y hojas de puerta	40 days	40	Mon 10/22/12	Mon 12/10/12	64 days	64	Mon 11/19/12	Mon 2/4/13	24	60%
921	Colgado de puertas (principal con chapa)	40 days	40	Tue 10/23/12	Tue 12/11/12	64 days	64	Tue 11/20/12	Tue 2/5/13	24	60%
922	Instalar aparatos sanitarios + griferÃ­as	40 days	40	Fri 10/26/12	Wed 12/12/12	64 days	64	Wed 11/21/12	Wed 2/6/13	24	60%
923	Instalar placas elÃ©ctricas e intercomunicadores	40 days	40	Sat 10/27/12	Thu 12/13/12	64 days	64	Thu 11/22/12	Thu 2/7/13	24	60%
924	Macillado de Muros y techos	40 days	40	Mon 10/29/12	Fri 12/14/12	64 days	64	Fri 11/23/12	Fri 2/8/13	24	60%
925	Lijado de Muros y techos	40 days	40	Tue 10/30/12	Sat 12/15/12	64 days	64	Sat 11/24/12	Sat 2/9/13	24	60%
926	Pintar 2Âº mano en muros y techos	40 days	40	Wed 10/31/12	Mon 12/17/12	64 days	64	Mon 11/26/12	Mon 2/11/13	24	60%
927	Limpieza gruesa de departamentos	40 days	40	Fri 11/2/12	Tue 12/18/12	64 days	64	Tue 11/27/12	Tue 2/12/13	24	60%
928	Limpieza Final para revisiÃ³n	40 days	40	Sat 11/3/12	Wed 12/19/12	64 days	64	Wed 11/28/12	Wed 2/13/13	24	60%
929	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO LLM	53 days	53	Mon 11/5/12	Tue 1/8/13	75 days	75	Thu 11/29/12	Wed 2/27/13	22	42%
930	Sellado para Colowall	40 days	40	Mon 11/5/12	Thu 12/20/12	64 days	64	Thu 11/29/12	Thu 2/14/13	24	60%
931	Colocaci3n de Colowall	40 days	40	Tue 11/6/12	Fri 12/21/12	64 days	64	Fri 11/30/12	Fri 2/15/13	24	60%
932	Lijado Final de Pisos	40 days	40	Wed 11/7/12	Sat 12/22/12						
933	Colocaci3n de vinÃ­lico	40 days	40	Thu 11/8/12	Wed 12/26/12						
934	InstalaciÃ³n de alfombras y tapajuntas	40 days	40	Fri 11/9/12	Thu 12/27/12	64 days	64	Mon 12/3/12	Mon 2/18/13	24	60%
935	Colocaci3n de contraz3calo	40 days	40	Sat 11/10/12	Fri 12/28/12	64 days	64	Tue 12/4/12	Tue 2/19/13	24	60%
936	acabado de contraz3calo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	40 days	40	Mon 11/12/12	Sat 12/29/12	64 days	64	Wed 12/5/12	Wed 2/20/13	24	60%
937	Observaciones de inmobiliaria	40 days	40	Tue 11/13/12	Mon 12/31/12	64 days	64	Thu 12/6/12	Thu 2/21/13	24	60%
938	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dÃ­a 1	40 days	40	Wed 11/14/12	Wed 1/2/13	64 days	64	Fri 12/7/12	Fri 2/22/13	24	60%
939	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dÃ­a 2	40 days	40	Thu 11/15/12	Thu 1/3/13	64 days	64	Sat 12/8/12	Sat 2/23/13	24	60%
940	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria dÃ­a 3	40 days	40	Fri 11/16/12	Fri 1/4/13						
941	Limpieza final	40 days	40	Sat 11/17/12	Sat 1/5/13	64 days	64	Mon 12/10/12	Mon 2/25/13	24	60%
942	Entrega a inmobiliaria	40 days	40	Mon 11/19/12	Mon 1/7/13	64 days	64	Tue 12/11/12	Tue 2/26/13	24	60%
943	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	40 days	40	Tue 11/20/12	Tue 1/8/13	64 days	64	Wed 12/12/12	Wed 2/27/13	24	60%
944	EDIFICIO XYZ	250 days	250	Fri 4/13/12	Wed 2/13/13	147 days	147	Mon 11/5/12	Tue 4/30/13	-103	-41%
945	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO XYZ	36 days	36	Mon 10/15/12	Wed 11/28/12	56 days	56	Fri 12/7/12	Wed 2/13/13	20	56%
946	Trazar muros	30 days	30	Mon 10/15/12	Wed 11/21/12	50 days	50	Fri 12/7/12	Wed 2/6/13	20	67%
947	Colocar acero vertical	30 days	30	Mon 10/15/12	Wed 11/21/12	51 days	51	Fri 12/7/12	Thu 2/7/13	21	70%
948	Instalaciones en muros - IISS	30 days	30	Mon 10/15/12	Wed 11/21/12	50 days	50	Fri 12/7/12	Wed 2/6/13	20	67%
949	Instalaciones en muros - IIEE	30 days	30	Mon 10/15/12	Wed 11/21/12	50 days	50	Fri 12/7/12	Wed 2/6/13	20	67%
950	Encofrado de muros	30 days	30	Tue 10/16/12	Thu 11/22/12	50 days	50	Sat 12/8/12	Thu 2/7/13	20	67%
951	Vaciado de muros	30 days	30	Tue 10/16/12	Thu 11/22/12	50 days	50	Sat 12/8/12	Thu 2/7/13	20	67%
952	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	30 days	30	Wed 10/17/12	Fri 11/23/12	50 days	50	Mon 12/10/12	Fri 2/8/13	20	67%
953	Curado y resane de muros	30 days	30	Wed 10/17/12	Fri 11/23/12	50 days	50	Mon 12/10/12	Fri 2/8/13	20	67%
954	Encofrado de losa (inc. friso)	30 days	30	Wed 10/17/12	Fri 11/23/12	50 days	50	Mon 12/10/12	Fri 2/8/13	20	67%
955	Acero de losa	30 days	30	Wed 10/17/12	Fri 11/23/12	50 days	50	Mon 12/10/12	Fri 2/8/13	20	67%
956	Armado de baterÃ­as de desagÃ¼e e inicio de pruebas	30 days	30	Wed 10/17/12	Fri 11/23/12	50 days	50	Mon 12/10/12	Fri 2/8/13	20	67%
957	Instalaciones en losa - IISS	30 days	30	Thu 10/18/12	Sat 11/24/12	50 days	50	Tue 12/11/12	Sat 2/9/13	20	67%
958	Instalaciones en losa - IIEE	30 days	30	Thu 10/18/12	Sat 11/24/12	50 days	50	Tue 12/11/12	Sat 2/9/13	20	67%
959	Vaciado de losa	30 days	30	Thu 10/18/12	Sat 11/24/12	50 days	50	Tue 12/11/12	Sat 2/9/13	20	67%

960	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	30 days	30	Fri 10/19/12	Mon 11/26/12	50 days	50	Wed 12/12/12	Mon 2/11/13	20	67%
961	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	30 days	30	Fri 10/19/12	Mon 11/26/12	50 days	50	Wed 12/12/12	Mon 2/11/13	20	67%
962	Curado de losa	30 days	30	Fri 10/19/12	Mon 11/26/12	50 days	50	Wed 12/12/12	Mon 2/11/13	20	67%
963	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	30 days	30	Fri 10/19/12	Mon 11/26/12	50 days	50	Wed 12/12/12	Mon 2/11/13	20	67%
964	Encofrado de alfeizar (8 und)	30 days	30	Sat 10/20/12	Tue 11/27/12	50 days	50	Thu 12/13/12	Tue 2/12/13	20	67%
965	Vaciado de alfeizar	30 days	30	Sat 10/20/12	Tue 11/27/12	50 days	50	Thu 12/13/12	Tue 2/12/13	20	67%
966	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	30 days	30	Mon 10/22/12	Wed 11/28/12	50 days	50	Fri 12/14/12	Wed 2/13/13	20	67%
967	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	30 days	30	Mon 10/22/12	Wed 11/28/12	50 days	50	Fri 12/14/12	Wed 2/13/13	20	67%
968	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO XYZ	47 days	47	Tue 10/23/12	Wed 12/19/12	69 days	69	Sat 12/15/12	Fri 3/8/13	22	47%
969	Lijado y desbaste de placas	30 days	30	Tue 10/23/12	Thu 11/29/12	50 days	50	Sat 12/15/12	Thu 2/14/13	20	67%
970	Entrega de picado de muros y techo	30 days	30	Tue 10/23/12	Thu 11/29/12	50 days	50	Sat 12/15/12	Thu 2/14/13	20	67%
971	Entrega de pruebas de presiÃ³n de IISS y winchado de IIEE	30 days	30	Tue 10/23/12	Thu 11/29/12	50 days	50	Sat 12/15/12	Thu 2/14/13	20	67%
972	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	30 days	30	Fri 10/26/12	Fri 11/30/12	50 days	50	Mon 12/17/12	Fri 2/15/13	20	67%
973	Tarrajeo de derrames	30 days	30	Mon 10/29/12	Mon 12/3/12	50 days	50	Tue 12/18/12	Sat 2/16/13	20	67%
974	Trazo para tabiques	30 days	30	Tue 11/6/12	Mon 12/10/12	50 days	50	Wed 1/2/13	Thu 2/28/13	20	67%
975	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	30 days	30	Tue 11/6/12	Mon 12/10/12	50 days	50	Wed 1/2/13	Thu 2/28/13	20	67%
976	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	30 days	30	Tue 11/6/12	Mon 12/10/12	50 days	50	Wed 1/2/13	Thu 2/28/13	20	67%
977	Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa	30 days	30	Tue 11/6/12	Mon 12/10/12	50 days	50	Wed 1/2/13	Thu 2/28/13	20	67%
978	Levantar tabiques - La Casa	30 days	30	Wed 11/7/12	Tue 12/11/12	50 days	50	Thu 1/3/13	Fri 3/1/13	20	67%
979	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	30 days	30	Wed 11/7/12	Tue 12/11/12	50 days	50	Thu 1/3/13	Fri 3/1/13	20	67%
980	Solaqueo de tabiques	30 days	30	Wed 11/7/12	Tue 12/11/12	50 days	50	Thu 1/3/13	Fri 3/1/13	20	67%
981	RectificaciÃ³n de cajas de vÃ¡lvulas	30 days	30	Wed 11/7/12	Tue 12/11/12	50 days	50	Thu 1/3/13	Fri 3/1/13	20	67%
982	Hacer sardinel de ducha	30 days	30	Thu 11/8/12	Wed 12/12/12	50 days	50	Fri 1/4/13	Sat 3/2/13	20	67%
983	Colocar zÃ³calo de cerÃ¡mica en baÃ±os y cocinas	30 days	30	Fri 11/9/12	Thu 12/13/12	50 days	50	Sat 1/5/13	Mon 3/4/13	20	67%
984	Enchapar piso cerÃ¡mico baÃ±o y cocina	30 days	30	Fri 11/9/12	Thu 12/13/12	50 days	50	Sat 1/5/13	Mon 3/4/13	20	67%
985	Enchapar contrazÃ³calo cerÃ¡mico baÃ±o y cocina	30 days	30	Sat 11/10/12	Fri 12/14/12	50 days	50	Mon 1/7/13	Tue 3/5/13	20	67%
986	InstalaciÃ³n de baranda meta rica en terraza	30 days	30	Sat 11/10/12	Fri 12/14/12	50 days	50	Mon 1/7/13	Tue 3/5/13	20	67%
987	Enchape de terrazas	30 days	30	Mon 11/12/12	Sat 12/15/12	50 days	50	Tue 1/8/13	Wed 3/6/13	20	67%
988	Fraguar zÃ³calos y pisos de cerÃ¡mico en cocinas y baÃ±os	30 days	30	Tue 11/13/12	Mon 12/17/12	50 days	50	Wed 1/9/13	Thu 3/7/13	20	67%
989	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	30 days	30	Wed 11/14/12	Tue 12/18/12	50 days	50	Thu 1/10/13	Fri 3/8/13	20	67%
990	Capa Nivel ante	30 days	30	Thu 11/15/12	Wed 12/19/12						
991	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO XYZ	60 days	60	Fri 11/16/12	Mon 1/28/13	80 days	80	Fri 1/11/13	Tue 4/16/13	20	33%
992	Cableado elÃ©ctrico interior / REVISION CAPATAZ	30 days	30	Fri 11/16/12	Thu 12/20/12	50 days	50	Fri 1/11/13	Sat 3/9/13	20	67%
993	ImprimaciÃ³n y empaste de muros interiores Colomural	30 days	30	Sat 11/17/12	Fri 12/21/12	50 days	50	Sat 1/12/13	Mon 3/11/13	20	67%
994	Empaste grueso techos+cocinas+baÃ±os	30 days	30	Mon 11/19/12	Sat 12/22/12	50 days	50	Mon 1/14/13	Tue 3/12/13	20	67%
995	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + baÃ±os	30 days	30	Tue 11/20/12	Wed 12/26/12	50 days	50	Tue 1/15/13	Wed 3/13/13	20	67%
996	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baÃ±os	30 days	30	Wed 11/21/12	Thu 12/27/12	50 days	50	Wed 1/16/13	Thu 3/14/13	20	67%
997	PreparaciÃ³n de techos	30 days	30	Thu 11/22/12	Fri 12/28/12	50 days	50	Thu 1/17/13	Fri 3/15/13	20	67%
998	Escarchado de techos	30 days	30	Fri 11/23/12	Sat 12/29/12	50 days	50	Fri 1/18/13	Sat 3/16/13	20	67%
999	Lijado y sellado cocinas + baÃ±os	30 days	30	Sat 11/24/12	Mon 12/31/12	50 days	50	Sat 1/19/13	Mon 3/18/13	20	67%
1000	Pintura 1era. Mano cocinas + baÃ±os	30 days	30	Mon 11/26/12	Wed 1/2/13	50 days	50	Mon 1/21/13	Tue 3/19/13	20	67%
1001	Instalar marcos de ventana + cristales	30 days	30	Tue 11/27/12	Thu 1/3/13	50 days	50	Tue 1/22/13	Wed 3/20/13	20	67%
1002	Instalar mamparas	30 days	30	Wed 11/28/12	Fri 1/4/13	50 days	50	Wed 1/23/13	Thu 3/21/13	20	67%
1003	Colocar marcos sellados y empastados	30 days	30	Thu 11/29/12	Sat 1/5/13	50 days	50	Thu 1/24/13	Fri 3/22/13	20	67%
1004	Presentar puertas + hueco en chapa	30 days	30	Fri 11/30/12	Mon 1/7/13	50 days	50	Fri 1/25/13	Sat 3/23/13	20	67%
1005	PresentaciÃ³n de jambas	30 days	30	Sat 12/1/12	Tue 1/8/13	50 days	50	Sat 1/26/13	Mon 3/25/13	20	67%
1006	Masillar y Lijar Marcos	30 days	30	Mon 12/3/12	Wed 1/9/13	50 days	50	Mon 1/28/13	Tue 3/26/13	20	67%
1007	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	30 days	30	Tue 12/4/12	Thu 1/10/13	50 days	50	Tue 1/29/13	Wed 3/27/13	20	67%
1008	Instalar Muebles de Cocina	30 days	30	Wed 12/5/12	Fri 1/11/13	50 days	50	Wed 1/30/13	Sat 3/30/13	20	67%
1009	RevisiÃ³n General de Acabados	30 days	30	Thu 12/6/12	Sat 1/12/13	50 days	50	Thu 1/31/13	Mon 4/1/13	20	67%
1010	InstalaciÃ³n de opcionales (closets, espejos)	30 days	30	Fri 12/7/12	Mon 1/14/13	50 days	50	Fri 2/1/13	Tue 4/2/13	20	67%
1011	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaciÃ³n en baÃ±os	30 days	30	Sat 12/8/12	Tue 1/15/13	50 days	50	Sat 2/2/13	Wed 4/3/13	20	67%
1012	Remasillado de marcos	30 days	30	Mon 12/10/12	Wed 1/16/13	50 days	50	Mon 2/4/13	Thu 4/4/13	20	67%
1013	Lijado del Masillado de Marcos	30 days	30	Tue 12/11/12	Thu 1/17/13	50 days	50	Tue 2/5/13	Fri 4/5/13	20	67%
1014	Pintar 2Ãº mano marcos y hojas de puerta	30 days	30	Wed 12/12/12	Fri 1/18/13	50 days	50	Wed 2/6/13	Sat 4/6/13	20	67%
1015	Colgado de puertas (principal con chapa)	30 days	30	Thu 12/13/12	Sat 1/19/13	50 days	50	Thu 2/7/13	Mon 4/8/13	20	67%
1016	Instalar aparatos sanitarios + griferÃ­as	30 days	30	Fri 12/14/12	Mon 1/21/13	50 days	50	Fri 2/8/13	Tue 4/9/13	20	67%
1017	Instalar placas elÃ©ctricas e intercomunicadores	30 days	30	Sat 12/15/12	Tue 1/22/13	50 days	50	Sat 2/9/13	Wed 4/10/13	20	67%
1018	Macillado de Muros y techos	30 days	30	Mon 12/17/12	Wed 1/23/13	50 days	50	Mon 2/11/13	Thu 4/11/13	20	67%
1019	Lijado de Muros y techos	30 days	30	Tue 12/18/12	Thu 1/24/13	50 days	50	Tue 2/12/13	Fri 4/12/13	20	67%
1020	Pintar 2Ãº mano en muros y techos	30 days	30	Wed 12/19/12	Fri 1/25/13	50 days	50	Wed 2/13/13	Sat 4/13/13	20	67%
1021	Limpieza gruesa de departamentos	30 days	30	Thu 12/20/12	Sat 1/26/13	50 days	50	Thu 2/14/13	Mon 4/15/13	20	67%
1022	Limpieza Final para revisiÃ³n	30 days	30	Fri 12/21/12	Mon 1/28/13	50 days	50	Fri 2/15/13	Tue 4/16/13	20	67%
1023	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO XYZ	43 days	43	Sat 12/22/12	Wed 2/13/13	61 days	61	Sat 2/16/13	Tue 4/30/13	18	42%
1024	Sellado para Colowall	30 days	30	Sat 12/22/12	Tue 1/29/13	50 days	50	Sat 2/16/13	Wed 4/17/13	20	67%
1025	Colocaci3n de Colowall	30 days	30	Wed 12/26/12	Wed 1/30/13	50 days	50	Mon 2/18/13	Thu 4/18/13	20	67%
1026	Lijado Final de Pisos	30 days	30	Thu 12/27/12	Thu 1/31/13						
1027	Colocaci3n de vinÃ­lico	30 days	30	Fri 12/28/12	Fri 2/1/13						
1028	InstalaciÃ³n de alfombras y tapajuntas	30 days	30	Sat 12/29/12	Sat 2/2/13	50 days	50	Wed 2/20/13	Sat 4/20/13	20	67%

1029	Colocación de contrazócalo	30 days	30	Mon 12/31/12	Mon 2/4/13	50 days	50	Thu 2/21/13	Mon 4/22/13	20	67%
1030	acabado de contrazócalo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	30 days	30	Wed 1/2/13	Tue 2/5/13	50 days	50	Fri 2/22/13	Tue 4/23/13	20	67%
1031	Observaciones de inmobiliaria	30 days	30	Thu 1/3/13	Wed 2/6/13	50 days	50	Sat 2/23/13	Wed 4/24/13	20	67%
1032	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 1	30 days	30	Fri 1/4/13	Thu 2/7/13	50 days	50	Mon 2/25/13	Thu 4/25/13	20	67%
1033	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 2	30 days	30	Sat 1/5/13	Fri 2/8/13	50 days	50	Tue 2/26/13	Fri 4/26/13	20	67%
1034	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 3	30 days	30	Mon 1/7/13	Sat 2/9/13						
1035	Limpieza final	30 days	30	Tue 1/8/13	Mon 2/11/13	50 days	50	Wed 2/27/13	Sat 4/27/13	20	67%
1036	Entrega a inmobiliaria	30 days	30	Wed 1/9/13	Tue 2/12/13	50 days	50	Thu 2/28/13	Mon 4/29/13	20	67%
1037	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	30 days	30	Thu 1/10/13	Wed 2/13/13	50 days	50	Fri 3/1/13	Tue 4/30/13	20	67%
1038	EDIFICIO KL	251 days	251	Sat 5/19/12	Wed 3/20/13	146 days	146	Sat 1/5/13	Mon 7/1/13	-105	-42%
1039	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO KL	39 days	39	Thu 11/22/12	Wed 1/9/13	54 days	54	Thu 2/7/13	Fri 4/12/13	15	38%
1040	Trazar muros	32 days	32	Thu 11/22/12	Mon 12/31/12	48 days	48	Thu 2/7/13	Fri 4/5/13	16	50%
1041	Colocar acero vertical	32 days	32	Thu 11/22/12	Mon 12/31/12	48 days	48	Thu 2/7/13	Fri 4/5/13	16	50%
1042	Instalaciones en muros - IISS	32 days	32	Thu 11/22/12	Mon 12/31/12	48 days	48	Thu 2/7/13	Fri 4/5/13	16	50%
1043	Instalaciones en muros - IIEE	32 days	32	Thu 11/22/12	Mon 12/31/12	48 days	48	Thu 2/7/13	Fri 4/5/13	16	50%
1044	Encofrado de muros	32 days	32	Fri 11/23/12	Wed 1/2/13	48 days	48	Fri 2/8/13	Sat 4/6/13	16	50%
1045	Vaciado de muros	32 days	32	Fri 11/23/12	Wed 1/2/13	48 days	48	Fri 2/8/13	Sat 4/6/13	16	50%
1046	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	32 days	32	Sat 11/24/12	Thu 1/3/13	48 days	48	Sat 2/9/13	Mon 4/8/13	16	50%
1047	Curado y resane de muros	32 days	32	Sat 11/24/12	Thu 1/3/13	48 days	48	Sat 2/9/13	Mon 4/8/13	16	50%
1048	Encofrado de losa (inc. friso)	32 days	32	Sat 11/24/12	Thu 1/3/13	48 days	48	Sat 2/9/13	Mon 4/8/13	16	50%
1049	Acero de losa	32 days	32	Sat 11/24/12	Thu 1/3/13	48 days	48	Sat 2/9/13	Mon 4/8/13	16	50%
1050	Armado de baterías de desagüe e inicio de pruebas	32 days	32	Mon 11/26/12	Fri 1/4/13	48 days	48	Sat 2/9/13	Mon 4/8/13	16	50%
1051	Instalaciones en losa - IISS	32 days	32	Tue 11/27/12	Sat 1/5/13	48 days	48	Mon 2/11/13	Tue 4/9/13	16	50%
1052	Instalaciones en losa - IIEE	32 days	32	Tue 11/27/12	Sat 1/5/13	48 days	48	Mon 2/11/13	Tue 4/9/13	16	50%
1053	Vaciado de losa	32 days	32	Tue 11/27/12	Sat 1/5/13	48 days	48	Mon 2/11/13	Tue 4/9/13	16	50%
1054	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	32 days	32	Wed 11/28/12	Mon 1/7/13	48 days	48	Tue 2/12/13	Wed 4/10/13	16	50%
1055	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	32 days	32	Wed 11/28/12	Mon 1/7/13	48 days	48	Tue 2/12/13	Wed 4/10/13	16	50%
1056	Curado de losa	32 days	32	Wed 11/28/12	Mon 1/7/13	48 days	48	Tue 2/12/13	Wed 4/10/13	16	50%
1057	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	32 days	32	Wed 11/28/12	Mon 1/7/13	48 days	48	Tue 2/12/13	Wed 4/10/13	16	50%
1058	Encofrado de alfeizar (8 und)	32 days	32	Thu 11/29/12	Tue 1/8/13	48 days	48	Wed 2/13/13	Thu 4/11/13	16	50%
1059	Vaciado de alfeizar	32 days	32	Thu 11/29/12	Tue 1/8/13	48 days	48	Wed 2/13/13	Thu 4/11/13	16	50%
1060	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	32 days	32	Fri 11/30/12	Wed 1/9/13	48 days	48	Thu 2/14/13	Fri 4/12/13	16	50%
1061	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	32 days	32	Fri 11/30/12	Wed 1/9/13	48 days	48	Thu 2/14/13	Fri 4/12/13	16	50%
1062	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO KL	46 days	46	Sat 12/1/12	Sat 1/26/13	68 days	68	Fri 2/15/13	Wed 5/8/13	22	48%
1063	Lijado y desbaste de placas	32 days	32	Sat 12/1/12	Thu 1/10/13	48 days	48	Fri 2/15/13	Sat 4/13/13	16	50%
1064	Entrega de picado de muros y techo	32 days	32	Sat 12/1/12	Thu 1/10/13	48 days	48	Fri 2/15/13	Sat 4/13/13	16	50%
1065	Entrega de pruebas de presión de IISS y winchado de IIEE	32 days	32	Sat 12/1/12	Thu 1/10/13	48 days	48	Fri 2/15/13	Sat 4/13/13	16	50%
1066	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	32 days	32	Sat 12/1/12	Thu 1/10/13	48 days	48	Sat 2/16/13	Mon 4/15/13	16	50%
1067	Tarrajeo de derrames	32 days	32	Tue 12/4/12	Sat 1/12/13	48 days	48	Wed 2/20/13	Thu 4/18/13	16	50%
1068	Trazo para tabiques	32 days	32	Sat 12/8/12	Thu 1/17/13	48 days	48	Fri 3/1/13	Sat 4/27/13	16	50%
1069	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	32 days	32	Sat 12/8/12	Thu 1/17/13	48 days	48	Fri 3/1/13	Sat 4/27/13	16	50%
1070	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	32 days	32	Sat 12/8/12	Thu 1/17/13	48 days	48	Fri 3/1/13	Sat 4/27/13	16	50%
1071	Anclajes y emplentillado para tabiques - La Casa	32 days	32	Sat 12/8/12	Thu 1/17/13	48 days	48	Fri 3/1/13	Sat 4/27/13	16	50%
1072	Levantar tabiques - La Casa	32 days	32	Mon 12/10/12	Fri 1/18/13	48 days	48	Sat 3/2/13	Mon 4/29/13	16	50%
1073	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	32 days	32	Mon 12/10/12	Fri 1/18/13	48 days	48	Sat 3/2/13	Mon 4/29/13	16	50%
1074	Solaqueo de tabiques	32 days	32	Mon 12/10/12	Fri 1/18/13	48 days	48	Sat 3/2/13	Mon 4/29/13	16	50%
1075	Rectificación de cajas de válvulas	32 days	32	Mon 12/10/12	Fri 1/18/13	48 days	48	Sat 3/2/13	Mon 4/29/13	16	50%
1076	Hacer sardinel de ducha	32 days	32	Tue 12/11/12	Sat 1/19/13	48 days	48	Mon 3/4/13	Tue 4/30/13	16	50%
1077	Colocar zócalo de cerámica en baños y cocinas	32 days	32	Wed 12/12/12	Mon 1/21/13	48 days	48	Tue 3/5/13	Thu 5/2/13	16	50%
1078	Enchapar piso cerámico baño y cocina	32 days	32	Wed 12/12/12	Mon 1/21/13	48 days	48	Wed 3/6/13	Fri 5/3/13	16	50%
1079	Enchapar contrazócalo cerámico baño y cocina	32 days	32	Thu 12/13/12	Tue 1/22/13	48 days	48	Thu 3/7/13	Sat 5/4/13	16	50%
1080	Instalación de baranda meta rica en terraza	32 days	32	Thu 12/13/12	Tue 1/22/13	48 days	48	Thu 3/7/13	Sat 5/4/13	16	50%
1081	Enchape de terrazas	32 days	32	Fri 12/14/12	Wed 1/23/13	48 days	48	Fri 3/8/13	Mon 5/6/13	16	50%
1082	Fraguar zócalos y pisos de cerámico en cocinas y baños	32 days	32	Sat 12/15/12	Thu 1/24/13	48 days	48	Sat 3/9/13	Tue 5/7/13	16	50%
1083	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	32 days	32	Mon 12/17/12	Fri 1/25/13	48 days	48	Mon 3/11/13	Wed 5/8/13	16	50%
1084	Capa Nivel ante	32 days	32	Tue 12/18/12	Sat 1/26/13						
1085	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO KL	62 days	62	Wed 12/19/12	Mon 3/4/13	78 days	78	Tue 3/12/13	Sat 6/15/13	16	26%
1086	Cableado eléctrico interior / REVISION CAPATAZ	32 days	32	Wed 12/19/12	Mon 1/28/13	48 days	48	Tue 3/12/13	Thu 5/9/13	16	50%
1087	Imprimación y empaste de muros interiores Colomural	32 days	32	Thu 12/20/12	Tue 1/29/13	48 days	48	Wed 3/13/13	Fri 5/10/13	16	50%
1088	Empaste grueso techos+cocinas+baños	32 days	32	Fri 12/21/12	Wed 1/30/13	48 days	48	Thu 3/14/13	Mon 5/13/13	16	50%
1089	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + baños	32 days	32	Sat 12/22/12	Thu 1/31/13	48 days	48	Fri 3/15/13	Tue 5/14/13	16	50%
1090	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baños	32 days	32	Wed 12/26/12	Fri 2/1/13	48 days	48	Sat 3/16/13	Wed 5/15/13	16	50%
1091	Preparación de techos	32 days	32	Thu 12/27/12	Sat 2/2/13	48 days	48	Mon 3/18/13	Thu 5/16/13	16	50%
1092	Escarchado de techos	32 days	32	Fri 12/28/12	Mon 2/4/13	48 days	48	Tue 3/19/13	Fri 5/17/13	16	50%
1093	Lijado y sellado cocinas + baños	32 days	32	Sat 12/29/12	Tue 2/5/13	48 days	48	Wed 3/20/13	Sat 5/18/13	16	50%
1094	Pintura 1era. Mano cocinas + baños	32 days	32	Mon 12/31/12	Wed 2/6/13	48 days	48	Thu 3/21/13	Mon 5/20/13	16	50%
1095	Instalar marcos de ventana + cristales	32 days	32	Wed 1/2/13	Thu 2/7/13	48 days	48	Fri 3/22/13	Tue 5/21/13	16	50%
1096	Instalar mamparas	32 days	32	Thu 1/3/13	Fri 2/8/13	48 days	48	Sat 3/23/13	Wed 5/22/13	16	50%
1097	Colocar marcos sellados y empastados	32 days	32	Fri 1/4/13	Sat 2/9/13	48 days	48	Mon 3/25/13	Thu 5/23/13	16	50%

1098	Presentar puertas + hueco en chapa	32 days	32	Sat 1/5/13	Mon 2/11/13	48 days	48	Tue 3/26/13	Fri 5/24/13	16	50%
1099	PresentaciÃ³n de jambas	32 days	32	Mon 1/7/13	Tue 2/12/13	48 days	48	Wed 3/27/13	Sat 5/25/13	16	50%
1100	Masillar y Lijar Marcos	32 days	32	Tue 1/8/13	Wed 2/13/13	48 days	48	Sat 3/30/13	Mon 5/27/13	16	50%
1101	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	32 days	32	Wed 1/9/13	Thu 2/14/13	48 days	48	Mon 4/1/13	Tue 5/28/13	16	50%
1102	Instalar Muebles de Cocina	32 days	32	Thu 1/10/13	Fri 2/15/13	48 days	48	Tue 4/2/13	Wed 5/29/13	16	50%
1103	RevisiÃ³n General de Acabados	32 days	32	Fri 1/11/13	Sat 2/16/13	48 days	48	Wed 4/3/13	Thu 5/30/13	16	50%
1104	InstalaciÃ³n de opcionales (closets, espejos)	32 days	32	Sat 1/12/13	Mon 2/18/13	48 days	48	Thu 4/4/13	Fri 5/31/13	16	50%
1105	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaciÃ³n en baÃ±os	32 days	32	Mon 1/14/13	Tue 2/19/13	48 days	48	Fri 4/5/13	Mon 6/3/13	16	50%
1106	Remasillado de marcos	32 days	32	Tue 1/15/13	Wed 2/20/13	48 days	48	Sat 4/6/13	Tue 6/4/13	16	50%
1107	Lijado del Masillado de Marcos	32 days	32	Wed 1/16/13	Thu 2/21/13	48 days	48	Mon 4/8/13	Wed 6/5/13	16	50%
1108	Pintar 2Âº mano marcos y hojas de puerta	32 days	32	Thu 1/17/13	Fri 2/22/13	48 days	48	Tue 4/9/13	Thu 6/6/13	16	50%
1109	Colgado de puertas (principal con chapa)	32 days	32	Fri 1/18/13	Sat 2/23/13	48 days	48	Wed 4/10/13	Fri 6/7/13	16	50%
1110	Instalar aparatos sanitarios + griferías	32 days	32	Sat 1/19/13	Mon 2/25/13	48 days	48	Thu 4/11/13	Sat 6/8/13	16	50%
1111	Instalar placas eléctricas e intercomunicadores	32 days	32	Mon 1/21/13	Tue 2/26/13	48 days	48	Fri 4/12/13	Mon 6/10/13	16	50%
1112	Macillado de Muros y techos	32 days	32	Tue 1/22/13	Wed 2/27/13	48 days	48	Sat 4/13/13	Tue 6/11/13	16	50%
1113	Lijado de Muros y techos	32 days	32	Wed 1/23/13	Thu 2/28/13	48 days	48	Mon 4/15/13	Wed 6/12/13	16	50%
1114	Pintar 2Âº mano en muros y techos	32 days	32	Thu 1/24/13	Fri 3/1/13	48 days	48	Tue 4/16/13	Thu 6/13/13	16	50%
1115	Limpieza gruesa de departamentos	32 days	32	Fri 1/25/13	Sat 3/2/13	48 days	48	Wed 4/17/13	Fri 6/14/13	16	50%
1116	Limpieza Final para revisiÃ³n	32 days	32	Sat 1/26/13	Mon 3/4/13	48 days	48	Thu 4/18/13	Sat 6/15/13	16	50%
1117	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO KL	45 days	45	Mon 1/28/13	Wed 3/20/13	59 days	59	Fri 4/19/13	Mon 7/1/13	14	31%
1118	Sellado para Colowall	32 days	32	Mon 1/28/13	Tue 3/5/13	48 days	48	Fri 4/19/13	Mon 6/17/13	16	50%
1119	Colocaci3n de Colowall	32 days	32	Tue 1/29/13	Wed 3/6/13	48 days	48	Sat 4/20/13	Tue 6/18/13	16	50%
1120	Lijado Final de Pisos	32 days	32	Wed 1/30/13	Thu 3/7/13						
1121	Colocaci3n de vinílico	32 days	32	Thu 1/31/13	Fri 3/8/13						
1122	InstalaciÃ³n de alfombras y tapajuntas	32 days	32	Fri 2/1/13	Sat 3/9/13	48 days	48	Tue 4/23/13	Thu 6/20/13	16	50%
1123	Colocaci3n de contraz3calo	32 days	32	Sat 2/2/13	Mon 3/11/13	48 days	48	Wed 4/24/13	Fri 6/21/13	16	50%
1124	acabado de contraz3calo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	32 days	32	Mon 2/4/13	Tue 3/12/13	48 days	48	Thu 4/25/13	Sat 6/22/13	16	50%
1125	Observaciones de inmobiliaria	32 days	32	Tue 2/5/13	Wed 3/13/13	48 days	48	Fri 4/26/13	Mon 6/24/13	16	50%
1126	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria d3a 1	32 days	32	Wed 2/6/13	Thu 3/14/13	48 days	48	Sat 4/27/13	Tue 6/25/13	16	50%
1127	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria d3a 2	32 days	32	Thu 2/7/13	Fri 3/15/13	48 days	48	Mon 4/29/13	Wed 6/26/13	16	50%
1128	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria d3a 3	32 days	32	Fri 2/8/13	Sat 3/16/13						
1129	Limpieza final	32 days	32	Sat 2/9/13	Mon 3/18/13	48 days	48	Tue 4/30/13	Thu 6/27/13	16	50%
1130	Entrega a inmobiliaria	32 days	32	Mon 2/11/13	Tue 3/19/13	48 days	48	Thu 5/2/13	Fri 6/28/13	16	50%
1131	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	32 days	32	Tue 2/12/13	Wed 3/20/13	48 days	48	Fri 5/3/13	Mon 7/1/13	16	50%
1132	EDIFICIO IJ	308 days	308	Fri 4/27/12	Thu 5/9/13	162 days	162	Thu 2/28/13	Fri 9/13/13	-146	-47%
1133	TREN ESTRUCTURA EDIFICIO IJ	46 days	46	Wed 1/2/13	Sat 2/23/13	70 days	70	Sat 4/6/13	Mon 7/1/13	24	52%
1134	Trazar muros	40 days	40	Wed 1/2/13	Sat 2/16/13	64 days	64	Sat 4/6/13	Sat 6/22/13	24	60%
1135	Colocar acero vertical	40 days	40	Wed 1/2/13	Sat 2/16/13	64 days	64	Sat 4/6/13	Sat 6/22/13	24	60%
1136	Instalaciones en muros - IISS	40 days	40	Wed 1/2/13	Sat 2/16/13	64 days	64	Sat 4/6/13	Sat 6/22/13	24	60%
1137	Instalaciones en muros - IIEE	40 days	40	Wed 1/2/13	Sat 2/16/13	64 days	64	Sat 4/6/13	Sat 6/22/13	24	60%
1138	Encofrado de muros	40 days	40	Thu 1/3/13	Mon 2/18/13	64 days	64	Mon 4/8/13	Mon 6/24/13	24	60%
1139	Vaciado de muros	40 days	40	Thu 1/3/13	Mon 2/18/13	64 days	64	Mon 4/8/13	Mon 6/24/13	24	60%
1140	Desencofrado de muros (inc. limpieza)	40 days	40	Fri 1/4/13	Tue 2/19/13	64 days	64	Tue 4/9/13	Tue 6/25/13	24	60%
1141	Curado y resane de muros	40 days	40	Fri 1/4/13	Tue 2/19/13	64 days	64	Tue 4/9/13	Tue 6/25/13	24	60%
1142	Encofrado de losa (inc. friso)	40 days	40	Fri 1/4/13	Tue 2/19/13	64 days	64	Tue 4/9/13	Tue 6/25/13	24	60%
1143	Acero de losa	40 days	40	Fri 1/4/13	Tue 2/19/13	64 days	64	Tue 4/9/13	Tue 6/25/13	24	60%
1144	Armado de baterías de desag3e e inicio de pruebas	40 days	40	Fri 1/4/13	Tue 2/19/13	64 days	64	Tue 4/9/13	Tue 6/25/13	24	60%
1145	Instalaciones en losa - IISS	40 days	40	Sat 1/5/13	Wed 2/20/13	64 days	64	Wed 4/10/13	Wed 6/26/13	24	60%
1146	Instalaciones en losa - IIEE	40 days	40	Sat 1/5/13	Wed 2/20/13	64 days	64	Wed 4/10/13	Wed 6/26/13	24	60%
1147	Vaciado de losa	40 days	40	Sat 1/5/13	Wed 2/20/13	64 days	64	Wed 4/10/13	Wed 6/26/13	24	60%
1148	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	40 days	40	Mon 1/7/13	Thu 2/21/13	64 days	64	Thu 4/11/13	Thu 6/27/13	24	60%
1149	Desencofrado de losa y frisos(inc. limpieza y apuntalamiento)	40 days	40	Mon 1/7/13	Thu 2/21/13	64 days	64	Thu 4/11/13	Thu 6/27/13	24	60%
1150	Curado de losa	40 days	40	Mon 1/7/13	Thu 2/21/13	64 days	64	Thu 4/11/13	Thu 6/27/13	24	60%
1151	Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector)	40 days	40	Mon 1/7/13	Thu 2/21/13	64 days	64	Thu 4/11/13	Thu 6/27/13	24	60%
1152	Encofrado de alfeizar (8 und)	40 days	40	Tue 1/8/13	Fri 2/22/13	64 days	64	Fri 4/12/13	Fri 6/28/13	24	60%
1153	Vaciado de alfeizar	40 days	40	Tue 1/8/13	Fri 2/22/13	64 days	64	Fri 4/12/13	Fri 6/28/13	24	60%
1154	Desencofrado de alfeizar (inc. limpieza)	40 days	40	Wed 1/9/13	Sat 2/23/13	64 days	64	Sat 4/13/13	Mon 7/1/13	24	60%
1155	Solaqueo de muros exteriores (desde andamio)	40 days	40	Wed 1/9/13	Sat 2/23/13	64 days	64	Sat 4/13/13	Mon 7/1/13	24	60%
1156	TREN ARQUITECTURA (Acabados húmedos) EDIFICIO IJ	55 days	55	Thu 1/10/13	Thu 3/14/13	82 days	82	Mon 4/15/13	Tue 7/23/13	27	49%
1157	Lijado y desbaste de placas	40 days	40	Thu 1/10/13	Mon 2/25/13	64 days	64	Mon 4/15/13	Tue 7/2/13	24	60%
1158	Entrega de picado de muros y techo	40 days	40	Thu 1/10/13	Mon 2/25/13	64 days	64	Mon 4/15/13	Tue 7/2/13	24	60%
1159	Entrega de pruebas de presi3n de IISS y winchado de IIEE	40 days	40	Thu 1/10/13	Mon 2/25/13	64 days	64	Mon 4/15/13	Tue 7/2/13	24	60%
1160	Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento	40 days	40	Thu 1/10/13	Mon 2/25/13	64 days	64	Tue 4/16/13	Wed 7/3/13	24	60%
1161	Tarrajeo de derrames	40 days	40	Sat 1/12/13	Wed 2/27/13	64 days	64	Thu 4/18/13	Fri 7/5/13	24	60%
1162	Trazo para tabiques	40 days	40	Fri 1/18/13	Tue 3/5/13	64 days	64	Sat 4/27/13	Mon 7/15/13	24	60%
1163	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS	40 days	40	Fri 1/18/13	Tue 3/5/13	64 days	64	Sat 4/27/13	Mon 7/15/13	24	60%
1164	Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE	40 days	40	Fri 1/18/13	Tue 3/5/13	64 days	64	Sat 4/27/13	Mon 7/15/13	24	60%
1165	Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa	40 days	40	Fri 1/18/13	Tue 3/5/13	64 days	64	Sat 4/27/13	Mon 7/15/13	24	60%
1166	Levantar tabiques - La Casa	40 days	40	Sat 1/19/13	Wed 3/6/13	64 days	64	Mon 4/29/13	Tue 7/16/13	24	60%

1167	Tarrajeo derrames (inc. Tabiques)	40 days	40	Sat 1/19/13	Wed 3/6/13	64 days	64	Mon 4/29/13	Tue 7/16/13	24	60%
1168	Solaqueo de tabiques	40 days	40	Sat 1/19/13	Wed 3/6/13	64 days	64	Mon 4/29/13	Tue 7/16/13	24	60%
1169	Rectificaci3n de cajas de v3lvulas	40 days	40	Sat 1/19/13	Wed 3/6/13	64 days	64	Mon 4/29/13	Tue 7/16/13	24	60%
1170	Hacer sardinel de ducha	40 days	40	Mon 1/21/13	Thu 3/7/13	64 days	64	Tue 4/30/13	Wed 7/17/13	24	60%
1171	Colocar z3calo de cer3mica en ba1os y cocinas	40 days	40	Tue 1/22/13	Fri 3/8/13	64 days	64	Thu 5/2/13	Thu 7/18/13	24	60%
1172	Enchapar piso cer3mico ba1o y cocina	40 days	40	Tue 1/22/13	Fri 3/8/13	64 days	64	Thu 5/2/13	Thu 7/18/13	24	60%
1173	Enchapar contraz3calo cer3mico ba1o y cocina	40 days	40	Wed 1/23/13	Sat 3/9/13	64 days	64	Fri 5/3/13	Fri 7/19/13	24	60%
1174	Instalaci2n de baranda meta rica en terraza	40 days	40	Wed 1/23/13	Sat 3/9/13	64 days	64	Fri 5/3/13	Fri 7/19/13	24	60%
1175	Enchape de terrazas	40 days	40	Thu 1/24/13	Mon 3/11/13	64 days	64	Sat 5/4/13	Sat 7/20/13	24	60%
1176	Fraguar z3calos y pisos de cer3mico en cocinas y ba1os	40 days	40	Fri 1/25/13	Tue 3/12/13	64 days	64	Mon 5/6/13	Mon 7/22/13	24	60%
1177	Desapuntalamiento de losa y resane de pisos	40 days	40	Sat 1/26/13	Wed 3/13/13	64 days	64	Tue 5/7/13	Tue 7/23/13	24	60%
1178	Capa Nivel ante	40 days	40	Mon 1/28/13	Thu 3/14/13						
1179	TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) EDIFICIO IJ	70 days	70	Tue 1/29/13	Mon 4/22/13	94 days	94	Wed 5/8/13	Thu 8/29/13	24	34%
1180	Cableado el3ctrico interior / REVISION CAPATAZ	40 days	40	Tue 1/29/13	Fri 3/15/13	64 days	64	Wed 5/8/13	Wed 7/24/13	24	60%
1181	Imprimaci3n y empaste de muros interiores Colomural	40 days	40	Wed 1/30/13	Sat 3/16/13	64 days	64	Thu 5/9/13	Thu 7/25/13	24	60%
1182	Empaste grueso techos+cocinas+ba1os	40 days	40	Thu 1/31/13	Mon 3/18/13	64 days	64	Fri 5/10/13	Fri 7/26/13	24	60%
1183	Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + ba1os	40 days	40	Fri 2/1/13	Tue 3/19/13	64 days	64	Mon 5/13/13	Sat 7/27/13	24	60%
1184	Empastar fino 2da mano - techo cocinas + ba1os	40 days	40	Sat 2/2/13	Wed 3/20/13	64 days	64	Tue 5/14/13	Tue 7/30/13	24	60%
1185	Preparaci3n de techos	40 days	40	Mon 2/4/13	Thu 3/21/13	64 days	64	Wed 5/15/13	Wed 7/31/13	24	60%
1186	Escarchado de techos	40 days	40	Tue 2/5/13	Fri 3/22/13	64 days	64	Thu 5/16/13	Thu 8/1/13	24	60%
1187	Lijado y sellado cocinas + ba1os	40 days	40	Wed 2/6/13	Sat 3/23/13	64 days	64	Fri 5/17/13	Fri 8/2/13	24	60%
1188	Pintura 1era. Mano cocinas + ba1os	40 days	40	Thu 2/7/13	Mon 3/25/13	64 days	64	Sat 5/18/13	Sat 8/3/13	24	60%
1189	Instalar marcos de ventana + cristales	40 days	40	Fri 2/8/13	Tue 3/26/13	64 days	64	Mon 5/20/13	Mon 8/5/13	24	60%
1190	Instalar mamparas	40 days	40	Sat 2/9/13	Wed 3/27/13	64 days	64	Tue 5/21/13	Tue 8/6/13	24	60%
1191	Colocar marcos sellados y empastados	40 days	40	Mon 2/11/13	Sat 3/30/13	64 days	64	Wed 5/22/13	Wed 8/7/13	24	60%
1192	Presentar puertas + hueco en chapa	40 days	40	Tue 2/12/13	Mon 4/1/13	64 days	64	Thu 5/23/13	Thu 8/8/13	24	60%
1193	Presentaci3n de jambas	40 days	40	Wed 2/13/13	Tue 4/2/13	64 days	64	Fri 5/24/13	Fri 8/9/13	24	60%
1194	Masillar y Lijar Marcos	40 days	40	Thu 2/14/13	Wed 4/3/13	64 days	64	Sat 5/25/13	Sat 8/10/13	24	60%
1195	Pintura 1era. Mano EN MARCOS	40 days	40	Fri 2/15/13	Thu 4/4/13	64 days	64	Mon 5/27/13	Mon 8/12/13	24	60%
1196	Instalar Muebles de Cocina	40 days	40	Sat 2/16/13	Fri 4/5/13	64 days	64	Tue 5/28/13	Tue 8/13/13	24	60%
1197	Revisi3n General de Acabados	40 days	40	Mon 2/18/13	Sat 4/6/13	64 days	64	Wed 5/29/13	Wed 8/14/13	24	60%
1198	Instalaci2n de opcionales (closets, espejos)	40 days	40	Tue 2/19/13	Mon 4/8/13	64 days	64	Thu 5/30/13	Thu 8/15/13	24	60%
1199	Colocar topes de puertas, rejillas de ventilaci2n en ba1os	40 days	40	Wed 2/20/13	Tue 4/9/13	64 days	64	Fri 5/31/13	Fri 8/16/13	24	60%
1200	Remasillado de marcos	40 days	40	Thu 2/21/13	Wed 4/10/13	64 days	64	Mon 6/3/13	Sat 8/17/13	24	60%
1201	Lijado del Masillado de Marcos	40 days	40	Fri 2/22/13	Thu 4/11/13	64 days	64	Tue 6/4/13	Mon 8/19/13	24	60%
1202	Pintar 2º mano marcos y hojas de puerta	40 days	40	Sat 2/23/13	Fri 4/12/13	64 days	64	Wed 6/5/13	Tue 8/20/13	24	60%
1203	Colgado de puertas (principal con chapa)	40 days	40	Mon 2/25/13	Sat 4/13/13	64 days	64	Thu 6/6/13	Wed 8/21/13	24	60%
1204	Instalar aparatos sanitarios + griferías	40 days	40	Tue 2/26/13	Mon 4/15/13	64 days	64	Fri 6/7/13	Thu 8/22/13	24	60%
1205	Instalar placas el3ctricas e intercomunicadores	40 days	40	Wed 2/27/13	Tue 4/16/13	64 days	64	Sat 6/8/13	Fri 8/23/13	24	60%
1206	Macillado de Muros y techos	40 days	40	Thu 2/28/13	Wed 4/17/13	64 days	64	Mon 6/10/13	Sat 8/24/13	24	60%
1207	Lijado de Muros y techos	40 days	40	Fri 3/1/13	Thu 4/18/13	64 days	64	Tue 6/11/13	Mon 8/26/13	24	60%
1208	Pintar 2º mano en muros y techos	40 days	40	Sat 3/2/13	Fri 4/19/13	64 days	64	Wed 6/12/13	Tue 8/27/13	24	60%
1209	Limpieza gruesa de departamentos	40 days	40	Mon 3/4/13	Sat 4/20/13	64 days	64	Thu 6/13/13	Wed 8/28/13	24	60%
1210	Limpieza Final para revisi3n	40 days	40	Tue 3/5/13	Mon 4/22/13	64 days	64	Fri 6/14/13	Thu 8/29/13	24	60%
1211	CHECK LIST FINAL (META) EDIFICIO IJ	53 days	53	Wed 3/6/13	Thu 5/9/13	75 days	75	Sat 6/15/13	Fri 9/13/13	22	42%
1212	Sellado para Colowall	40 days	40	Wed 3/6/13	Tue 4/23/13	64 days	64	Sat 6/15/13	Sat 8/31/13	24	60%
1213	Colocaci3n de Colowall	40 days	40	Thu 3/7/13	Wed 4/24/13	64 days	64	Mon 6/17/13	Mon 9/2/13	24	60%
1214	Lijado Final de Pisos	40 days	40	Fri 3/8/13	Thu 4/25/13						
1215	Colocaci3n de vinílico	40 days	40	Sat 3/9/13	Fri 4/26/13						
1216	Instalaci2n de alfombras y tapajuntas	40 days	40	Mon 3/11/13	Sat 4/27/13	64 days	64	Wed 6/19/13	Wed 9/4/13	24	60%
1217	Colocaci3n de contraz3calo	40 days	40	Tue 3/12/13	Mon 4/29/13	64 days	64	Thu 6/20/13	Thu 9/5/13	24	60%
1218	acabado de contraz3calo / limpieza de vidrios (RR,COINSA)	40 days	40	Wed 3/13/13	Tue 4/30/13	64 days	64	Fri 6/21/13	Fri 9/6/13	24	60%
1219	Observaciones de inmobiliaria	40 days	40	Thu 3/14/13	Thu 5/2/13	64 days	64	Sat 6/22/13	Sat 9/7/13	24	60%
1220	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 1	40 days	40	Fri 3/15/13	Fri 5/3/13	64 days	64	Mon 6/24/13	Mon 9/9/13	24	60%
1221	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 2	40 days	40	Sat 3/16/13	Sat 5/4/13	64 days	64	Tue 6/25/13	Tue 9/10/13	24	60%
1222	Levantamiento de observaciones Inmobiliaria día 3	40 days	40	Mon 3/18/13	Mon 5/6/13						
1223	Limpieza final	40 days	40	Tue 3/19/13	Tue 5/7/13	64 days	64	Wed 6/26/13	Wed 9/11/13	24	60%
1224	Entrega a inmobiliaria	40 days	40	Wed 3/20/13	Wed 5/8/13	64 days	64	Thu 6/27/13	Thu 9/12/13	24	60%
1225	ENTREGA REAL A INMOBILIARIA	40 days	40	Thu 3/21/13	Thu 5/9/13	64 days	64	Fri 6/28/13	Fri 9/13/13	24	60%
