Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**CCSalaverry - Muro Pantalla**	**138 días**	**lun 03/09/12**	**vie 15/02/13**
2	Contrato Firmado	1 día	lun 03/09/12	lun 03/09/12
3	Adelanto de Obra	1 día	lun 03/09/12	lun 03/09/12
4	Licencia de construccion	1 día	lun 03/09/12	lun 03/09/12
5	Entrega de terreno con Excavacion Minima	1 día	lun 03/09/12	lun 03/09/12
6	**1er Anillo**	**65 días**	**lun 03/09/12**	**lun 19/11/12**
7	**Frente 1**	**30 días**	**lun 03/09/12**	**sab 06/10/12**
8	**Paños Impares**	**21 días**	**lun 03/09/12**	**mié 26/09/12**
9	Anclaje	12 días	lun 03/09/12	sáb 15/09/12
10	Perfilado	9 días	sáb 08/09/12	mar 18/09/12
11	Acero	9 días	lun 10/09/12	mié 19/09/12
12	Encofrado	9 días	mar 11/09/12	jue 20/09/12
13	Concreto	9 días	mié 12/09/12	vie 21/09/12
14	Dia de Espera 1	9 días	jue 13/09/12	sáb 22/09/12
15	Dia de Espera 2	9 días	vie 14/09/12	lun 24/09/12
16	Dia de Espera 3	9 días	sáb 15/09/12	mar 25/09/12
17	Tensado	9 días	lun 17/09/12	mié 26/09/12
18	**Paños Pares**	**18 días**	**lun 17/09/12**	**sáb 06/10/12**
19	Anclaje	9 días	lun 17/09/12	mié 26/09/12
20	Perfilado	9 días	mié 19/09/12	vie 28/09/12
21	Acero	9 días	jue 20/09/12	sáb 29/09/12
22	Encofrado	9 días	vie 21/09/12	lun 01/10/12
23	Concreto	9 días	sáb 22/09/12	mar 02/10/12
24	Dia de Espera 1	9 días	lun 24/09/12	mié 03/10/12
25	Dia de Espera 2	9 días	mar 25/09/12	jue 04/10/12
26	Dia de Espera 3	9 días	mié 26/09/12	vie 05/10/12
27	Tensado	9 días	jue 27/09/12	sáb 06/10/12
28	**Frente 2**	**52 días**	**lun 03/09/12**	**sáb 03/11/12**
29	**Paños Impares**	**43 días**	**lun 03/09/12**	**mar 23/10/12**
30	Anclaje	34 días	lun 03/09/12	vie 12/10/12
31	Perfilado	9 días	jue 04/10/12	lun 15/10/12
32	Acero	9 días	vie 05/10/12	mar 16/10/12
33	Encofrado	9 días	sáb 06/10/12	mié 17/10/12
34	Concreto	9 días	mar 09/10/12	jue 18/10/12
35	Dia de Espera 1	9 días	mié 10/10/12	vie 19/10/12
36	Dia de Espera 2	9 días	jue 11/10/12	sáb 20/10/12
37	Dia de Espera 3	9 días	vie 12/10/12	lun 22/10/12
38	Tensado	9 días	sáb 13/10/12	mar 23/10/12
39	**Paños Pares**	**18 días**	**sáb 13/10/12**	**sáb 03/11/12**
40	Anclaje	9 días	sáb 13/10/12	mar 23/10/12
41	Perfilado	9 días	mar 16/10/12	jue 25/10/12
42	Acero	9 días	mié 17/10/12	vie 26/10/12
43	Encofrado	9 días	jue 18/10/12	sáb 27/10/12
44	Concreto	9 días	vie 19/10/12	lun 29/10/12
45	Dia de Espera 1	9 días	sáb 20/10/12	mar 30/10/12
46	Dia de Espera 2	9 días	lun 22/10/12	mié 31/10/12
47	Dia de Espera 3	9 días	mar 23/10/12	vie 02/11/12
48	Tensado	9 días	mié 24/10/12	sáb 03/11/12
49	1er anillo del eje 27 al eje D	22 días	mié 24/10/12	lun 19/11/12
50	**2do Anillo**	**65 días**	**jue 27/09/12**	**vie 14/12/12**
51	**Frente 1**	**30 días**	**jue 27/09/12**	**vie 02/11/12**
52	**Paños Impares**	**19 días**	**jue 27/09/12**	**vie 19/10/12**
53	Anclaje	10 días	jue 27/09/12	mar 09/10/12
54	Perfilado	10 días	sáb 29/09/12	jue 11/10/12
55	Acero	10 días	lun 01/10/12	vie 12/10/12
56	Encofrado	10 días	mar 02/10/12	sáb 13/10/12
57	Concreto	10 días	mié 03/10/12	lun 15/10/12
58	Dia de Espera 1	10 días	jue 04/10/12	mar 16/10/12
59	Dia de Espera 2	10 días	vie 05/10/12	mié 17/10/12
60	Dia de Espera 3	10 días	sáb 06/10/12	jue 18/10/12
61	Tensado	10 días	mar 09/10/12	vie 19/10/12
62	**Paños Pares**	**20 días**	**mié 10/10/12**	**vie 02/11/12**
63	Anclaje	11 días	mié 10/10/12	lun 22/10/12
64	Perfilado	11 días	vie 12/10/12	mié 24/10/12
65	Acero	11 días	sáb 13/10/12	jue 25/10/12
66	Encofrado	11 días	lun 15/10/12	vie 26/10/12
67	Concreto	11 días	mar 16/10/12	sáb 27/10/12
68	Dia de Espera 1	11 días	mié 17/10/12	lun 29/10/12
69	Dia de Espera 2	11 días	jue 18/10/12	mar 30/10/12
70	Dia de Espera 3	11 días	vie 19/10/12	mié 31/10/12
71	Tensado	11 días	sáb 20/10/12	vie 02/11/12
72	**Frente 2**	**30 días**	**mié 24/10/12**	**mié 28/11/12**
73	**Paños Impares**	**19 días**	**mié 24/10/12**	**jue 15/11/12**
74	Anclaje	10 días	mié 24/10/12	lun 05/11/12
75	Perfilado	10 días	vie 26/10/12	mié 07/11/12
76	Acero	10 días	sáb 27/10/12	jue 08/11/12
77	Encofrado	10 días	lun 29/10/12	vie 09/11/12
78	Concreto	10 días	mar 30/10/12	sáb 10/11/12
79	Dia de Espera 1	10 días	mié 31/10/12	lun 12/11/12
80	Dia de Espera 2	10 días	vie 02/11/12	mar 13/11/12
81	Dia de Espera 3	10 días	sáb 03/11/12	mié 14/11/12
82	Tensado	10 días	lun 05/11/12	jue 15/11/12
83	**Paños Pares**	**20 días**	**mar 06/11/12**	**mié 28/11/12**
84	Anclaje	11 días	mar 06/11/12	sáb 17/11/12
85	Perfilado	11 días	jue 08/11/12	mar 20/11/12
86	Acero	11 días	vie 09/11/12	mié 21/11/12
87	Encofrado	11 días	sáb 10/11/12	jue 22/11/12
88	Concreto	11 días	lun 12/11/12	vie 23/11/12
89	Dia de Espera 1	11 días	mar 13/11/12	sáb 24/11/12
90	Dia de Espera 2	11 días	mié 14/11/12	lun 26/11/12
91	Dia de Espera 3	11 días	jue 15/11/12	mar 27/11/12
92	Tensado	11 días	vie 16/11/12	mié 28/11/12
93	2do anillo del eje 27 al eje D	21 días	mar 20/11/12	vie 14/12/12
94	**3er Anillo**	**66 días**	**mar 23/10/12**	**vie 11/01/13**
95	**Frente 1**	**29 días**	**mar 23/10/12**	**lun 26/11/12**
96	**Paños Impares**	**19 días**	**mar 23/10/12**	**mié 14/11/12**
97	Anclaje	10 días	mar 23/10/12	sáb 03/11/12
98	Perfilado	10 días	jue 25/10/12	mar 06/11/12
99	Acero	10 días	vie 26/10/12	mié 07/11/12
100	Encofrado	10 días	sáb 27/10/12	jue 08/11/12
101	Concreto	10 días	lun 29/10/12	vie 09/11/12
102	Dia de Espera 1	10 días	mar 30/10/12	sáb 10/11/12
103	Dia de Espera 2	10 días	mié 31/10/12	lun 12/11/12
104	Dia de Espera 3	10 días	vie 02/11/12	mar 13/11/12
105	Tensado	10 días	sáb 03/11/12	mié 14/11/12
106	**Paños Pares**	**19 días**	**lun 05/11/12**	**lun 26/11/12**
107	Anclaje	10 días	lun 05/11/12	jue 15/11/12
108	Perfilado	10 días	mié 07/11/12	sáb 17/11/12
109	Acero	10 días	jue 08/11/12	lun 19/11/12
110	Encofrado	10 días	vie 09/11/12	mar 20/11/12
111	Concreto	10 días	sáb 10/11/12	mié 21/11/12
112	Dia de Espera 1	10 días	lun 12/11/12	jue 22/11/12
113	Dia de Espera 2	10 días	mar 13/11/12	vie 23/11/12
114	Dia de Espera 3	10 días	mié 14/11/12	sáb 24/11/12
115	Tensado	10 días	jue 15/11/12	lun 26/11/12
116	**Frente 2**	**29 días**	**lun 19/11/12**	**sáb 22/12/12**
117	**Paños Impares**	**19 días**	**lun 19/11/12**	**mar 11/12/12**
118	Anclaje	10 días	lun 19/11/12	jue 29/11/12
119	Perfilado	10 días	mié 21/11/12	sáb 01/12/12
120	Acero	10 días	jue 22/11/12	lun 03/12/12
121	Encofrado	10 días	vie 23/11/12	mar 04/12/12
122	Concreto	10 días	sáb 24/11/12	mié 05/12/12
123	Dia de Espera 1	10 días	lun 26/11/12	jue 06/12/12
124	Dia de Espera 2	10 días	mar 27/11/12	vie 07/12/12
125	Dia de Espera 3	10 días	mié 28/11/12	lun 10/12/12
126	Tensado	10 días	jue 29/11/12	mar 11/12/12
127	**Paños Pares**	**19 días**	**vie 30/11/12**	**sáb 22/12/12**
128	Anclaje	10 días	vie 30/11/12	mié 12/12/12
129	Perfilado	10 días	lun 03/12/12	vie 14/12/12
130	Acero	10 días	mar 04/12/12	sáb 15/12/12
131	Encofrado	10 días	mié 05/12/12	lun 17/12/12
132	Concreto	10 días	jue 06/12/12	mar 18/12/12
133	Dia de Espera 1	10 días	vie 07/12/12	mié 19/12/12
134	Dia de Espera 2	10 días	lun 10/12/12	jue 20/12/12
135	Dia de Espera 3	10 días	mar 11/12/12	vie 21/12/12
136	Tensado	10 días	mié 12/12/12	sáb 22/12/12
137	3er anillo del eje 27 al eje D	22 días	sáb 15/12/12	vie 11/01/13
138	**4to Anillo**	**69 días**	**vie 16/11/12**	**jue 07/02/13**
139	**Frente 1**	**69 días**	**vie 16/11/12**	**jue 07/02/13**
140	**Paños Impares**	**20 días**	**vie 16/11/12**	**lun 10/12/12**
141	Anclaje	11 días	vie 16/11/12	mié 28/11/12
142	Perfilado	11 días	lun 19/11/12	vie 30/11/12
143	Acero	11 días	mar 20/11/12	sáb 01/12/12
144	Encofrado	11 días	mié 21/11/12	lun 03/12/12
145	Concreto	11 días	jue 22/11/12	mar 04/12/12
146	Dia de Espera 1	11 días	vie 23/11/12	mié 05/12/12
147	Dia de Espera 2	11 días	sáb 24/11/12	jue 06/12/12
148	Dia de Espera 3	11 días	lun 26/11/12	vie 07/12/12
149	Tensado	11 días	mar 27/11/12	lun 10/12/12
150	**Paños Pares**	**20 días**	**jue 29/11/12**	**sáb 22/12/12**
151	Anclaje	11 días	jue 29/11/12	mié 12/12/12
152	Perfilado	11 días	sáb 01/12/12	vie 14/12/12
153	Acero	11 días	lun 03/12/12	sáb 15/12/12
154	Encofrado	11 días	mar 04/12/12	lun 17/12/12
155	Concreto	11 días	mié 05/12/12	mar 18/12/12
156	Dia de Espera 1	11 días	jue 06/12/12	mié 19/12/12
157	Dia de Espera 2	11 días	vie 07/12/12	jue 20/12/12
158	Dia de Espera 3	11 días	lun 10/12/12	vie 21/12/12
159	Tensado	11 días	mar 11/12/12	sáb 22/12/12
160	**4to anillo del eje 27 al eje D(Muro**	**23 días**	**sáb 12/01/13**	**jue 07/02/13**
161	**Paños Impares**	**23 días**	**sáb 12/01/13**	**jue 07/02/13**
162	Perfilado,Excav.y Solado c	10 días	sáb 12/01/13	mié 23/01/13
163	Acero y Concreto cimient	10 días	lun 14/01/13	jue 24/01/13
164	Encofrado	10 días	mar 15/01/13	vie 25/01/13
165	Concreto	10 días	mié 16/01/13	sáb 26/01/13
166	**Paños Pares**	**13 días**	**jue 24/01/13**	**jue 07/02/13**
167	Perfilado,Excav.y Sol	10 días	jue 24/01/13	lun 04/02/13
168	Acero y Concreto cim	10 días	vie 25/01/13	mar 05/02/13
169	Encofrado	10 días	sáb 26/01/13	mié 06/02/13
170	Concreto	10 días	lun 28/01/13	jue 07/02/13
171	**5to Anillo (Muro Tradicional)**	**52 días**	**sáb 15/12/12**	**vie 15/02/13**
172	**Frente 1**	**23 días**	**sáb 15/12/12**	**sáb 12/01/13**
173	**Paños Impares**	**13 días**	**sáb 15/12/12**	**lun 31/12/12**
174	Perfilado,Excav.y Solado cimie	10 días	sáb 15/12/12	jue 27/12/12
175	Acero y Concreto cimiento	10 días	lun 17/12/12	vie 28/12/12
176	Encofrado	10 días	mar 18/12/12	sáb 29/12/12
177	Concreto	10 días	mié 19/12/12	lun 31/12/12
178	**Paños Pares**	**13 días**	**vie 28/12/12**	**sáb 12/01/13**
179	Perfilado,Excav.y Solado cimie	10 días	vie 28/12/12	mié 09/01/13
180	Acero y Concreto cimiento	10 días	sáb 29/12/12	jue 10/01/13
181	Encofrado	10 días	lun 31/12/12	vie 11/01/13
182	Concreto	10 días	mié 02/01/13	sáb 12/01/13
183	**Frente 2**	**23 días**	**sáb 15/12/12**	**sáb 12/01/13**
184	**Paños Impares**	**13 días**	**sáb 15/12/12**	**lun 31/12/12**
185	Perfilado,Excav.y Solado cimie	10 días	sáb 15/12/12	jue 27/12/12
186	Acero y Concreto cimiento	10 días	lun 17/12/12	vie 28/12/12
187	Encofrado	10 días	mar 18/12/12	sáb 29/12/12
188	Concreto	10 días	mié 19/12/12	lun 31/12/12
189	**Paños Pares**	**13 días**	**vie 28/12/12**	**sáb 12/01/13**
190	Perfilado,Excav.y Solado cimie	10 días	vie 28/12/12	mié 09/01/13
191	Acero y Concreto cimiento	10 días	sáb 29/12/12	jue 10/01/13
192	Encofrado	10 días	lun 31/12/12	vie 11/01/13
193	Concreto	10 días	mié 02/01/13	sáb 12/01/13
194	5to anillo del eje 27 al eje D	10 días	mar 05/02/13	vie 15/02/13

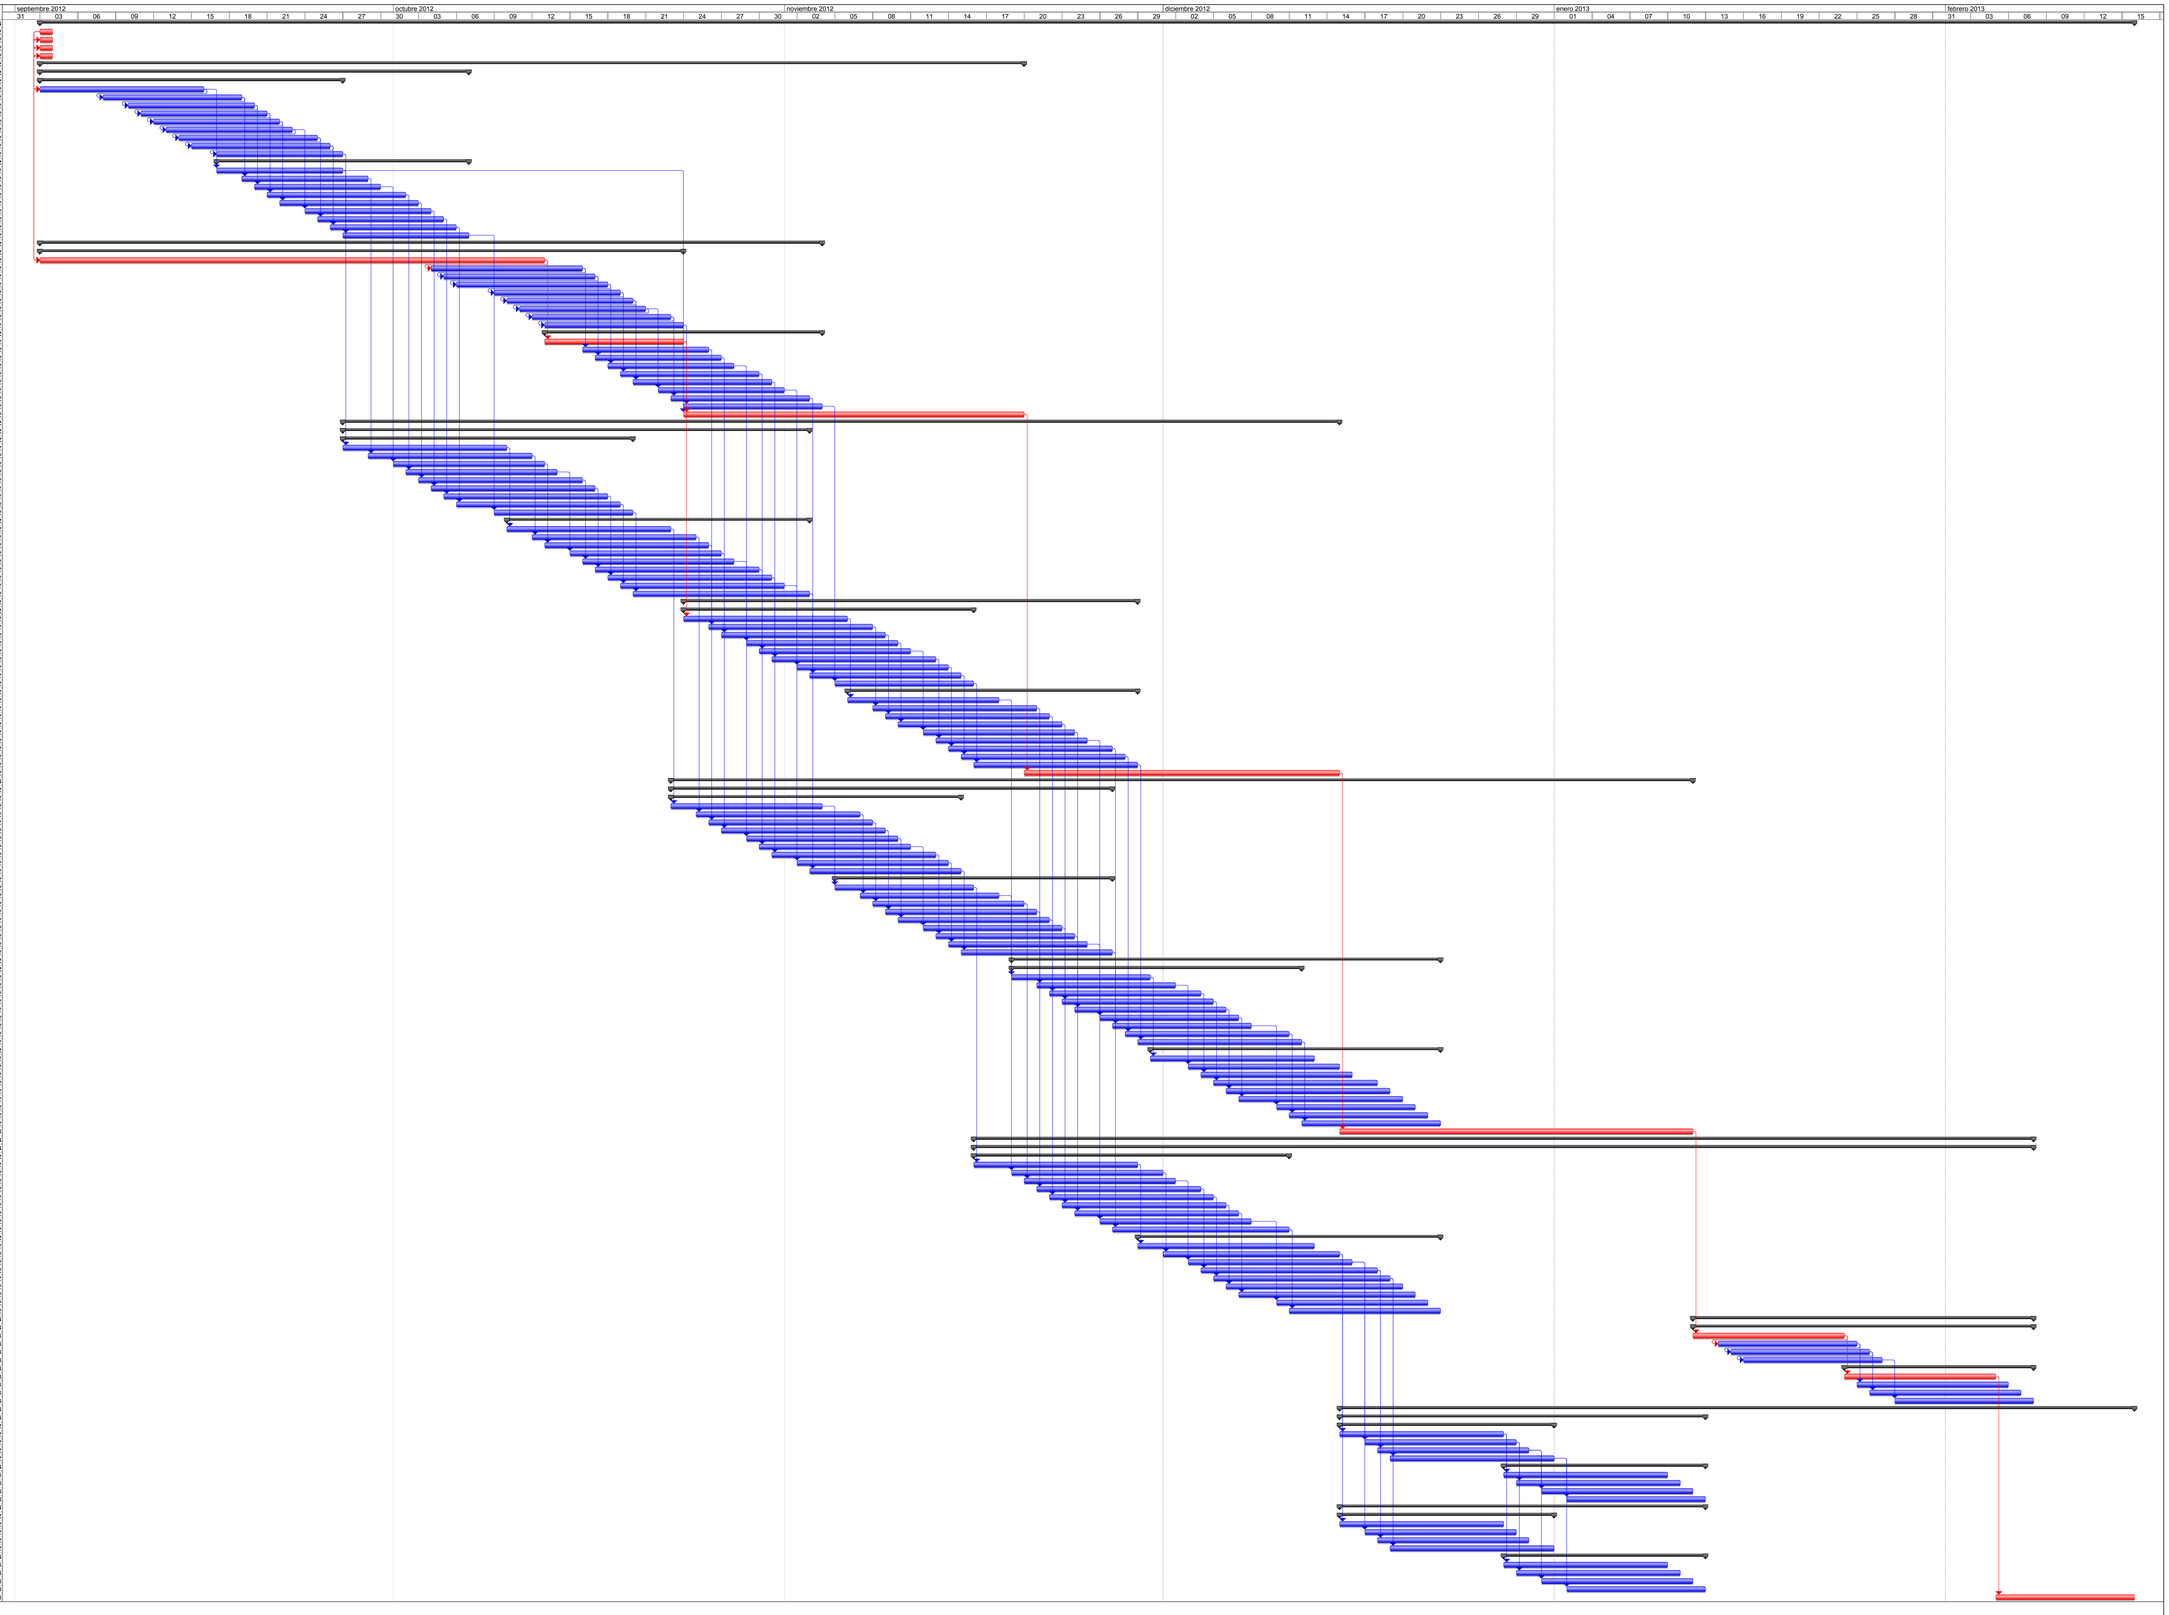

Proyecto: Cronograma Muro Anclado
Fecha: jue 02/10/14

Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Fecha límite
