


ANEXO 1

CARTAS DE BALANCE

Resultados de la aplicación (Fuente: Propia)


VACIADO DE CONCRETO EN LOSAS – RESULTADOS GENERALES



GENERAL

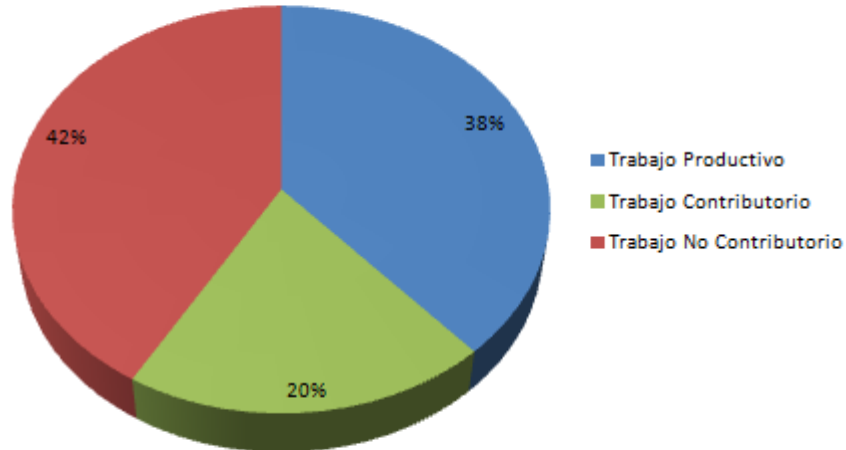

Trabajo Productivo	38%
Trabajo Contributorio	20%
Trabajo No Contributorio	41%


TRABAJO PRODUCTIVO

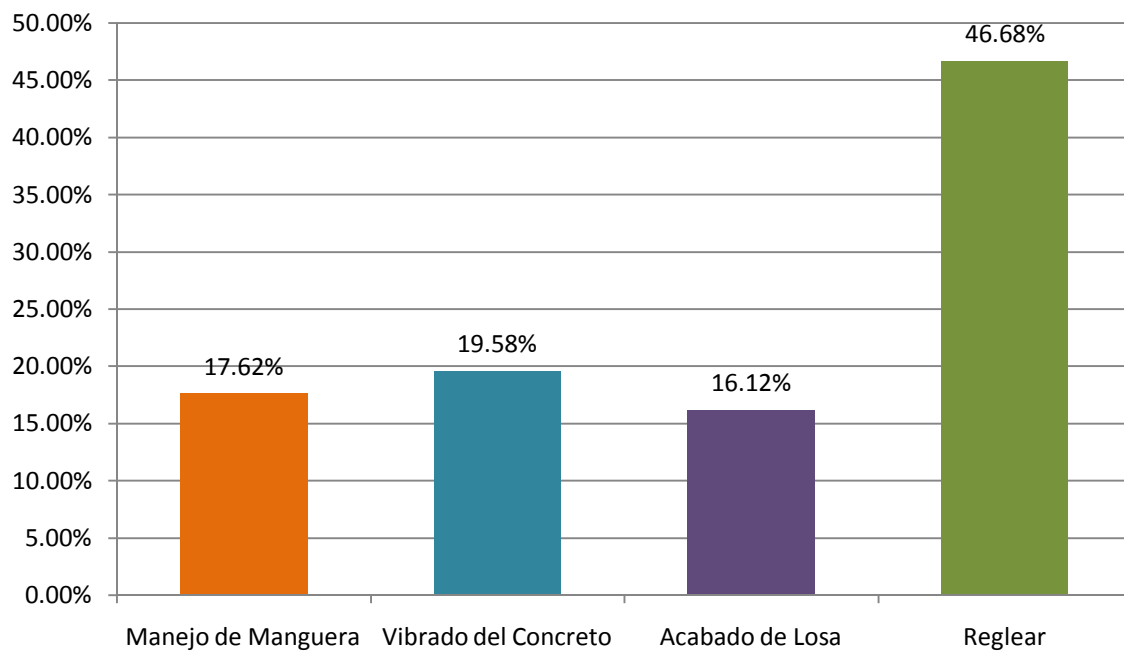

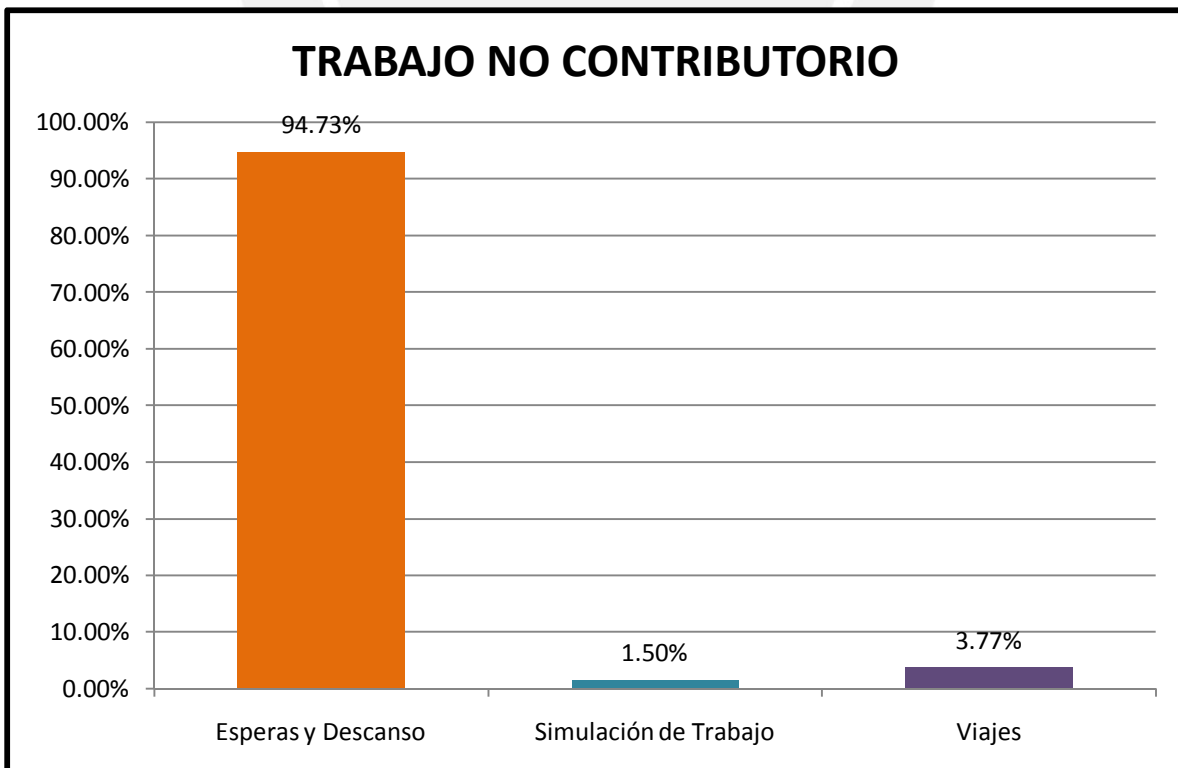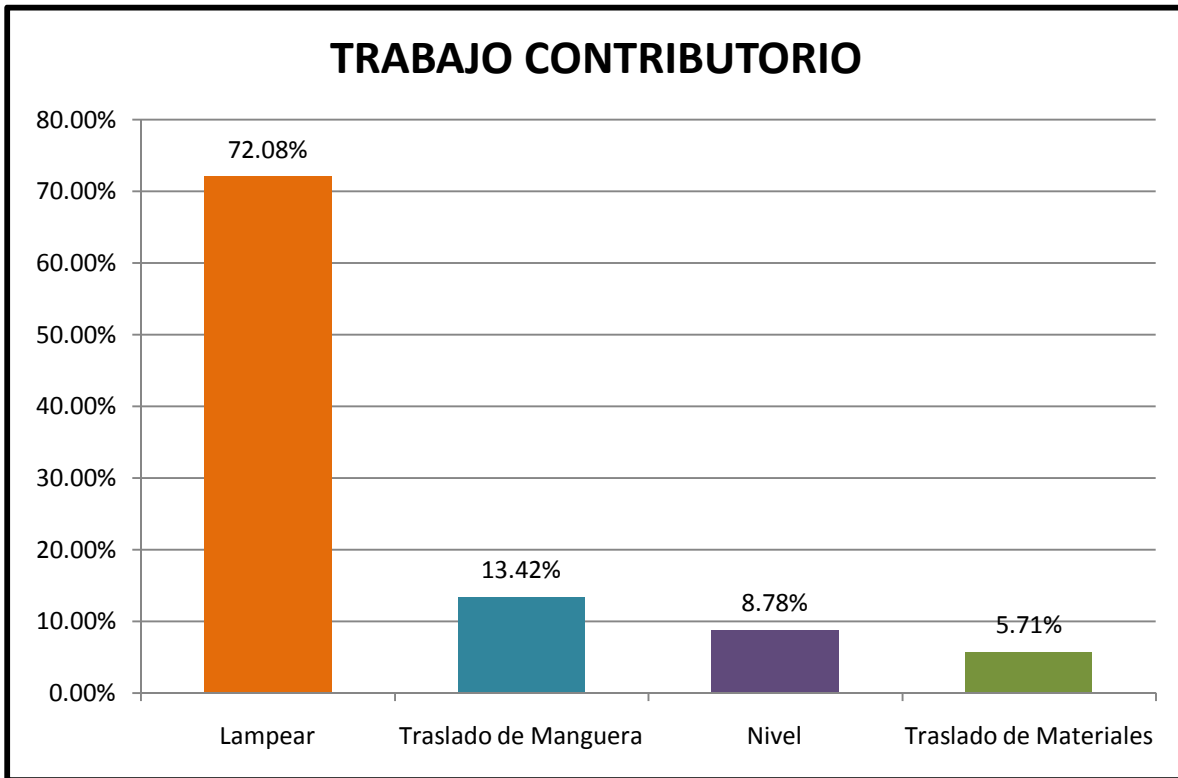


VACIADO DE CONCRETO EN LOSAS – RESULTADOS PERSONALES


Ayudante (manguera): Jorge Manihuari

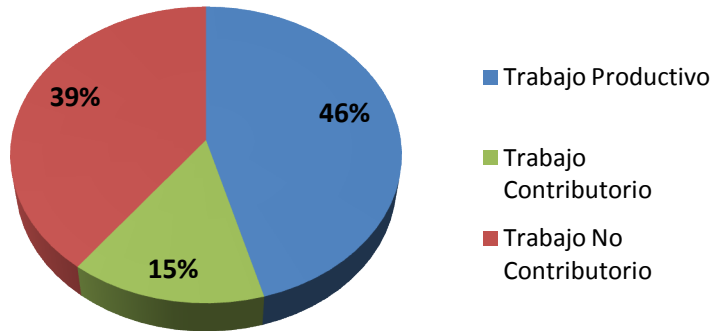


Oficial (vibrado): Mauro Mena

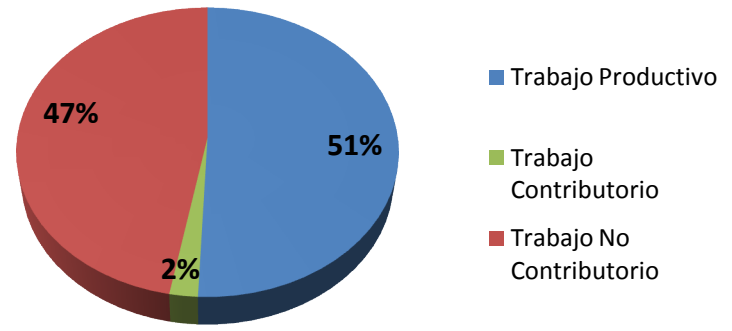


Ayudante (lampa y acabado): Félix Tacuche

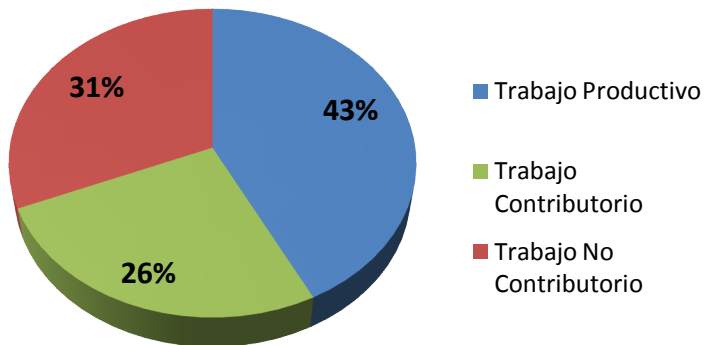


Operario (regla): Juan Aquino Villar

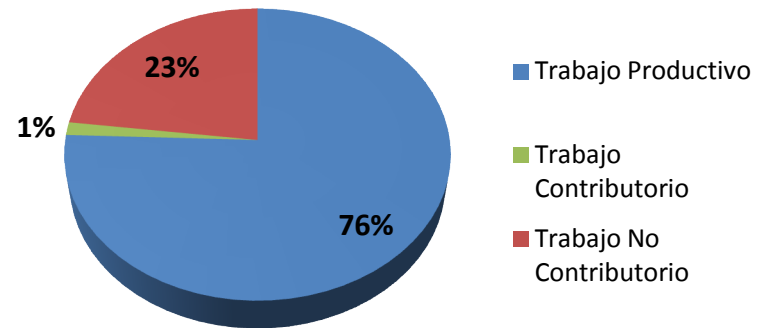


Operario (regla y nivel): Victor Pizarro

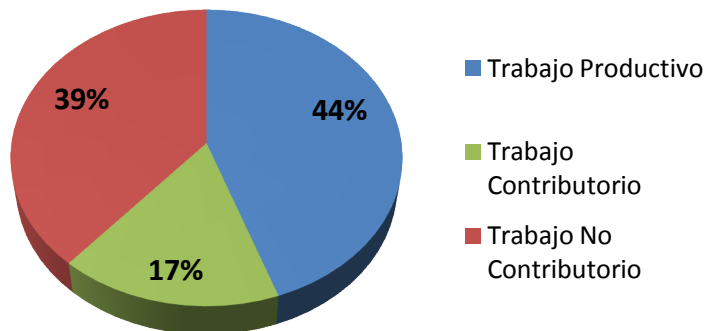

Ayudante (lampa): Luis Mendoza

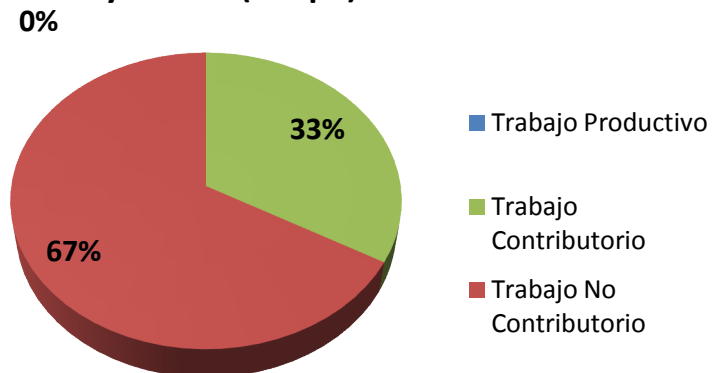


Ayudante (lampa): José Acuña Delgado

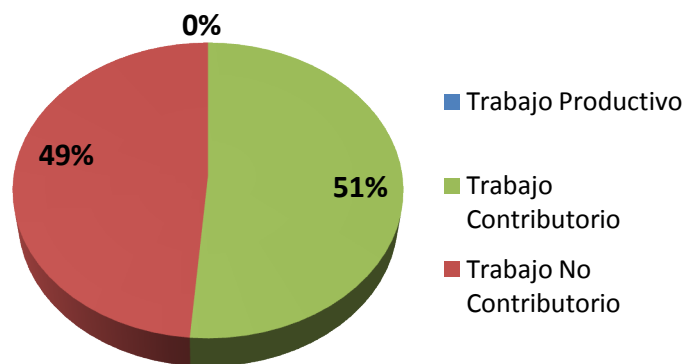




ENCOFRADO DE VIGAS – RESULTADOS GENERALES

GENERAL

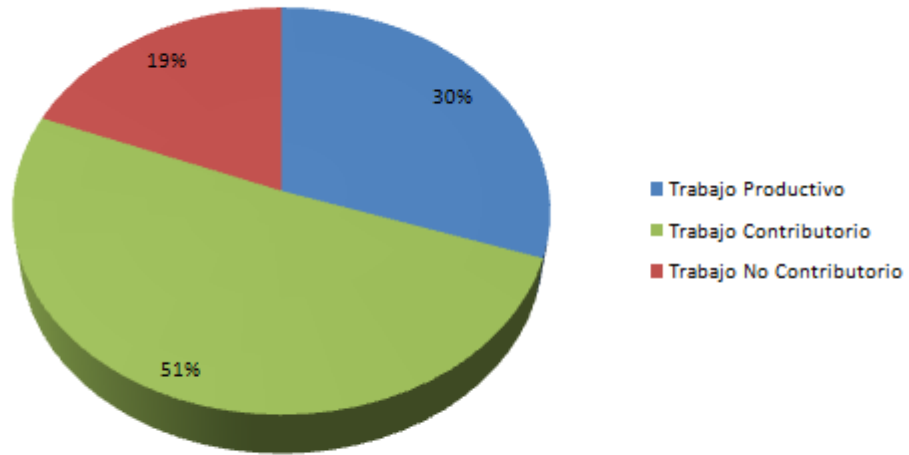


Trabajo Productivo	30%
Trabajo Contributorio	51%
Trabajo No Contributorio	19%

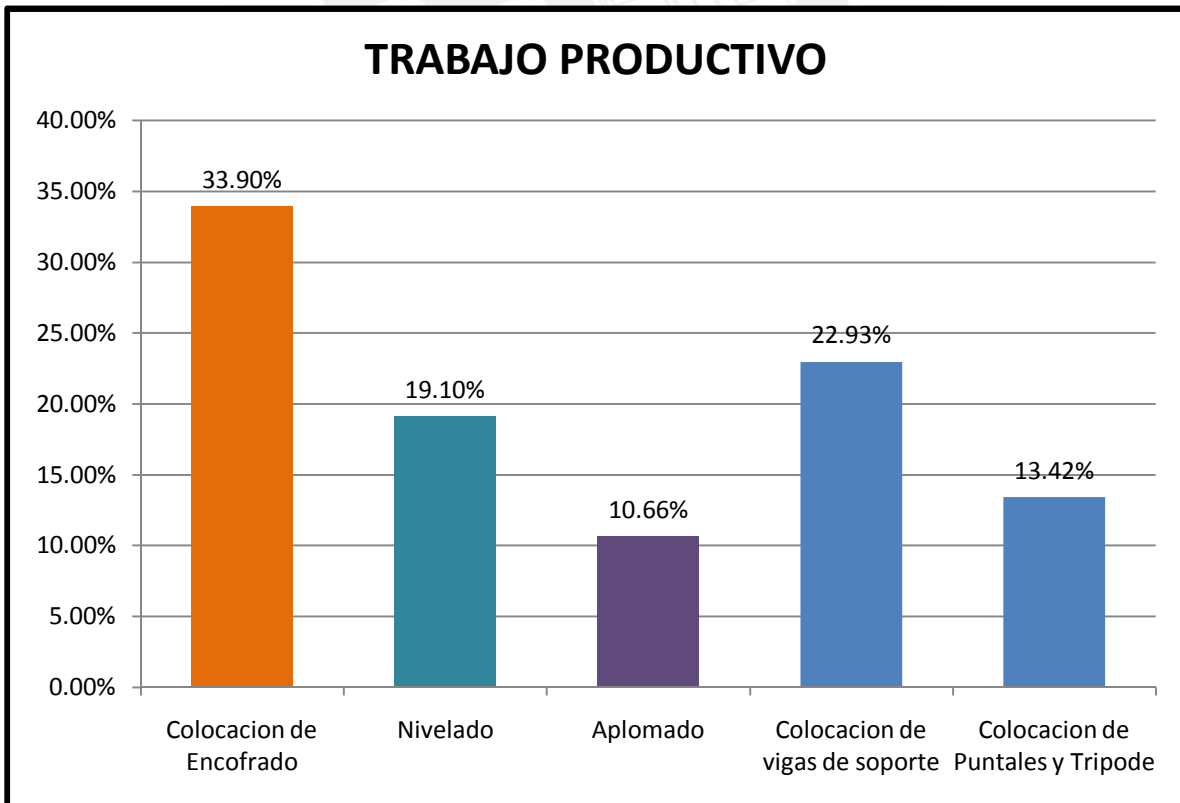

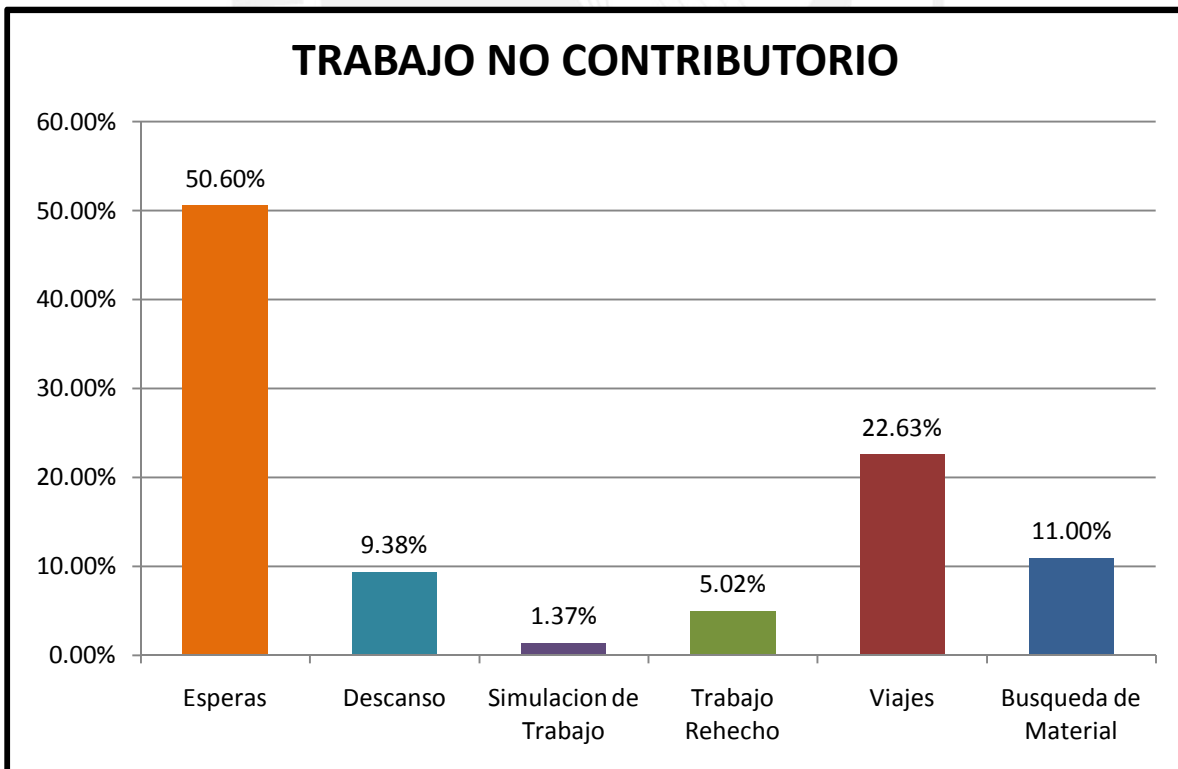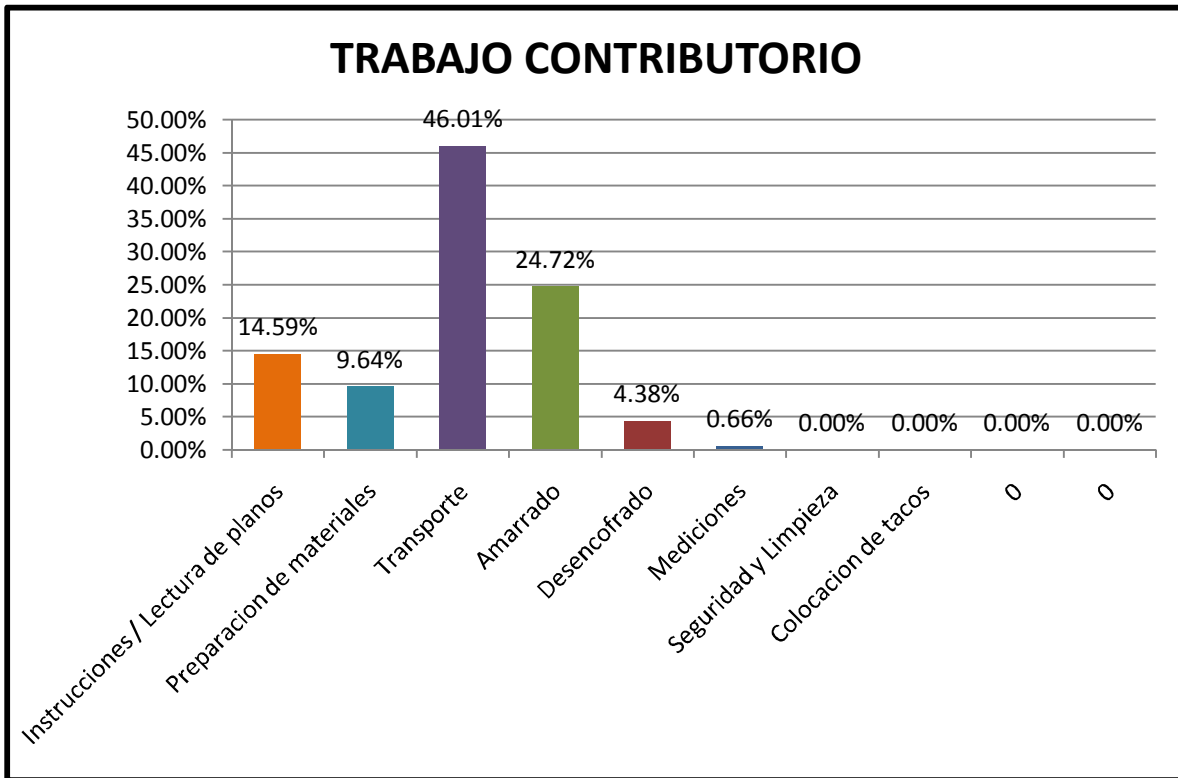


ENCOFRADO DE VIGAS –RESULTADOS PERSONALES


Operario 1: Marcos Rivas

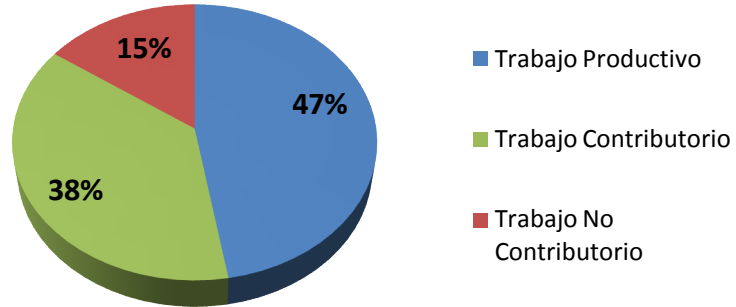


Ayudante 1: Jian Carlos Guzman

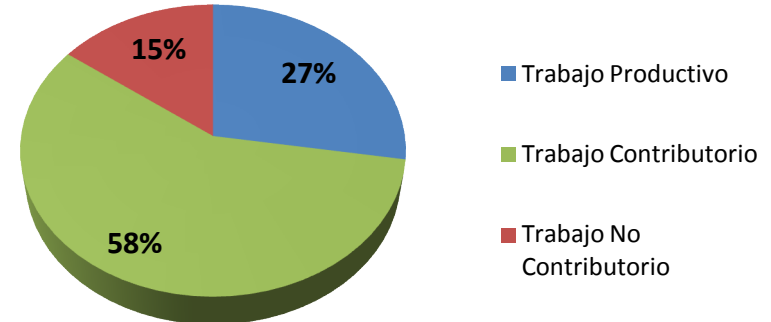


Operario 2: Carlos Espinoza

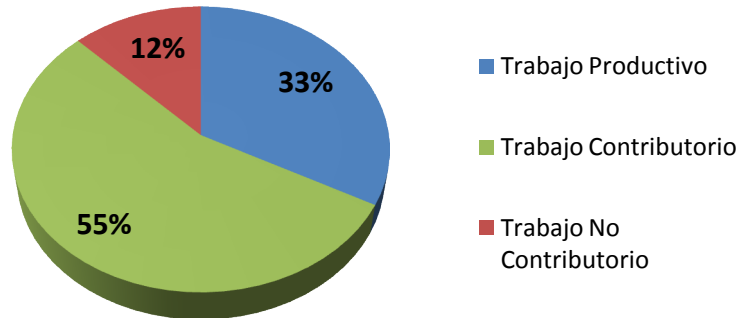


Ayudante 2: Johan Aquino

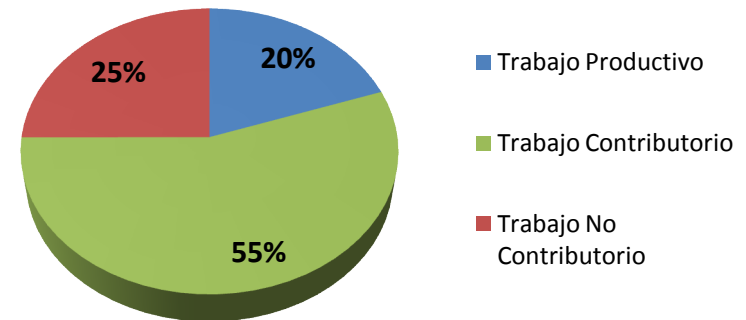


Operario 3 : Evaristo Diaz

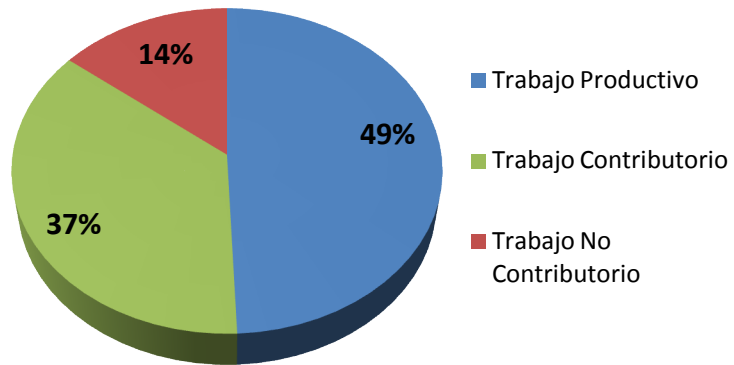


Ayudante 3: Jose Rodriguez

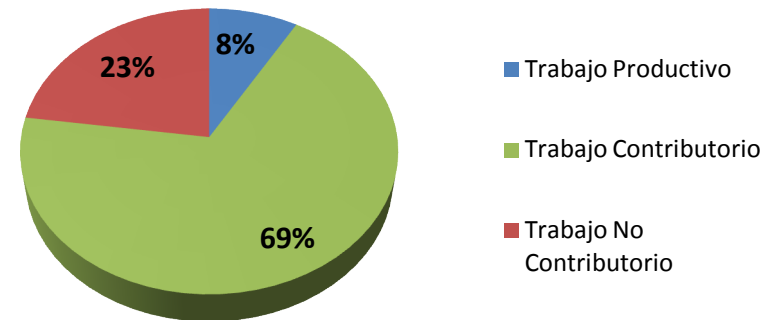

Operario 4: Julio Mina

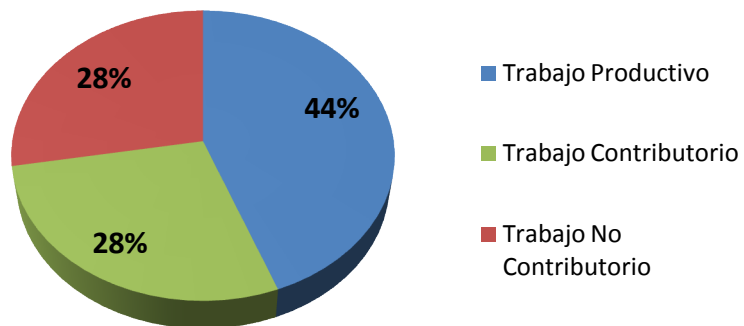

Ayudante 4: Diego Adrianzen

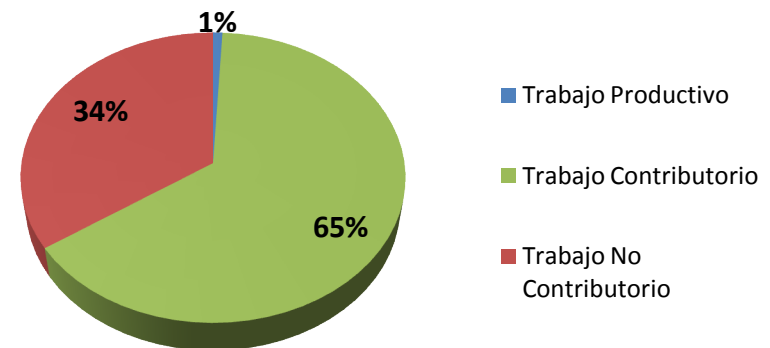

ANEXO 2

DIMENSIONAMIENTO DE CUADRILLAS

Proyecto Barranco 360 (Fuente: Edifica)

ENCOFRADO DE VERTICALES

Personas	11												
h día	9.6												
									LAST DAY	Buffer	Buffer	Buffer	Buffer
Día de obra	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
hh	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60
hhacum	3,484.80	3,590.40	3,696.00	3,801.60	3,907.20	4,012.80	4,118.40	4,224.00	4,329.60	4,435.20	4,540.80	4,646.40	
met	135.21	142.43	120.50	101.94	135.21	142.43	120.50	101.94	-	-	-	-	
met acum	4,135.85	4,278.28	4,398.78	4,500.72	4,635.93	4,778.36	4,898.86	5,000.80	5,000.80	5,000.80	5,000.80	5,000.80	
Ren diario	0.78	0.74	0.88	1.04	0.78	0.74	0.88	1.04	-	-	-	-	
Ren. Acum.	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.87	0.89	0.91	0.93	
Rend. Pres	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Formación de Cuadrilla	Operario	6
	Oficial	0
	Peon	5
	Total	11

Dif Rend	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	hh/m2
Dif HH	776.80	671.20	565.60	460.00	354.40	HH
Dif Soles	9,710.00	7,047.60	5,938.80	4,830.00	3,721.20	S/.

ENCOFRADO DE VIGAS

Personas	6													
h día	9.6													
									LAST DAY	Buffer	Buffer	Buffer	Buffer	
Día de obra	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
hh	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	
hhacum	1,843.20	1,900.80	1,958.40	2,016.00	2,073.60	2,131.20	2,188.80	2,246.40	2,304.00	2,361.60	2,419.20	2,476.80	2,534.40	
met	43.78	47.05	53.78	54.80	43.78	47.05	53.78	54.80	43.78	-	-	-	-	
met acum	1,595.28	1,642.33	1,696.11	1,750.91	1,794.69	1,841.74	1,895.52	1,950.32	1,994.10	1,994.10	1,994.10	1,994.10	1,994.10	
Ren diario	1.32	1.22	1.07	1.05	1.32	1.22	1.07	1.05	1.32	-	-	-	-	
Ren. Acum.	1.16	1.16	1.15	1.15	1.16	1.16	1.15	1.15	1.16	1.18	1.21	1.24	1.27	
Rend. Pres	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	

Formación de Cuadrilla	Operario	3
	Oficial	
	Peon	3
	Total	6

Dif Rend	0.44	0.42	0.39	0.36	0.33	hh/m2
Dif HH	886.56	828.96	771.36	713.76	656.16	HH
Dif Soles	9,308.88	8,704.08	8,099.28	7,494.48	6,889.68	S/.

ENCOF DE LOSA ALIGERADA

Personas	8													
h día	9.6													
									LAST DAY	Buffer	Buffer	Buffer	Buffer	
Día de obra	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
hh	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	
hhacum	2,457.60	2,534.40	2,611.20	2,688.00	2,764.80	2,841.60	2,918.40	2,995.20	3,072.00	3,148.80	3,225.60	3,302.40	3,379.20	
met	148.04	166.48	140.66	120.69	148.04	166.48	140.66	120.69	148.04	-	-	-	-	
met acum	4,606.96	4,773.44	4,914.10	5,034.79	5,182.83	5,349.31	5,489.97	5,610.66	5,758.70	5,758.70	5,758.70	5,758.70	5,758.70	
Ren diario	0.52	0.46	0.55	0.64	0.52	0.46	0.55	0.64	0.52	-	-	-	-	
Ren. Acum.	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.55	0.56	0.57	0.59	
Rend. Pres	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	

Formación de Cuadrilla	Operario	4
	Oficial	
	Peon	4
	Total	8

Dif Rend	0.16	0.14	0.13	0.12	0.10	hh/m2
Dif HH	901.50	824.70	747.90	671.10	594.30	HH
Dif Soles	9,465.78	8,659.38	7,852.98	7,046.58	6,240.18	S/.

CONCRETO DE VERTICALES

Personas	1													
h día	4.8													
Día de obra	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	44	
hh	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	
hhacum	158.40	163.20	168.00	172.80	177.60	182.40	187.20	192.00	196.80	201.60	206.40	211.20	211.20	
met	14.47	15.81	11.44	11.19	14.47	15.81	11.44	11.19	-	-	-	-	-	
met acum	437.75	453.56	465.00	476.19	490.66	506.47	517.91	529.10	529.10	529.10	529.10	529.10	529.10	
Ren diario	0.33	0.30	0.42	0.43	0.33	0.30	0.42	0.43	-	-	-	-	-	
Ren. Acum.	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.40	
Rend. Pres	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	

Formación de Cuadrilla	Operario	1
	Oficial	
	Peon	
	Total	1

Dif Rend	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	hh/m2
Dif HH	188.95	184.15	179.35	174.55	169.75	HH
Dif Soles	1,984.00	1,933.60	1,883.20	1,832.80	1,782.40	S/.

CONCRETO DE HORIZONTALES

Personas	3														
h día	4.8														
Día de obra	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
hh	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40
hhacum	432.00	446.40	460.80	475.20	489.60	504.00	518.40	532.80	547.20	561.60	576.00	590.40	604.80	619.20	633.60
met	22.56	17.23	18.82	21.64	22.56	17.23	18.82	21.64	22.56	17.23	18.82	-	-	-	-
met acum	605.95	623.18	642.00	663.64	686.20	703.43	722.25	743.89	766.45	783.68	802.50	802.50	802.50	802.50	802.50
Ren diario	0.64	0.84	0.77	0.67	0.64	0.84	0.77	0.67	0.64	0.84	0.77	-	-	-	-
Ren. Acum.	0.71	0.72	0.72	0.72	0.71	0.72	0.72	0.72	0.71	0.72	0.72	0.74	0.75	0.77	0.79
Rend. Pres	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96

Formación de Cuadrilla	Operario	1
	Oficial	1
	Peon	1
	Total	3

Dif Rend	0.24	0.22	0.21	0.19	0.17	hh/m2
Dif HH	194.40	180.00	165.60	151.20	136.80	HH
Dif Soles	2,041.20	1,890.00	1,738.80	1,587.60	1,436.40	S/.

ACABADO DE LOSA

Personas	4														
h día	4.8														
Día de obra	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
hh	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20
hhacum	576.00	595.20	614.40	633.60	652.80	672.00	691.20	710.40	729.60	748.80	768.00	787.20	806.4	825.60	844.80
met	112.80	86.15	94.10	108.20	112.80	86.15	94.10	108.20	112.80	86.15	94.10	-	-	-	-
met acum	3,029.75	3,115.90	3,210.00	3,318.20	3,431.00	3,517.15	3,611.25	3,719.45	3,832.25	3,918.40	4,012.50	4,012.50	4,012.50	4,012.50	4,012.50
Ren diario	0.17	0.22	0.20	0.18	0.17	0.22	0.20	0.18	0.17	0.22	0.20	-	-	-	-
Ren. Acum.	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.200972	0.21	0.21
Rend. Pres	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39

Formación de Cuadrilla	Operario	3
	Oficial	1
	Peon	
	Total	4

Dif Rend	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	hh/m2
Dif HH	796.88	777.68	758.47	739.27	720.07	HH
Dif Soles	8,367.19	8,165.59	7,963.99	7,762.39	7,560.79	S/.

ANEXO 3

CURVAS DE APRENDIZAJE

Proyecto Barranco 360 (Fuente: Edifica)

Curvas de Aprendizaje

- Encofrado de Placas:

Partida	Encofrado de Placas				
Rend. Presup	0.94				
Inicio	SEM 15				
Fin	SEM 30				
Semana	Rend Acumulado	% Aprendizaje	Avance por Hora	Rend Teórico	Avance Teórico
15	1.42	91%	0.70	1.42	0.70
16	1.46		0.68	1.29	0.77
17	1.42		0.70	1.22	0.82
18	1.40		0.71	1.17	0.85
19	1.37		0.73	1.14	0.88
20	1.33		0.75	1.11	0.90
21	1.30		0.77	1.09	0.92
22	1.25		0.80	1.07	0.94
23	1.17		0.85	1.05	0.95
24	1.13		0.88	1.04	0.96
25	1.10		0.91	1.02	0.98
26	1.07		0.93	1.01	0.99
27	1.05		0.95	1.00	1.00
28	1.02		0.98	0.99	1.01
29	1.00		1.00	0.98	1.02
30	0.97		1.03	0.97	1.03

Cuadro de rendimientos de la partida encofrado de placas (Fuente Propia)

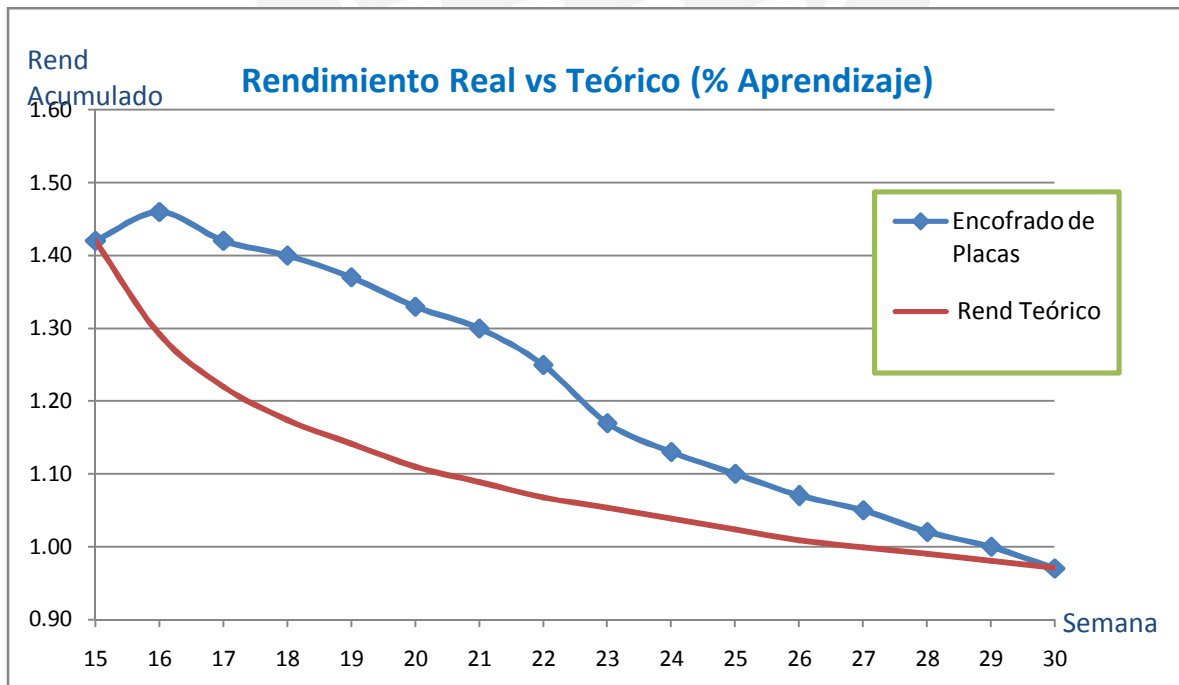


Gráfico de Rendimientos Acumulados de la partida encofrado de placas (Fuente Propia)

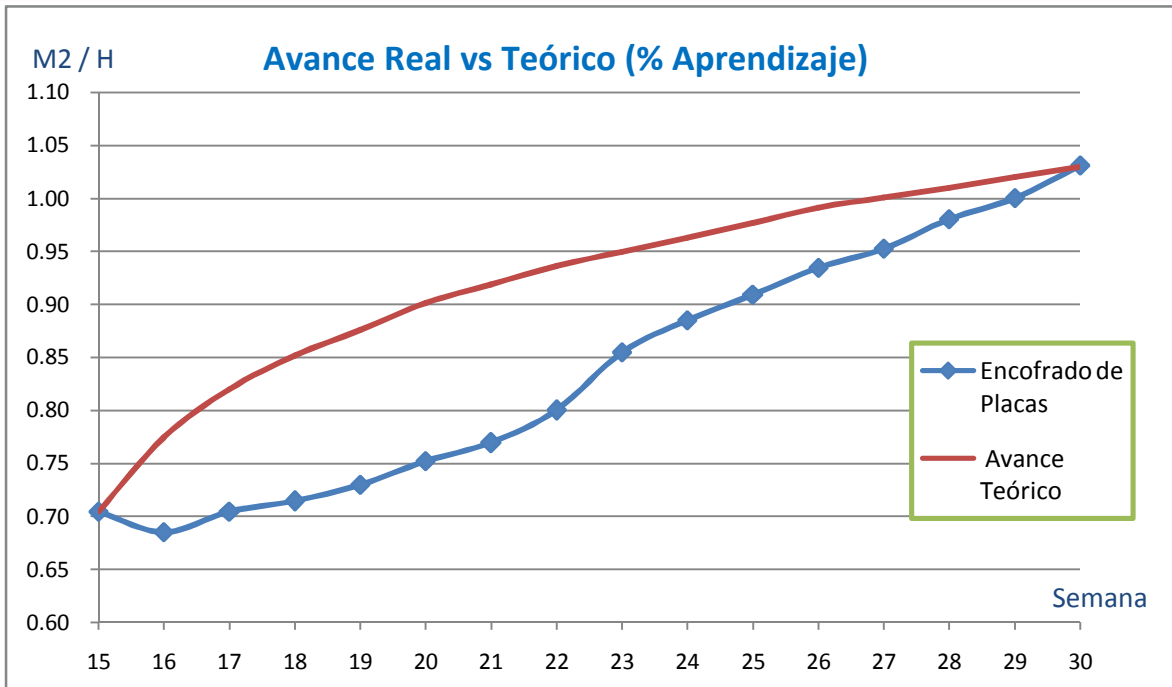


Gráfico de avance diario de la partida encofrado de placas (Fuente Propia)

- **Encofrado de Losa Aligerada**

Partida	Encofrado de Losa Aligerada				
Rend. Presup	0.55				
Inicio	SEM 15				
Fin	SEM 30				
Semana	Rend Acumulado	% Aprendizaje	Avance por Hora	Rend Teórico	Avance Teórico
15	0.74	96%	1.35	0.74	1.35
16	0.68		1.47	0.71	1.41
17	0.68		1.47	0.70	1.44
18	0.67		1.49	0.68	1.47
19	0.67		1.49	0.68	1.48
20	0.71		1.41	0.67	1.50
21	0.74		1.35	0.66	1.51
22	0.75		1.33	0.65	1.53
23	0.72		1.39	0.65	1.53
24	0.71		1.41	0.65	1.54
25	0.71		1.41	0.64	1.55
26	0.70		1.43	0.64	1.56
27	0.68		1.47	0.64	1.57
28	0.66		1.52	0.64	1.57
29	0.64		1.56	0.63	1.58
30	0.63	1.59	0.63	1.59	

Cuadro de rendimientos de la partida encofrado de Losa Aligerada (Fuente Propia)

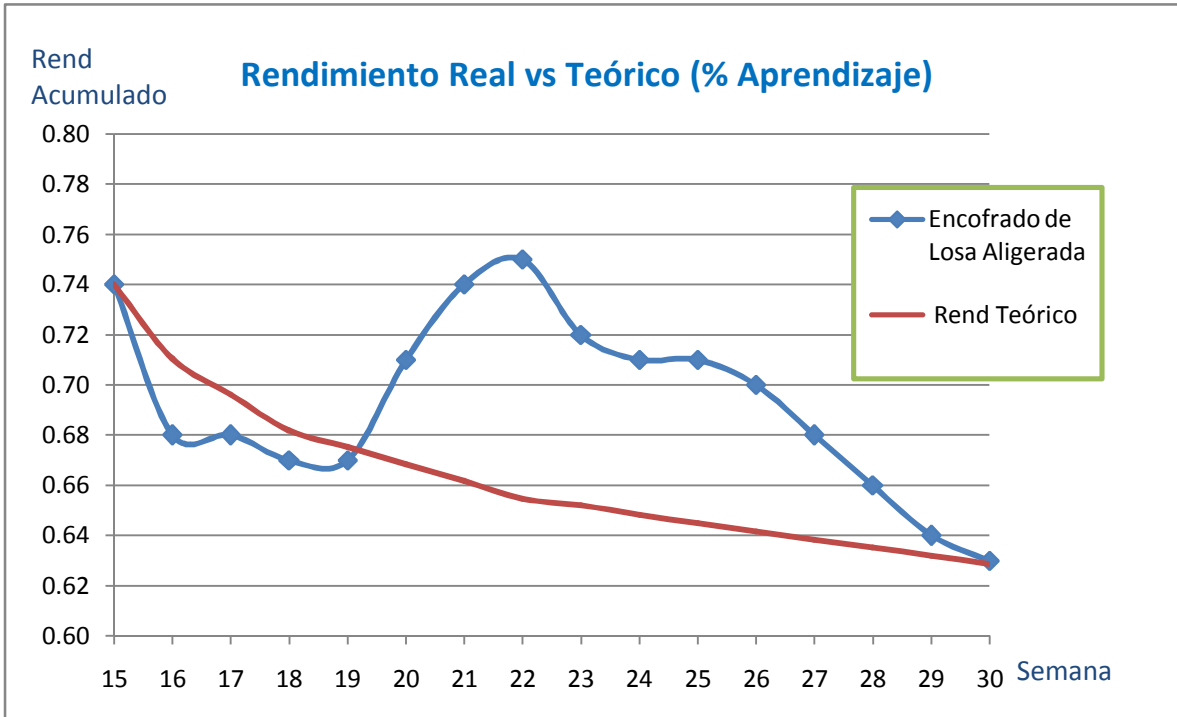


Grafico de Rendimientos Acumulados de la partida encofrado de losa aligerada (Fuente Propia)

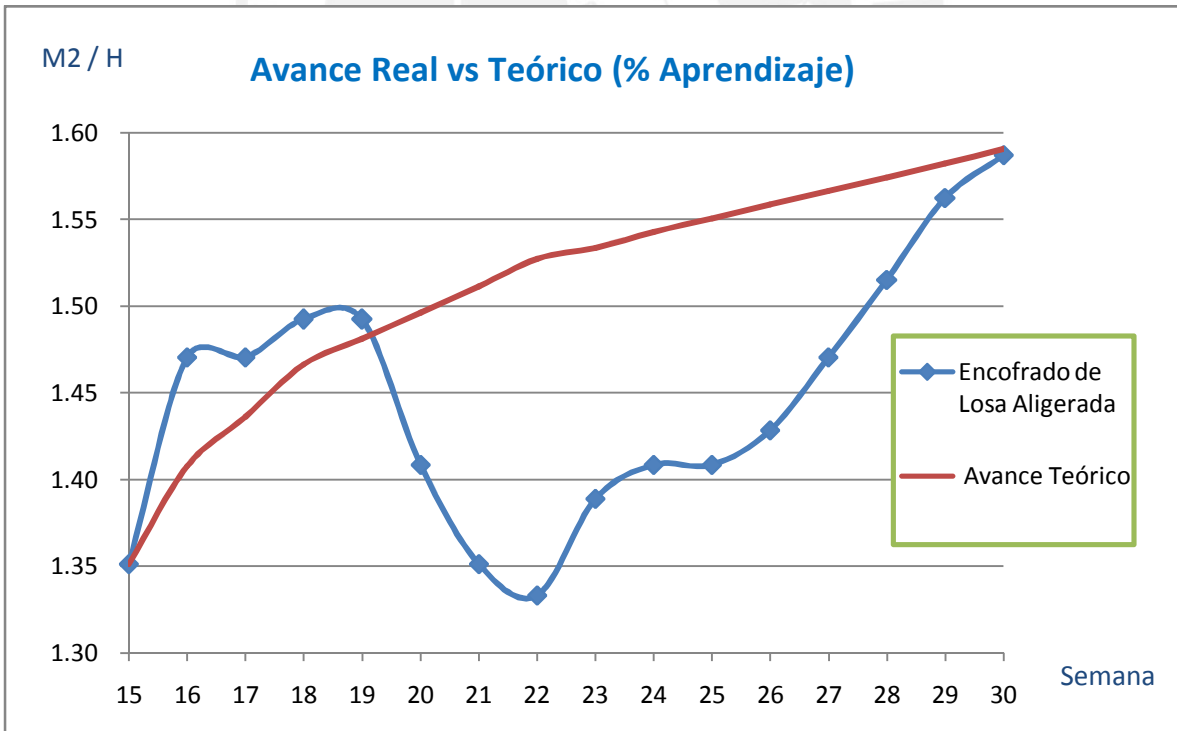


Grafico de avance diario de la partida encofrado de losa aligerada (Fuente Propia)

- **Encofrado de Losa Maciza**

Partida	Encofrado de Losa Maciza				
Rend. Presup	1.28				
Inicio	SEM 15				
Fin	SEM 30				
Semana	Rend Acumulado	% Aprendizaje	Avance por Hora	Rend Teórico	Avance Teórico
15	1.49	92%	0.67	1.490	0.671
16	1.54		0.65	1.365	0.732
17	1.56		0.64	1.298	0.770
18	1.59		0.63	1.251	0.799
19	1.51		0.66	1.220	0.819
20	1.38		0.72	1.189	0.841
21	1.35		0.74	1.168	0.856
22	1.27		0.79	1.147	0.872
23	1.21		0.83	1.133	0.883
24	1.20		0.83	1.118	0.894
25	1.18		0.85	1.104	0.906
26	1.15		0.87	1.090	0.917
27	1.14		0.88	1.080	0.926
28	1.12		0.89	1.070	0.934
29	1.07		0.93	1.061	0.943
30	1.05	0.95	1.051	0.952	

Cuadro de rendimientos de la partida encofrado de Losa Maciza (Fuente Propia)

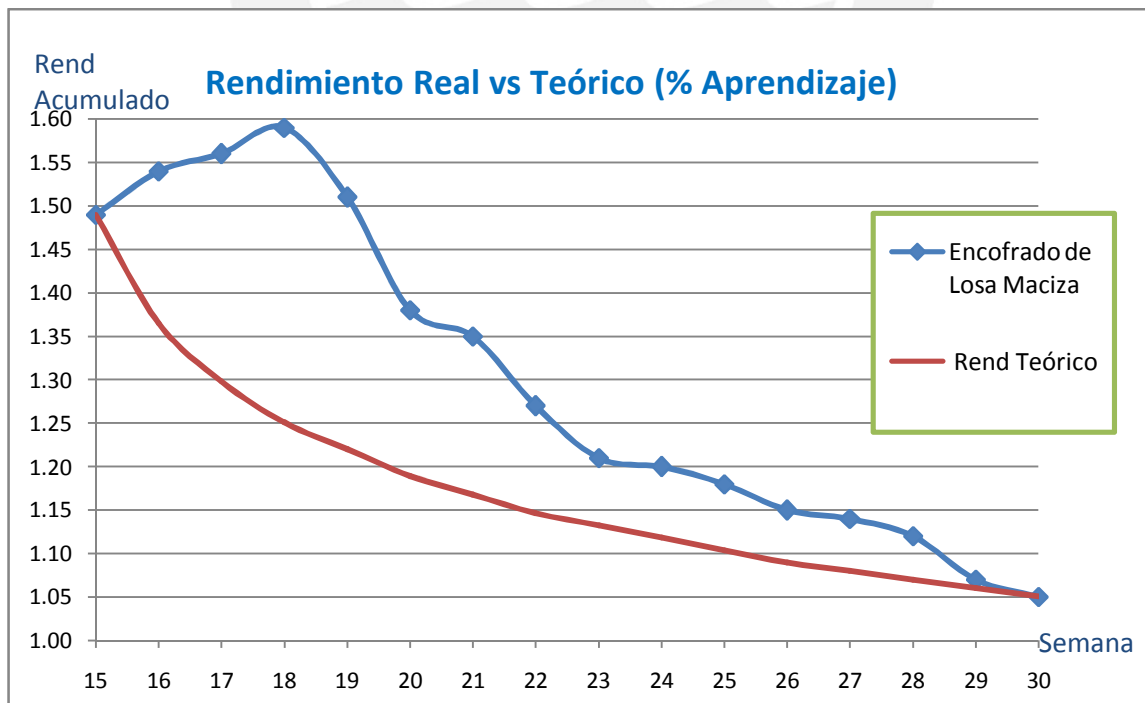


Grafico de Rendimientos Acumulados de la partida encofrado de losa Maciza (Fuente Propia)

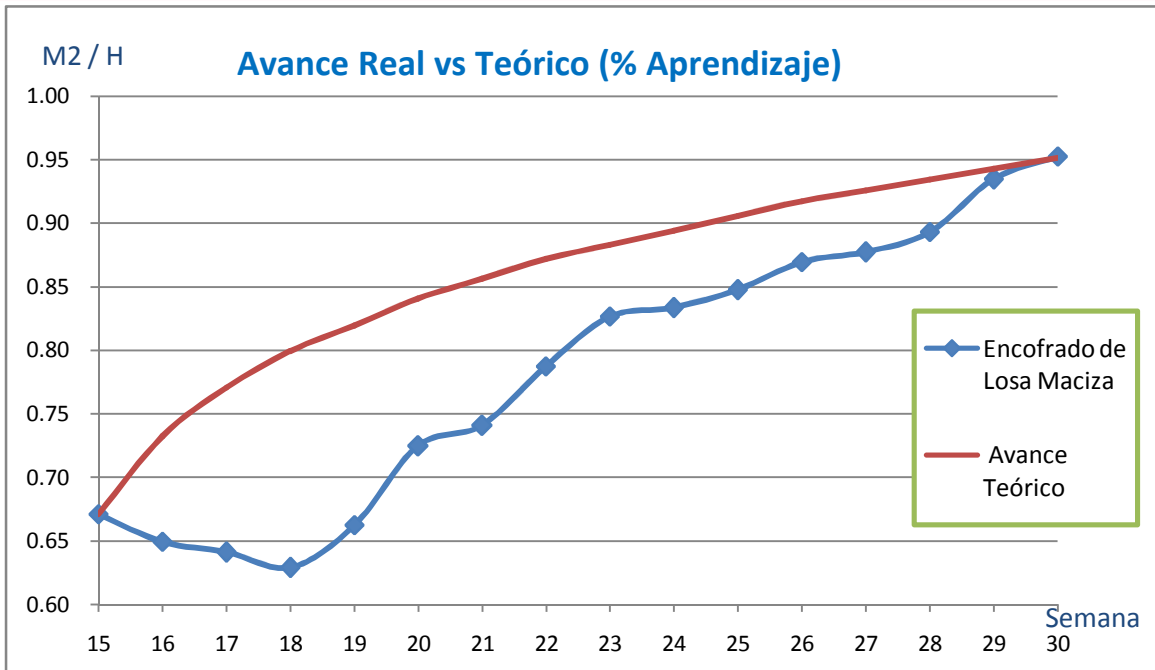


Grafico de avance diario de la partida encofrado de losa maciza (Fuente Propia)

- **Encofrado de Vigas**

Partida	Encofrado de Vigas				
Rend. Presup	1.6				
Inicio	SEM 15				
Fin	SEM 30				
Semana	Rend Acumulado	% Aprendizaje	Avance por Hora	Rend Teórico	Avance Teórico
15	2.49	96%	0.40	2.490	0.402
16	2.39		0.42	2.380	0.420
17	2.28		0.44	2.318	0.431
18	2.18		0.46	2.276	0.439
19	2.14		0.47	2.246	0.445
20	2.14		0.47	2.216	0.451
21	2.16		0.46	2.196	0.455
22	2.21		0.45	2.176	0.460
23	2.19		0.46	2.161	0.463
24	2.19		0.46	2.147	0.466
25	2.17		0.46	2.133	0.469
26	2.14		0.47	2.119	0.472
27	2.13		0.47	2.109	0.474
28	2.10		0.48	2.099	0.476
29	2.10	0.48	2.090	0.479	
30	2.08	0.48	2.080	0.481	

Cuadro de rendimientos de la partida encofrado de Vigas (Fuente Propia)

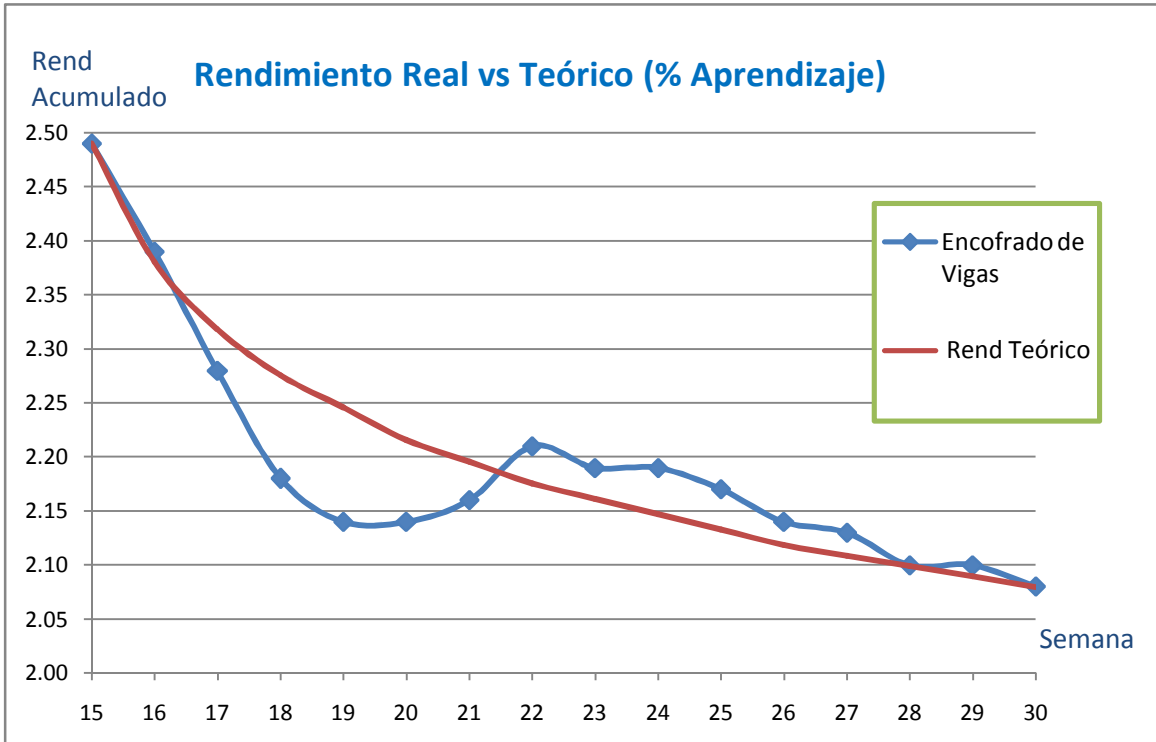


Grafico de Rendimientos Acumulados de la partida encofrado de Vigas (Fuente Propia)

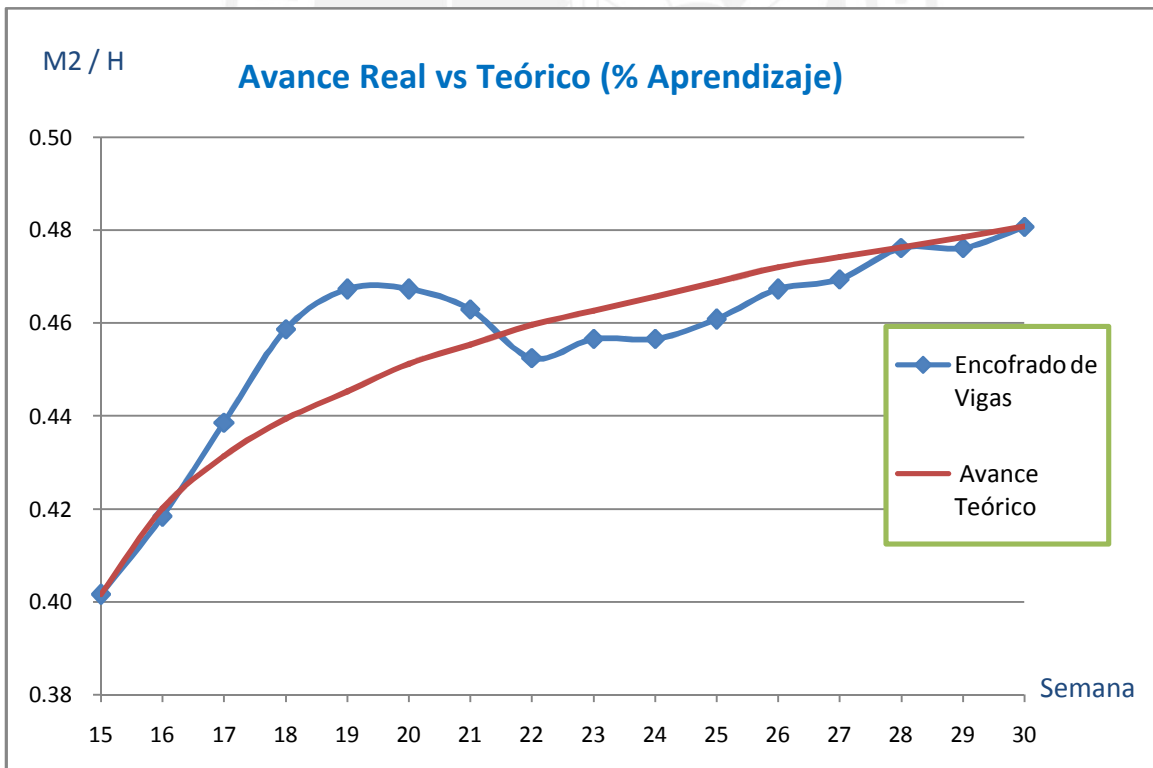


Grafico de avance diario de la partida encofrado de Vigas (Fuente Propia)

- Concreto

Partida	Concreto Armado				
Rend. Presup	0.72				
Inicio	SEM 13				
Fin	SEM 30				
Semana	Rend Acumulado	% Aprendizaje	Avance por Hora	Rend Teórico	Avance Teórico
13	1.04	92%	0.96	1.044	0.958
14	1.01		0.99	0.957	1.045
15	1.00		1.00	0.907	1.103
16	0.96		1.04	0.877	1.141
17	0.95		1.05	0.854	1.171
18	0.91		1.10	0.831	1.204
19	0.89		1.12	0.817	1.224
20	0.88		1.14	0.803	1.245
21	0.86		1.16	0.793	1.261
22	0.85		1.18	0.782	1.278
23	0.84		1.19	0.772	1.296
24	0.82		1.22	0.761	1.314
25	0.81		1.23	0.755	1.325
26	0.78		1.28	0.749	1.336
27	0.76		1.32	0.742	1.347
28	0.75		1.33	0.736	1.359
29	0.73		1.37	0.731	1.368
30	0.73		1.37	0.726	1.377

Cuadro de rendimientos de la partida Concreto Armado (Fuente Propia)

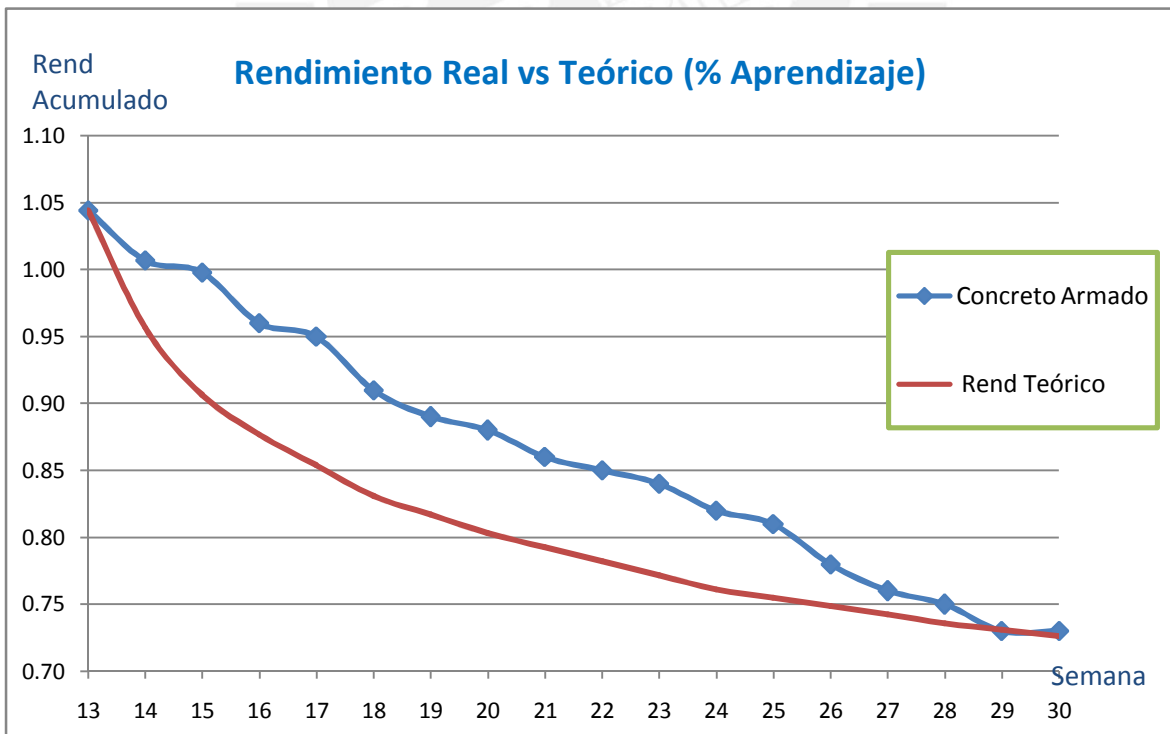


Grafico de Rendimientos Acumulados de la partida Concreto Armado (Fuente Propia)

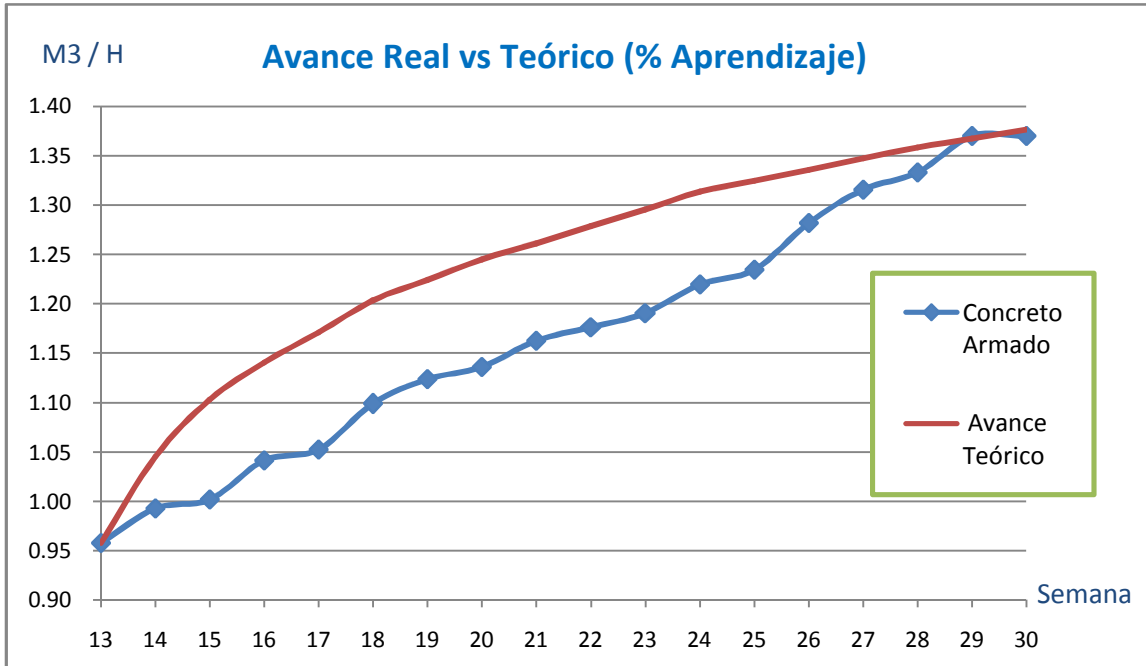


Grafico de avance diario de la partida Concreto Armado (Fuente Propia)

- **Tarrajeo**

Partida	Tarrajeo				
Rend. Presup	1.28				
Inicio	SEM 18				
Fin	SEM 32				
Semana	Rend Acumulado	% Aprendizaje	Avance por Hora	Rend Teórico	Avance Teórico
18	1.82	88%	0.55	1.820	0.549
19	1.59		0.63	1.596	0.627
20	1.41		0.71	1.468	0.681
21	1.21		0.83	1.400	0.714
22	1.11		0.90	1.339	0.747
23	1.07		0.93	1.287	0.777
24	1.06		0.94	1.258	0.795
25	1.06		0.94	1.228	0.815
26	1.07		0.93	1.201	0.833
27	1.07		0.93	1.174	0.852
28	1.08		0.93	1.152	0.868
29	1.08		0.93	1.129	0.886
30	1.10		0.91	1.116	0.896
31	1.10		0.91	1.103	0.907
32	1.09	0.92	1.090	0.918	

Cuadro de rendimientos de la partida Tarrajeo (Fuente Propia)

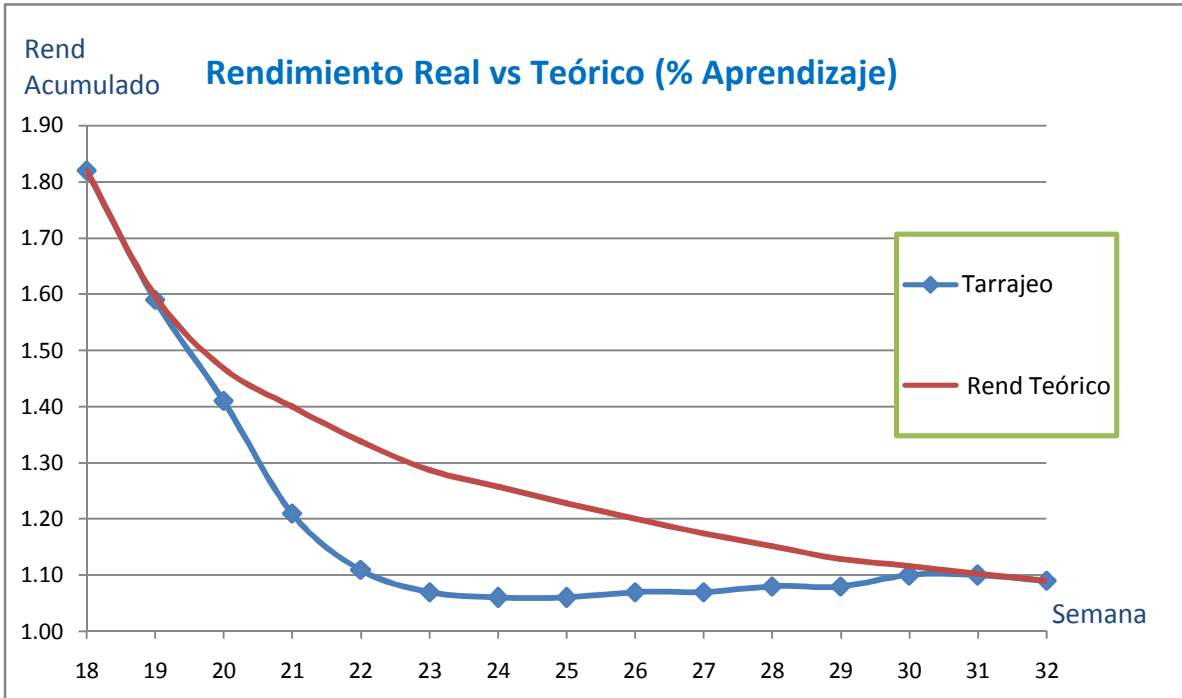


Gráfico de Rendimientos Acumulados de la partida Tarrajeo (Fuente Propia)

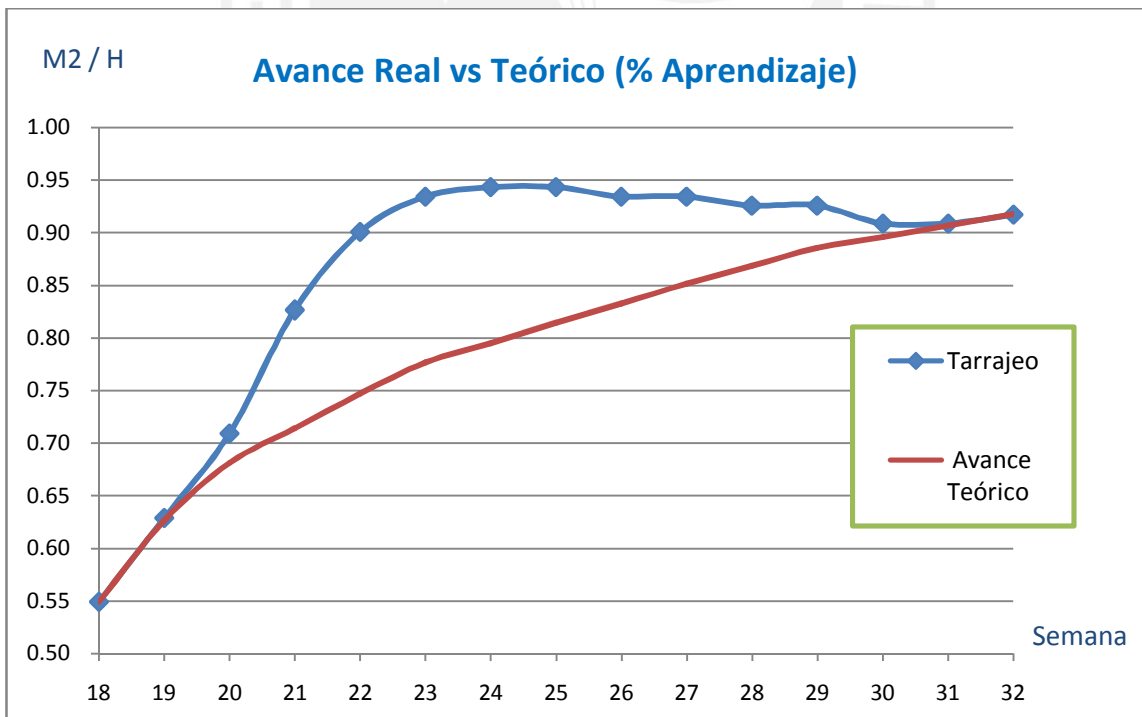


Gráfico de avance diario de la partida Tarrajeo (Fuente Propia)

ANEXO 4

CATALOGO DE RESTRICCIONES

Restricciones de las partidas analizadas (Fuente: Propia)

ACERO

RESTRICCIONES					
N°	Restricción	Etapa de ocurrencia			Categoria
		Inicio	Durante	Final	
1	Busqueda de Personal para la cuadrilla				MO
2	Enviar a Examen Medico Pre ocupacional				MO
3	Definir Personal que ingresara a laborar				MO
4	Tramitar seguro SCTR				DOC
5	Charla de Inducción general				SEG
6	Charla de inducción por cuadrillas				SEG
7	Pedido de Acero				MAT
8	Pedido de Alambre				MAT
9	Pedido de andamios				EQ
10	Pedido de amoladoras				EQ
11	Pedido de discos de corte				MAT
12	Establecer ubicación del banco de habilitación				HZT
13	Establecer ubicación de acopio de acero				HZT
14	Coordinar Llegada de material a obra (acero y alambre)				OTRO
15	Charlas preventivas de seguridad				SEG
16	Elaboración de ATS				SEG
17	Revisión de ATS				INS
18	Revisión de andamios				INS
19	Revisión de permisos de trabajo en altura				INS
20	Colocación de Linea de Vida				SEG
21	Entrega de Planos				DIS
22	Inspección de planos actualizados				INS
23	Consultas incompatibilidades				DIS
24	Establecer zona de pre-armado				HZT
25	Actualizar Layout				HZT
26	Entregar Programación semanal				OTRO
27	Renovación Mensual del SCTR				DOC
28	Coordinaciones con vecinos (Trabajos contiguos)				OTRO
29	Pedido de Separadores				MAT
30	Coordinar horarios de izaje con grúa				OTRO
31	Liberación actividades precedentes				INS
32	Habilitación de Acero				OTRO
33	Pedido Zizalla y dobladora eléctrica				EQ
34	Aprobación de adicionales previo a la ejecución				DOC
35	Programación para la utilización de grúa torre				OTRO

Catalogo de restricciones de la partida de habilitación y colocación de acero (Fuente: Propia)

ENCOFRADO

RESTRICCIONES					
N°	Restricción	Etapa de ocurrencia			Categoría
		Inicio	Durante	Final	
1	Busqueda de proveedores de Encofrado				SC
2	Solicitar cotizaciones				SC
3	Definir proveedor final				SC
4	Definir cantidad de encofrado a pedir				EQ
5	Busqueda de Personal para la cuadrilla				MO
6	Enviar a Examen Medico Pre ocupacional				MO
7	Definir Personal que ingresara a laborar				MO
8	Tramitar seguro SCTR				DOC
9	Charla de Inducción general				SEG
10	Charla de inducción por cuadrillas				SEG
11	Pedido inicial de encofrado				EQ
12	Coordinar transporte para recoger encofrado				SC
13	Establecer punto de acopio de encofrado				HZT
14	Pedido de aditivo desmoldante para encofrado				MAT
15	Pedido de rodillos para aplicar desmoldante				MAT
16	Pedido de encofrado				EQ
17	Devolucion de encofrado				EQ
18	Coordinar fechas de llegada de material (encofrado)				OTRO
19	Charlas preventivas de seguridad				SEG
20	Elaboración de ATS				SEG
21	Revisión de ATS				INS
22	Revisión de andamios				INS
23	Revisión de permisos de trabajo en altura				INS
24	Colocación de Linea de Vida				SEG
25	Entrega de Planos				DIS
26	Inspección de planos actualizados				INS
27	Consultas incompatibilidades				DIS
28	Establecer zona de pre-armado de paneles				HZT
29	Actualizar Layout				HZT
30	Entregar Programación semanal				OTRO
31	Limpiar encofrado para devolución				OTRO
32	Coordinar horarios de izaje con grúa				OTRO
33	Liberación actividades precedentes				INS
34	Ensayo de probetas de concreto para desencofrado				INS
35	Programación para la utilización de grúa torre				OTRO

Catalogo de restricciones de la partida de encofrado (Fuente: Propia)

VIGUETAS Y BOVEDILLAS

RESTRICCIONES					
N°	Restricción	Etapa de ocurrencia			Categoria
		Inicio	Durante	Final	
1	Busqueda de Personal para la cuadrilla				MO
2	Enviar a Examen Medico Pre ocupacional				MO
3	Definir Personal que ingresara a laborar				MO
4	Tramitar seguro SCTR				DOC
5	Charla de Inducción general				SEG
6	Charla de inducción por cuadrillas				SEG
7	Busqueda de proveedores de Viguetas y Bovediilas				SC
8	Solicitar cotizaciones				SC
9	Definir proveedor final				SC
10	Solicitar planos modificados				DIS
11	Definir cantidades a pedir				MAT
12	Definir cronograma de llegada de materiales				OTRO
13	Confirmar despachos de materiales				OTRO
14	Programar la descarga con la grúa				OTRO
15	Establecer ubicación de acopio				HZT
16	Charlas preventivas de seguridad				SEG
17	Elaboración de ATS				SEG
18	Revisión de ATS				INS
19	Revisión de andamios				INS
20	Revisión de permisos de trabajo en altura				INS
21	Colocación de Linea de Vida				SEG
22	Entrega de Planos				DIS
23	Inspección de planos actualizados				INS
24	Consultas incompatibilidades				DIS
25	Actualizar Layout				OTRO
26	Entregar Programación semanal				OTRO
27	Coordinar horarios de izaje con grúa				OTRO
28	Liberación actividades precedentes				INS
29	Programación para la utilización de grúa torre				OTRO

Catalogo de restricciones de la partida de colocación de viguetas y bovedillas Fuente: Propia)

CONCRETO


RESTRICCIONES					
Nº	Restricción	Etapa de ocurrencia			Categoria
		Inicio	Durante	Final	
1	Busqueda de Personal para la cuadrilla				MO
2	Enviar a Examen Medico Pre ocupacional				MO
3	Definir Personal que ingresara a laborar				MO
4	Tramitar seguro SCTR				DOC
5	Charla de Inducción general				SEG
6	Charla de inducción por cuadrillas				SEG
7	Analizar proveedores de Concreto				OTRO
8	Definir proveedor				SC
9	Definir Tipos de concreto a usar				MAT
10	Definir Cantidades de concreto a usar				MAT
11	Realizar Programa estimado de vaciados de obra				OTRO
12	Realizar Programa mensual de vaciados de obra				OTRO
13	Definir volumen diario a vaciar				OTRO
14	Realizar el pedido diario de concreto				OTRO
15	Analizar resultados de ensayos de probetas				OTRO
16	Enviar a ensayar probetas				OTRO
17	Pedido de Vibradoras				EQ
18	Pedido de reglas de aluminio				EQ
19	Pedido de accesorios para la Grúa (Vaciados con Chute)				EQ
20	Solicitar Montante de tuberías				SC
21	Inspecciones de Seguridad (equipos)				SEG
22	Charlas preventivas de seguridad				SEG
23	Elaboración de ATS				SEG
24	Revisión de ATS				INS
25	Revisión de andamios				INS
26	Revisión de permisos de trabajo en altura				INS
27	Colocación de Línea de Vida				SEG
28	Entregar Programación semanal				OTRO
29	Pedido de aditivo Curador				MAT
30	Pedido de equipo para aplicar Curador				EQ
31	Liberación actividades precedentes				HZT

Catalogo de restricciones de la partida de vaciado de concreto (Fuente: Propia)

ANEXO 5

PROCEDIMIENTO DE SECTORIZACION

Flujo del procedimiento de sectorización (Fuente: Edifica)

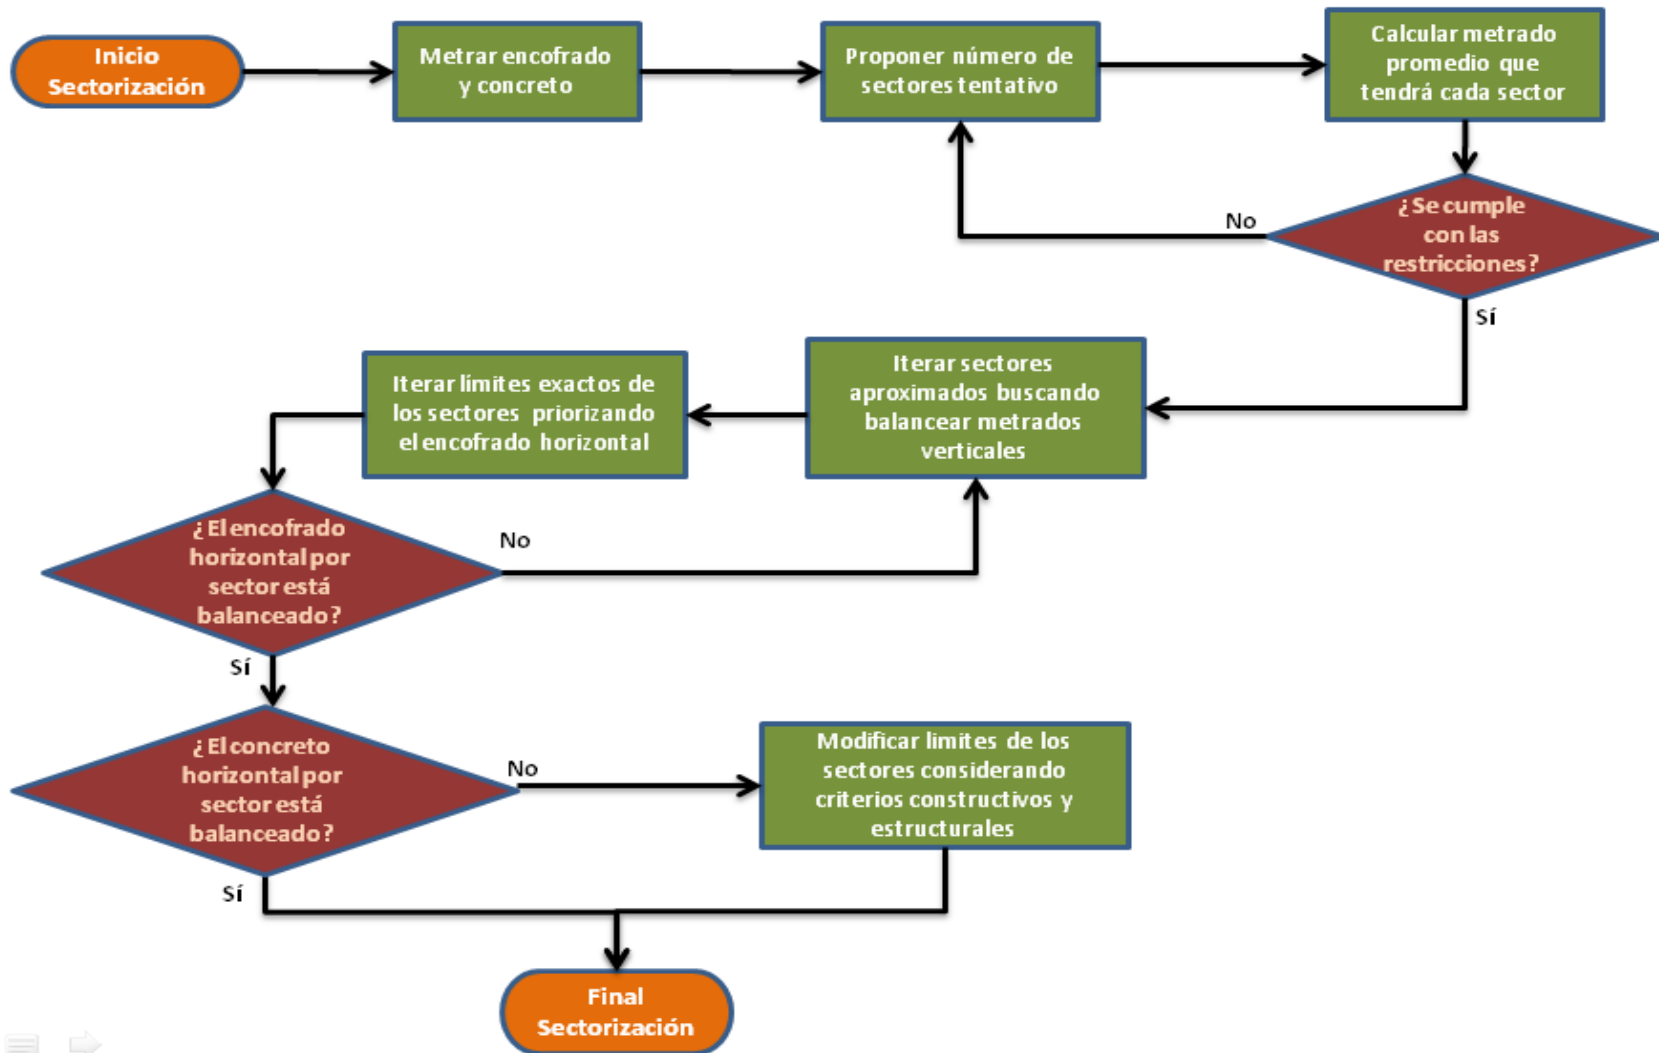

Flujo de procedimiento de sectorización (Fuente: Edifica)

ANEXO 6

LOOKAHEAD SEMANAL

Proyecto Barranco 360 (Fuente: Edifica)

		LOOKAHEAD PLANNING																				EDIFICA									
NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:										FECHA:					UBICACION:														
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC										sábado, 21 de enero de 2012					AV. SAN MARTIN 625														
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 8					SEMANA 9					SEMANA 10					SEMANA 11												
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D							
				23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION																														
	EXCAVACION MASIVA 2DO ANILLO	m3		X	X						X	X	X								X	X				X	X	X			
	EXCAVACION MASIVA 3ER ANILLO	m3																													
	MUROS ANCLADOS (2DO Y 3ER ANILLO)																														
	PERFORACION DE ANCLAJES CON MAQUINA	ML				2.02-2.04-2.47	2.41-2.38-2.37-2.34	2.30-2.32-1.25-1.22-1.28	1.08-1.11-1.14-1.17-2.44-2.46	2.38-2.40-2.05	2.49-2.51-1.26-1.29-2.48	1.26-1.29-2.48	2.50-2.52-1.27-2.01-2.10	2.14-2.18-3.44	3.46-2.06-3.04	2.16-2.20-3.44	3.37-3.39-3.42-3.45	3.47-3.50-3.01	3.03-3.05-3.01	3.33-3.36-3.32-3.18-3.14	3.53-3.30-3.01	3.10-3.06-4.02-4.04	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48	4.50-4.52-4.05-4.39-4.41	4.01-4.03-4.05-4.39-4.41	4.43-4.45-4.47-4.49	4.38-4.51-4.53	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48			
	INYECCION DE CONCRETO	ML				2.02-2.04-2.47	2.41-2.38-2.37-2.34	2.30-2.32-1.25-1.22-1.28	1.08-1.11-1.14-1.17-2.44-2.46	2.38-2.40-2.05	2.49-2.51-1.26-1.29-2.48	1.26-1.29-2.48	2.50-2.52-1.27-2.01-2.10	2.14-2.18-3.44	3.46-2.06-3.04	2.16-2.20-3.44	3.37-3.39-3.42-3.45	3.47-3.50-3.01	3.03-3.05-3.01	3.33-3.36-3.32-3.18-3.14	3.53-3.30-3.01	3.10-3.06-4.02-4.04	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48	4.50-4.52-4.05-4.39-4.41	4.01-4.03-4.05-4.39-4.41	4.43-4.45-4.47-4.49	4.38-4.51-4.53	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48			
	EXCAVACION DE BANQUETAS CON MAQUINA	M3		2.30-1.14-1.17-1.25-2.44	1.08-1.11-1.14-1.17-2.44-2.46	2.38-2.40-2.05	2.49-2.51-1.26-1.29-2.48	1.26-1.29-2.48	2.50-2.52-1.27-2.01-2.10	2.14-2.18-3.44	3.46-2.06-3.04	2.16-2.20-3.44	3.37-3.39-3.42-3.45	3.47-3.50-3.01	3.03-3.05-3.01	3.33-3.36-3.32-3.18-3.14	3.53-3.30-3.01	3.10-3.06-4.02-4.04	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48	4.50-4.52-4.05-4.39-4.41	4.01-4.03-4.05-4.39-4.41	4.43-4.45-4.47-4.49	4.38-4.51-4.53	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48							
	PERFILADO DE BANQUETA (MANUAL) Y LECHADA DE CEMENTO	M2		2.30-1.14-1.17-1.25-2.44	1.08-1.11-1.14-1.17-2.44-2.46	2.38-2.40-2.05	2.49-2.51-1.26-1.29-2.48	1.26-1.29-2.48	2.50-2.52-1.27-2.01-2.10	2.14-2.18-3.44	3.46-2.06-3.04	2.16-2.20-3.44	3.37-3.39-3.42-3.45	3.47-3.50-3.01	3.03-3.05-3.01	3.33-3.36-3.32-3.18-3.14	3.53-3.30-3.01	3.10-3.06-4.02-4.04	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48	4.50-4.52-4.05-4.39-4.41	4.01-4.03-4.05-4.39-4.41	4.43-4.45-4.47-4.49	4.38-4.51-4.53	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48							
	COLOCACION DE ACERO	UND		2.41-2.39-2.37-1.25-1.22-2.44	1.08-1.11-1.14-1.17-2.44-2.46	2.38-2.40-2.05	2.49-2.51-1.26-1.29-2.48	1.26-1.29-2.48	2.50-2.52-1.27-2.01-2.10	2.14-2.18-3.44	3.46-2.06-3.04	2.16-2.20-3.44	3.37-3.39-3.42-3.45	3.47-3.50-3.01	3.03-3.05-3.01	3.33-3.36-3.32-3.18-3.14	3.53-3.30-3.01	3.10-3.06-4.02-4.04	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48	4.50-4.52-4.05-4.39-4.41	4.01-4.03-4.05-4.39-4.41	4.43-4.45-4.47-4.49	4.38-4.51-4.53	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48							
	EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA PARA EMPALMES DE ACERO	UND		2.41-2.39-2.37-1.25-1.22-2.44	1.08-1.11-1.14-1.17-2.44-2.46	2.38-2.40-2.05	2.49-2.51-1.26-1.29-2.48	1.26-1.29-2.48	2.50-2.52-1.27-2.01-2.10	2.14-2.18-3.44	3.46-2.06-3.04	2.16-2.20-3.44	3.37-3.39-3.42-3.45	3.47-3.50-3.01	3.03-3.05-3.01	3.33-3.36-3.32-3.18-3.14	3.53-3.30-3.01	3.10-3.06-4.02-4.04	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48	4.50-4.52-4.05-4.39-4.41	4.01-4.03-4.05-4.39-4.41	4.43-4.45-4.47-4.49	4.38-4.51-4.53	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48							
	ENCOFRADO DE MURO	M2		2.02-2.04-2.47	2.41-2.39-2.37-1.25-1.22-2.44-2.46	2.38-2.40-2.05	2.49-2.51-1.26-1.29-2.48	1.26-1.29-2.48	2.50-2.52-1.27-2.01-2.10	2.14-2.18-3.44	3.46-2.06-3.04	2.16-2.20-3.44	3.37-3.39-3.42-3.45	3.47-3.50-3.01	3.03-3.05-3.01	3.33-3.36-3.32-3.18-3.14	3.53-3.30-3.01	3.10-3.06-4.02-4.04	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48	4.50-4.52-4.05-4.39-4.41	4.01-4.03-4.05-4.39-4.41	4.43-4.45-4.47-4.49	4.38-4.51-4.53	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48							
	COLOCACION DE CONTRAFUERTE PARA ENCOFRADO	UND		2.02-2.04-2.47	2.41-2.39-2.37-1.25-1.22-2.44-2.46	2.38-2.40-2.05	2.49-2.51-1.26-1.29-2.48	1.26-1.29-2.48	2.50-2.52-1.27-2.01-2.10	2.14-2.18-3.44	3.46-2.06-3.04	2.16-2.20-3.44	3.37-3.39-3.42-3.45	3.47-3.50-3.01	3.03-3.05-3.01	3.33-3.36-3.32-3.18-3.14	3.53-3.30-3.01	3.10-3.06-4.02-4.04	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48	4.50-4.52-4.05-4.39-4.41	4.01-4.03-4.05-4.39-4.41	4.43-4.45-4.47-4.49	4.38-4.51-4.53	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48							
	VACIADO DE MURO	M3		2.02-2.04-2.47	2.41-2.39-2.37-1.25-1.22-2.44-2.46	2.38-2.40-2.05	2.49-2.51-1.26-1.29-2.48	1.26-1.29-2.48	2.50-2.52-1.27-2.01-2.10	2.14-2.18-3.44	3.46-2.06-3.04	2.16-2.20-3.44	3.37-3.39-3.42-3.45	3.47-3.50-3.01	3.03-3.05-3.01	3.33-3.36-3.32-3.18-3.14	3.53-3.30-3.01	3.10-3.06-4.02-4.04	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48	4.50-4.52-4.05-4.39-4.41	4.01-4.03-4.05-4.39-4.41	4.43-4.45-4.47-4.49	4.38-4.51-4.53	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48							
	DESENCOFADO	M2		2.02-2.04-2.47	2.41-2.39-2.37-1.25-1.22-2.44-2.46	2.38-2.40-2.05	2.49-2.51-1.26-1.29-2.48	1.26-1.29-2.48	2.50-2.52-1.27-2.01-2.10	2.14-2.18-3.44	3.46-2.06-3.04	2.16-2.20-3.44	3.37-3.39-3.42-3.45	3.47-3.50-3.01	3.03-3.05-3.01	3.33-3.36-3.32-3.18-3.14	3.53-3.30-3.01	3.10-3.06-4.02-4.04	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48	4.50-4.52-4.05-4.39-4.41	4.01-4.03-4.05-4.39-4.41	4.43-4.45-4.47-4.49	4.38-4.51-4.53	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48							
	TENSADO DE ANCLAJES DE MUROS	UND		2.02-2.04-2.47	2.41-2.39-2.37-1.25-1.22-2.44-2.46	2.38-2.40-2.05	2.49-2.51-1.26-1.29-2.48	1.26-1.29-2.48	2.50-2.52-1.27-2.01-2.10	2.14-2.18-3.44	3.46-2.06-3.04	2.16-2.20-3.44	3.37-3.39-3.42-3.45	3.47-3.50-3.01	3.03-3.05-3.01	3.33-3.36-3.32-3.18-3.14	3.53-3.30-3.01	3.10-3.06-4.02-4.04	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48	4.50-4.52-4.05-4.39-4.41	4.01-4.03-4.05-4.39-4.41	4.43-4.45-4.47-4.49	4.38-4.51-4.53	4.40-4.42-4.46-4.44-4.48							

Lookahead de obra Semana N° 7 (Fuente: Edifica)

		LOOKAHEAD PLANNING																								EDIFICA					
NOMBRE DE PROYECTO:				PROPIETARIO:										FECHA:					UBICACION:												
BARRANCO 360				EDIFICA CONSTRUCTORES SAC										sábado, 28 de enero de 2012					AV. SAN MARTIN 625												
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 9					SEMANA 10					SEMANA 11					SEMANA 12												
				L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y		
				06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02
	EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION																														
	EXCAVACION MASIVA 2DO ANILLO	m3																													
	EXCAVACION MASIVA 3ER ANILLO	m3																													
	MUROS ANCLADOS (2DO Y 3ER ANILLO)																														
	PERFORACION DE ANCLAJES CON MAQUINA	ML		3.42	2.10-2.14-2.18	2.29-3.06-3.49-3.51	302			3.30-3.32	4.38-4.40	3.08-3.12	4.43-4.45																		
	INYECCION DE CONCRETO	ML		3.44	2.22-2.26-3.39	3.53-2.31-3.01-3.03	304			3.34-3.36	4.42-4.44	3.31-4.39-4.41	4.47-4.49-4.51	4.50-4.52																	
	EXCAVACION DE BANQUETAS CON MAQUINA	M3		4.38	3.08-3.12-3.31	4.43-4.45	4.50-4.52																								
	PERFILADO DE BANQUETA (MANUAL) Y LECHADA DE CEMENTO	M2		3.30	4.38-4.40	3.12-3.31	4.43-4.45	4.50-4.52																							
	EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA PARA EMPALMES DE ACERO	UND		3.02	3.04-3.10	4.38-3.08-3.12	4.43-4.45	4.50-4.52																							
	COLOCACION DE ACERO	UND		2.29	3.06-3.49	3.02-3.04-3.10-3.14	4.38-4.40	3.08		4.43-4.45																					
	ENCOFRADO DE MURO	M2		2.10	2.14-2.18	2.29-3.06-3.49-3.51	3.02-3.04-3.10	4.38-4.40	3.08-3.12	4.43-4.45	4.50-4.52																				
	COLOCACION DE CONTRAFUERTE PARA ENCOFRADO	UND		2.22	2.26-3.39	3.53-2.31-3.01-3.03	3.14-3.30-3.32	4.42-4.44	3.31-4.39	4.47-4.49	4.50-4.52																				
	VACIADO DE MURO	M3		2.06	2.10-2.14	2.18-2.22	3.06-3.08	3.10-3.14	4.42-4.44	3.31-4.39-4.41	4.47-4.49-4.51	4.50-4.52																			
	DESENCOFRADO	M2		3.35	2.06-2.10-2.14	2.18-2.22	3.06-3.08	3.10-3.14	4.42-4.44	4.39-4.41	4.49-4.51-4.53	4.52																			
	TENSADO DE ANCLAJES DE MUROS	UND		1.10	1.14-1.17-1.20	1.27-1.29-2.01-2.30	2.29-2.24-3.33	2.06-3.38-3.40-3.42	2.10-2.14-2.18-2.22-2.26-3.39	2.29-3.06-3.49-3.51	2.30-3.12-3.31	4.43-4.45-4.47-4.50																			
	EXCAVACION DE SUBCIMIENTO	M3		3.02	4.38-3.08-3.12-3.31	4.43-4.45	4.50-4.52																								
	EXCAVACION DE CIMENTOS ARMADOS	M3		3.04	4.40-3.12-3.31	4.47-4.49	4.50-4.52																								
	SOLDADO EN CIMENTOS ARMADOS	M2		3.02	4.38-3.08-3.12	4.43-4.45	4.50-4.52																								
	ACERO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CIMENTOS ARMADOS	UND		2.29	3.02	4.38-4.40	3.08-3.12	4.43-4.45	4.47-4.49	4.50-4.52																					
	CONCRETO EN CIMENTOS ARMADOS	M3		2.22	2.26	3.02-3.04	4.38-4.40	3.08-3.12	4.43-4.45	4.47-4.49	4.50-4.52																				
	EXCAVACION DE ZAPATAS	M3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	SOLDADO EN ZAPATAS	M2				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	ACERO EN ZAPATAS (HORIZONTAL Y VERTICAL)	UND				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	CONCRETO EN ZAPATAS	M3					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Lookahead de obra Semana N° 8 (Fuente: Edifica)



NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:		FECHA:		UBICACION:																									
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC		sábado, 04 de febrero de 2012		AV. SAN MARTIN 625																									
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrad o Total	SEMANA 10							SEMANA 11							SEMANA 12							SEMANA 13						
				L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	
	EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION										X	X																			
	EXCAVACION MASIVA 3ER ANILLO	m3		X	X																										
	MUROS ANCLADOS (2DO Y 3ER ANILLO)																														
	PERFORACION DE ANCLAJES CON MAQUINA	ML		2.48-2.52	c3.38-3.37	2.22-2.26	4.01-4.05	4.45-4.51	4.43-4.49	4.39-4.45	3.08-3.12	3.30-3.32	4.38-4.40	4.42-4.44																	
	INYECCION DE CONCRETO	ML		2.48-2.52	c3.38-3.37	2.22-2.26	4.01-4.05	4.45-4.51	4.43-4.49	4.39-4.45	3.08-3.12	3.30-3.32	4.38-4.40	4.42-4.44																	
	EXCAVACION DE BANQUETAS CON MAQUINA	M3		3.08-3.12	3.30-3.32	4.38-4.40																									
	PERFILADO DE BANQUETA (MANUAL) Y LECHADA DE CEMEN	M2		3.31-3.33	3.08-3.12	3.32-4.40																									
	EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA PARA EMPALMES DE ACE	UND		4.45-4.49	4.41-4.45	3.08-3.12	4.38-4.40	4.42-4.44																							
	COLOCACION DE ACERO	UND		2.22-2.26	4.01-4.05	4.45-4.51	3.32-3.36	3.30-3.32	4.40-4.42	4.38-4.40																					
	ENCOFRADO DE MURO	M2		c3.38-3.37	3.34-3.36	2.22-2.26	4.01-4.05	4.45-4.51	4.43-4.49	4.39-4.45	3.08-3.12	3.30-3.32	4.38-4.40	4.42-4.44																	
	COLOCACION DE CONTRAFUERTE PARA ENCOFRADO	UND		c3.38-3.37	3.34-3.36	2.22-2.26	4.01-4.05	4.45-4.51	4.43-4.49	4.39-4.45	3.08-3.12	3.30-3.32	4.38-4.40	4.42-4.44																	
	VACIADO DE MURO	M3		2.48-2.52	2.44-2.46	3.04-3.06	3.31-3.33	4.45-4.51	4.43-4.49	4.39-4.45	3.08-3.12	3.30-3.32	4.38-4.40	4.42-4.44																	
	DESENCOFRADO	M2		2.40-2.44	2.42-2.46	c3.38-3.37	3.34-3.36	2.22-2.26	4.01-4.05	4.45-4.51	4.43-4.49	4.39-4.45	3.08-3.12	3.30-3.32	4.38-4.40	4.42-4.44															
	TENSADO DE ANCLAJES DE MUROS	UND		1.10-1.14	1.17-1.23	3.03-3.04	2.22-2.26	2.53-2.51	2.49-2.47	2.49-2.47	2.49-2.53	c3.38-3.37	3.34-3.36	2.22-2.26	4.01-4.05	4.45-4.51	4.43-4.49	4.39-4.45	3.08-3.12	3.30-3.32	4.38-4.40	4.42-4.44									
	EXCAVACION DE CIMENTOS ARMADOS	M3		2.26-4.01	4.41-4.45	3.12-1.16	3.30-3.32	4.40-4.42	4.42-4.44																						
	SOLLADO EN CIMENTOS ARMADOS	M2		c3.38-3.37	3.34-3.36	2.22-2.26	4.01-4.05	4.45-4.51	4.43-4.49	4.39-4.45	3.08-3.12	3.30-3.32	4.38-4.40	4.42-4.44																	
	ACERO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CIMENTOS ARMADO	UND		c3.38-3.37	3.34-3.36	2.22-2.26	4.01-4.05	4.45-4.51	4.43-4.49	4.39-4.45	3.08-3.12	3.30-3.32	4.38-4.40	4.42-4.44																	
	ENCOFRADO EN CIMENTOS ARMADOS	UND		c3.38-3.37	3.34-3.36	2.22-2.26	4.01-4.05	4.45-4.51	4.43-4.49	4.39-4.45	3.08-3.12	3.30-3.32	4.38-4.40	4.42-4.44																	
	CONCRETO EN CIMENTOS ARMADOS	M3		c3.38-3.37	3.34-3.36	2.22-2.26	4.01-4.05	4.45-4.51	4.43-4.49	4.39-4.45	3.08-3.12	3.30-3.32	4.38-4.40	4.42-4.44																	
	EXCAVACION DE ZAPATAS	M3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	SOLLADO EN ZAPATAS	M2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	ACERO EN ZAPATAS (HORIZONTAL Y VERTICAL)	UND		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	CONCRETO EN ZAPATAS	M3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Lookahead de obra Semana N° 9 (Fuente: Edifica)



NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:		FECHA:		UBICACION:																									
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC		sábado, 11 de febrero de 2012		AV. SAN MARTIN 625																									
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrao Total	SEMANA 11					SEMANA 12					SEMANA 13					SEMANA 14												
				L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION																														
	EXCAVACION MASIVA 3ER ANILLO	m3		X	X						X	X																			
	MUROS ANCLADOS (2DO Y 3ER ANILLO)																														
	PERFORACION DE ANCLAJES CON MAQUINA	ML		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X															
	INYECCION DE CONCRETO	ML		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X															
	EXCAVACION DE BANQUETAS CON MAQUINA	M3		4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42					4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42																		
	PERFILADO DE BANQUETA (MANUAL) Y LECHADA DE CEMENTO	M2		4.53-4.49-4.51	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-4.52	3.33-			4.40-4.42	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42			4.38-4.40-														
	EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA PARA EMPALMES DE ACER	UND		3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	4.52	4.53-			3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42			4.42														
	COLOCACION DE ACERO	M2		3.06-3.12-3.18-4.01-4.03-4.05	3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.52	4.53-			4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42		4.42														
	ENCOFRADO DE MURO	UND		2.29-3.10-3.163.30-3.38	3.06-3.12-3.18-4.01-4.03-4.05	3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.52	4.53-			4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42		4.42													
	COLOCACION DE CONTRAFUERTE PARA ENCOFRADO	UND		2.29-3.10-3.163.30-3.38	3.06-3.12-3.18-4.01-4.03-4.05	3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.52	4.53-			4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42		4.42													
	VACIADO DE MURO	M3		3.20-3.39	2.29-3.10-3.16-3.30	3.06-3.12-3.18-4.01-4.03-4.05	3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.52	4.53-			3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	3.33-3.35-	4.39-4.41-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	
	DESENCOFRADO	M2		2.22-2.28-3.08-3.14-	3.20-3.39	2.29-3.10-3.16-3.30	3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.52	4.53-			3.06-3.10-3.18-4.01-4.03-4.05	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	3.33-3.35-	4.39-4.41-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	
	TENSADO DE ANCLAJES DE MUROS	UND				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	EXCAVACION DE SUBCIMENTOS	M3		3.06-3.12-3.18-	3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.52	4.53-			4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42		4.42														
	VACIADO DE SUBCIMENTOS	M3		3.06-3.12-3.18-	3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.52	4.53-			4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42		4.42														
	EXCAVACION DE CIMENTOS ARMADOS	M3		2.29-3.10-3.16-3.30-	3.06-3.12-3.18-4.01-4.03-4.05	3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.52	4.53-			4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42		4.42													
	SOLIDADO EN CIMENTOS ARMADOS	M2		2.29-3.10-3.16-3.30-	3.06-3.12-3.18-4.01-4.03-4.05	3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.52	4.53-			4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42		4.42													
	ACERO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CIMENTOS ARMADOS	UND		2.29-3.10-3.16-3.30-	3.06-3.12-3.18-4.01-4.03-4.05	3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.52	4.53-			4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42	4.39-4.41-4.43-4.45-4.47	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	3.31-3.33-3.35-4.38-4.40-4.42		4.42													
	ENCOFRADO EN CIMENTOS ARMADOS	M2		3.20-3.39	2.29-3.10-3.16-3.30-	3.06-3.12-3.18-4.01-4.03-4.05	3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.52	4.53-			3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	3.33-3.35-	4.39-4.41-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	
	CONCRETO EN CIMENTOS ARMADOS	M3		3.20-3.39	2.29-3.10-3.16-3.30-	3.06-3.12-3.18-4.01-4.03-4.05	3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.52	4.53-			3.32-3.34-4.49-4.51-4.53	4.44-4.46-4.48-4.50-4.52	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	3.33-3.35-	4.39-4.41-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	4.44-	
	EXCAVACION DE ZAPATAS	M3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	SOLIDADO EN ZAPATAS	M2																													
	ACERO EN ZAPATAS (HORIZONTAL Y VERTICAL)	UND																													
	CONCRETO EN ZAPATAS	M3																													

Lookahead de obra Semana N° 10 (Fuente: Edifica)



NOMBRE DE PROYECTO: BARRANCO 360				PROPIETARIO: EDIFICA CONSTRUCTORES SAC													FECHA: sábado, 10 de febrero de 2012					UBICACION: AV. SAN MARTIN 625									
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 12							SEMANA 13							SEMANA 14							SEMANA 15						
				L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D
	EXCAVACION MASIVA Y ELIMINACION																														
	EXCAVACION Y ELIMINACION MASIVA 3ER ANILLO	m3		X	X	X																									
	MUROS ANCLADOS (2DO Y 3ER ANILLO)																														
	EXCAVACION DE BANQUETAS CON MAQUINA	M3			4.46-4.47-4.49		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49			4.45-4.50																			
	PERFILADO DE BANQUETA (MANUAL) Y LECHADA DE CEMENT	M2		2.22-3.12-3.20-4.43		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50																			
	EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA PARA EMPALMES DE ACEF	UND		2.22-3.12-3.20		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50																			
	COLOCACION DE ACEFO	UND		3.16-3.184.02		2.22-3.12-3.20-4.43		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50																	
	ENCOFRADO DE MURO	M2		3.16-3.184.02-4.03		2.22-3.12-3.20-4.43		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50																	
	COLOCACION DE CONTRAFUERTE PARA ENCOFRADO	UND		3.16-3.184.02-4.03		2.22-3.12-3.20-4.43		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50																	
	VACIADO DE MURO	M3		2.24-2.26-3.16-3.18		3.16-3.184.02-4.03		2.22-3.12-3.20-4.43-4.44		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50															
	DESENCOFRADO	M2		3.31-3.33-3.36-4.46		2.24-2.26-3.16-3.18		3.16-3.18-4.02-4.03		2.22-3.12-3.20-4.43		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50																	
	EXCAVACION DE SUBCIMENTOS	M3		2.22-3.12-3.20-4.43		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50																			
	VACIADO DE SUBCIMENTOS	M3		2.22-3.12-3.20		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50																			
	EXCAVACION DE CIMENTOS ARMADOS	M3																													
	SOLADO EN CIMENTOS ARMADOS	M2		2.22-3.12-3.20		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50																			
	ACEFO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CIMENTOS ARMADOS	UND		3.16-3.184.02		2.22-3.12-3.20-4.43		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50																	
	ENCOFRADO EN CIMENTOS ARMADOS			3.16-3.184.02-4.03		2.22-3.12-3.20-4.43		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50																	
	CONCRETO EN CIMENTOS ARMADOS	M3		3.16-3.184.02-4.03		2.22-3.12-3.20-4.43		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50		4.46-4.47-4.49-4.51		4.45-4.50																	
	EXCAVACION DE ZAPATAS	M3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	SOLADO EN ZAPATAS	M2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	ACEFO EN ZAPATAS (HORIZONTAL Y VERTICAL)	UND		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	CONCRETO EN ZAPATAS	M3		Z-C04-PL02		Z-PL14-C11-C12		Z-C10-C18		Z-C10-C18		Z-CTO DE BOMBAS		Z-CISTERNA		Z-RAMPA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Lookahead de obra Semana N° 11 (Fuente: Edifica)

		LOOKAHEAD PLANNING																												EDIFICA	
NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:										FECHA:								UBICACION:											
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC										sábado, 25 de febrero de 2012								AV. SAN MARTIN 625											
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 13							SEMANA 14							SEMANA 15							SEMANA 16						
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
				05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01
	MUROS ANCLADOS (3ER ANILLO), CISTERNA Y ZAPATAS-CIMENTOS																														
	VACIADO DE MURO	M3	2.24																												
	DESENCOFRADO	M2	2.22-2.25	2.24																											
	PERFILADO DE CISTERNA	M2	X	X	X																										
	EXCAVACIÓN DE LUÑAS	M3				X	X		X																						
	SOLIDADO EN CISTERNA	M2																													
	ACERO DE CISTERNA (LADOS Y BASE)	GLB	CISTERNA	CISTERNA																											
	ENCOFRADO DE CISTERNA	M2				CISTERNA	CISTERNA							X																	
	VACIADO DE CISTERNA	M3									CISTERNA																				
	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA	M2									CISTERNA	CISTERNA																			
	ENCOFRADO DE TAPA DE CISTERNA																CISTERNA	CISTERNA													
	ACERO EN TAPA DE CISTERNA																	CISTERNA													
	CONCRETO EN TAPA DE CISTERNA																	CISTERNA													
	EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
	SOLIDADO EN ZAPATAS	M2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
	ACERO EN ZAPATAS (HORIZONTAL Y VERTICAL)	UND	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
	ENCOFRADO DE ZAPATAS	M2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
	CONCRETO EN ZAPATAS	M3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
	SUBESTRUCTURA																														
	ACERO DE VERTICALES										S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E						
	ENCOFRADO DE VERTICALES										S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D							
	CONCRETO DE VERTICALES										S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D							
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS											S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C							
	ACERO DE VIGAS											S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C							
	COLOCACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS											S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B								
	COLOCACIÓN DE LADRILLO BOVEDILLA											S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B								
	COLOCACIÓN DE I.I.S.S. Y I.I.E.E.											S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B								
	CONCRETO DE LOSA												S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A								

Lookahead de obra Semana N° 12 (Fuente: Edifica)



NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:		FECHA:		UBICACION:																									
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC		sábado, 03 de marzo de 2012		AV. SAN MARTIN 625																									
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 14							SEMANA 15							SEMANA 16							SEMANA 17						
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08
	CISTERNA Y ZAPATAS-CMIENTOS																														
	SOLADO EN CISTERNA	M2																													
	ACERO DE CISTERNA (LADOS Y BASE)	GLB																													
	ENCOFRADO DE CISTERNA	M2																													
	VACIADO DE CISTERNA	M3																													
	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA	M2																													
	ENCOFRADO DE TAPA DE CISTERNA																														
	ACERO EN TAPA DE CISTERNA																														
	CONCRETO EN TAPA DE CISTERNA																														
	EXCAVACION DE ZAPATAS	M3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
	SOLADO EN ZAPATAS	M2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
	ACERO EN ZAPATAS (HORIZONTAL Y VERTICAL)	UND		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
	ENCOFRADO DE ZAPATAS	M2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
	CONCRETO EN ZAPATAS	M3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
	SUBESTRUCTURA																														
	ACERO DE VERTICALES	KG		S3A	S3B	S3C	S3D	S3E			S2A	S2B	S2C	S2D	S2E		S1A	S1B	S1C	S1D	S1E		1A	1B	1C	1D	2A				
	ENCOFRADO DE VERTICALES	M2		S3A	S3B	S3C	S3D				S3E	S2A	S2B	S2C	S2D		S2E	S1A	S1B	S1C	S1D		S1E	1A	1B	1C	1D				
	CONCRETO DE VERTICALES	M3		S3A	S3B	S3C	S3D				S3E	S2A	S2B	S2C	S2D		S2E	S1A	S1B	S1C	S1D		S1E	1A	1B	1C	1D				
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS	M2			S3A	S3B	S3C				S3D	S3E	S2A	S2B	S2C		S2D	S2E	S1A	S1B	S1C		S1D	S1E	1A	1B	1C				
	ACERO DE VIGAS	KG			S3A	S3B	S3C				S3D	S3E	S2A	S2B	S2C		S2D	S2E	S1A	S1B	S1C		S1D	S1E	1A	1B	1C				
	COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS	M2			S3A	S3B					S3C	S3D	S3E	S2A	S2B		S2C	S2D	S2E	S1A	S1B		S1C	S1D	S1E	1A	1B				
	COLOCACION DE LADRILLO BOVEDILLA	M2			S3A	S3B					S3C	S3D	S3E	S2A	S2B		S2C	S2D	S2E	S1A	S1B		S1C	S1D	S1E	1A	1B				
	COLOCACION DE HISS. Y HIEE.	GLB			S3A	S3B					S3C	S3D	S3E	S2A	S2B		S2C	S2D	S2E	S1A	S1B		S1C	S1D	S1E	1A	1B				
	CONCRETO DE LOSA	M3				S3A					S3B	S3C	S3D	S3E	S2A		S2B	S2C	S2D	S2E	S1A		S1B	S1C	S1D	S1E	1A				

Lookahead de obra Semana N° 13 (Fuente: Edifica)



NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:		FECHA:		UBICACION:																									
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC		sábado, 03 de marzo de 2012		AV. SAN MARTIN 625																									
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 15					SEMANA 16					SEMANA 17					SEMANA 18												
				L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D
				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	CISTERNA Y ZAPATAS-CIEMENTOS																														
	SOLADO EN CISTERNA	M2																													
	ACERO DE CISTERNA (LADOS Y BASE)	GLB																													
	ENCOFRADO DE CISTERNA	M2																													
	VACIADO DE CISTERNA	M3																													
	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA	M2		ACI			CISTERNA	CISTERNA			CISTERNA	CISTERNA	CISTERNA	CISTERNA	CISTERNA		CISTERNA														
	ENCOFRADO DE TAPA DE CISTERNA																														
	ACERO EN TAPA DE CISTERNA																														
	CONCRETO EN TAPA DE CISTERNA																														
	SUBESTRUCTURA																														
	ACERO DE VERTICALES			S2A	S2B	S2C	S2D	S2E			S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A			2B	2C	2D	3A	3B				
	ENCOFRADO DE VERTICALES			S3E	S2A	S2B	S2C	S2D			S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D			2A	2B	2C	2D	3A				
	CONCRETO DE VERTICALES			S3E	S2A	S2B	S2C	S2D			S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D			2A	2B	2C	2D	3A				
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS				S3E	S2A	S2B	S2C			S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C			1D	2A	2B	2C	2D				
	ACERO DE VIGAS				S3E	S2A	S2B	S2C			S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C			1D	2A	2B	2C	2D				
	ENCOFRADO DE LOSA				S3E	S2A	S2B	S2C			S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C			1D	2A	2B	2C	2D				
	COLOCACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS				S3E	S2A	S2B	S2C			S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C			1D	2A	2B	2C	2D				
	COLOCACIÓN DE LADRILLO BOVEDILLA				S3E	S2A	S2B	S2C			S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C			1D	2A	2B	2C	2D				
	COLOCACIÓN DE H.SS. Y H.EE.				S3E	S2A	S2B	S2C			S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C			1D	2A	2B	2C	2D				
	CONCRETO DE LOSA				S3E	S2A	S2B	S2C			S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C			1D	2A	2B	2C	2D				
	IIMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																														
	TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS													X																	
	EXCAVACION DE DUCTOS														X																
	ENCOFRADO DE BASE															X	X	X	X	X			X	X	X	X	X				
	VACIADO DE BASE															X	X	X	X	X			X	X	X	X	X				
	ENCOFRADO DE LADOS																	X	X	X			X	X	X	X	X				
	VACIADO DE LADOS																	X	X	X			X	X	X	X	X				
	PREFABRICADO DE TAPAS																	X	X	X			X	X	X	X	X				
	RELLENO DE DUCTOS																	X	X	X			X	X	X	X	X				
	COMPACTACION DE TERRENO																		X				X	X	X	X	X				
	ACERO DE LOSA																						X	X	X	X	X				
	VACIADO DE LOSA																						X	X	X	X	X				
	JUNTA DE LOSA																							X	X	X	X				

Lookahead de obra Semana N° 14 (Fuente: Edifica)



NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:		FECHA:		UBICACION:																									
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC		sábado, 10 de marzo de 2012		AV. SAN MARTIN 625																									
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 16							SEMANA 17							SEMANA 18							SEMANA 19						
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
				26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	CISTERNA ACI Y USO DOMESTICO																														
	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA	M2																													
	ENCOFRADO DE TAPA DE CISTERNA																														
	ACERO EN TAPA DE CISTERNA																														
	CONCRETO EN TAPA DE CISTERNA																														
	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA							X	X		X	X																			
	SUBESTRUCTURA																														
	ACERO DE VERTICALES			S2C	S2D	S2E	S1A	S1B			S1C	S1D	S1E	1A	1B		1C	1D	2A	2B	2C		2D	3A	3B	3C	3D				
	ENCOFRADO DE VERTICALES			S2B	S2C	S2D	S2E	S1A			S1B	S1C	S1D	S1E	1A		1B	1C	1D	2A	2B		2C	2D	3A	3B	3C				
	CONCRETO DE VERTICALES			S2B	S2C	S2D	S2E	S1A			S1B	S1C	S1D	S1E	1A		1B	1C	1D	2A	2B		2C	2D	3A	3B	3C				
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS			S2A	S2B	S2C	S2D	S2E			S1A	S1B	S1C	S1D	S1E		1A	1B	1C	1D	2A		2B	2C	2D	3A	3B				
	ACERO DE VIGAS			S2A	S2B	S2C	S2D	S2E			S1A	S1B	S1C	S1D	S1E		1A	1B	1C	1D	2A		2B	2C	2D	3A	3B				
	ENCOFRADO DE LOSA			S2A	S2B	S2C	S2D	S2E			S1A	S1B	S1C	S1D	S1E		1A	1B	1C	1D	2A		2B	2C	2D	3A	3B				
	COLOCACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS			S3E	S2A	S2B	S2C	S2D			S2E	S1A	S1B	S1C	S1D		S1E	1A	1B	1C	1D		2A	2B	2C	2D	3A				
	COLOCACIÓN DE LADRILLO BOVEDILLA			S3E	S2A	S2B	S2C	S2D			S2E	S1A	S1B	S1C	S1D		S1E	1A	1B	1C	1D		2A	2B	2C	2D	3A				
	COLOCACIÓN DE I.I.S.S. Y I.I.E.E.			S3E	S2A	S2B	S2C	S2D			S2E	S1A	S1B	S1C	S1D		S1E	1A	1B	1C	1D		2A	2B	2C	2D	3A				
	CONCRETO DE LOSA			S3D	S3E	S2A	S2B	S2C			S2D	S2E	S1A	S1B	S1C		S1D	S1E	1A	1B	1C		1D	2A	2B	2C	2D				
	TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																														
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO																						S3A	S3B	S3C	S3D	S3E				
	TARRAJEO DE CIELO RASO																						S3A	S3B	S3C	S3D					
	TARRAJEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA																						S3A	S3B	S3C						
	TARRAJEO O SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS																							S3A	S3B						
	IIMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																														
	TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS													X																	
	EXCAVACION DE DUCTOS														X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	ENCOFRADO DE BASE																X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	VACIADO DE BASE																X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	ENCOFRADO DE LADOS																X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	VACIADO DE LADOS																X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	PREFABRICADO DE TAPAS																X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	RELLENO DE DUCTOS																		X	X			X	X	X	X	X				
	COMPACTACION DE TERRENO																				X		X	X	X	X	X				
	ACERO DE LOSA																						X	X	X	X	X				
	VACIADO DE LOSA																						X	X	X	X	X				
	JUNTA DE LOSA																							X	X		X				

Lookahead de obra Semana N° 15 (Fuente: Edifica)

		LOOKAHEAD PLANNING																												EDIFICA		
NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:										FECHA:					UBICACION:															
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC										sábado, 24 de marzo de 2012					AV. SAN MARTIN 625															
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 17							SEMANA 18							SEMANA 19							SEMANA 20							
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	
				02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	CISTERNA ACI Y USO DOMESTICO																															
	ENCOFRADO DE CISTERNA (LADOS Y BASE)																															
	VACIADO DE CISTERNA (LADOS Y BASE)																															
	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA	M2																														
	ENCOFRADO DE TAPA DE CISTERNA																															
	ACERO EN TAPA DE CISTERNA																															
	CONCRETO EN TAPA DE CISTERNA																															
	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA																															
	SUBESTRUCTURA																															
	ACERO DE VERTICALES			S1C	S1D	S1E	1A	1B			1C	1D	2A	2B	2C		2D	3A	3B	3C	3D		4A	4B	4C	4D	5A					
	ENCOFRADO DE VERTICALES			S2E	S1C	S1D	S1E	1A			1B	1C	1D	2A	2B		2C	2D	3A	3B	3C		3D	4A	4B	4C	4D					
	CONCRETO DE VERTICALES			S2E	S1C	S1D	S1E	1A			1B	1C	1D	2A	2B		2C	2D	3A	3B	3C		3D	4A	4B	4C	4D					
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS			S3C	S2E	S1C	S1D	S1E			1A	1B	1C	1D	2A		2B	2C	2D	3A	3B		3C	3D	4A	4B	4C					
	ACERO DE VIGAS			S3C	S2E	S1C	S1D	S1E			1A	1B	1C	1D	2A		2B	2C	2D	3A	3B		3C	3D	4A	4B	4C					
	ENCOFRADO DE LOSA			S3C	S2E	S1C	S1D	S1E			1A	1B	1C	1D	2A		2B	2C	2D	3A	3B		3C	3D	4A	4B	4C					
	COLOCACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS			S2D	S3C	S2E	S1C	S1D			S1E	1A	1B	1C	1D		2A	2B	2C	2D	3A		3B	3C	3D	4A	4B					
	COLOCACIÓN DE LADRILLO BOVEDILLA			S2D	S3C	S2E	S1C	S1D			S1E	1A	1B	1C	1D		2A	2B	2C	2D	3A		3B	3C	3D	4A	4B					
	COLOCACIÓN DE I.I.S.S. Y I.I.E.E.			S2D	S3C	S2E	S1C	S1D			S1E	1A	1B	1C	1D		2A	2B	2C	2D	3A		3B	3C	3D	4A	4B					
	CONCRETO DE LOSA			S1C	S2D	S3C	S2E	S1C			S1D	S1E	1A	1B	1C		1D	2A	2B	2C	2D		3A	3B	3C	3D	4A					
	TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																															
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO																															
	TARRAJEO DE CIELO RASO																															
	TARRAJEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA																															
	TARRAJEO O SOLAJUEO DE PLACAS Y COLUMNAS																															
	I.I.M.M - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																															
	TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS							X																								
	EXCAVACION DE DUCTOS							X																								
	ENCOFRADO DE BASE										X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	VACIADO DE BASE										X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	ENCOFRADO DE LADOS												X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	VACIADO DE LADOS												X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	PREFABRICADO DE TAPAS												X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	RELLENO DE DUCTOS												X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	COMPACTACION DE TERRENO												X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	ACERO DE LOSA																X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	VACIADO DE LOSA																X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	JUNTA DE LOSA																		X	X	X		X	X	X	X	X					
	TABIQUERIA UNICON																															
	ABASTECIMIENTO DE LADRILLO													1A	1B		1C	1D	2A	2B	2C		2D	3A	3B	3C	4D					

Lookahead de obra Semana N° 16 (Fuente: Edifica)

		LOOKAHEAD PLANNING																												EDIFICA	
NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:										FECHA:						UBICACION:													
BARRANCO 350		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC										sábado, 31 de marzo de 2012						AV. SAN MARTIN 625													
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 18					SEMANA 19					SEMANA 20					SEMANA 21												
				L	M	X	Y	S	D	L	M	X	Y	S	D	L	M	X	Y	S	D	L	M	X	Y	S	D				
				09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05
	CISTERNA ACI Y USO DOMESTICO																														
	ACERO DE CISTERNA (LADOS Y BASE)																														
	ENCOFRADO DE CISTERNA (LADOS Y BASE)																														
	VACIADO DE CISTERNA (LADOS Y BASE)																														
	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA																														
	ENCOFRADO DE TAPA DE CISTERNA																														
	ACERO EN TAPA DE CISTERNA																														
	CONCRETO EN TAPA DE CISTERNA																														
	SUBESTRUCTURA																														
	ACERO DE VERTICALES				S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D									
	ENCOFRADO DE VERTICALES				S2E	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D								
	CONCRETO DE VERTICALES				S2E	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D								
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS				S3C	S2E	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D							
	ACERO DE VIGAS				S3C	S2E	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D							
	ENCOFRADO DE LOSA				S3C	S2E	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D							
	COLOCACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS				S2D	S3C	S2E	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D						
	COLOCACIÓN DE LADRILLO BOVEDILLA				S2D	S3C	S2E	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D						
	COLOCACIÓN DE INSS. Y IIIEE.				S2D	S3C	S2E	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D						
	CONCRETO DE LOSA				S1C	S2D	S3C	S2E	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D					
	TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																														
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO									S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D								
	TARRAJEO DE CIELO RASO									S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D								
	TARRAJEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA									S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D								
	TARRAJEO O SCLAJUEO DE PLACAS Y COLUMNAS									S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D								
	IIIMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2														S3A	S3B	S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D								
	TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS						X																								
	EXCAVACION DE DUCTOS						X																								
	ENCOFRADO DE BASE							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	VACIADO DE BASE							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ENCOFRADO DE LADOS									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	VACIADO DE LADOS									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	PREFABRICADO DE TAPAS									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	RELLENO DE DUCTOS											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	COMPACTACION DE TERRENO												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ACERO DE LOSA														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	VACIADO DE LOSA														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	JUNTA DE LOSA															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	TABIQUERIA UNICON																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ABASTECIMIENTO DE LADRILLO																														

Lookahead de obra Semana N° 17 (Fuente: Edifica)

					LOOKAHEAD PLANNING																			EDIFICA							
NOMBRE DE PROYECTO: BARRANCO 360					PROPIETARIO: EDIFICA CONSTRUCTORES SAC										FECHA: sábado, 07 de abril de 2012				UBICACION: AV. SAN MARTIN 625												
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 19							SEMANA 20					SEMANA 21					SEMANA 22										
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	CISTERNA ACI Y USO DOMESTICO																														
	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA (LADOS Y BASE)			ACI	ACI	ACI	ACI	ACI			USO DOMEST.	USO DOMEST.	USO DOMEST.	USO DOMEST.	USO DOMEST.																
	ENCOFRADO DE TAPA DE CISTERNA						TAPAS																								
	ACERO EN TAPA DE CISTERNA						TAPAS																								
	CONCRETO EN TAPA DE CISTERNA						TAPAS																								
	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA (CIELO RASO)											X	X	X	X																
	SUBESTRUCTURA																														
	ACERO DE VERTICALES			S1E	1A	1B	1C	1D			2A	2B	2C	2D	3A		3B		3C	3D	4A		4B	4C	4D	5A	5B				
	ENCOFRADO DE VERTICALES			S1D	S1E	1A	1B	1C			1D	2A	2B	2C	2D		3A		3B	3C	3D		4A	4B	4C	4D	5A				
	CONCRETO DE VERTICALES			S1D	S1E	1A	1B	1C			1D	2A	2B	2C	2D		3A		3B	3C	3D		4A	4B	4C	4D	5A				
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS			S1C	S1D	S1E	1A	1B			1C	1D	2A	2B	2C		2D		3A	3B	3C		3D	4A	4B	4C	4D				
	ACERO DE VIGAS			S1C	S1D	S1E	1A	1B			1C	1D	2A	2B	2C		2D		3A	3B	3C		3D	4A	4B	4C	4D				
	ENCOFRADO DE LOSA			S1C	S1D	S1E	1A	1B			1C	1D	2A	2B	2C		2D		3A	3B	3C		3D	4A	4B	4C	4D				
	COLOCACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS			S1B	S1C	S1D	S1E	1A			1B	1C	1D	2A	2B		2C		2D	3A	3B		3C	3D	4A	4B	4C				
	COLOCACIÓN DE LADRILLO BOVEDILLA			S1B	S1C	S1D	S1E	1A			1B	1C	1D	2A	2B		2C		2D	3A	3B		3C	3D	4A	4B	4C				
	COLOCACIÓN DE I.ISS. Y I.IEE.			S1B	S1C	S1D	S1E	1A			1B	1C	1D	2A	2B		2C		2D	3A	3B		3C	3D	4A	4B	4C				
	CONCRETO DE LOSA			S1A	S1B	S1C	S1D	S1E			1A	1B	1C	1D	2A		2B		2C	2D	3A		3B	3C	3D	4A	4B				
	TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																														
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO			S3A	S3B	S3C	S3D	S3E			S2A	S2B	S2C	S2D	S2E		S1A		S1B	S1C	S1D		S1E	1A	1B	1C	1D				
	TARRAJEO DE CIELO RASO				S3A	S3B	S3C	S3D			S3E	S2A	S2B	S2C	S2D		S2E		S1A	S1B	S1C		S1D	S1E	1A	1B	1C				
	TARRAJEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA					S3A	S3B	S3C			S3D	S3E	S2A	S2B	S2C		S2D		S2E	S1A	S1B		S1C	S1D	S1E	1A	1B				
	TARRAJEO O SOLAQEO DE PLACAS Y COLUMNAS						S3A	S3B			S3C	S3D	S3E	S2A	S2B		S2C		S2D	S2E	S1A		S1B	S1C	S1D	S1E	1A				
	IIMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																														
	TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS							X																							
	EXCAVACION DE DUCTOS							X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X				
	ENCOFRADO DE BASE							X		X	X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X					
	VACIADO DE BASE							X		X	X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X					
	ENCOFRADO DE LADOS										X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X					
	VACIADO DE LADOS										X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X					
	PREFABRICADO DE TAPAS										X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X					
	RELLENO DE DUCTOS										X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X					
	COMPACTACION DE TERRENO												X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X					
	ACERO DE LOSA															X		X	X	X		X	X	X	X	X					
	VACIADO DE LOSA															X		X	X	X		X	X	X	X	X					
	JUNTA DE LOSA																X		X	X		X	X	X	X	X					
	TABIQUERIA UNICON																														
	ABASTECIMIENTO DE LADRILLO																														

Lookahead de obra Semana N° 18 (Fuente: Edifica)

		LOOKAHEAD PLANNING																												EDIFICA	
NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:										FECHA:						UBICACION:													
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC										sábado, 14 de abril de 2012						AV. SAN MARTIN 625													
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 19					SEMANA 20					SEMANA 21					SEMANA 22												
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
				23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	CISTERNA ACI Y USO DOMESTICO																														
	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA (LADOS Y BASE)			USO DOMEST.	USO DOMEST.	USO DOMEST.	USO DOMEST.	USO DOMEST.																							
	SUBESTRUCTURA																														
	ACERO DE VERTICALES			1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6B									
	ENCOFRADO DE VERTICALES			1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A									
	CONCRETO DE VERTICALES			1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A									
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS			1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D									
	ACERO DE VIGAS			1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D									
	ENCOFRADO DE LOSA			1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D									
	COLOCACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS			1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C									
	COLOCACIÓN DE LADRILLO BOVEDILLA			1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C									
	COLOCACIÓN DE I.ISS. Y I.IEE.			1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C									
	CONCRETO DE LOSA			S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B									
	TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																														
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO			S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A									
	TARRAJEO DE CIELO RASO			S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D									
	SOLAQUEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA			S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C									
	SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS			S3C	S3D	S3E	S2A	S2B	S2C	S2D	S2E	S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	1A	1B	1C	1D	2A	2B									
	IIMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																														
	TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS																														
	EXCAVACION DE DUCTOS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	ENCOFRADO DE BASE			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	VACIADO DE BASE			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	ENCOFRADO DE LADOS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	VACIADO DE LADOS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	PREFABRICADO DE TAPAS					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	RELLENO DE DUCTOS						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	COMPACTACION DE TERRENO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	ACERO DE LOSA								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	VACIADO DE LOSA									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	JUNTA DE LOSA									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	TABIQUERIA UNICOM																														
	ABASTECIMIENTO DE LADRILLO								1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B									

Lookahead de obra Semana N° 19 (Fuente: Edifica)



NOMBRE DE PROYECTO:		O:		FECHA:		UBICACION:																								
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC		sábado, 21 de abril de 2012		AV. SAN MARTIN 625																								
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 20					SEMANA 21					SEMANA 22					SEMANA 23											
				M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	CISTERNA AQI Y USO DOMESTICO																													
	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA (LADOS Y BASE)				CISTERNA	CISTERNA	CISTERNA																							
	SUBESTRUCTURA																													
	ACERO DE VERTICALES				2A	2B	2C	2D		3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6B	6C	6D	7A				
	ENCOFRADO DE VERTICALES				1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6B	6C	6D	6D				
	CONCRETO DE VERTICALES				1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6B	6C	6D	6D				
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS				1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6B	6C	6C				
	ACERO DE VIGAS				1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6B	6C	6C				
	ENCOFRADO DE LOSA				1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6B	6C	6C				
	COLOCACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS				1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6B	6B				
	COLOCACIÓN DE LADRILLO BOVEDILLA				1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6B	6B				
	COLOCACIÓN DE I.S.S. Y I.I.EE.				1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6B	6B				
	CONCRETO DE LOSA				1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6A				
	TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																													
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO				S1B	S1C	S1D			S1E	1A	1B	1C	1D		1E	2A	2B	2C	2D		2E	3A	3B	3C	3D				
	TARRAJEO DE CIELO RASO				S1A	S1B	S1C			S1D	S1E	1A	1B	1C		1D	1E	2A	2B	2C		2D	2E	3A	3B	3C				
	SOLAQUEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA				S2E	S1A	S1B			S1C	S1D	S1E	1A	1B		1C	1D	1E	2A	2B		2C	2D	2E	3A	3B				
	SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS				S2D	S2E	S1A			S1B	S1C	S1D	S1E	1A		1B	1C	1D	1E	2A		2B	2C	2D	2E	3A				
	HMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																													
	TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS																													
	EXCAVACION DE DUCTOS				X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X										
	ENCOFRADO DE BASE				X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X										
	VACIADO DE BASE				X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X										
	ENCOFRADO DE LADOS				X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X										
	VACIADO DE LADOS				X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X										
	PREFABRICADO DE TAPAS				X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X										
	RELLENO DE DUCTOS					X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X										
	COMPACTACION DE TERRENO						X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X										
	ACERO DE LOSA						X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X										
	VACIADO DE LOSA						X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X										
	JUNTA DE LOSA										X	X	X			X	X	X	X	X										
	TABIQUERIA UNICON																													
	ABASTECIMIENTO DE LADRILLO									1A	1B	1C	1D	1E		2A	2B	2C	2D	2E		3A	3B	3C	3D	3E				

Lookahead de obra Semana N° 20 (Fuente: Edifica)

NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:		FECHA:		UBICACION:																									
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC		sábado, 28 de abril de 2012		AV. SAN MARTIN 625																									
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 22					SEMANA 23					SEMANA 24					SEMANA 25												
				L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D							
				07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04
	CISTERNA ACI Y USO DOMESTICO																														
	SOLAQUEO DE CISTERNA (CIELO RASO)																														
	SUBESTRUCTURA																														
	ACERO DE VERTICALES			2A	2B	2C	2D	3A		3B	3C	3D	4A	4B		4C	4D	5A	5B	5C		5D	6A	6B	6C	6D					
	ENCOFRADO DE VERTICALES			1D	2A	2B	2C	2D		3A	3B	3C	3D	4A		4B	4C	4D	5A	5B		5C	5D	6A	6B	6C					
	CONCRETO DE VERTICALES			1D	2A	2B	2C	2D		3A	3B	3C	3D	4A		4B	4C	4D	5A	5B		5C	5D	6A	6B	6C					
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS			1C	1D	2A	2B	2C		2D	3A	3B	3C	3D		4A	4B	4C	4D	5A		5B	5C	5D	6A	6B					
	ACERO DE VIGAS			1C	1D	2A	2B	2C		2D	3A	3B	3C	3D		4A	4B	4C	4D	5A		5B	5C	5D	6A	6B					
	ENCOFRADO DE LOSA			1C	1D	2A	2B	2C		2D	3A	3B	3C	3D		4A	4B	4C	4D	5A		5B	5C	5D	6A	6B					
	COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS			1B	1C	1D	2A	2B		2C	2D	3A	3B	3C		3D	4A	4B	4C	4D		5A	5B	5C	5D	6A					
	COLOCACION DE LADRILLO BOVEDILLA			1B	1C	1D	2A	2B		2C	2D	3A	3B	3C		3D	4A	4B	4C	4D		5A	5B	5C	5D	6A					
	COLOCACION DE IISS. Y IIEE.			1B	1C	1D	2A	2B		2C	2D	3A	3B	3C		3D	4A	4B	4C	4D		5A	5B	5C	5D	6A					
	CONCRETO DE LOSA			1A	1B	1C	1D	2A		2B	2C	2D	3A	3B		3C	3D	4A	4B	4C		4D	5A	5B	5C	5D					
	TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																														
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO			S1E	1A	1B	1C	1D		1E	2A	2B	2C	2D		2E	3A	3B	3C	3D		3E	4A	4B	4C	4D					
	TARRAJEO DE CIELO RASO			S1D	S1E	1A	1B	1C		1D	1E	2A	2B	2C		2D	2E	3A	3B	3C		3D	3E	4A	4B	4C	4D				
	SOLAQUEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA			S1C	S1D	S1E	1A	1B		1C	1D	1E	2A	2B		2C	2D	2E	3A	3B		3C	3D	3E	4A	4B					
	SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS			S1B	S1C	S1D	S1E	1A		1B	1C	1D	1E	2A		2B	2C	2D	2E	3A		3B	3C	3D	3E	4A					
	PUENTE METALICO																														
	TRAZO									P2						P3				P4											
	COLOCACION DE VIGAS PRINCIPALES										P2					P3				P4											
	COLOCACION DE VIGAS SECUNDARIAS											P2					P3			P4											
	ENCOFRADO DE PISO											P2					P3			P4											
	VACIADO DE PISO												P2				P3			P4											
	IIMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																														
	TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS																														
	EXCAVACION DE DUCTOS			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	ENCOFRADO DE BASE			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	VACIADO DE BASE			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	ENCOFRADO DE LADOS				X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	VACIADO DE LADOS					X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	PREFABRICADO DE TAPAS					X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	RELLENO DE DUCTOS					X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	COMPACTACION DE TERRENO					X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	ACERO DE LOSA									X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	VACIADO DE LOSA									X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	JUNTA DE LOSA										X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	TABIQUERIA UNICON											X	X	X																	
	LIMPIEZA DE PISO															1A	1B	1C	1D	1E		2A	2B	2C	2D	2E					
	TRAZO Y REPLANTEO															1A						1E	2A	2B	2C	2D					
	LIMPIEZA Y REUBICACION DE TUBERIAS SEGUN TRAZO															1A	1B	1C				1D	1E	2A	2B	2C					
	ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO 8 MM.																	1A	1B			1C	1D	1E	2A	2B					
	ASENTADO DE LADRILLO UNICON																			1A		1B	1C	1D	1E	2A					
	SOLAQUEO DE LADRILLOS UNICON																					1A	1B	1C	1D	1E					
	DERRAMES DE INTERIORES Y EXTERIORES																					1A	1B	1C	1D	1E					
	ENCOFRADO Y VACIADO DE POYOS																						1A	1B	1C	1D					
	ENCOFRADO Y VACIADO DE SARDINELES																							1A	1B	1C	1D				
	RESANE Y NIVELACION DE PISOS																								1A						

Lookahead de obra Semana N° 21 (Fuente: Edifica)

NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:		FECHA:		UBICACION:																									
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC		sábado, 05 de mayo de 2012		AV. SAN MARTIN 625																									
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 22					SEMANA 23					SEMANA 24					SEMANA 25												
				L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D
				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	SUBESTRUCTURA																														
	ACERO DE VERTICALES			3A	3B	3C	3D	4A			4B	4C	4D	5A	5B		5C	5D	6A	6B	6C		6D	7A	7B	7C	7D				
	ENCOFRADO DE VERTICALES			2D	3A	3B	3C	3D			4A	4B	4C	4D	5A		5B	5C	5D	6A	6B		6C	6D	7A	7B	7C				
	CONCRETO DE VERTICALES			2D	3A	3B	3C	3D			4A	4B	4C	4D	5A		5B	5C	5D	6A	6B		6C	6D	7A	7B	7C				
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS			2C	2D	3A	3B	3C			3D	4A	4B	4C	4D		5A	5B	5C	5D	6A		6B	6C	6D	7A	7B				
	ACERO DE VIGAS			2C	2D	3A	3B	3C			3D	4A	4B	4C	4D		5A	5B	5C	5D	6A		6B	6C	6D	7A	7B				
	ENCOFRADO DE LOSA			2C	2D	3A	3B	3C			3D	4A	4B	4C	4D		5A	5B	5C	5D	6A		6B	6C	6D	7A	7B				
	COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS			2B	2C	2D	3A	3B			3C	3D	4A	4B	4C		4D	5A	5B	5C	5D		6A	6B	6C	6D	7A				
	COLOCACION DE LADRILLO BOVEDILLA			2B	2C	2D	3A	3B			3C	3D	4A	4B	4C		4D	5A	5B	5C	5D		6A	6B	6C	6D	7A				
	COLOCACION DE IISS. Y IIEE.			2B	2C	2D	3A	3B			3C	3D	4A	4B	4C		4D	5A	5B	5C	5D		6A	6B	6C	6D	7A				
	CONCRETO DE LOSA			2A	2B	2C	2D	3A			3B	3C	3D	4A	4B		4C	4D	5A	5B	5C		5D	6A	6B	6C	6D				
	TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																														
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO			1D	1E	2A	2B	2C			2D	2E	3A	3B	3C		3D	3E	4A	4B	4C		4D	4E	5A	5B	5C				
	TARRAJEO DE CIELO RASO			1C	1D	1E	2A	2B			2C	2D	2E	3A	3B		3C	3D	3E	4A	4B		4C	4D	4E	5A	5B				
	SOLAQUEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA			1B	1C	1D	1E	2A			2B	2C	2D	2E	3A		3B	3C	3D	3E	4A		4B	4C	4D	4E	5A				
	SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS																														
	PUENTE METALICO																														
	TRAZO			P2								P3			P4																
	COLOCACION DE VIGAS PRINCIPALES				P2							P3						P4						P5							
	COLOCACION DE VIGAS SECUNDARIAS					P2							P3						P4						P5						
	ENCOFRADO DE PISO						P2							P3						P4						P5					
	VACIADO DE PISO							P2							P3						P4						P5				
	IIMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																														
	TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS																														
	EXCAVACION DE DUCTOS			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	ENCOFRADO DE BASE			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	VACIADO DE BASE			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	ENCOFRADO DE LADOS				X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	VACIADO DE LADOS					X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	PREFABRICADO DE TAPAS					X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	RELLENO DE DUCTOS						X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	COMPACTACION DE TERRENO							X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	ACERO DE LOSA										X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	VACIADO DE LOSA										X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	JUNTA DE LOSA												X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	TABQUERIA UNICON																1A	1B	1C	1D	1E		2A	2B	2C	2D	2E				
	LIMPIEZA DE PISO																	1A	1B	1C	1D		1E	2A	2B	2C	2D				
	TRAZO Y REPLANTEO																		1A	1B	1C		1D	1E	2A	2B	2C				
	LIMPIEZA Y REUBICACION DE TUBERIAS SEGUN TRAZO																			1A	1B		1C	1D	1E	2A	2B				
	ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO 8 MM.																				1A		1B	1C	1D	1E	2A				
	ASENTADO DE LADRILLO UNICON																						1A	1B	1C	1D	1E				
	SOLAQUEO DE LADRILLOS UNICON																						1A	1B	1C	1D	1E				
	DERRAMES DE INTERIORES Y EXTERIORES																						1A	1B	1C	1D	1E				
	ENCOFRADO Y VACIADO DE POYOS																						1A	1B	1C	1D	1E				
	ENCOFRADO Y VACIADO DE SARDINELES																						1A	1B	1C	1D	1E				
	RESANE Y NIVELACION DE PISOS																						1A	1B	1C	1D	1E				

Lookahead de obra Semana N° 22 (Fuente: Edifica)

LOOKAHEAD PLANNING						EDIFICA																									
NOMBRE DE PROYECTO: BARRANCO 360					PROPIETARIO: EDIFICA CONSTRUCTORES SAC							FECHA: sábado, 12 de mayo de 2012			UBICACION: AV. SAN MARTIN 625																
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 23					SEMANA 24					SEMANA 25					SEMANA 26												
				L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V								
				21	22	23	24	25	S	D	28	29	30	31	01	S	D	04	05	06	07	08	S	D	11	12	13	14	15	S	D
SUBESTRUCTURA																															
ACERO DE VERTICALES																															
ENCOFRADO DE VERTICALES																															
CONCRETO DE VERTICALES																															
ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS																															
ACERO DE VIGAS																															
ENCOFRADO DE LOSA																															
COLOCACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS																															
COLOCACIÓN DE LADRILLO BOVEDILLA																															
COLOCACIÓN DE I.I.S.S. Y I.I.E.																															
CONCRETO DE LOSA																															
TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																															
INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO																															
TARRAJEO DE CIELO RASO																															
SOLAQUEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA																															
SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS																															
PUENTE METALICO																															
TRAZO																															
COLOCACION DE VIGAS PRINCIPALES																															
COLOCACION DE VIGAS SECUNDARIAS																															
ENCOFRADO DE PISO																															
VACIADO DE PISO																															
IIMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																															
TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS																															
EXCAVACION DE DUCTOS																															
ENCOFRADO DE BASE																															
VACIADO DE BASE																															
ENCOFRADO DE LADOS																															
VACIADO DE LADOS																															
PREFABRICADO DE TAPAS																															
RELLENO DE DUCTOS																															
COMPACTACION DE TERRENO																															
ACERO DE LOSA																															
VACIADO DE LOSA																															
JUNTA DE LOSA																															
TABQUERIA UNICON																															
LIMPIEZA DE PISO																															
TRAZO Y REPLANTEO																															
LIMPIEZA Y REUBICACION DE TUBERIAS SEGUN TRAZO																															
ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO 8 MM.																															
ASENTADO DE LADRILLO UNICON																															
SOLAQUEO DE LADRILLOS UNICON																															
DERRAMES DE INTERIORES Y EXTERIORES																															
ENCOFRADO Y VACEADO DE POYOS																															
ENCOFRADO Y VACIADO DE SARDINELES																															
RESANE Y NIVELACION DE PISOS																															

Lookahead de obra Semana N° 23 (Fuente: Edifica)

		LOOKAHEAD PLANNING																				EDIFICA									
NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:										FECHA:					UBICACION:														
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC										sábado, 19 de mayo de 2012					AV. SAN MARTIN 625														
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrad o Total	SEMANA 25					SEMANA 26					SEMANA 27					SEMANA 28												
				L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D
				28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SUBESTRUCTURA																															
	ACERO DE VERTICALES			4C	4D	4E	5A	5B		5C	5D	5E	6A	6B		6C	6D	6E	7A	7B		7C	7D	7E	8A	8B					
	ENCOFRADO DE VERTICALES			4B	4C	4D	4E	5A		5B	5C	5D	5E	6A		6B	6C	6D	6E	7A		7B	7C	7D	7E	8A					
	CONCRETO DE VERTICALES			4B	4C	4D	4E	5A		5B	5C	5D	5E	6A		6B	6C	6D	6E	7A		7B	7C	7D	7E	8A					
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS			4A	4B	4C	4D	4E		5A	5B	5C	5D	5E		6A	6B	6C	6D	6E		7A	7B	7C	7D	7E					
	ACERO DE VIGAS			4A	4B	4C	4D	4E		5A	5B	5C	5D	5E		6A	6B	6C	6D	6E		7A	7B	7C	7D	7E					
	ENCOFRADO DE LOSA + LADO 2 DE VIGA			3E	4A	4B	4C	4D		4E	5A	5B	5C	5D		5E	6A	6B	6C	6D		6E	7A	7B	7C	7D					
	COLOCACION DE VIGUETAS PRE TENSADAS			3D	3E	4A	4B	4C		4D	4E	5A	5B	5C		5D	5E	6A	6B	6C		6D	6E	7A	7B	7C					
	COLOCACION DE LADRILLO BOVEDILLA			3D	3E	4A	4B	4C		4D	4E	5A	5B	5C		5D	5E	6A	6B	6C		6D	6E	7A	7B	7C					
	COLOCACION DE ISS: Y IEE:			3D	3E	4A	4B	4C		4D	4E	5A	5B	5C		5D	5E	6A	6B	6C		6D	6E	7A	7B	7C					
	CONCRETO DE LOSA			3C	3D	3E	4A	4B		4C	4D	4E	5A	5B		5C	5D	5E	6A	6B		6C	6D	6E	7A	7B					
TARRAJEO, REVOCOS Y ENLUCIDO																															
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO			1D	1E	2A	2B	2C		2D	2E	3A	3B	3C		3D	3E	4A	4B	4C		4D	4E	5A	5B	5C					
	TARRAJEO DE CIELO RASO			1C	1D	1E	2A	2B		2C	2D	2E	3A	3B		3C	3D	3E	4A	4B		4C	4D	4E	5A	5B					
	SOLAQUEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA			1B	1C	1D	1E	2A		2B	2C	2D	2E	3A		3B	3C	3D	3E	4A		4B	4C	4D	4E	5A					
	SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS			1A	1B	1C	1D	1E		2A	2B	2C	2D	2E		3A	3B	3C	3D	3E		4A	4B	4C	4D	4E					
PUENTE METALICO																															
	TRAZO					P3					P4																				
	COLOCACION DE VIGAS PRINCIPALES					P3					P4																				
	COLOCACION DE VIGAS SECUNDARIAS			P2								P4																			
	ENCOFRADO DE PISO			P2									P4																		
	VACIADO DE PISO					P2																									
IIMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																															
	TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS																														
	EXCAVACION DE DUCTOS			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	ENCOFRADO DE BASE			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	VACIADO DE BASE			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	ENCOFRADO DE LADOS				X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	VACIADO DE LADOS					X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	PREFABRICADO DE TAPAS					X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	RELLENO DE DUCTOS					X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	COMPACTACION DE TERRENO						X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	ACERO DE LOSA						X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	VACIADO DE LOSA							X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
	JUNTA DE LOSA									X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
TABICERIA UNICON																															
	LIMPIEZA DE PISO									1A	1B	1C	1D	1E		2A	2B	2C	2D	2E		3A	3B	3C	3D	3E					
	TRAZO Y REPLANTEO										1A	1B	1C	1D		1E	2A	2B	2C	2D		2E	3A	3B	3C	3D					
	LIMPIEZA Y RELUBICACION DE TUBERIAS SEGUN TRAZO											1A	1B	1C		1D	1E	2A	2B	2C		2D	2E	3A	3B	3C					
	ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO 8 MM.												1A	1B		1C	1D	1E	2A	2B		2C	2D	2E	3A	3B					
	ASENTAJE DE LADRILLO UNICON													1A		1B	1C	1D	1E	2A		2B	2C	2D	2E	3A					
	SOLAQUEO DE LADRILLO UNICON														1A	1B	1C	1D	1E	2A		2B	2C	2D	2E	3A					
	DEFRAMES DE INTERIORES Y EXTERIORES															1A	1B	1C	1D	1E		2A	2B	2C	2D	2E					
	ENCOFRADO Y VACIADO DE POYOS																1A	1B	1C			1D	1E	2A	2B	2C					
	ENCOFRADO Y VACIADO DE SARDINELES																	1A	1B			1C	1D	1E	2A	2B					
	RESANE Y NIVELACION DE PISOS																		1A				1B	1C	1D	1E	2A				

Lookahead de obra Semana N° 24 (Fuente: Edifica)

		LOOKAHEAD PLANNING																												EDIFICA	
NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:										FECHA:						UBICACION:													
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC										sábado, 26 de mayo de 2012						AV. SAN MARTIN 625													
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 26							SEMANA 27							SEMANA 28							SEMANA 29						
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
				04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	SUBESTRUCTURA																														
	ACERO DE VERTICALES			5C	5D	5E	6A	6B			6C	6D	6E	7A	7B		7C	7D	7E	8A	8B		8C	8D	8E	9A	9B				
	ENCOFRADO DE VERTICALES			5B	5C	5D	5E	6A			6B	6C	6D	6E	7A		7B	7C	7D	7E	8A		8B	8C	8D	8E	9A				
	CONCRETO DE VERTICALES			5B	5C	5D	5E	6A			6B	6C	6D	6E	7A		7B	7C	7D	7E	8A		8B	8C	8D	8E	9A				
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS			5A	5B	5C	5D	5E			6A	6B	6C	6D	6E		7A	7B	7C	7D	7E		8A	8B	8C	8D	8E				
	ACERO DE VIGAS			5A	5B	5C	5D	5E			6A	6B	6C	6D	6E		7A	7B	7C	7D	7E		8A	8B	8C	8D	8E				
	ENCOFRADO DE LOSA + LADO 2 DE VIGA			4E	5A	5B	5C	5D			5E	6A	6B	6C	6D		6E	7A	7B	7C	7D		7E	8A	8B	8C	8D				
	COLOCACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS			4D	4E	5A	5B	5C			5D	5E	6A	6B	6C		6D	6E	7A	7B	7C		7D	7E	8A	8B	8C				
	COLOCACIÓN DE LADRILLO BOVEDILLA			4D	4E	5A	5B	5C			5D	5E	6A	6B	6C		6D	6E	7A	7B	7C		7D	7E	8A	8B	8C				
	COLOCACIÓN DE HISS. Y HIEE.			4D	4E	5A	5B	5C			5D	5E	6A	6B	6C		6D	6E	7A	7B	7C		7D	7E	8A	8B	8C				
	CONCRETO DE LOSA			4C	4D	4E	5A	5B			5C	5D	5E	6A	6B		6C	6D	6E	7A	7B		7C	7D	7E	8A	8B				
	TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																														
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO			2C	2D	2E	3A	3B			3C	3D	3E	4A	4B		4C	4D	4E	5A	5B		5C	5D	5E	6A	6B				
	TARRAJEO DE CIELO RASO			2B	2C	2D	2E	3A			3B	3C	3D	3E	4A		4B	4C	4D	4E	5A		5B	5C	5D	5E	6A				
	SOLAQUEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA			2A	2B	2C	2D	2E			3A	3B	3C	3D	3E		4A	4B	4C	4D	4E		5A	5B	5C	5D	5E				
	SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS			1E	2A	2B	2C	2D			2E	3A	3B	3C	3D		3E	4A	4B	4C	4D		4E	5A	5B	5C	5D				
	PUENTE METALICO																														
	TRAZO			P3										P5							P6						P7				
	COLOCACION DE VIGAS PRINCIPALES				P3										P5							P6						P7			
	COLOCACION DE VIGAS SECUNDARIAS					P3					P4						P5						P6								
	ENCOFRADO DE PISO						P3				P4							P5						P6							
	VACIADO DE PISO							P3									P4			P5											
	HIMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																														
	TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS																														
	EXCAVACION DE DUCTOS			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	ENCOFRADO DE BASE			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	VACIADO DE BASE			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	ENCOFRADO DE LADOS				X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	VACIADO DE LADOS				X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	PREFABRICADO DE TAPAS					X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	RELLENO DE DUCTOS						X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	COMPACTACION DE TERRENO							X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	ACERO DE LOSA							X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	VACIADO DE LOSA							X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	JUNTA DE LOSA							X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
	TABIQUERIA UNICON																														
	LIMPIEZA DE PISO				1A	1B	1C	1D			1E	2A	2B	2C	2D		2E	3A	3B	3C	3D		3E	4A	4B	4C	4D				
	TRAZO Y REPLANTEO					1A	1B	1C			1D	1E	2A	2B	2C		2D	2E	3A	3B	3C		3D	3E	4A	4B	4C				
	LIMPIEZA Y REUBICACION DE TUBERIAS SEGUN TRAZO						1A	1B			1C	1D	1E	2A	2B		2C	2D	2E	3A	3B		3C	3D	3E	4A	4B				
	ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO 8 MM.							1A			1B	1C	1D	1E	2A		2B	2C	2D	2E	3A		3B	3C	3D	3E	4A				
	ASENTADO DE LADRILLO UNICON							1A	1B	1C	1D	1E	1E	1E		2A	2B	2C	2D	2E		3A	3B	3C	3D	3E					
	SOLAQUEO DE LADRILLOS UNICON							1A	1B	1C	1D	1D	1D	1D		1E	2A	2B	2C	2D		2E	3A	3B	3C	3D					
	DERRAMES DE INTERIORES Y EXTERIORES								1A	1B	1C	1C	1C	1C		1D	1E	2A	2B	2C		2D	2E	3A	3B	3C					
	ENCOFRADO Y VACIADO DE POYOS									1A	1B	1B	1B	1B		1C	1D	1E	2A	2B		2C	2D	2E	3A	3B					
	ENCOFRADO Y VACIADO DE SARDINELES													1A	1B		1B	1C	1D	1E	2A		2A	2E	3A						
	RESANE Y NIVELACION DE PISOS														1A	1B		1B	1C	1D	1E	2A		2A	2B	2C	2D	2E			

Lookahead de obra Semana N° 25 (Fuente: Edifica)

			LOOKAHEAD PLANNING																								EDIFICA				
NOMBRE DE PROYECTO:			PROPIETARIO:												FECHA:						UBICACION:										
BARRANCO 360			EDIFICA CONSTRUCTORES SAC												sábado, 02 de junio de 2012						AV. SAN MARTIN 625										
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 27							SEMANA 28							SEMANA 29							SEMANA 30						
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07
SUBESTRUCTURA																															
	ACERO DE VERTICALES			6C	6D	6E	7A	7B			7C	7D	7E	8A	8B			8C	8D	8E	9A	9B			9C	9D	9E	10A	10B		
	ENCOFRADO DE VERTICALES			6B	6C	6D	6E	7A			7B	7C	7D	7E	8A			8B	8C	8D	8E	9A			9B	9C	9D	9E	10A		
	CONCRETO DE VERTICALES			6B	6C	6D	6E	7A			7B	7C	7D	7E	8A			8B	8C	8D	8E	9A			9B	9C	9D	9E	10A		
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS			6A	6B	6C	6D	6E			7A	7B	7C	7D	7E			8A	8B	8C	8D	8E			9A	9B	9C	9D	9E		
	ACERO DE VIGAS			6A	6B	6C	6D	6E			7A	7B	7C	7D	7E			8A	8B	8C	8D	8E			9A	9B	9C	9D	9E		
	ENCOFRADO DE LOSA + LADO 2 DE VIGA			5E	6A	6B	6C	6D			6E	7A	7B	7C	7D			7E	8A	8B	8C	8D			8E	9A	9B	9C	9D		
	COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS			5D	5E	6A	6B	6C			6D	6E	7A	7B	7C			7D	7E	8A	8B	8C			8D	8E	9A	9B	9C		
	COLOCACION DE LADRILLO BOVEDILLA			5D	5E	6A	6B	6C			6D	6E	7A	7B	7C			7D	7E	8A	8B	8C			8D	8E	9A	9B	9C		
	COLOCACION DE ISS. Y IIEE			5D	5E	6A	6B	6C			6D	6E	7A	7B	7C			7D	7E	8A	8B	8C			8D	8E	9A	9B	9C		
	CONCRETO DE LOSA			5C	5D	5E	6A	6B			6C	6D	6E	7A	7B			7C	7D	7E	8A	8B			8C	8D	8E	9A	9B		
TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																															
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO			3C	3D	3E	4A	4B			4C	4D	4E	5A	5B			5C	5D	5E	6A	6B			6C	6D	6E	7A	7B		
	TARRAJEO DE CIELO RASO			3B	3C	3D	3E	4A			4B	4C	4D	4E	5A			5B	5C	5D	5E	6A			6B	6C	6D	6E	7A		
	SOLAJEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA			3A	3B	3C	3D	3E			4A	4B	4C	4D	4E			5A	5B	5C	5D	5E			6A	6B	6C	6D	6E		
	SOLAJEO DE PLACAS Y COLUMNAS			2E	3A	3B	3C	3D			3E	4A	4B	4C	4D			4E	5A	5B	5C	5D			5E	6A	6B	6C	6D		
PUENTE METALICO																															
	TRAZO						P5							P6							P7						P8				
	COLOCACION DE VIGAS PRINCIPALES						P5							P6							P7						P8				
	COLOCACION DE VIGAS SECUNDARIAS			P4						P5							P6					P7						P8			
	ENCOFRADO DE PISO			P4						P5							P6					P7						P8			
	VACIADO DE PISO									P4		P5																			
IIMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																															
	TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS																														
	EXCAVACION DE DUCTOS			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
	ENCOFRADO DE BASE			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
	VACIADO DE BASE			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
	ENCOFRADO DE LADOS			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
	VACIADO DE LADOS			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
	PREFABRICADO DE TAPAS			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
	RELLENO DE DUCTOS			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
	COMPACTACION DE TERRENDO			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
	ACERO DE LOSA			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
	VACIADO DE LOSA			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
	JUNTA DE LOSA					X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
ENCHAPE																															
	EMPLANTILLADO																	1A	1B	1C	1D			1E	2A	2B	2C	2D			
	ENCHAPE DE PAREDES EN COCINA Y BAÑOS																	1A	1B	1C				1D	1E	2A	2B	2C			
	ENCHAPE DE PISOS EN COCINA, BAÑOS, TERRAZAS Y AREAS DE SERVICIO																		1A	1B				1C	1D	1E	2A	2B			
	UBICACION DE SUMIDEROS Y REGISTROS																			1A				1B	1C	1D	1E	2A			
FRAGUADO																															
TABIQUERIA UNICON																															
	LIMPIEZA DE PISO			1E	2A	2B	2C	2D		2E	3A	3B	3C	3D		3E	4A	4B	4C	4D		4E	5A	5B	5C	5D					
	TRAZO Y REPLANTEO			1D	1E	2A	2B	2C		2D	2E	3A	3B	3C		3D	3E	4A	4B	4C		4D	4E	5A	5B	5C					
	LIMPIEZA Y REUBICACION DE TUBERIAS SEGUN TRAZO			1C	1D	1E	2A	2B		2C	2D	2E	3A	3B		3C	3D	3E	4A	4B		4C	4D	4E	5A	5B					
	ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO 8 MM.			1B	1C	1D	1E	2A		2B	2C	2D	2E	3A		3B	3C	3D	3E	4A		4B	4C	4D	4E	5A					
	ASENTADO DE LADRILLO UNICON			1A	1B	1C	1D	1E		2A	2B	2C	2D	2E		3A	3B	3C	3D	3E		4A	4B	4C	4D	4E					
	SOLAJEO DEL LADRILLO UNICON			1A	1B	1C	1D	1E		2A	2B	2C	2D	2E		3A	3B	3C	3D	3E		4A	4B	4C	4D	4E					
	DERRAMES DE INTERIORES Y EXTERIORES				1A	1B	1C	1D		1E	2A	2B	2C	2D		2E	2E	3A	3B	3C		3D	3E	4A	4B	4C	4D				
	ENCOFRADO Y VACIADO DE POYOS					1A	1B			1C	1D	1E	2A	2B		2C	2D	2E	3A	3D		3C	3D	3E	4A	4B					
	ENCOFRADO Y VACIADO DE SAFONIELES					1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E						
	RESANE Y NIVELACION DE PISOS					1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E						

Lookahead de obra Semana N° 26 (Fuente: Edifica)



NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:		FECHA:		UBICACION:																					
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC		sábado, 09 de junio de 2012		AV. SAN MARTIN 625																					
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metro Total	SEMANA 28					SEMANA 29					SEMANA 30					SEMANA 31								
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
SUBESTRUCTURA																											
ACEPO DE VERTICALES																											
ENCOFRADO DE VERTICALES																											
CONCRETO DE VERTICALES																											
ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS																											
ACEPO DE VIGAS																											
ENCOFRADO DE LOSA - LADO 2 DE VIGA																											
COLOCACION DE VIQUETAS PRETENSADAS																											
COLOCACION DE LADRILLO BOVEDILLA																											
COLOCACION DE ISS, Y IIE.																											
CONCRETO DE LOSA																											
TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																											
COLOCACION DE PUNTOS DE NIVEL PARA CIELO RASO																											
INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO																											
TARRAJEO DE CIELO RASO																											
SOLAQUEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA																											
SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS																											
PUENTE METALICO																											
TRAZO																											
COLOCACION DE VIGAS PRINCIPALES																											
COLOCACION DE VIGAS SECUNDARIAS																											
ENCOFRADO DE PISO																											
VACIADO DE PISO																											
HMM - LOSA DE ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO 2																											
TRAZO PARA EXCAVACION DE DUCTOS																											
EXCAVACION DE DUCTOS																											
ENCOFRADO DE BASE																											
VACIADO DE BASE																											
ENCOFRADO DE LADOS																											
VACIADO DE LADOS																											
PREFABRICADO DE TAPAS																											
RELLENO DE DUCTOS																											
COMPACTACION DE TERRENO																											
ACEPO DE LOSA																											
VACIADO DE LOSA																											
JUNTA DE LOSA																											
ENCHAPE																											
EMPLANTILLADO																											
ENCHAPE DE PAREDES EN COCINA Y BAÑOS																											
ENCHAPE DE PISOS EN COCINA, BAÑOS, TERRAZAS Y AREAS DE SERVICIO																											
UBICACION DE SUMIDOROS Y REGISTROS																											
FRAGUADO																											
TABIQUERIA UNICON																											
LIMPIEZA DE PISO																											
TRAZO Y REPLANTEO																											
LIMPIEZA Y RUBICACION DE TUBERIAS SEGUN TRAZO																											
ANCLAJE DE ACEPO DE REFUERZO 8 MM.																											
ASSENTADO DE LADRILLO UNICON																											
DINTELES																											
SOLAQUEO DE LADRILLOS UNICON																											
DERRAMES DE INTERIORES Y EXTERIORES																											
ENCOFRADO Y VACIADO DE SARDINELES																											
RESANE Y NIVELACION DE PISOS																											

Lookahead de obra Semana N° 27 (Fuente: Edifica)

NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:		FECHA:		UBICACION:																									
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC		sábado, 16 de junio de 2012		AY. SAN MARTIN 625																									
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 23							SEMANA 30							SEMANA 31							SEMANA 32						
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
				25	26	27	28	29	30	31	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SUBESTRUCTURA																															
ACERO DE VERTICALES																															
ENCOFRADO DE VERTICALES																															
CONCRETO DE VERTICALES																															
ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS																															
ACERO DE VIGAS																															
ENCOFRADO DE LOSA - LADO 2 DE VIGA																															
COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS																															
COLOCACION DE LADRILLO BOVEDILLA																															
COLOCACION DE HSS. Y IEE.																															
CONCRETO DE LOSA																															
TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																															
COLOCACION DE PUNTOS DE NIVEL PARA CIELO RASO																															
INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO																															
TARRAJEO DE CIELO RASO																															
SOLAQUEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA																															
SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS																															
PUENTE METALICO																															
TRAZO																															
COLOCACION DE VIGAS PRINCIPALES																															
COLOCACION DE VIGAS SECUNDARIAS																															
ENCOFRADO DE PISO																															
VACIADO DE PISO																															
ENCHAPE																															
EMPLANTILLADO																															
ENCHAPE DE PAREDES EN COCINA Y BAÑOS																															
ENCHAPE DE PISOS EN COCINA, BAÑOS, TERRAZAS Y AREAS DE SERVICIO																															
UBICACION DE SUMIDEROS Y REGISTROS																															
FRAGUADO																															
TABQUERIA UNICON																															
LIMPIEZA DE PISO																															
TRAZO Y REPLANTEO																															
LIMPIEZA Y REUBICACION DE TUBERIAS SEGUN TRAZO																															
ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO 8 MM.																															
ASENTADO DE LADRILLO UNICON																															
DINTELES																															
SOLAQUEO DE LADRILLOS UNICON																															
DERRAMES DE INTERIORES Y EXTERIORES																															
ENCOFRADO Y VACIADO DE SARDINELES																															
RESANE Y NIVELACION DE PISOS																															
PINTURA DE TECHO																															
LIVADO DE TECHO																															
IMPRESION																															
EMPASTADO (3 MANOS)																															
LIVADO FINAL (PULIDO)																															
SELLADO																															
PRIMERA MANO DE PINTURA																															
REMASILLADO																															
ULTIMA MANO DE PINTURA																															
PINTURA DE TABIQUE DE LADRILLO SOLAQUEADO Y/O MURO SOLAQ.																															
LIVADO																															
SOLAQUEO CON YESO Y SELLADOR (3 MANOS)																															
EMPASTADO (2 MANOS)																															
LIVADO FINAL (PULIDO)																															
SELLADO																															


Lookahead de obra Semana N° 28 (Fuente: Edifica)

		LOOKAHEAD PLANNING																		EDIFICA											
NOMBRE DE PROYECTO: BARRANCO 360		PROPIETARIO: EDIFICA CONSTRUCTORES SAC									FECHA: sábado, 23 de junio de 2012					UBICACION: AV. SAN MARTIN 625															
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 29					SEMANA 30					SEMANA 31					SEMANA 32					SEMANA 33							
				L	M	J	J	V	S	L	M	J	J	V	S	L	M	J	J	V	S	L	M	J	J	V	S	L	M	J	J
				03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SUBESTRUCTURA																															
	ACERO DE VERTICALES																														
	ENCOFRADO DE VERTICALES																														
	CONCRETO DE VERTICALES																														
	ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS																														
	ACERO DE VIGAS																														
	ENCOFRADO DE LOSA - LADO 2 DE VIGA																														
	COLOCACIÓN DE VIQUETAS PRETENSADAS																														
	COLOCACIÓN DE LADRILLO BOVEDILLA																														
	COLOCACIÓN DE BISS. Y IIEE.																														
	CONCRETO DE LOSA																														
TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																															
	COLOCACION DE PUNTOS DE NIVEL PARA CIELO RASO																														
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO																														
	TARRAJEO DE CIELO RASO																														
	SOLAQUEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA																														
	SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS																														
PUENTE METALICO																															
	TRAZO																														
	COLOCACION DE VIGAS PRINCIPALES																														
	COLOCACION DE VIGAS SECUNDARIAS																														
	ENCOFRADO DE PISO																														
	VACIADO DE PISO																														
ENCHAPE																															
	EMPLANTILLADO																														
	ENCHAPE DE PAREDES EN COCINA Y BAÑOS																														
	ENCHAPE DE PISOS EN COCINA, BAÑOS, TERRAZAS Y AREAS DE SERVICIO																														
	UBICACION DE SUMIDOROS Y REGISTROS																														
	FRAGUADO																														
TABICERIA UNICON																															
	LIMPIEZA DE PISO																														
	TRAZO Y REPLANTEO																														
	LIMPIEZA Y REUBICACION DE TUBERIAS SEGUN TRAZO																														
	ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO 8 MM.																														
	ASENTADO DE LADRILLO UNICON																														
	DINTELES																														
	SOLAQUEO DE LADRILLOS UNICON																														
	DERRAMES DE INTERIORES Y EXTERIORES																														
	ENCOFRADO Y VACIADO DE SARDINELES																														
	RESANE Y NIVELACION DE PISOS																														
PINTURA DE TECHO																															
	LIJADO DE TECHO																														
	IMPRESION																														
	EMPASTADO (3 MANOS)																														
	LIJADO FINAL (PULIDO)																														
	SELLADO																														
	PRIMERA MANO DE PINTURA																														
	REMASILLADO																														
	ULTIMA MANO DE PINTURA																														
PINTURA DE TABIQUE DE LADRILLO SOLAQUEADO Y/O MURO SOLAQ.																															
	LIJADO																														
	SOLAQUEO CON YESO Y SELLADOR (3MANOS)																														
	EMPASTADO (2 MANOS)																														
	LIJADO FINAL (PULIDO)																														
	SELLADO																														

Lookahead de obra Semana N° 29 (Fuente: Edifica)

			LOOKAHEAD PLANNING																																
NOMBRE DE PROYECTO:			PROPIETARIO:												FECHA:						UBICACION:														
BARRANCO 360			EDIFICA CONSTRUCTORES SAC												sábado, 07 de julio de 2012						AV. SAN MARTIN 625														
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metra do Total	SEMANA 32							SEMANA 33							SEMANA 34							SEMANA 35										
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D				
SUBESTRUCTURA																																			
ACERO DE VERTICALES																																			
ENCOFRADO DE VERTICALES																																			
CONCRETO DE VERTICALES																																			
ENCOFRADO DE FONDOS Y COSTADOS DE VIGAS																																			
ACERO DE VIGAS																																			
ENCOFRADO DE LOSA - LADO 2 DE VIGA																																			
COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS																																			
COLOCACION DE LADRILLO BOVEDILLA																																			
COLOCACION DE ISS Y IIEE																																			
CONCRETO DE LOSA																																			
TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																																			
COLOCACION DE PUNTOS DE NIVEL PARA CIELO RASO																																			
INSTALACION DE ANCLAJES PARA CIELO RASO																																			
TARRAJEO DE CIELO RASO																																			
SOLAQUEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA																																			
SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS																																			
PUENTE METALICO																																			
TRAZO																																			
COLOCACION DE VIGAS PRINCIPALES																																			
COLOCACION DE VIGAS SECUNDARIAS																																			
ENCOFRADO DE PISO																																			
VACIADO DE PISO																																			
ENCHAPE																																			
EMPLANTILLADO																																			
ENCHAPE DE PAREDES EN COCINA Y BAÑOS																																			
ENCHAPE DE PISOS EN COCINA, BAÑOS, TERRAZAS Y AREAS DE SERVICIO																																			
UBICACION DE SUMIDROS Y REGISTROS																																			
FRAGUADO																																			
TABQUERIA UNICON																																			
LIMPIEZA DE PISO																																			
TRAZO Y REPLANTEO																																			
LIMPIEZA Y REUBICACION DE TUBERIAS SEGUN TRAZO																																			
ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO 8 MM																																			
ASENTADO DE LADRILLO UNICON																																			
DIFITELES																																			
SOLAQUEO DE LADRILLOS UNICON																																			
DEFRAMES DE INTERIORES Y EXTERIORES																																			
ENCOFRADO Y VACIADO DE SAPONELES																																			
RESANE Y NIVELACION DE PISOS																																			
PINTURA DE TECHO																																			
Llujado de techo																																			
IMPRIMACION																																			
EMPASTADO (3 MANOS)																																			
Llujado final (pulido)																																			
SELLADO																																			
PRIMERA MANO DE PINTURA																																			
REMASILLADO																																			
ULTIMA MANO DE PINTURA																																			
PINTURA DE TABIQUE DE LADRILLO SOLAQUEADO Y/O MURO SOLAQ.																																			
Llujado																																			
SOLAQUEO CON YESO Y SELLADOR (3 MANOS)																																			
EMPASTADO (2 MANOS)																																			
Llujado final (pulido)																																			
SELLADO																																			

Lookahead de obra Semana N° 31 (Fuente: Edifica)


		LOOKAHEAD PLANNING																																	
NOMBRE DE PROYECTO:		PROPIETARIO:										FECHA:				UBICACION:																			
BARRANCO 360		EDIFICA CONSTRUCTORES SAC										sábado, 14 de julio de 2012				AV. SAN MARTIN 525																			
Código	Descripción de la Actividad	Und	Metrado Total	SEMANA 33							SEMANA 34							SEMANA 35							SEMANA 36										
				L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D	L	M	X	J	Y	S	D				
				23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDO																																		
	COLOCACION DE PUNTOS DE NIVEL PARA CIELO RASO			7E	8A	8B	8C	8D			8E	9A	9B	9C	9D		9E	10A	10B	10C	10D			10E											
	INSTALACION DE ANDAMIOS PARA CIELO RASO			7D	7E	8A	8B	8C			8D	8E	9A	9B	9C		9D	9E	10A	10B	10C			10D	10E										
	TARRAJEO DE CIELO RASO			7C	7D	7E	8A	8B			8C	8D	8E	9A	9B		9C	9D	9E	10A	10B			10C	10D	10E									
	SOLAQUEO DE FONDO Y COSTADOS DE VIGA			7B	7C	7D	7E	8A			8B	8C	8D	8E	9A		9B	9C	9D	9E	10A			10B	10C	10D	10E								
	SOLAQUEO DE PLACAS Y COLUMNAS			7A	7B	7C	7D	7E			8A	8B	8C	8D	8E		9A	9B	9C	9D	9E			10A	10B	10C	10D	10E							
	PUENTE METALICO																																		
	TRAZO						PII																												
	COLOCACION DE VIGAS PRINCIPALES							PII																											
	COLOCACION DE VIGAS SECUNDARIAS			PIII							PIII																								
	ENCOFRADO DE PISO				PIII							PIII																							
	VACIADO DE PISO					PIII							PIII																						
	ENCHAPE																																		
	EMPLANTILLADO			3B	3C	3D	3E	4A			4B	4C	4D	4E	5A		5B	5C	5D	5E	6A			6B	6C	6D	6E	7A							
	ENCHAPE DE PAREDES EN COCINA Y BAÑOS			3A	3B	3C	3D	3E			4A	4B	4C	4D	4E		5A	5B	5C	5D	5E			6A	6B	6C	6D	6E							
	ENCHAPE DE PISOS EN COCINA, BAÑOS, TERRAZAS Y AREAS DE SERVICIO			2E	3A	3B	3C	3D			3E	4A	4B	4C	4D		4E	5A	5B	5C	5D			5E	6A	6B	6C	6D							
	UBICACION DE SUMIDORES Y REGISTROS			2D	2E	3A	3B	3C			3D	3E	4A	4B	4C		4D	4E	5A	5B	5C			5D	5E	6A	6B	6C							
	FRAGUADO																																		
	TABIQUERIA UNICON																																		
	LIMPIEZA DE PISO			6B	6C	6D	6E	7A			7B	7C	7D	7E	8A		8B	8C	8D	8E	9A			9B	9C	9D	9E	10A							
	TRAZO Y REPLANTEO			6A	6B	6C	6D	6E			7A	7B	7C	7D	7E		8A	8B	8C	8D	8E			9A	9B	9C	9D	9E							
	LIMPIEZA Y REUBICACION DE TUBERIAS SEGUN TRAZO			5E	6A	6B	6C	6D			6E	7A	7B	7C	7D		7E	8A	8B	8C	8D			8E	9A	9B	9C	9D							
	ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO 8 MM.			5D	5E	6A	6B	6C			6D	6E	7A	7B	7C		7D	7E	8A	8B	8C			8D	8E	9A	9B	9C							
	ASENTADO DE LADRILLO UNICON			5C	5D	5E	6A	6B			6C	6D	6E	7A	7B		7C	7D	7E	8A	8B			8C	8D	8E	9A	9B							
	DINTELES			5B	5C	5D	5E	6A			6B	6C	6D	6E	7A		7B	7C	7D	7E	8A			8B	8C	8D	8E	9A							
	SOLAQUEO DE LADRILLOS UNICON			5A	5B	5C	5D	5E			6A	6B	6C	6D	6E		7A	7B	7C	7D	7E			8A	8B	8C	8D	8E							
	DERRAMES DE INTERIORES Y EXTERIORES			4E	5A	5B	5C	5D			5E	6A	6B	6C	6D		6E	7A	7B	7C	7D			7E	8A	8B	8C	8D							
	ENCOFRADO Y VACIADO DE SARDINELES			4D	4E	5A	5B	5C			5D	5E	6A	6B	6C		6D	6E	7A	7B	7C			7D	7E	8A	8B	8C							
	RESANE Y NIVELACION DE PISOS			4C	4D	4E	5A	5B			5C	5D	5E	6A	6B		6C	6D	6E	7A	7B			7C	7D	7E	8A	8B							
	PINTURA DE TECHO																																		
	LIADO DE TECHO			1B	1C	1D	1E	2A			2B	2C	2D	2E	3A		3B	3C	3D	3E	4A			4B	4C	4D	4E	5A							
	IMPRIMACION			1A	1B	1C	1D	1E			2A	2B	2C	2D	2E		3A	3B	3C	3D	3E			4A	4B	4C	4D	4E							
	EMPASTADO (3 MANOS)				1A	1B	1C	1D			1E	2A	2B	2C	2D		2E	3A	3B	3C	3D			3E	4A	4B	4C	4D							
	LIADO FINAL (PULIDO)					1A	1B	1C			1D	1E	2A	2B	2C		2D	2E	3A	3B	3C			3D	3E	4A	4B	4C							
	SELLADO						1A	1B			1C	1D	1E	2A	2B		2C	2D	2E	3A	3B			3C	3D	3E	4A	4B							
	PRIMERA MANO DE PINTURA						1B	1C			1D	1E	2A	2B	2C		2D	2E	3A	3B			3C	3D	3E	4A	4B								
	REMASILLADO							1A			1B	1C	1D	1E		2A	2B	2C	2D	2E			3A	3B	3C	3D	3E								
	ULTIMA MANO DE PINTURA								1A		1B	1C	1D	1E		2A	2B	2C	2D	2E			3A	3B	3C	3D	3E								
	PINTURA DE TABIQUE DE LADRILLO SOLAQUEADO Y/O MURO SOLAQ.																																		
	LIADO			1A	1B	1C	1D	1E			2A	2B	2C	2D	2E		3A	3B	3C	3D	3E			4A	4B	4C	4D	4E							
	SOLAQUEO CON YESO Y SELLADOR (3 MANOS)				1A	1B	1C	1D			1E	2A	2B	2C	2D		2E	3A	3B	3C	3D			3E	4A	4B	4C	4D							
	EMPASTADO (2 MANOS)					1A	1B	1C			1D	1E	2A	2B	2C		2D	2E	3A	3B	3C			3D	3E	4A	4B	4C							
	LIADO FINAL (PULIDO)						1A	1B			1C	1D	1E	2A	2B		2C	2D	2E	3A	3B			3C	3D	3E	4A	4B							
	SELLADO							1A			1B	1C	1D	1E	2A		2B	2C	2D	2E	3A			3B	3C	3D	3E	4A							

Lookahead de obra Semana N° 32 (Fuente: Edifica)


ANEXO 7

PLANOS REFERENCIALES DE OBRA


Proyecto Barranco 360 (Fuente: Edifica)

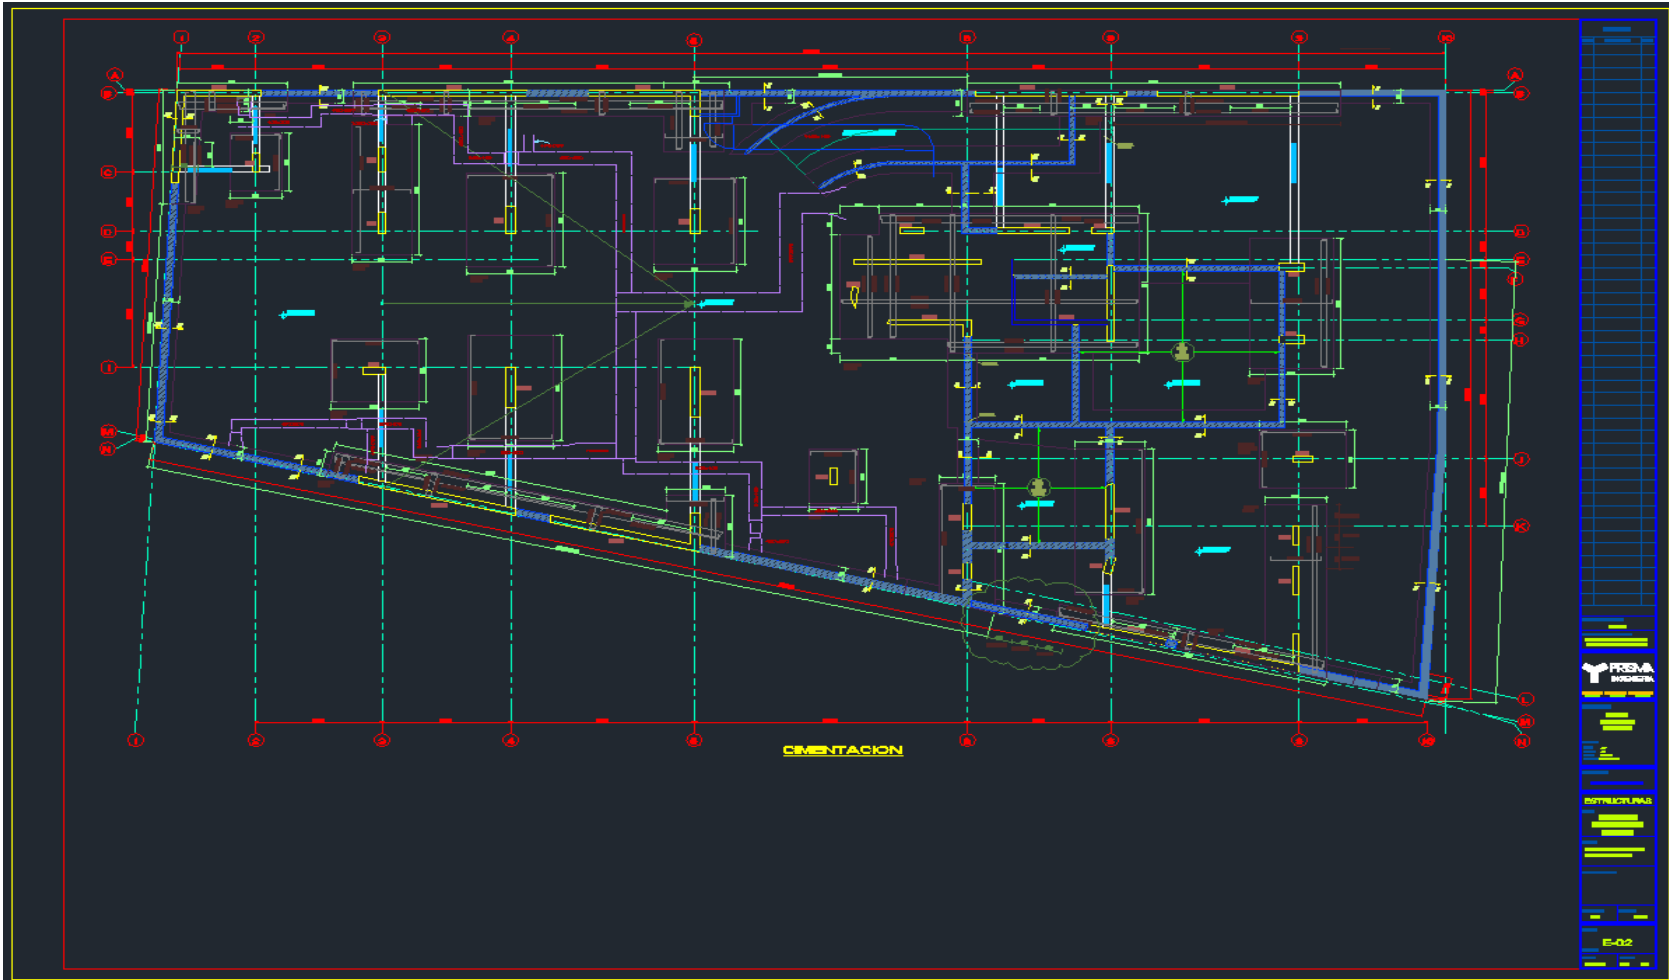


Plano de Cimentación Proyecto Barranco 360 (Fuente: Edifica)

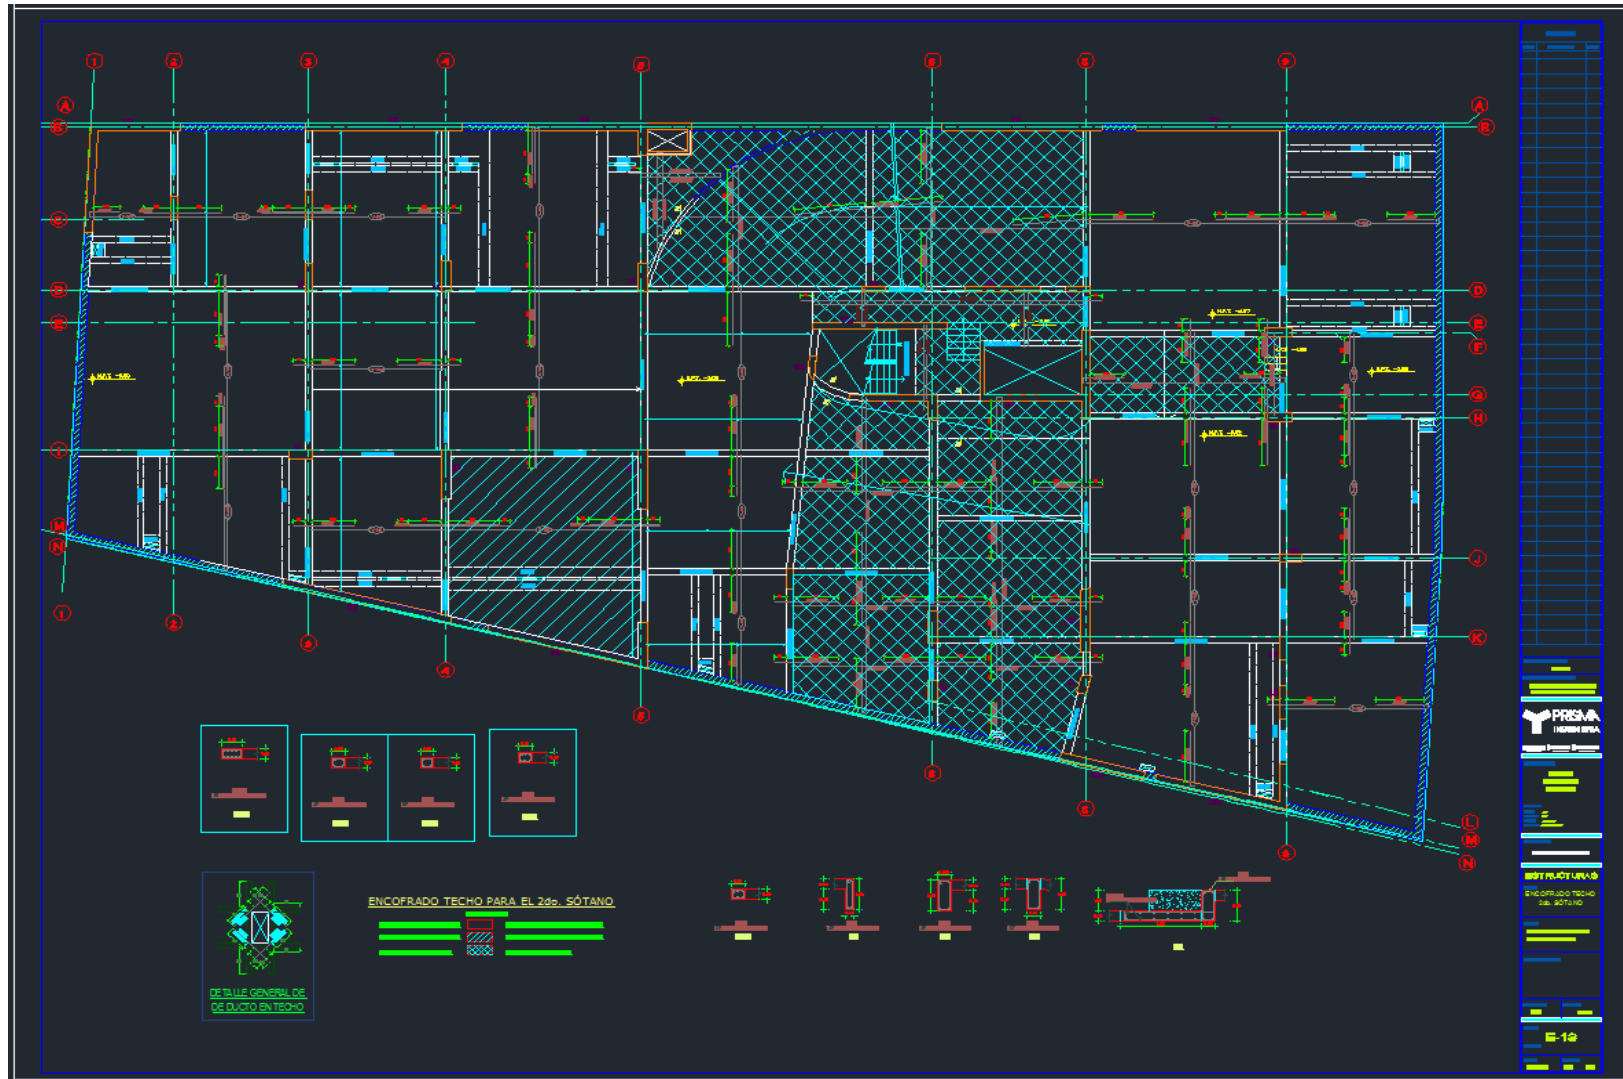

Plano de Encofrado sótanos Proyecto Barranco 360 (Fuente: Edifica)

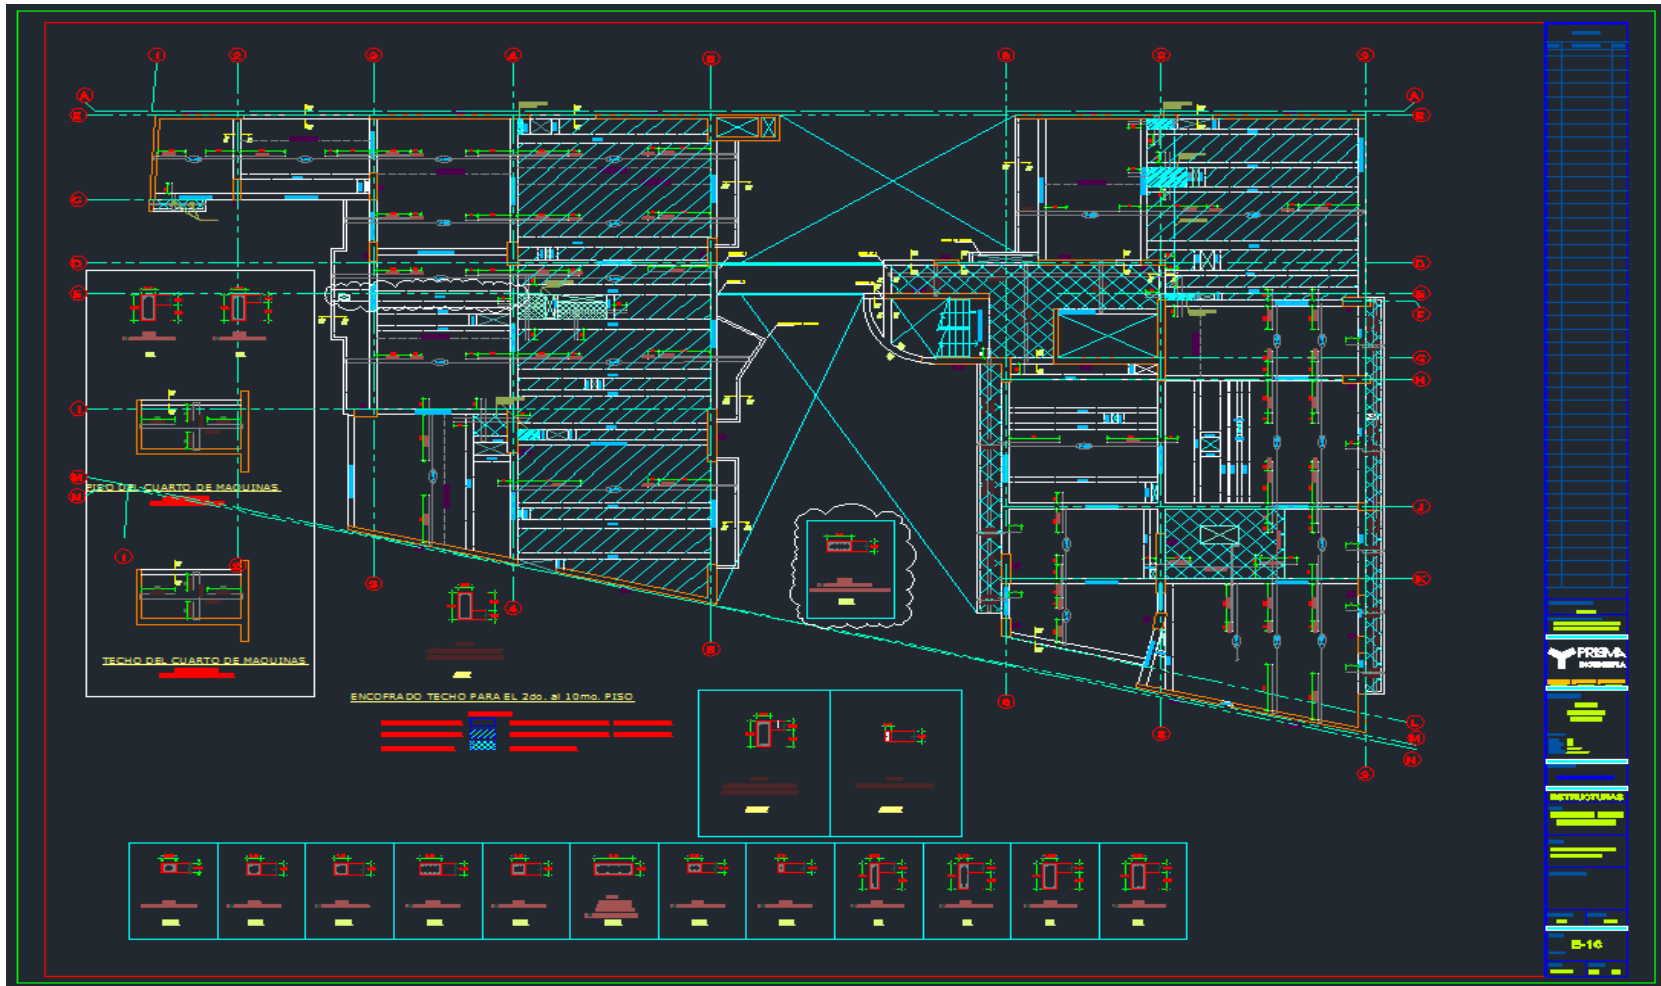


Plano de Encofrado típico Proyecto Barranco 360 (Fuente: Edifica)

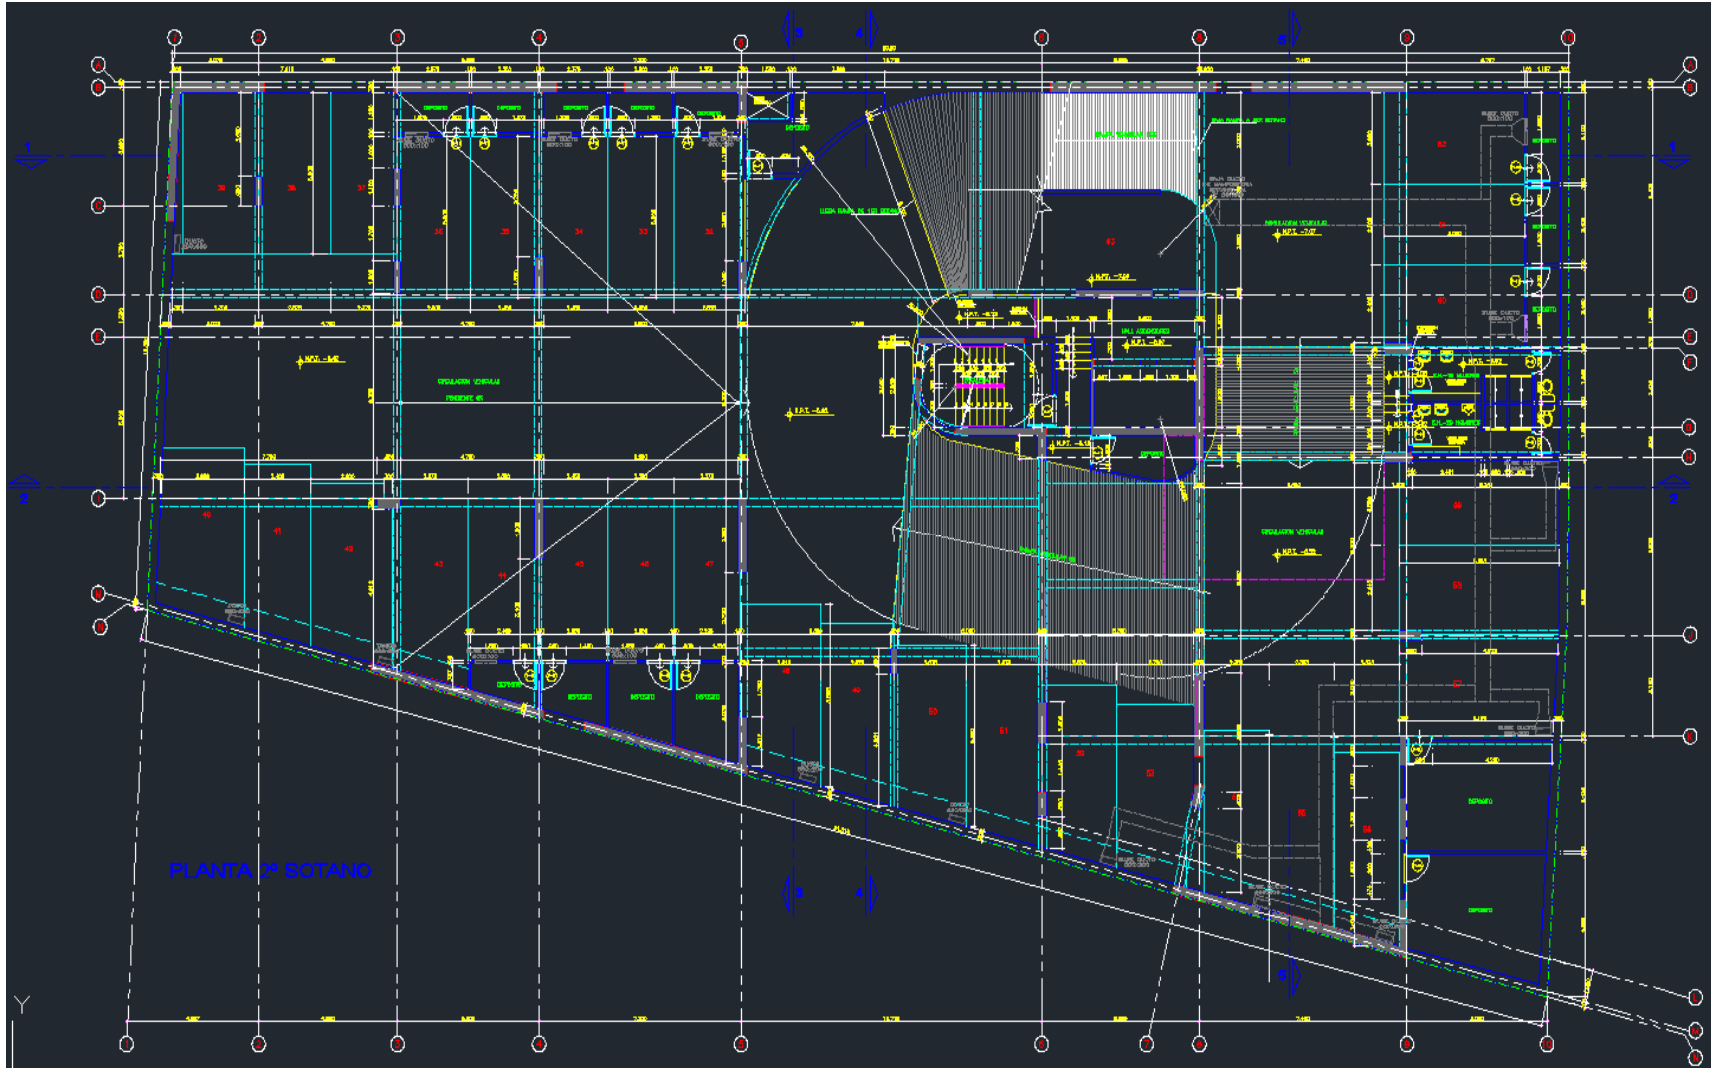


Plano de Arquitectura sótano 2 Proyecto Barranco 360 (Fuente: Edifica)



Plano de Arquitectura Piso 1 Proyecto Barranco 360 (Fuente: Edifica)

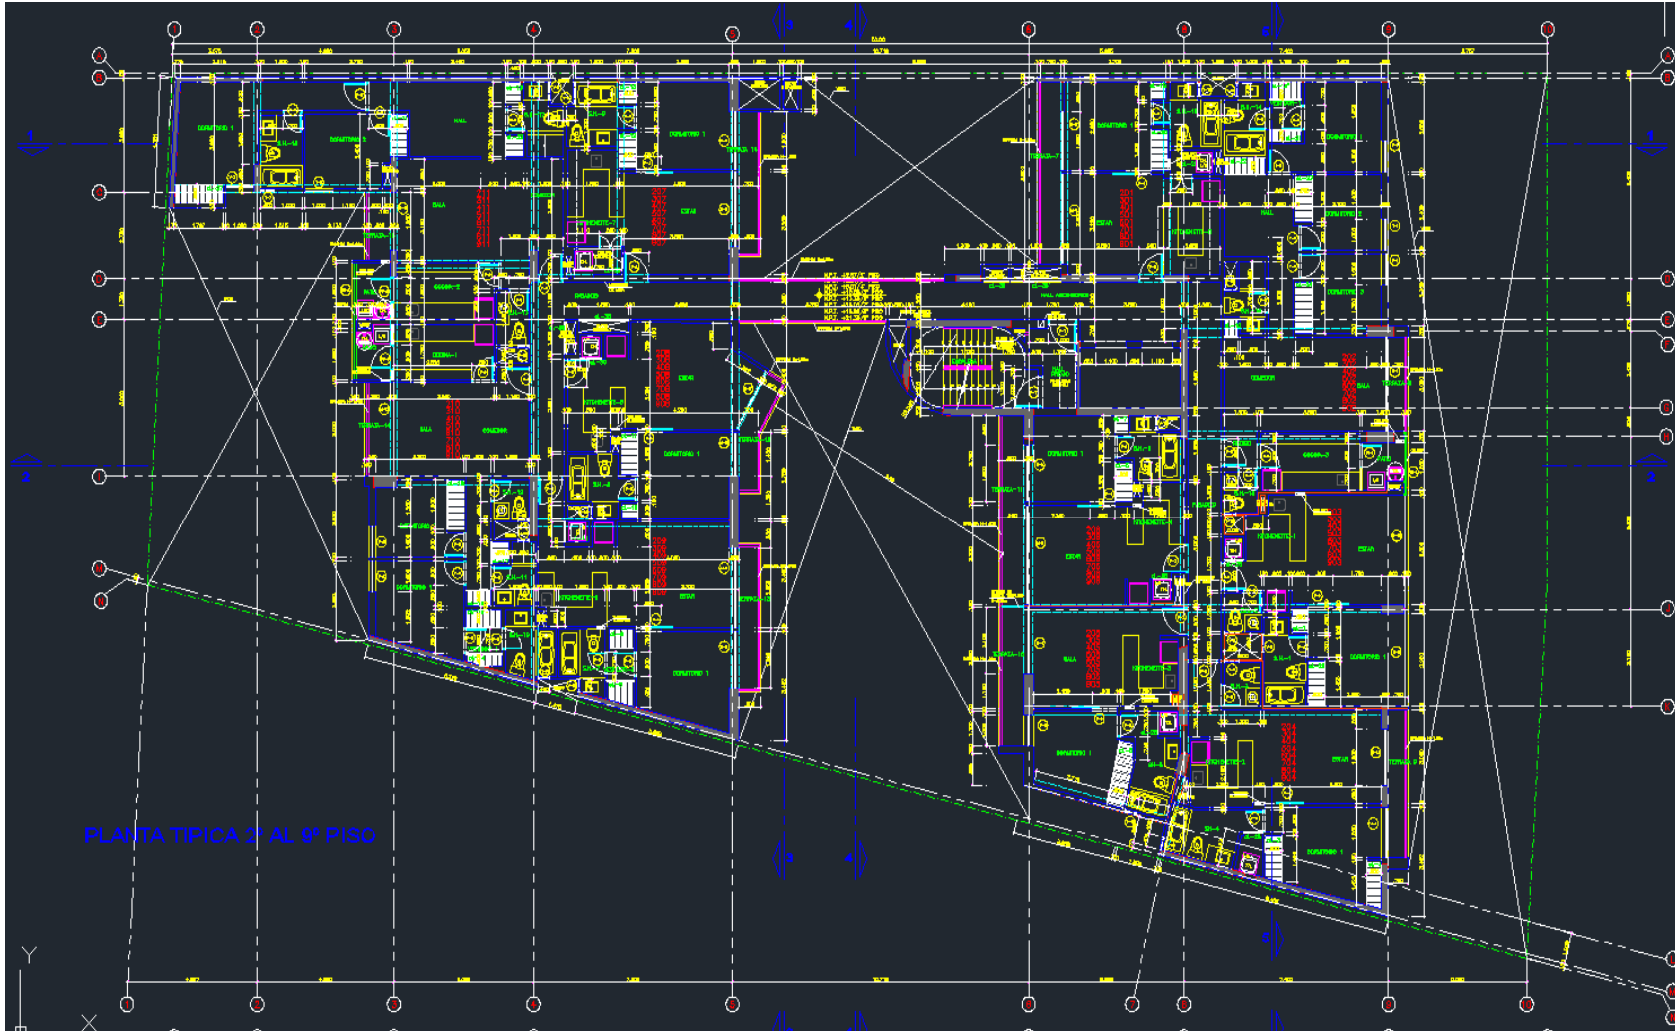

Plano de Arquitectura Pisos 2-9 (típicos) Proyecto Barranco 360 (Fuente: Edifica)

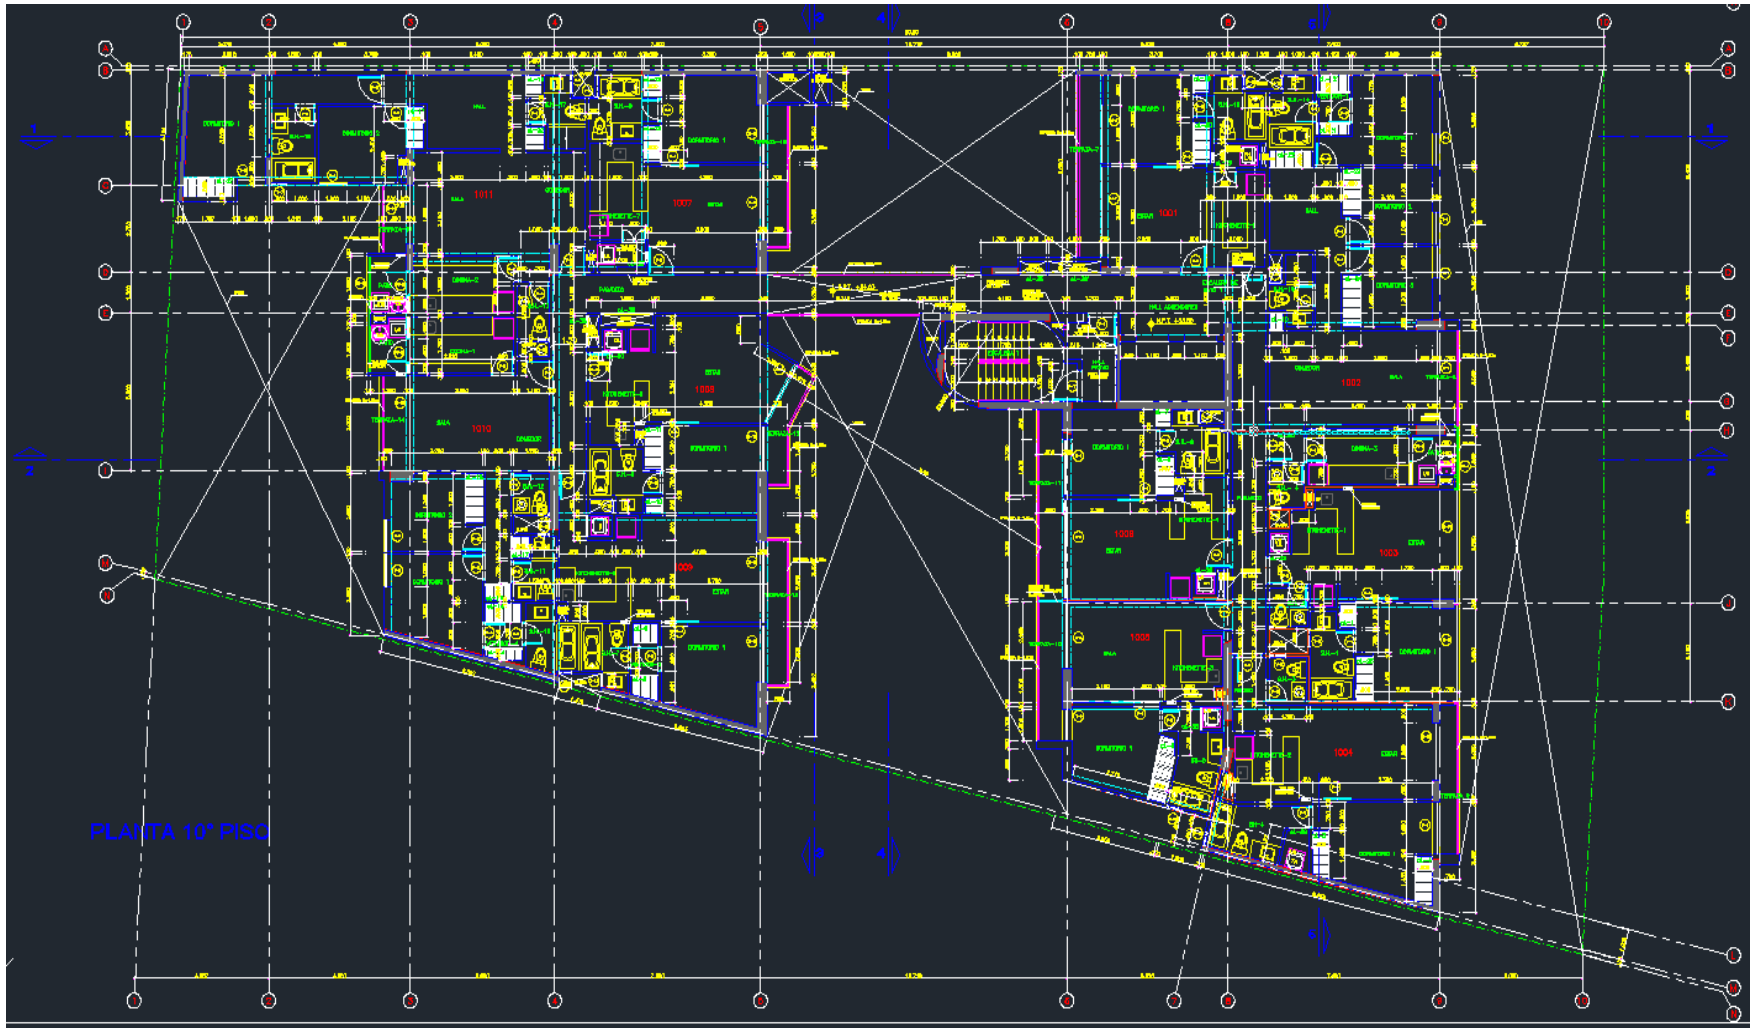

Plano de Arquitectura Piso 10 Proyecto Barranco 360 (Fuente: Edifica)

ANEXO 8

CRONOGRAMA DE LINEAS DE BALANCE

