PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES.

Tesis para obtener el título profesional de Ingeniero Civil

AUTOR:

Jorge Luis Uribe Doria

ASESOR:

Luis Humberto Bravo Salomón

Lima, julio, 2025

Declaración jurada de autenticidad

Yo, Luis Humberto Bravo Salomón, docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia

Universidad Católica del Perú, asesor(a) de la tesis titulada “Análisis del impacto de las herramientas de mejora continua dentro del sistema integrado de gestión (SIG) durante el desarrollo de un proyecto de edificios multifamiliares”, del autor Jorge Luis Uribe Doria, dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 6%. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el 15/07/2025.
- He revisado con detalle dicho reporte y confirmo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio alguno.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha: San Miguel 15 de julio del 2025

Apellidos y nombres del asesor / de la asesora: Bravo Salomón, Luis Humberto	
DNI: 06994878	Firma
ORCID: 0000-0003-1476-9710	

DEDICATORIA

Gracias a los que me apoyaron en conseguir algo que, durante un tiempo, pensé imposible:

A mi padre, por darme más oportunidades de las que creo haber merecido, sacrificando su tiempo y paz para permitirme llegar a donde estoy.

A mi madre, la cual no dejo de preocuparse por mi durante todo mi trayecto, consintiéndome y presionándome por partes iguales para que siempre diera lo mejor de mí.

A mi asesor, por brindarme su tiempo para resolver las muchas consultas que tuve con respecto a la tesis, sin nunca perder la paciencia o renegar a pesar de los cambios que realizaba.

Y a mi compañera de la vida, Sandra Peralta, que se convirtió en mi confidente y apoyo desde que la conozco, acompañándome en las partes más estresantes de este proceso de redacción y sufriendo mientras realizaba las lecturas de prueba en las fases iniciales de este documento.

RESUMEN

En el presente trabajo, cuyo objetivo es identificar la herramienta de mejora continua con mayor efectividad dentro del sistema integrado de gestión (SIG) empleado durante la construcción de un proyecto inmobiliario, se realiza un análisis de los resultados obtenidos por las herramientas de mejora continua durante la construcción de un condominio multifamiliar consistente de doce torres divididas en seis etapas durante un plazo de cinco años. Esta investigación, comenzada por la variabilidad del impacto de las diversas herramientas de mejora continua en diversos escenarios, es desarrollada mediante una metodología cuantitativa transversal, en la cual se normalizan los resultados obtenidos por las diversas herramientas analizadas para permitir su comparación. Los resultados revelan que, si bien las herramientas con mayor número de horas hombre invertidas son las que obtienen un mayor número de hallazgos, son las herramientas con menor número de aplicaciones las que poseen una mejor ratio de hallazgos debido a su característica más inquisitiva. Con ello se concluye que "las auditorías e inspecciones" es la herramienta que obtiene de forma más consistente hallazgos de desperfectos en el funcionamiento del SIG. Así mismo, la investigación demuestra que "las lecciones aprendidas" es la herramienta que obtiene de forma más consistente los hallazgos de mejoramiento al funcionamiento del SIG.

Palabra clave: Mejora continua, Sistema de Gestión, optimización.

ÍNDICE

RESUMEN i

DEDICATORIA ..... **¡Error! Marcador no definido.**

ÍNDICE ii

LISTA DE TABLAS xi

LISTA DE FIGURAS xiii

CAPÍTULO I: EXPLICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 1

1.1. Introducción 1

1.2. Objetivos 2

1.2.1. Objetivo general. 2

1.2.2. Objetivos específicos. 2

1.3. Justificación 2

1.4. Metodología 3

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 5

2.1. Antecedentes 5

2.1.1. Antecedentes internacionales. 5

2.1.1.1. Antecedente internacional número 1. 5

2.1.1.2. Antecedente internacional número 2. 6

2.1.1.3. Antecedente internacional número 3. 7

2.1.2. Antecedentes nacionales. 8

2.1.2.1. Antecedente nacional número 1. 8

2.1.2.2. Antecedente nacional número 2. 9

2.1.2.4. Antecedente nacional número 3. 9

2.2. Normas técnicas de gestión 10

2.2.1. Norma ISO 9001:2015. 10

2.2.1.1. Objetivo norma ISO 9001:2015. 10

2.2.1.2. Aplicación norma ISO 9001:2015. 11

2.2.1.2.1. Definición de la organización y su contexto. 11

2.2.1.2.2. Responsabilidades de alta gerencia. 11

2.2.1.2.3. Planificación. 12

2.2.1.2.4. Recursos de la empresa. 13

2.2.1.2.5. Operación. 14

2.2.1.2.6. Evaluación de desempeño. 16

2.2.1.2.7. Mejora....17

2.2.2. Norma ISO 14001:2015. 17

2.2.2.1. Objetivo norma ISO 14001:2015. 18

2.2.2.2. Aplicación norma ISO 14001:2015.....18

2.2.2.2.1. Planificación. 18

2.2.2.2.2. Operación. 19

2.2.2.2.3. Evaluación del desempeño. 20

2.2.2.2.4. Mejora....21

2.2.3. Norma ISO 45001:2018. 21

2.2.3.1. Objetivo norma ISO 45001:2018. 21

2.2.3.2. Aplicación norma ISO 45001:2018.....22

2.2.3.2.1. Planificación. 22

2.2.3.2.2. Operación. 23

2.2.3.2.3. Evaluación del desempeño. 23

2.2.3.2.4. Mejora....25

2.3. Definiciones 25

2.3.1. Sistema de gestión. 25

2.3.2. Sistema integrado de gestión. 25

2.3.2.1. Implementación del SIG. 26

2.3.2.2. Ventajas del SIG. 27

2.3.3. Mejora continua. 27

2.3.4. Ciclo de Deming. 28

2.3.4.1. Planear (Plan). 29

2.3.4.2. Hacer (Do). 30

2.3.4.3. Verificar (Check). 30

2.3.4.4. Estandarizar (Act). 31

2.3.5. Herramientas de mejora continua. 31

2.3.5.1. Clasificación de herramientas. 32

2.2.5.1.1. Nivel 1: Nivel de sistema. 32

2.2.5.1.2. Nivel 2: Objeto. 33

2.2.5.1.3. Nivel 3: Operación. 34

2.2.5.1.4. Nivel 4: Actividad. 34

2.2.5.1.5. Nivel 5: Recursos. 35

2.2.5.1.6. Nivel 6: Evaluación. 35

2.2.5.1.7. Nivel 7: Aplicación....36

2.3.5.2. Auditorías e inspecciones. 37

2.3.5.2.1. Plan de auditoría. 37

2.3.5.2.2. Preparación de auditoría. 38

2.3.5.2.3. Ejecución de auditoría. 41

2.3.5.3. Encuestas de satisfacción. 42

2.3.5.3.1. Enfoque de preguntas. 43

2.3.5.3.2. Elaboración de preguntas. 44

2.3.5.3.3. Implementación de encuestas. 46

2.3.5.3.4. Análisis de resultados. 47

2.3.5.4. Registro de observaciones. 47

2.3.5.4.1. Criterios de revisión. 48

2.3.5.4.2. Procesos de control de calidad. 49

2.3.5.4.3. Criterios registrados.....50

2.3.5.4.4. Análisis estadístico. 50

2.3.5.5. Lecciones aprendidas.....51

2.3.5.5.1. Clasificación de mejoras.....51

2.3.5.5.2. Análisis de lecciones aprendidas. 52

2.3.5.5.3. Difusión empresarial. 52

CAPITULO III: DOCUMENTACIÓN ADQUIRIDA DE LA EMPRESA 54

3.1. Información general 54

3.1.1. Empresa inmobiliaria.....54

3.1.2. Proyecto. 56

3.2. SIG en el proyecto a inicios del proyecto 56

3.2.1. Políticas. 57

3.2.2. Objetivos.....58

3.2.2.1. Objetivos de política de protección. 58

3.2.2.2. Objetivos de política de cobertura integral. 59

3.2.2.3. Objetivos de política de participación. 59

3.2.2.4. Objetivos de política de mejora continua. 59

3.2.2.5. Objetivos de política de satisfacción del cliente..... 60

3.2.2.6. Objetivos de política de innovación. 60

3.2.3. Herramientas de mejora continua. 60

3.2.3.1. Auditoría e inspecciones..... 61

3.2.3.2. Encuestas de satisfacción. 63

3.2.3.3. Registro de observaciones. 65

3.2.3.4. Lecciones aprendidas..... 67

CAPITULO IV: ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 69

4.1. Clasificación de hallazgos..... 69

4.2. Hallazgos de auditoría e inspecciones 70

4.2.1. Oportunidades de mejora en auditorías e inspecciones. 71

4.2.2. Fortalezas en auditorías e inspecciones. 72

4.2.3. Observaciones en auditorías e inspecciones. 73

4.2.4. No conformidades en auditorías e inspecciones. 74

4.2.5. Recopilado de hallazgos en auditorías e inspecciones. 75

4.3. Hallazgos de las encuestas de satisfacción 75

4.3.1. Oportunidades de mejora en encuestas de satisfacción. 76

4.3.2. Fortalezas en encuestas de satisfacción. 77

4.3.3. Observaciones en encuestas de satisfacción. 78

4.3.4. No conformidades en encuestas de satisfacción. 79

4.3.5. Recopilado de hallazgos en encuestas de satisfacción. 80

4.4. Hallazgos del registro de observaciones 80

4.4.1. Oportunidades de mejora en registro de observaciones. 82

4.4.2. Fortaleza en registro de observaciones. 82

4.4.3. Observaciones en registro de observaciones. 83

4.4.4. No conformidades en registro de observaciones. 84

4.4.5. Recopilado de hallazgos en registro de observaciones. 85

4.5. Hallazgos de las lecciones aprendidas 85

4.5.1. Oportunidades de mejora en lecciones aprendidas. 87

4.5.2. Fortaleza en lecciones aprendidas. 88

4.5.3. Observaciones en lecciones aprendidas 89

4.5.4. No conformidades en lecciones aprendidas. 89

4.5.5. Recopilado de hallazgos en lecciones aprendidas. 90

CAPITULO V: RESULTADOS 91

5.1. Eficacia de obtención de hallazgos 91

5.1.1. Ratio de oportunidades de mejora según herramientas. 92

5.1.2. Ratio de fortalezas según herramientas. 92

5.1.3. Ratio de observaciones según herramientas. 93

5.1.4. Ratio de no conformidades según herramienta. 94

5.1.5. Recopilado de hallazgos en lecciones aprendidas. 94

5.2. Comparación de horas hombre (H.H.) empleadas 95

CONCLUSIONES 97

COMENTARIOS 101

RECOMENDACIONES 102

BIBLIOGRAFÍA 103

ANEXOS 108

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Métodos de auditoría aplicables 39

Tabla 2. Posibles métodos de evaluación 40

Tabla 3. Procedimientos sugeridos para el análisis de datos 47

Tabla 4. Resultados de las inspecciones por área 70

Tabla 5. Hallazgos clasificados de las inspecciones 75

Tabla 6. Resultados de las encuestas de satisfacción 76

Tabla 7. Hallazgos por encuestas de satisfacción 80

Tabla 8. Hallazgos del registro de observaciones, sin filtro 81

Tabla 9. Hallazgos del registro de observaciones, con filtro 82

Tabla 10. Hallazgos clasificados del registro de observaciones 85

Tabla 11. Hallazgos por registro de observaciones 87

Tabla 12. No conformidades en del registro de observaciones 90

Tabla 13. Resumen de hallazgos categorizados 91

Tabla 14. Resumen de ratios de categoría de hallazgos 95

Tabla 15. Resumen de horas hombre (H.H.) por hallazgo 95

Tabla 16. Comparación de H.H. empleadas en las herramientas de mejora continua ...96

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Flujo de investigación 4

Figura 2. Recursos disponibles de una empresa 13

Figura 3. Ciclo PDCA de Ishikawa 29

Figura 4. Clasificación de herramientas de mejora continua 37

Figura 5. Errores comunes en la elaboración de preguntas 46

Figura 6. Estrategias de control de calidad 49

Figura 7. Diagrama Ishikawa 52

Figura 8. Organigrama de sección de construcción 55

Figura 9. Línea temporal de la evolución del sistema integrado de gestión 57

Figura 10. División de los objetivos del SIG de acuerdo a las políticas de la empresa . 58

Figura 11. Programación anual de auditorías e inspecciones 61

Figura 12. Formato de inspección de gestión total de la calidad 62

Figura 13. Clasificación de auditorías e inspecciones 63

Figura 14. Formato de encuesta de satisfacción al cliente 64

Figura 15. Clasificación de encuesta de satisfacción 65

Figura 16. Formato del registro de observaciones.....66

Figura 17. Clasificación del registro de observaciones.....67

Figura 18. Formato de lecciones aprendidas.....68

Figura 19. Clasificación de lecciones aprendidas.....68

Figura 20. Oportunidades de mejora durante auditorías e inspecciones.....71

Figura 21. Fortalezas durante auditorías e inspecciones.....72

Figura 22. Observaciones durante auditorías e inspecciones.....73

Figura 23. No conformidades durante auditorías e inspecciones.....74

Figura 24. Oportunidades de mejora en encuestas de satisfacción.....77

Figura 25. Fortalezas en encuestas de satisfacción.....78

Figura 26. Observaciones en encuestas de satisfacción.....79

Figura 27. No conformidades en encuestas de satisfacción.....80

Figura 28. Observaciones del registro de observaciones.....83

Figura 29. No conformidades del registro de observaciones.....84

Figura 30. Oportunidades de mejora de lecciones aprendidas.....88

Figura 31. Fortalezas de lecciones aprendidas.....89

Figura 32. Ratio de oportunidades de mejora según herramientas.....92

Figura 33. Ratio de hallazgos de fortalezas por herramientas.....93

Figura 34. Ratio de hallazgos de observaciones según herramientas.....93

Figura 35. Ratio de hallazgos de no conformidades según herramientas.....94

CAPÍTULO I: EXPLICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

1.1. Introducción

Ante un ambiente laboral cada vez más intenso y competitivo, la necesidad de una constante actualización y la mejora de procesos es una realidad que afrontan las empresas para mantenerse como una alternativa viable ante los ojos de los consumidores. Debido a esta problemática, muchas empresas han intentado adoptar técnicas y modelos aplicados por otras entidades que han demostrado efectos positivos durante su aplicación; sin embargo, el éxito de estas emulaciones es en gran parte limitado por la falta de conocimientos y experiencias de la empresa en cuestión (Marín, Quintero y Medina, 2013).

El sector constructor no es ajeno a las exigencias que los tiempos modernos acarrean. Tanto las empresas inmobiliarias como las constructoras han comenzado a adoptar diversos modelos de gestión para que sus empresas se encaminen a la "Excelencia" (Huayamave, 2013); ya sea adoptando estándares internacionales, como las normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y las normas de Salud Ocupacional y Series de Evaluación de la Seguridad (OSHAS), o empleando una combinación de estas mediante un sistema integrado de gestión (SIG). Mas el problema surge cuando, al iniciar en el proceso de mejora continua, las empresas abarcan demasiados puntos y aprecian que están consumiendo más recursos en la búsqueda de la "mejora" que lo esperado.

Esto se debe a que, como lo menciona Ackoff: "La sobreabundancia de información irrelevante constituye un mayor problema que la falta de información relevante, debido a que requiere más tiempo filtrar la información masiva que esta dispone, con el fin de encontrar que es lo realmente relevante" (Hernández, 2016). Dando a entender que es necesario focalizar los esfuerzos en un punto para poder obtener resultados más óptimos. Es por ello que, en la

presente tesis, se analiza el impacto de las herramientas de mejora continua del SIG de una empresa inmobiliaria durante el periodo de construcción de un condominio de edificios multifamiliares, con la finalidad de identificar cuál es la que mayor beneficio ha traído en relación a sus cambios.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general.

Analizar la eficacia de las diversas herramientas de mejora continua durante la ejecución de un condominio de edificios multifamiliares

1.2.2. Objetivos específicos.

- Identificar las herramientas de mejora continua que son relevantes para el proyecto a analizar
- Identificar cuál es el impacto de dichas herramientas de mejora continua para generar situaciones de mejora
- Identificar el tiempo empleado para la implementación de las herramientas de mejora continua
- Identificar cuál es la herramienta de mejora continua que obtuvo mejor desempeño para obtener un tipo específico de hallazgo

1.3. Justificación

Las empresas implementan los sistemas de gestiones con la finalidad de aumentar la efectividad de los procesos que emplean, minimizando los desperdicios y maximizando las ganancias. Las herramientas que más enfatizan en dicho aspecto son las herramientas de mejora

continua, estas buscan identificar errores en el proceso de ejecución de las actividades que las empresas utilizan, con el fin de optimizarlos. Esto es de suma importancia para empresas que requieren un alto nivel de inversión como es el caso de las empresas constructoras.

Así como existen diversos sistemas integrados de gestión, un proyecto constructivo puede poseer diversas herramientas de mejora continua para sus respectivos SIG; sin embargo, esto no significa que todos estos tengan la misma efectividad o que su aplicación sea conveniente bajo las mismas circunstancias. La aplicación de cada una de estas herramientas tiene un impacto diferente dependiendo del proyecto, existiendo la posibilidad de poder identificar cuál es la más eficaz y, por lo tanto, se le debe brindar más recursos o importancia durante el transcurso de las actividades.

1.4. Metodología

La investigación a realizar se hará utilizando información compilada durante el periodo de construcción de un condominio de viviendas multifamiliares. La investigación a realizar será cuantitativa transversa.

Durante el Capítulo I se plantea la problemática en cuestión, así como los objetivos, alcances y justificación del trabajo de investigación. Así mismo, se presenta la metodología usada durante la investigación del problema.

El Capítulo II abarca los antecedentes donde se evidencia la efectividad de las herramientas de mejora continua, así mismo, se desarrollan los fundamentos teóricos necesarios para la comprensión de este trabajo, abarcando un análisis de las diversas normas usualmente adoptadas por las constructoras dentro de su sistema integrado de gestión y los conceptos claves sobre la mejora continua y sus herramientas.

El Capítulo III se realiza una contextualización de la situación del proyecto a estudiar y se identifican cuáles son las herramientas de mejora continua más relevantes del proyecto.

El Capítulo IV se centra en el análisis los resultados obtenidos por parte de las herramientas de mejora continua, normalizando los resultados a un patrón común para su análisis posterior.

El Capítulo V se analiza los resultados obtenidos del capítulo IV, permitiendo obtener patrones o conceptos claves.

Finalmente, en el Capítulo VI se expone las conclusiones del análisis y se presentan recomendaciones sobre las pautas al utilizar las herramientas de mejora continua de acuerdo al propósito de una empresa en un determinado momento, esto se resume en la Figura 1.



Figura 1. Flujo de investigación

Fuente: propia.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Es una realidad que las empresas, ante la actitud competitiva de sus pares, busquen mejorarse y generar innovación con el fin de destacarse sobre el resto. Sin embargo, este cambio no necesariamente debe venir de una idea revolucionaria o arriesgada. La acumulación sistemática de pequeñas mejoras en los procesos desemboca a largo plazo en un incremento a la competitividad del negocio (Pastor, Noriega, Díaz y Kleeberg, 2010). En esta sección, se procede a ejemplificar diversos antecedentes de la aplicación de herramientas de mejora continua para poder obtener una mejora viable en el rendimiento de una empresa, donde se puede llegar a analizar las causantes de sus éxitos o fracasos.

2.1.1. Antecedentes internacionales.

A continuación, se muestran antecedentes internacionales relacionados con el tema de la tesis.

2.1.1.1. Antecedente internacional número 1.

El primer caso a estudiar se trata del reciente artículo publicado por Javanmardi, He, Hsiang, Abbasian y Liu (2023), llamado "*Enhancing Construction Project Work flow Reliability through Observe–Plan–Do–Check–React Cycle: A Bridge Project Case Study*". En él se plantea determinar el apropiado nivel de esfuerzo requerido en cada caso del "observar-planear-hacer-reaccionar", conocido como OPDCA por sus siglas en inglés, para aumentar la confiabilidad en el flujo de trabajo en un proyecto de construcción. Este estudio se realizó mediante el análisis del desarrollo de las 475 actividades particulares realizadas durante el

proceso de construcción de un proyecto inmobiliario, siendo una investigación cuantitativa, experimental y transversal.

Después de comparar el tiempo empleado en cada una de las fases del OPDCA y el porcentaje de compleción de lo planeado (PPC) para cada una de las actividades implicadas en la construcción del puente, los autores llegan a la conclusión de que el tiempo que se le debe atribuir a cada etapa del ciclo OPDCA es limitado. Si bien este articulo realiza un estudio sobre la cantidad de veces que las discusiones del OPDCA ocurren durante las reuniones semanales y no en su extensión, la información planteada puede permitir al personal gerencial encontrar cuáles son las partes del ciclo OPDCA donde se presenta la falla.

Esta tesis es relevante porque marca un precedente en la medición de la efectividad de cada fase del ciclo OPDCA. Así mismo, demuestra la necesidad de establecer un tiempo límite de los pasos en las fases de planeación y sobre todo en casos de emergencias donde se necesita una respuesta rápida.

2.1.1.2. Antecedente internacional número 2.

El segundo caso de estudio se trata del artículo "*Application of safety management system in building construction based on BIM and PDCA theory"*, escrito por Men (2024), este tiene como objetivo establecer una integración del método OPDCA a la metodología BIM. Este estudio está centrado en los sistemas de gestión de la seguridad y control de riesgos en las obras de construcción. La investigación fue realizada de forma pura y transversal, empleando la información teórica de la metodología BIM y el ciclo OPDCA.

En este artículo se llega a la conclusión que el modelo OPDCA permite identificar la información sobre la seguridad del proyecto de manera más intuitiva, haciendo su gestión más

eficiente. Así mismo, debido a que, el sistema de gestión de la construcción está basado en la ideología BIM y PDCA tiende a ser más intuitivo y esto facilita su control. Sin embargo, lo anterior mencionado requiere un continuo y meticuloso control del sistema de gestión, perfeccionando los procesos cada vez que se encuentran y solucionan problemas.

Este documento es relevante dado que analiza la aplicación de la metodología PDCA y sus beneficios a un sistema de gestión basado en la metodología BIM, siendo la primera de estas metodologías empleada en la empresa a investigar en esta tesis. Si bien la empresa a analizar en la presente tesis es dueña del SIG, también aplica la metodología BIM, esta aplicación es diferente a la estudiada en el artículo del autor.

2.1.1.3. Antecedente internacional número 3.

El tercer documento de estudio es el artículo de los autores Montesinos, Vázquez, Maya y Gracida (2020), "Mejora Continua en una empresa en México: estudio desde el ciclo Deming". Este artículo tiene como objetivo analizar los resultados de la aplicación del ciclo PCDA en el área de inventarios de una planta de almacenamientos y distribución de gas licuado de petróleo (GLP) en México. La metodología utilizada durante la investigación fue transversal cuantitativa.

Este estudio alcanza la conclusión de que sí existe una mejora continua en el área después de la aplicación del ciclo de Deming, o también conocido como el ciclo PDCA, cumpliéndose los objetivos planteados en el 2016, 2017 y 2018, siendo el último el que tuvo mayor margen de mejora después de la aplicación del ciclo de Deming. Gracias a dicho ciclo, se pudo identificar los problemas y las soluciones necesarias para satisfacer los requerimientos de la empresa.

Este caso de estudio es de suma importancia porque realiza un análisis exhaustivo de los cuatro pasos del ciclo de Deming, aplicados a un proceso específico del proceso de almacenamiento mediante la toma de datos de diferentes herramientas de medición propia de la empresa. Esto nos permite apreciar cómo se extrapola la información obtenida de diversos medidores de desempeño para poder extraer las fallas en el sistema y posteriormente dar con una solución. Así mismo, ayuda a marcar una referencia durante el análisis de las herramientas de recolección de datos del caso a tratar en la presente tesis.

2.1.2. Antecedentes nacionales.

A continuación, se muestran algunos antecedentes nacionales relacionados con el tema de la tesis.

2.1.2.1. Antecedente nacional número 1.

El ingeniero Arzapalo (2020) en su tesis “Implementación del Ciclo PHVA en la mejora del cumplimiento del plan mensual de avances - AESA RAURA”. Plantea determinar la manera en la que el ciclo Deming aumenta el cumplimiento de los planes mensuales de los avances. Este informe fue realizado empleando una metodología experimental en el área de producción de la empresa Administración de empresas SAC (AESA).

Como resultado, el autor indica que se obtuvo una mejora del cumplimiento del plan mensual en un 20%, debido a la identificación de las demoras operativas que afectaban el cumplimiento de los objetivos al finalizar el mes. Así mismo, se logró corroborar una mejora de un 5% con respecto al mes anterior a la aplicación de la metodología empleada. Adicionalmente, gracias a la elaboración de la gráfica de Pareto, se logran identificar los puntos claves de la deficiencia del proyecto en estudio, lo que permitió la búsqueda de una solución.

Esta tesis es importante porque proporciona evidencia de los beneficios de la aplicación del ciclo de Deming de forma correctiva. Adicionalmente, el documento permite apreciar los beneficios colaterales de las herramientas de recolección como el gráfico de Pareto mencionado.

2.1.2.2. Antecedente nacional número 2.

Escobedo, Mendoza y Oblitas (2020), en su artículo "*Assessing Development and Sustainability of a Research Management System: Deming's cycle in a Peruvian University*", tiene como objetivo evaluar el desarrollo del sistema de gestión de investigación de la Universidad Privada del Norte (UPN). El estudio está enfocado en el sistema de gestión de investigación de la UPN durante el periodo de entre 2012 al 2017.

El resultado al que llegan los investigadores es que, por parte de la universidad, se ha visto un esfuerzo palpable para fortalecer su sistema de investigación. Resaltando el proceso que se desarrolló y enfatizando la importancia de la implementación del ciclo de Deming para buscar oportunidades de mejora.

Este documento es importante para este trabajo de investigación por lo que permite identificar los beneficios de la implementación de herramientas de mejora continua. A pesar de no presentarse observaciones como tal, esto nos permite evidenciar la necesidad de la autoanálisis rutinario y objetivo.

2.1.2.4. Antecedente nacional número 3.

Bustamante & Sosa (2022), en su tesis "Modelo de optimización basado en la metodología Lean Manufacturing y PDCA para mejorar la productividad del proceso de ejecución de enchapado en un edificio multifamiliar", plantean como objetivo establecer un

modelo de optimización para mejorar la productividad del proceso de enchapado. La investigación, que tiene un carácter aplicativo y explicativo, establece como objeto de estudio a un proyecto de construcción especifico de un edificio multifamiliar.

El resultado de la investigación permite corroborar la hipótesis sobre el beneficio del uso de metodología Lean Manufacturing. En consecuencia, los autores llegaron a la conclusión de que el modelo de optimización propuesto por ellos era viable, obteniendo un aumento de productividad del 11.7 m2/día a 16.3 m2/día.

Esta tesis es relevante debido a que presenta la aplicación del ciclo de Deming con pasos claros y precisos, ahondando en las variables y herramientas de medición utilizadas para el análisis.

2.2. Normas técnicas de gestión

2.2.1. Norma ISO 9001:2015.

La norma internacional ISO 9001:2015 es una norma generada por ISO y se centra en los requisitos necesarios para la aplicación de un sistema de gestión de calidad. Esta norma fue elaborada bajo el marco de referencia ISO y con enfoques en procesos basados en el ciclo PHVA, facilitando de esa manera su adaptación conjunta con otras de las normas elaboradas por la ISO.

2.2.1.1. Objetivo norma ISO 9001:2015.

La adopción de la norma ISO 9001:2015 por parte de una empresa tiene como fin mejorar su capacidad de proporcionar, de forma constante, servicios o productos que cumplan con los

requisitos de calidad del cliente, la norma y la legislación. Así mismo, busca aumentar la satisfacción del cliente y analizar riesgos y oportunidades en sus contextos y objetivos.

2.2.1.2. Aplicación norma ISO 9001:2015.

Los requisitos propuestos por la norma, para la aplicación de un plan de calidad, abarcan una amplia gama de características. Estas no se limitan a establecer requerimientos sobre la infraestructura o los procesos, sino que estipulan la necesidad de determinar los requisitos de las actitudes de alta dirección y procedimientos de mejora.

2.2.1.2.1. Definición de la organización y su contexto.

En una primera instancia, la norma comienza explicando la necesidad de determinar el contexto de la organización. En este punto, se requiere que la empresa determine los factores, externos e internos, que influyan, positiva o negativamente, al alcance del sistema de gestión de la calidad propuesto. Adicionalmente, se requiere identificar de manera precisa las partes interesadas en el producto o servicio a brindar; así como sus demandas, sus necesidades e incluso el mismo producto. La definición de los elementos previamente mencionados permite que la empresa pueda asegurar que sus procesos tengan como objetivo garantizar la calidad solicitada por los clientes, minimizando la posibilidad de realizar trabajos innecesarios en elementos no relacionados con su producto.

2.2.1.2.2. Responsabilidades de alta gerencia.

Una vez establecido de manera clara los clientes, los productos y el alcance de los servicios de la empresa, la norma enfatiza la necesidad de incluir a la alta gerencia en el proceso de control y evaluación del sistema de gestión de la calidad, mostrándose comprometidos con este. Se requiere que los gerentes y los supervisores asuman la responsabilidad por la eficacia

del sistema aplicado. Siendo ellos el primer punto de control de los procesos de la empresa, deben verificar que estos cumplen los requerimientos de calidad, que reciban los recursos necesarios para su funcionamiento y verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente. Adicionalmente, es la alta gerencia quienes deben establecer y difundir la política de calidad; esta debe estar incluir compromisos del cumplimiento de requisitos y de mejora continua.

2.2.1.2.3. Planificación.

Finalizada la asignación de responsabilidades por parte de la alta gerencia, es necesario realizar una planificación previa que permita que el sistema de gestión de calidad pueda alcanzar los resultados previstos. Esto se desglosa en la responsabilidad por parte de la empresa para planificar las acciones sobre cómo abordar riesgos y oportunidades que puedan suceder; el definir los objetivos del plan de calidad y el cómo lograrlo; y la planificación de los cambios posibles durante cualquier variación en el sistema de gestión de la calidad.

La primera responsabilidad mencionada, el definir cómo se abordan los riegos u oportunidades, debe estar guiado bajo la finalidad de asegurar los resultados esperados, disminuyendo los riesgos y logrando una mejora. La manera ideal de conseguirlo es que la empresa identifique las acciones a realizar en dichas situaciones y pueda evaluar su eficacia. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las acciones tomadas serán proporcionales a los efectos esperados.

Para la definición de los objetivos del plan de calidad, la empresa debe tener en cuenta que estos deben de ser medibles, así mismo, cumplir con las normas legales y con los requerimientos del cliente. La compañía está en la obligación de dar un correcto seguimiento a los objetivos establecidos, así como difundirlos y actualizarlos periódicamente. A la vez, es

importante recalcar la obligación por parte de la empresa de determinar cómo se alcanzarán las metas trazadas, así como quiénes serán responsables y cómo se evaluarán los resultados.

La planificación de los cambios a realizar se llevará a cabo siempre y cuando la empresa haya determinado el propósito y consecuencia de estos, verificando que dichas modificaciones no alteren la integridad del sistema de gestión de calidad. Así mismo, la empresa debe verificar la disponibilidad de los recursos necesarios para el cambio; así como definir quiénes serán los responsables a cargo de las modificaciones al sistema de gestión.

2.2.1.2.4. Recursos de la empresa.

Después de la planeación, la empresa debe definir los recursos con los que cuenta y que necesitará para la elaboración de sus actividades. Estos recursos, como detallan en la Figura 2, se dividen en personal, ambiente laboral, conocimiento y controles de trazabilidad.

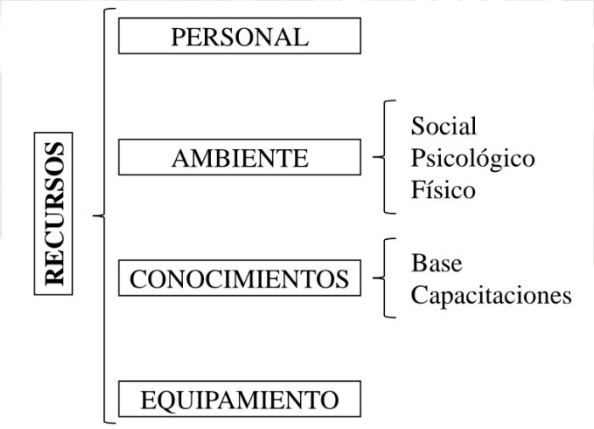


Figura 2. Recursos disponibles de una empresa

Fuente: Adaptado de la ISO 9001 (2015).

La trazabilidad es un punto importante dentro del sistema de gestión de calidad, ya que es el medio por el que la empresa proporciona validez a los resultados de sus mediciones. Por

lo previamente mencionado, la norma exige a las empresas que las mediciones efectuadas se realicen con equipos calibrados o con patrones de medición nacionales o internacionales.

Con respecto al personal a emplear en las diversas actividades de la empresa, la norma exige a la misma garantizar las competencias del personal para realizar sus laboras sin problemas de desempeño o eficacia, conservando un registro documentado de la evidencia de la competencia. Así mismo, se pide difundir al personal las políticas del plan de calidad, los objetivos de este y las repercusiones de no cumplirlos. A su vez, se exige a la empresa establecer canales de comunicación interna y externa, agilizando la respuesta de la empresa ante una posible emergencia.

2.2.1.2.5. Operación.

Superada la fase de planeación previa, la organización debe de implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir con la entrega de los servicios o productos al cliente, cumpliendo los objetivos previamente propuestos. Para ello, es necesario que la empresa determine los requisitos de los productos y establezca los criterios de revisión durante los procesos o aceptación del elemento. Adicionalmente, la empresa tiene la obligación de elaborar e implementar controles en los procesos con el fin de salvaguardar los criterios previamente mencionados, documentando la información crucial que evidencie la conformidad tanto del criterio como del producto.

Con el fin de establecer los requisitos, la norma expresa la necesidad del establecimiento de canales de comunicación empresa-cliente. Mediante estos canales se realizará el cambio de información obligatoria, como contratos o la solicitud de permisos; así como información útil para la mejora de atención al cliente, como la obtención de retroalimentación o recepción de pedidos. Mediante estos canales la empresa y el cliente acordarán los criterios necesarios para

el producto establecido, siguiendo como base los requisitos legales y el reglamento aplicable; siendo la empresa responsable del cumplimiento de lo establecido. La empresa está obligada a notificar a las personas pertinentes de cualquier cambio en los requisitos mínimos del producto que ofrece.

Posteriormente, la empresa debe definir su proceso de diseño y desarrollo de sus productos. El establecimiento de este proceso debe tener en cuenta las dificultas, etapas, actividades de verificación, recursos y hasta el nivel de participación activa del cliente; siendo todo lo mencionado registrado mediante documentos oficiales y trazables. Así mismo, se establece las entradas necesarias para el cumplimiento de dicho proceso de diseño y desarrollo, tomando en consideración tanto los recursos necesarios, como las normas y leyes necesarias. Finalmente, la norma exige establecer controles, definiendo los resultados y verificando que estos cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior. Así mismo, es necesario recalcar que la norma exige que los cambios realizados en los procesos se deben evaluar, analizando sus posibles impactos adversos. Toda la información relevante debe estar documentada de manera apropiada.

Con respecto a los productos o servicios que la empresa subcontrata y que obtenga por agentes externos, la norma establece que también deben ser sujetos a un control detallado; adaptando sus criterios, en la manera de lo posible, a los establecidos en el sistema de gestión de calidad de la empresa. Adicionalmente, se establece controles a los procesos de los servicios provistos por el agente externo, así como un sistema de verificación sobre los resultados esperados. De manera similar a lo establecido en todo el resto de los controles del sistema de gestión de calidad, la norma exige que todo dato importante, como los contratos y las verificaciones realizadas sean debidamente documentado por parte de la empresa.

Finalizada la totalidad de las actividades a realizar, salvo el supervisor a cargo solicite lo contrario, se realizará la liberación del producto terminado, verificándose el cumplimiento de los requisitos y criterio de aceptación previamente establecidos. En caso se presente incompatibilidades con dichos criterios, el producto será catalogado como un elemento no conforme. Ante tal situación, la norma establece que la empresa debe reparar, devolver o solicitar la aceptación del producto no conforme con sus criterios establecidos. Toda la información relevante referente al proceso de revisión del producto finalizado debe ser debidamente documentado, en especial el responsable de la liberación.

2.2.1.2.6. Evaluación de desempeño.

Como se menciona en el segmento anterior, la norma exige que la empresa evalué el desempeño y la eficacia de las diversas fases de las operaciones realizadas. Para ello, la organización está en la necesidad de establecer los aspectos de sus procesos a los cuales se realizarán seguimiento o harán mediciones; definiendo los métodos, análisis y evaluaciones necesarios para determinar la eficacia de esto. A su vez, la norma solicita que se obtenga información respecto a la conformidad del cliente referente al producto, lo cual brindará información sobre el grado de satisfacción del cliente, así mismo, se evidencia posibles oportunidades de mejora.

Adicionalmente, la norma exige a la empresa realizar auditorías internas para la verificación del cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad y la norma internacional. Estas auditorías deben ser planeadas con una frecuencia establecida para asegurar el correcto funcionamiento de los procesos y levantar de las observaciones encontradas por las mismas auditorías.

La norma estipula que la alta gerencia es la encargada de realizar esta evaluación del sistema de gestión de calidad, verificando que cumplan con los requisitos de la presente norma y los requisitos establecidos por ellos mismos. El análisis de los datos recopilados permite obtener información sobre oportunidades de mejora, identificar necesidades de cambio o reconocer la necesidad de implementar más recursos en ciertos procesos. Todo dato analizado y conclusión realizada deberá ser documentada de manera adecuada.

2.2.1.2.7. Mejora.

La normativa estudiada señala que la empresa está en la obligación de buscar mejorar sus productos o servicios, con el fin de cumplir de una forma más optima los requisitos del cliente. Esto se puede alcanzar mediante la consideración de requisitos futuros, la optimización de su sistema de gestión de calidad y corrigiendo posibles observaciones o no conformidades que se encontraron durante la fase de operaciones.

Las no conformidades, que se definen como un incumplimiento de un requisitos legales o normativos, son las principales fuentes de oportunidades de mejora. Al presentarse una no conformidad, la empresa está en la obligación de corregirla lo antes posible, y adicionalmente, planificar acciones preventivas que eviten su reincidencia, las cuales a su vez deberán ser monitoreadas y evaluadas. Esta acción correctiva puede incluir la actualización parcial del sistema de gestión de la calidad.

2.2.2. Norma ISO 14001:2015.

La norma internacional ISO 14001:2015 es una norma generada por ISO y se centra en los requisitos necesarios para la aplicación de un sistema de gestión ambiental. Esta norma fue elaborada bajo el marco de referencia ISO y un enfoque en procesos basado en el ciclo PHVA,

facilitando de esa manera su adaptación conjunta con otras de las normas elaboradas por la ISO.

2.2.2.1. Objetivo norma ISO 14001:2015.

La adopción de la norma ISO 14001:2015 por parte de una empresa tiene como fin establecer un marco de referencia para poder encaminar a la empresa para que proteja al medio ambiente y sea socioeconómicamente viable. Para ello, la norma incita a la empresa a mitigar los efectos adversos al medio ambiente mediante la mejora del desempeño ambiental.

2.2.2.2. Aplicación norma ISO 14001:2015.

La estructuración de las normas ISO comparten características comunes, lo cual hace fácil la integración de ellas en un mismo sistema de gestión integrado. Es por ello, que la norma ISO 14001:2015 comparte mucho de los requisitos de la fase de planeación con lo especificado en la norma ISO 9001:2015. Debido a eso, en la sección actual se procede a explicar solo los apartados de la norma referentes a la etapa de "Planificación", "Operaciones", "Evaluación del desempeño" y "Mejora".

2.2.2.2.1. Planificación.

La norma requiere que la empresa establezca los procesos que permitan cumplir con los resultados previstos por el sistema de gestión ambiental, minimizando los efectos no deseados mientras se mantiene un estado de mejora continua. Para ello se debe establecer el impacto ambiental del producto o servicio brindado por la empresa, considerando situaciones de emergencia o posibles accidentes generados por su elaboración o uso. Así mismo, la empresa debe determinar cuáles son los requisitos legales que aplican para sus productos o servicios, y

cómo estos son aplicados a la empresa. Adicionalmente, la empresa debe planificar las acciones que aseguren todo lo mencionado.

Por otra parte, la norma exige que la empresa establezca sus objetivos ambientales que sean coherentes con los requisitos legales determinados previamente y con la política ambiental establecida, de tal manera que dichos objetivos sean medibles y se comuniquen a todo el personal de la empresa. La empresa debe determinar las acciones necesarias para cumplir dichos objetivos, especificando a detalle el proceso, los plazos, los responsables y su forma de evaluación de resultados. Toda información debe ser apropiadamente documentada.

2.2.2.2.2. Operación.

La empresa está requerida de establecer procesos que cumplan con los requisitos ambientales establecidos mediante el establecimiento de criterios de operaciones y la implementación de controles de los procesos, controlando los cambios que se puedan generar y mitigando los efectos negativos que puedan surgir. De igual manera, la empresa está en la obligación de asegurarse que los procesos contratados exteriormente también cumplan con los requisitos ambientales establecidos, para ello se determinan los requisitos para la compra de productos o servicios. Toda información sobre requerimientos ambientales debe ser debidamente documentada y almacenada.

Por otra parte, la norma exhorta a la empresa a establecer procesos de reacción ante emergencias. Para ello, la organización debe planificar acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales en situaciones de emergencia, estas deben ser consecuentes a la magnitud de la misma y de su posible impacto ambiental. Todos los procesos de preparación y respuesta deben de ser comunicados e instruidos pertinentemente, así como evaluados y revisados cada vez que haya ocurrido una prueba o haya ocurrido una emergencia.

2.2.2.2.3. Evaluación del desempeño.

Como se menciona en el segmento anterior, la norma exige que la empresa evalué el desempeño y eficacia de las diversas fases de las operaciones realizadas. Para ello, la organización está en la necesidad de establecer los aspectos de sus procesos a los cuales se realizará un seguimiento mediante mediciones; determinando los métodos, análisis y evaluaciones necesarias para determinar su eficacia. Con lo mencionado, la norma exige a la empresa evaluar el desempeño y la eficacia de su sistema de gestión ambiental.

La auditoría interna es una de las herramientas más útiles para la evaluación del cumplimiento y seguimiento de los requisitos propios e internacionales. Estas inspecciones deben ser planificados según programas previamente establecidos, determinando los requisitos inspeccionados, su alcance y evaluador. Los resultados de las inspecciones de auditoría deben ser debidamente documentados y comunicados a las direcciones pertinentes, ya sea entidades propias o estatales.

La norma estipula que la alta gerencia es la encargada de realizar la evaluación periódica del sistema de gestión ambiental. Dicha evaluación debe incluir el análisis de los cambios realizados, tanto normativo como por cuestiones externas; la evaluación del grado de cumplimientos de los objetivos ambientales trazados; la recopilación de la información sobre el desempeño ambiental de la organización; la indagación sobre la correcta distribución de recursos; entre otros. Los resultados obtenidos en base de esta evaluación deben incluir las conclusiones del mismo, las decisiones relacionadas con oportunidades de mejora continua y acciones correctivas en caso no se hayan logrado los objetivos ambientales. Toda información deberá ser documentada y almacenada.

2.2.2.2.4. Mejora.

La norma ISO 14001:2015 especifica la necesidad de analizar los resultados obtenidos en los distintos sistemas de medición para poder establecer oportunidades de mejora y alcanzar los objetivos del sistema de gestión ambiental. Esto se debe a que las no conformidades requieren la aplicación de acciones correctivas, las cuales no solo corrigen la observación en el momento, sino que toma medidas para solucionar su causa raíz. Así mismo, la empresa está en la obligación de revisar la efectividad de las medidas correctivas aplicadas, aunque esto implique realizar cambios en el mismo sistema de gestión ambiental.

2.2.3. Norma ISO 45001:2018.

La norma ISO 45001 plantea los requisitos necesarios para aplicar un sistema de gestión de la seguridad y salud en trabajo (SST) en una empresa y así mejorar su desempeño en dicha área. Para lograr ese objetivo, la norma se basa en un flujo de trabajo bajo el concepto del PHVA, siendo este un punto en común de todas las normas ISO y por lo que es muy fácil integrarlas entre sí. Cabe resaltar que la norma en cuestión reemplaza a la norma OHSAS 18001 desde marzo del 2018, diferenciándose principalmente en el grado de detalle a la hora de especificar los requisitos.

2.2.3.1. Objetivo norma ISO 45001:2018.

La aplicación de esta norma tiene como objetivo principal establecer un sistema de gestión de la SST, así como el alcance de sus objetivos establecidos. La mejora continua de los parámetros de la SST y el cumplimiento de sus requisitos legales y normativos impuestos son algunos de los beneficios esperados por la aplicación de este sistema de gestión.

2.2.3.2. Aplicación norma ISO 45001:2018.

La estructuración de las normas ISO comparten características comunes, esto facilita la integración de ellas en un mismo sistema de gestión. Es por ello que la norma ISO 45001:2018 comparte mucho de los requisitos de la fase de planeación con lo especificado en la norma ISO 9001:2015. Debido a eso, se procede a explicar los apartados de la norma referentes solo a las etapas de planificación, operaciones, evaluación del desempeño y mejora.

2.2.3.2.1. Planificación.

La norma requiere que la empresa establezca los procesos que permitan cumplir con los resultados previstos por el sistema de gestión, minimizando los efectos no deseados mientras se mantiene un estado de mejora continua. Para ello, la norma exige que la empresa establezca procesos de identificación de los peligros activamente, ya sean provenientes de la organización del trabajo, las actividades rutinarias o generados por cambios en el conocimiento e información sobre los peligros. Con igual importancia, la norma exige a la organización la constante evaluación de los riesgos para la SST, basándose en los peligros identificados y los generados por la misma implementación del sistema de gestión. Así mismo, la norma exhorta a la entidad establecer procesos de evaluación de oportunidades para el sistema de gestión de la SST y la determinación de los requisitos legales aplicados a la misma.

Por otra parte, la norma exige que la empresa establezca los objetivos del sistema de gestión para que sean coherentes con los requisitos legales determinados previamente y con las políticas existentes. De esta manera, dichos objetivos deben ser medibles y que estos se comuniquen a todo el personal de la empresa. La empresa debe determinar las acciones necesarias para cumplir dichos objetivos, especificando a detalle el proceso, los plazos, los

responsables y su forma de evaluación de resultados. Toda información debe ser apropiadamente documentada.

2.2.3.2.2. Operación.

La empresa esta requerida de establecer procesos que cumplan con los requisitos del sistema de gestión. Para ello, se debe establecer criterios para los procesos, así como la elaboración de controles para su cumplimiento de acuerdo al perfil de sus trabajadores. Por otra parte, la norma exige que la empresa busque la eliminación o reducción de los peligros de toda la actividad elaborada durante la prestación de servicios, aunque esto requiera sustituir procesos o instauración de más controles de ingeniería o administrativos. Adicionalmente, se requiere que la empresa establezca procesos de actualización ante cambios con el fin de minimizar nuevos peligros generados por estos. Los procesos de control deben ser extendidos al proceso de contratación externa, permitiendo que empresas de terceros se alinean a los parámetros establecidos por el sistema de gestión de la SST.

Por otra parte, la norma menciona la necesidad de que la empresa establezca procesos de preparación y reacción frente a una emergencia. Para la correcta reacción ante accidentes producidos, la norma exhorta el establecimiento de respuestas previamente planificadas, las cuales contarán con pruebas periódicas. De mismo modo, la norma exige la comunicación pertinente a los trabajadores de la empresa, informando sobre sus deberes y responsabilidades ante situaciones de peligro y, de ser necesario, realizando capacitaciones.

2.2.3.2.3. Evaluación del desempeño.

Como mencionado en el segmento anterior, la norma exige que la empresa evalué el desempeño y eficacia de las diversas fases de las operaciones realizadas. Para ello, la

organización está en la necesidad de establecer los aspectos de sus procesos a los que se realizará seguimiento o se harán mediciones; determinando los métodos, análisis y evaluaciones necesarios para determinar la eficacia de estos. Con lo mencionado, la norma exige a la organización a evaluar el desempeño del sistema de gestión de la SST y determinar su eficiencia.

La auditoría interna son una de las herramientas más útiles para la evaluación del cumplimiento y seguimiento de los requisitos del sistema de gestión. Estas inspecciones deben ser planificados de acuerdo a los programas previamente establecidos, determinando los requisitos inspeccionados, su alcance y evaluador. En caso de presentarse no conformidades, la norma exhorta a la empresa a su urgente levantamiento y la elaboración de las modificaciones necesarias en el sistema de gestión de la SST y así evitar su reincidencia. Los resultados de las inspecciones de auditoría deben ser debidamente documentados y comunicados a las direcciones pertinentes.

La norma estipula que la alta gerencia es la encargada de realizar la evaluación periódica del sistema de gestión de la SST. Esta evaluación debe incluir el análisis de los cambios realizados, tanto normativo como por cuestiones externas; la evaluación del grado de incumplimientos de los objetivos trazados; la recopilación de la información sobre el desempeño de la organización; la indagación sobre la correcta distribución de recursos; entre otros. Los resultados obtenidos en base de esta evaluación deben incluir sus conclusiones, las decisiones relacionadas con oportunidades de mejora continua y acciones correctivas en caso no se hayan logrado los objetivos. Toda información deberá ser documentada y almacenada.

2.2.3.2.4. Mejora.

La norma ISO 45001:2015 especifica la necesidad de analizar los resultados obtenidos en los distintos sistemas de medición para poder establecer oportunidades de mejora y alcanzar los objetivos del sistema de gestión de la SST. Esto se debe a que las no conformidades requieren la aplicación de acciones correctivas, las cuales no solo corrigen la observación en el momento, sino que toma medidas para solucionar la causa raíz. Así mismo, la empresa está en la obligación de revisar la efectividad de las medidas correctivas aplicadas, aunque esto implique realizar cambios en el mismo sistema de gestión de la SST.

2.3. Definiciones

2.3.1. Sistema de gestión.

Según la norma ISO 9000:2015, un sistema de gestión es un "conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos". A lo que hace referencia la norma es que cada sistema de gestión de una empresa usa herramientas para generar objetivos y políticas independientes.

2.3.2. Sistema integrado de gestión.

Un SIG es aquel que integra todos los componentes de una organización en un sistema coherente que permita lograr su propósito y misión, los cuales deben estar enfocados a la satisfacción de las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, tanto internas como externas (Martínez, Agüero, Penabad y Montero, 2011).

En la cita, Martínez et al (2011) hacen referencia a cómo un SIG es una unión de los componentes disponibles por la empresa de manera eficiente y ordenada, con el fin de facilitar

su aplicación simultánea para alcanzar el objetivo común de la empresa. Por lo tanto, se puede inferir que un sistema integrado de gestión es la combinación de dos o más sistemas de gestión de diversas áreas para poder brindar un servicio más completo al cliente.

2.3.2.1. Implementación del SIG.

Existen diversos autores que proporcionan diversos enfoques para la implementación de un SIG. Un ejemplo de esto es el caso de Castillo & Martínez (2010), que se centran en la implementación de una sola gestión, aplicando un solo ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Debido a las similitudes entre las normas ISO, que están basadas en el ciclo PHVA, cualquier sistema de gestión que tenga como base dichas normas se pueden integrar con facilidad. Elementos como establecer políticas del SIG y fijar objetivos, artículos delimitados dentro del rango de alcance de las normas ISO previamente mencionadas en este capítulo, son de los aspectos más beneficiados de la semejanza en la estructura de las normas. En contraste, la metodología del Instituto Nacional de Investigación de Normalización (ININ), desarrollada en Cuba en el 2011, estipula requisitos específicos y elementos comunes establecidos en la Guía 72 de ISO e implícitos en la NC PAS 99:2008 (Guerrero & Soler, 2012). En ambas metodologías, los puntos clave se mantienen son los siguientes: la determinación de alcances, la contemplación de la realidad de la organización, la planificación de la integración, el monitoreo y seguimiento de la implementación y la supervisión de mejora del SIG (Guerrero & Soler, 2012). Sin embargo, la forma de interrelacionar los elementos existentes es lo que dificulta la aplicación del SIG.

Para facilitar la integración de los diversos componentes y mantener una coherencia, las empresas suelen establecer sus SIG con sistemas de gestión basados en normas con una estructuración similar, como es el caso de las normas ISO. Si bien, a simple vista, se podría

decir que la implementación de un SIG tiene como tarea acumular un sistema con el otro; esto suele conllevar, en muchos casos, un reto o un cambio en el paradigma clásico de la empresa, por lo que se debe analizar las ventajas y posibles problemas de implementación en ellos.

2.3.2.2. Ventajas del SIG.

Existen varios beneficios en la implementación del SIG. En primer lugar, se pueden considerar los beneficios de la simplificación de procesos de gestión, como la reducción de los costos en la contratación de auditores; el proporcionar valor agregado por actividades de innovación; la estandarización de la documentación para facilitar su manejo; la mejora en competitividad del mercado; y la simplificación de procesos de implementación (Bolívar & Chinchila, 2014). Por otro lado, existen beneficios externos a la misma organización, como el alza de los niveles de satisfacción del cliente, la alta percepción de la calidad y el aumento de ventas, mediante pedidos y exportaciones (Mejía, 2015). Finalmente se puede apreciar la posibilidad de la obtención de beneficios internos, como la mejora de la productividad y la eficiencia de la organización, el incremento de la eficiencia del personal y la reducción de gastos y desperdicios (Mejía, 2015). La combinación de estos tres factores permite a las empresas que cuentan con su propio SIG ya implementado ser más competitivas

2.3.3. Mejora continua.

El término de mejora continua proveniente de la palabra japonesa *Kaizen*, un término acuñado en Japón durante los años 1950´s, después de finalizada de la segunda guerra mundial. La palabra se compone del vocablo “KAI”, que significa “cambio”, y el vocablo “ZEN”, que significa “bueno”. Este término se vuelve una filosofía adoptada durante el Japón postguerra, fomentando la mejora de los procesos de manera gradual con el fin de mitigar los desperdicios.

Según la norma ISO 9000:2015, la mejora continua es una actividad recurrente para mejorar el desempeño. Dicha definición hace referencia a que la mejora continua no busca un cambio radical implementado de manera inmediata, sino que busca mejoras pequeñas a lo largo del tiempo que conlleven a cambios importantes y significativos.

2.3.4. Ciclo de Deming.

El ciclo de Deming, también conocido como el ciclo PDCA, es una metodología de mejora continua instaurada en los años 1950´s en Japón. Según Galgano (1995), el objetivo de aplicar el ciclo PDCA es mejorar la eficacia de todos los componentes de la empresa, con el fin de solucionar los problemas surgidos durante su día a día. Así mismo, aunque en una primera instancia no se logre resolver el problema, la aplicación repetitiva del ciclo permitirá cumplir con los objetivos de la empresa.

Como se puede apreciar la Figura 3, el ciclo PDCA consiste en someter a un problema o a una actividad a 4 etapas principales. La primera etapa, a cargo de la directiva, es dedicada a la fase planear (*Plan*). La segunda etapa, a cargo del operario, es denominada la fase hacer (*Do*), la que abarca la ejecución de los planes trazados. La tercera etapa, a cargo del inspector, es denominada la fase de verificar (*Check*). La última etapa, a cargo de la directiva, se encarga de la estandarización (*Act*) al cumplir las metas inicialmente planteadas.

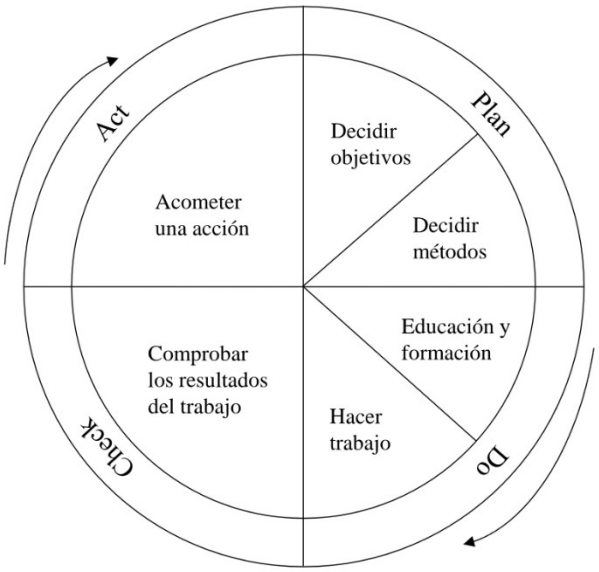


Figura 3. Ciclo PDCA de Ishikawa

Fuente: Camisón, Cruz y Gonzáles (2006).

2.3.4.1. Planear (Plan).

Durante las etapas iniciales de la fase planear es donde se identifican los posibles errores o puntos de mejora de un proceso. De estos, se escoge uno que tenga un carácter de urgencia o prioritario sobre el resto, del cual se definen claramente las características. Finalmente, y una vez escogido el tipo de problema a tratar en el presente ciclo, se indican los objetivos a los que se desea llegar después de aplicada el ciclo de Deming.

Completada la fase preliminar, el ejecutor del ciclo se enfocará en analizar y documentar la situación actual, analizando las brechas entre los resultados obtenidos y los resultados esperados durante el proceso. Después de analizar y documentar la situación actual, se procede a identificar las posibles causas que influyen en el incumplimiento de los objetivos, así como un posterior análisis de la influencia real de dichas causas. Como último paso de la fase de planeamiento se determinan las medidas correctivas a emplear.

2.3.4.2. Hacer (Do).

La fase hacer ejecuta lo planeado durante la fase planear. Sin embargo, Galgano (1995) sugiere que la aplicación de la fase hacer no debería ser directa y mecánica, sino que debe conllevar una serie de sub fases para obtener un resultado más óptimo. En primer lugar, se sugiere la capacitación del personal que va a aplicar las acciones correctivas, permitiéndole tanto al ejecutor como al supervisor identificar el valor de las medidas tomadas y de la información recopilada. Una vez capacitado el personal, se comienza el proceso de aplicación de la medida correctiva diseñada en la fase planear, siempre verificando su correcta aplicación. En el caso de que no se logren los objetivos planteados inicialmente, y obteniendo retroalimentación del personal ejecutor previamente capacitado, se implementarán medidas correctivas o modificaciones al método de aplicación. Todo trabajo desarrollado, así como los resultados positivos y negativos obtenidos, deberán ser registrados para su análisis futuro.

2.3.4.3. Verificar (Check).

La fase verificar controla lo ejecutado durante la fase hacer. Sin embargo, y como menciona Galgano (1995) "… lo primero que debe hacerse es fijar qué, cuándo y dónde se piensa controlar". Con ello, el autor resalta la importancia de los puntos de control establecidos en esta fase, puesto que con ellas se verificarán que las medidas tomadas hayan sido las correctas.

Uno de los puntos principales que se debe controlar vienen a ser las causas de las observaciones del proceso previo a la aplicación del ciclo PDCA. Por otro lado, existe el control del cumplimiento de los procesos previamente establecidos en la fase planear. Finalmente, se realiza la verificación de la calidad de materias primas y la calibración de los equipos.

Los resultados obtenidos por los diversos puntos de control, después de la eliminación de la información anómala mediante métodos estadísticos, servirán para realizar una comparación de la eficacia de las medidas implementadas durante el ciclo PDCA. Esta comparación realizada no debe tomar en cuenta solo los valores cuantificables o económicos, sino que debe abarcar otros efectos no tangibles derivados de las acciones correctivas como el aumento de la seguridad en los procesos o la mejora en la satisfacción de los empleadores.

2.3.4.4. Estandarizar (Act).

Durante la fase estandarizar, los directivos de la empresa evalúan los resultados obtenidos mediante la aplicación del ciclo de Deming, conllevando dos alternativas a proceder. En primer lugar, si se llega a confirmar la hipótesis planteada durante la fase planear, se analiza el motivo principal por el cual las medidas correctivas obtuvieron buenos resultados y se evalúa la necesidad de ampliar o reducir dichas medidas. Así mismo, mientras se mantiene en ejecución la versión de operaciones más exitosa, se busca estandarizar los resultados en toda la empresa. Por otra parte, si la hipótesis fuera descartada, la directiva debería evaluar por qué las medidas correctivas no fueron suficientes y se iniciaría un nuevo ciclo de Deming.

2.3.5. Herramientas de mejora continua.

Las herramientas de mejora continua sirven, siguiendo los parámetros de la metodología Kaisen, para solucionar problemas en el proceso de manufactura de forma gradual y constante. Muchas empresas aplican múltiples herramientas de mejora continua para reducir paulatinamente los desperdicios durante su funcionamiento. Esto conlleva a que existan miles de herramientas de mejora continua, algunos incluso con nombres similares, pero funciones completamente distintas.

Si bien existen una amplia gama de herramientas de mejora continua, esto no garantiza que su funcionamiento no presente errores. Según Pavnaskar, Gershenson y Jambekar (2003), existen tres posibles tipos de errores durante la aplicación de estas herramientas: La primera es el uso de la herramienta incorrecta para resolver un problema, la segunda es el uso de una sola herramienta para intentar resolver todos los problemas, y la tercera es usar todo un juego amplio de herramientas para resolver cada problema.

2.3.5.1. Clasificación de herramientas.

Debido a la problemática de escoger una herramienta ideal para la resolución de un problema específico, varios investigadores han elaborado sistemas de clasificación para las mismas. En el 2003, Pavnaskar et al proponen un sistema de clasificación en forma de árbol que categorizaría las herramientas de mejora continua con los componentes de manufactura a los que han sido aplicados y las características que desean mejorar. Sin embargo, en esta clasificación solo se tomaron en cuenta los procesos directamente relacionados con el producto finalizado, dejando de lado los elementos suplementarios como lo es el diseño y la prueba de elementos nuevos. Aun así, este sistema de clasificación puede resultar especialmente útil para las empresas que estén recién implementando la metodología Lean Construction.

2.2.5.1.1. Nivel 1: Nivel de sistema.

Este nivel responde a la pregunta: ¿En qué nivel de operación se encuentra la data evaluada? Permitiendo que la herramienta sea clasificada según el nivel del tamaño de sistema al que está siendo aplicada. Las respuestas planteadas en esta metodología de clasificación por Pavnaskar et al (2003) son las siguientes:

- **Estación de Trabajo**: Es un conjunto de operaciones realizadas en un punto de trabajo específico, sin llegar a formar un producto finalizado por su propia cuenta. Adicionalmente, los trabajos a este nivel no implican transporte o almacenamiento de bienes.
- **Cedula de trabajo**: Es un grupo de estaciones de trabajos diversos que permiten transformar la materia prima a un producto terminado.
- **Línea de trabajo**: Es un grupo de cedulas de trabajo que producen uno o más tipos de productos finalizados.
- **Planta de trabajo**: Es un grupo de diversas líneas de trabajo ubicadas en un mismo punto geográfico. En esta categoría también es considerado el movimiento de materia prima o productos finalizados que entran o salen de la planta de trabajo.
- **Cadena de suministros de entrada**: En este nivel de clasificación entran los procesos de trabajo que permiten la llegada de materia prima a las plantas de trabajo, sin abarcar el tema de fabricación de los productos.
- **Compañía**: Los procesos a este nivel ya solo implican decisiones de alto nivel, desligándose del proceso mismo de manufactura.

2.2.5.1.2. Nivel 2: Objeto.

Este nivel responde a la pregunta: ¿En qué estado está lo evaluado? Permitiendo que la herramienta sea clasificada según el tipo de materia que se está tratando. Las respuestas planteadas en esta metodología de clasificación por Pavnaskar et al (2003) son las siguientes:

- **Materia prima**: Objeto en el cual no se han aplicado procedimientos.

- **Trabajo en proceso**: Cualquier material en el que se haya comenzado operaciones.
- **Producto final**: Es el estado en el que acaba la materia prima una vez culminado el proceso de trabajo. Este producto final puede ser, a su vez, la materia prima de algún otro trabajo.

2.2.5.1.3. Nivel 3: Operación.

Este nivel responde a la pregunta: ¿Qué etapa del proceso que se está evaluando? Permitiendo que la herramienta sea clasificada según la etapa del proceso en la que se encuentra. Las respuestas planteadas en esta metodología de clasificación por Pavnaskar et al (2003) son las siguientes:

- **Procesando**: Cualquier secuencia de operaciones que se le aplica a un objeto para transformarlo y acercarlo a su versión de producto culminado.
- **Inspección**: Es el proceso de examinación o evaluación de las propiedades del objeto.
- **Transporte**: Cualquier traslado que se efectué al producto.
- **Almacenamiento**: El mantenimiento temporal de un objeto hasta su posterior venta o uso.

2.2.5.1.4. Nivel 4: Actividad.

Este nivel responde a la pregunta: ¿Durante qué actividad se está evaluando? Permitiendo que la herramienta sea clasificada según la actividad analizada. Las respuestas planteadas en esta metodología de clasificación por Pavnaskar et al (2003) son las siguientes:

- **Gestión**: Proceso de asignación de recursos y toma de decisiones.

- **Ejecución**: Proceso de ejecución de actividades a un objeto.

2.2.5.1.5. Nivel 5: Recursos.

Este nivel responde a la pregunta: ¿Qué recursos se están evaluando? Permitiendo que la herramienta sea clasificada según el tipo de recurso utilizado o desperdiciado. Las respuestas planteadas en esta metodología de clasificación por Pavnaskar et al (2003) implican respuestas genéricas, con el fin de que el sistema de clasificación sirva para varios tipos de industrias:

- **Información**: Cualquier tipo de información adquirida o suministrada que ayuda a la realización de la actividad.
- **Tiempo**: Periodo que consume el objeto previo a su entrada al mercado.
- **Dinero**: Capital usado para apoyar el sistema de actividades.
- **Espacio**: Espacio disponible para el sistema de operaciones.
- **Mano de obra**: Personal disponible trabajando en el sistema para culminar la operación.
- **Maquinaria**: Maquinaria disponible para elaborar operaciones.
- **Materiales**: Materia al cual se le aplicará un proceso o que será consumido durante el mismo.
- **Herramientas de manufactura**: Herramientas que facilitan el control y ejecución del trabajo.

2.2.5.1.6. Nivel 6: Evaluación.

Este nivel se responde a la pregunta: ¿Cuál es la causa del desperdicio evaluado? Permitiendo que la herramienta sea clasificada según el origen del desperdicio evaluado. Las

respuestas planteadas en esta metodología de clasificación por Pavnaskar et (2003) al implican respuestas genéricas, cuya combinación conllevaría a definiciones más específicas y detalladas.

- **Poca moral**: Falta de deseo por parte del personal para aportar sus habilidades completas al sistema de trabajo. Este elemento está limitado al recurso de mano de obra.
- **Incapacidad**: Imposibilidad de elaborar un trabajo asignado.
- **Ineficiencia**: Fallo en elaborar un trabajo asignado de la forma más óptima posible.
- **Poca fiabilidad**: Inconsistencia en el uso de recursos para realizar una actividad.

2.2.5.1.7. Nivel 7: Aplicación.

Este nivel se responde a la pregunta: ¿Cuál es el propósito de esta herramienta?, permitiendo que la herramienta sea clasificada según la intención de análisis que tiene. Las respuestas planteadas en esta metodología de clasificación por Pavnaskar et al (2003) son las siguientes:

- **Identificación de desperdicio**: Identificar el uso de recursos y, en ocasiones, cuánto es el desperdicio.
- **Cuantificar el desperdicio**: Cuantifica cuánto es el desperdicio o cualquier otra actividad no productiva.
- **Eliminación del desperdicio**: Eliminación de actividades que no agregan valor o reducción de desperdicios.

Finalmente, y después de aplicar un sistema secuencial de preguntas para su fácil entendimiento, se logra implementar un esquema como el mostrado en la

Figura 4, que permite clasificar las herramientas de mejora continua de una manera más eficiente.

Figura 4. Clasificación de herramientas de mejora continua

Fuente: Pavnaskar et al (2003).

En el presente trabajo de tesis se evaluará el funcionamiento de diversas herramientas de mejora continua. Sin embargo, y como se menciona previamente en la tesis, la multitud de herramientas de mejora continua conllevan a la posibilidad de que los conceptos y términos se superpongan entre sí, existiendo casos en los que el mismo nombre haga referencia a dos herramientas que cumplan roles distintos. Es por ello que en este segmento se procederá a explicar algunas de las herramientas de mejora continua a tratar más adelante en la tesis.

2.3.5.2. Auditorías e inspecciones.

La auditoría es una de las herramientas de mejora continua más popularizadas y con mayor desarrollo de todas. Según la definición de la ISO 9000-2015: “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría”. Con dicha definición, se puede evidenciar que la auditoría es una herramienta de medición del cumplimiento de parámetros previamente establecidos, los cuales suelen estar estrechamente ligados al correcto funcionamiento de un sistema de gestión.

2.3.5.2.1. Plan de auditoría.

El alcance de las auditorías varía dependiendo del tamaño o la complejidad de la empresa a cuestionar. Es por ello que, no se puede realizar una auditoría de manera intempestiva o acelerada sin antes definir sus objetivos, el procedimiento, los criterios, la metodología, entre

otros. Para llevar a cabo una evaluación de forma imparcial y que a su vez sea relevante, es necesario que se realice un programa de auditorías completo.

El primer paso para establecer un programa de auditorías es definir los objetivos, los cuales son influenciados, entre otras cosas, por las prioridades de la alta gerencia, las intenciones comerciales, los requisitos legales o por el riesgo del auditado. En segundo lugar, es necesario establecer los roles, responsabilidades y competencias de la persona que gestiona el programa de auditoría. En tercer lugar, se establecen los alcances del programa de auditoría, teniendo en cuenta factores como la duración de la auditoría, las conclusiones de las auditorías previas, cambios significativos del auditado o eventos internos o externos. Finalmente, se evalúa el procedimiento a seguir para realizar la auditoría y los recursos a su disposición.

2.3.5.2.2. Preparación de auditoría.

Si bien el plan de auditorías propone los lineamientos generales a seguir, es necesario establecer para cada auditoría individual ciertos criterios fundamentales. La diferenciación entre estos criterios y el plan de auditorías puede conllevar a una actualización del plan de auditorías, resultando en una mejora paulatina conforme se vayan aplicando más casos de auditorías. Por el contrario, si el programa de auditorías se toma como una guía absoluta y no se establecen cambios, puede conllevar a obtener una falsa sensación de funcionamiento y efectividad en la empresa.

El paso inicial para implementar una auditoría es establecer los objetivos de esta. Según la ISO 19011-2011, los objetivos usuales de las auditorías son determinar el grado de conformidad de las actividades, de los procesos, de los productos o incluso del mismo sistema de gestión. Adicionalmente, se menciona que la evaluación de las capacidades y efectividades de los sistemas son parte importante de los objetivos a establecer previo al inicio de una

auditoría. Así mismo, el hecho de que la auditoría sea una herramienta de mejora continua indica que el objetivo principal de esta es encontrar potenciales áreas de mejora en los sistemas de gestión.

Una vez establecido los objetivos de la auditoría, es necesario establecer cuáles de los numerosos métodos de auditoría se ejecutarán. Los principales factores que influyen en la elección del método son los objetivos, el alcance, los criterios, la duración, la ubicación y las competencias de los auditores. Sin embargo, como se puede apreciar en la Tabla 1, en la mayoría de las metodologías se implementan la revisión documentaria, la realización del muestreo y la realización de las entrevistas.

Tabla 1. Métodos de auditoría aplicables

Grado de interacción entre el auditor y el auditado	**Ubicación del auditor**	
	En sitio	**Remoto**
Interacción humana	Conducir entrevistas. Completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado. Revisión documental con participación del auditado. Muestreo.	A través de medios de comunicación interactiva: - entrevistas; - completar listas de chequeo y cuestionarios; - revisión documental con participación del auditado.
Sin interacción humana	Revisión documental (ej. registros, análisis de datos). Observación del trabajo realizado. Visita a sitio. Completar listas de verificación. Muestreo (ej. productos).	Revisión documental (ej. registros, análisis de datos). Observación de trabajo a través de medios de vigilancia, teniendo en cuenta requisitos legales y sociales. Análisis de datos.

Las actividades de auditoría en sitio son llevadas a cabo en las instalaciones del auditado. Las actividades de auditoría remota son desarrolladas en otro sitio diferente a las instalaciones del auditado, independientemente de la distancia.

Las actividades interactivas de auditoría involucran interacción entre el personal del auditado y el equipo auditor. Las actividades no interactivas de auditoría no involucran interacción humana con personas que representan al auditado, pero sí con equipo, instalaciones y documentación.

Fuente: Extraído de – ISO 19001 (2011).

Después de la elección de los métodos a emplear, se procede a escoger cuidadosamente a un grupo de profesionales que cumplan con los conocimientos técnicos y los valores éticos para realizar una evaluación adecuada. Para poder escoger a los integrantes del grupo de auditoría es necesario establecer los criterios cualitativos como los conocimientos y áreas de especialización, y los criterios cuantitativos, los años de experiencia o número de auditorías realizadas. Como se puede apreciar en la Tabla 2, la corroboración de dichos criterios de elección puede ser evaluado de muchas formas; sin embargo, se recomienda utilizar al menos dos métodos diferentes.

Tabla 2. Posibles métodos de evaluación

Método de Evaluación	**Objetivos**	**Ejemplos**
Revisión de registros	Verificar los antecedentes del auditor	Análisis de registros de educación, entrenamiento, empleo, credenciales profesionales y experiencia en auditoría
Retroalimentación	Proporcionar información sobre cómo se percibe el desempeño del auditor	Encuestas, cuestionarios, referencias personales, recomendaciones, quejas, evaluación del desempeño, evaluación entre pares
Entrevista	Evaluar los atributos personales y las habilidades de comunicación, para verificar la información y examinar los conocimientos, y para obtener información adicional	Entrevistas personales
Observación	Evaluar los atributos personales y la aptitud para aplicar los conocimientos y habilidades	Actuación, testificación de auditorías, desempeño en el trabajo
Examen	Evaluar las cualidades personales, los conocimientos y habilidades, y su aplicación	Exámenes orales y escritos, exámenes psicotécnicos
Revisión después de la auditoría	Proveer información sobre el desempeño del auditor durante las actividades de auditoría, identificar fortalezas y debilidades	Revisión del reporte de auditoría, entrevistas con el líder del equipo auditor, con el equipo auditor y, si es adecuado, retroalimentación del auditado.

Fuente: Extraído de – ISO 19001 (2011).

2.3.5.2.3. Ejecución de auditoría.

Una vez planteados los pasos previamente establecidos en la elaboración del plan de auditorías y en las preparaciones previas a la misma, se procede a iniciar formalmente el proceso de inspección mediante una reunión de apertura entre el grupo de auditores y la entidad auditada. Estas reuniones pueden variar en el nivel de formalidad y en la cantidad de especialistas involucrados. Esto puede ser desde una simple notificación de inicio a una reunión formal con los altos directivos de la empresa con un registro notarial. Sin embargo, la esencia de esta reunión es la misma, confirmar los acuerdos del plan de auditorías, como lo son los objetivos y los alcances, los métodos a emplear, la confidencialidad de los documentos o el manejo de los hallazgos encontrados.

Finalizada la reunión se comienza formalmente con la revisión documentaria de la empresa auditada por parte del equipo de auditores. En esta etapa, los auditores revisan que la documentación entregada sea completa, correcta, consistente y actual. En el caso de que no se pueda proveer dicha documentación en un plazo de tiempo razonable, la auditoría podría suspenderse hasta la subsanación del problema.

Un punto importante de la información recibida es poder verificar su trazabilidad, puesto que solo de esta manera será válida durante la auditoría. Existen tres métodos usuales por el cual los auditores recopilan información: revisión documentaria, registro de observaciones y entrevistas. Este último elemento de recopilación de información requiere elaborar un muestreo imparcial por parte del auditor, ya sea siguiendo un método de criterio o estadístico.

Una vez realizada la recopilación de información, se evalúa la evidencia obtenida contra los criterios inicialmente establecidos para dar conformidad de su cumplimiento o no. Después de realizada la clasificación, se elabora un registro de todas las conformidades y no

conformidades de la auditoría realizada. En el caso de que exista una diferencia de opinión durante la clasificación de alguno de los criterios evaluados, deberá quedar un registro para su posterior resolución.

Acabada la evaluación de los criterios de auditoría, y de manera análoga al inicio, se realiza una reunión de cierre de auditoría donde idealmente participan el cliente de la auditoría, los responsables de las funciones auditadas y el líder del equipo auditor. El propósito de esta reunión es hacer un recuento al cliente sobre los hallazgos obtenidos y el plan de acción sugerido a tomar en cada uno de los casos. Así mismo, en esta etapa se resuelven los conflictos de clasificación de los criterios evaluados, y en el caso de que no se llegaran a resolver ambas opiniones deberían quedar registradas.

Finalmente, el equipo auditor debe elaborar el reporte de fin de auditoría, en donde se especifican las conclusiones y el grado de cumplimiento de los criterios de la auditoría. La entrega de este informe, después de la culminación del resto de actividades planeadas, marca el fin de la auditoría. Sin embargo, la empresa auditada deberá modificar su sistema de gestión de acuerdo a las lecciones aprendidas obtenidas en la auditoría.

2.3.5.3. Encuestas de satisfacción.

La encuesta o cuestionario de satisfacción es una herramienta de mejora continua que tienen un alcance más expandido a lo largo del campo industrial. Esto se debe a que es la que requiere menor cantidad de inversión y es más rápida. Esta herramienta consiste en plantear a un grupo especifico de personas, denominados la muestra, un grupo de preguntas específicas, con el fin de permitir la medición de ciertas variables.

2.3.5.3.1. Enfoque de preguntas.

Las preguntas planteadas por una encuesta de satisfacción buscan identificar la diferencia entre la calidad del servicio presentado y la satisfacción producida al cliente. Estas discrepancias, según nos explican Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985), se pueden resumir en cinco tipos específicos de brechas.

La primera brecha se da entre la expectativa del consumidor y la percepción de los ejecutivos de la empresa sobre la expectativa del consumidor. Esto se produce debido a que, en muchas ocasiones, la percepción de una característica de alta calidad en el producto no es la misma para los ejecutivos y para los consumidores de la empresa. Por ejemplo, el caso de una tienda de ropa de diseñador que busca ofrecer un producto de altísima calidad a un precio correspondiente, mientras que la mayoría de los consumidores busca adquirir prendas de buena calidad a un precio más asequible. Para investigar esta brecha es necesario incluir en las encuestas de satisfacción preguntas sobre las expectativas del cliente y compararlas con la percepción interna de la empresa.

La segunda brecha se da entre la percepción de los directivos de una empresa como lo que realmente es considerado un servicio de calidad y la realidad de las especificaciones del producto. Esto se produce principalmente porque no implementan estándares en los procedimientos que se alinean con las expectativas del cliente. Por ejemplo, el caso de una aerolínea que conoce la preferencia por comodidad de su clientela, pero sus políticas se centran en la seguridad y no en invertir en asientos más cómodos. Para investigar esta brecha es importante incluir en las encuestas preguntas sobre la opinión de los clientes acerca de cuáles son las expectativas para con el producto.

La tercera brecha se da entre las especificaciones del producto y la realidad del producto entregado al cliente. Esta brecha es causada porque, a pesar que existan parámetros y estándares a seguir para alcanzar un producto de calidad, siempre existirán errores durante el proceso de manufactura debido a la intervención humana. Por ejemplo, un banco que cuenta con servicio de cajeros automáticos en múltiples ubicaciones, pero no se pueden realizar retiros debido a la falta de billetes. Para investigar esta brecha se plantean preguntas sobre la conformidad ante la entrega del producto.

La cuarta brecha se da entre el servicio de entrega y la comunicación externa. Esta brecha es causada porque durante los anuncios o propagandas del producto, las empresas comunicadoras exageran u omiten factores que influyen en las expectativas del cliente sobre el producto. Por ejemplo, un restaurante con un menú cuyas imágenes no corresponden con el platillo entregado. Para investigar esta brecha se aplican preguntas sobre la información recibida por el consumidor.

La quinta brecha se da entre el producto esperado por el cliente y la percepción del servicio. Esta brecha es influenciada por factores como las expectativas previas del cliente, las experiencias con servicios anteriores, la reputación de la empresa, la publicidad y el contexto en el que recibe el servicio. Por ejemplo, un colegio que tienen a los docentes mejor preparados y un plan de estudio de prestigio, pero tiene problemas administrativos. Para investigar esta brecha se aplican preguntas de cómo perciben los clientes el servicio y que factores influyen en dicha opinión.

2.3.5.3.2. Elaboración de preguntas.

Existen dos tipos de preguntas elaboradas durante una encuesta, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son preguntas que limitan el rango de respuesta

de los encuestados, ofreciendo una gamma determinada de respuestas a escoger desde el inicio. Por el contraria, las preguntas abiertas son las que no ofrecen una fijación en sus respuestas, permitiendo recopilar mayor información de los encuestados. Si bien estos dos conceptos son relativamente fáciles, es durante el proceso de elaboración de preguntas donde se presentan la mayoría de los problemas que conllevan a una dificultad de procesamiento de datos.

Para solucionar este problema, se suele emplear la metodología Likert durante la fase de elaboración de preguntas. Esta metodología, creada por Likert en 1932, disgrega una respuesta binaria en una escala ordenada de cinco alternativas que reflejan el rango de satisfacción de un cliente ante un postulado o pregunta. Estos rangos son totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Sin embargo, Boone & Boone (2012) afirman que existe una diferencia entre las preguntas elaboradas bajo el esquema Likert y las preguntas tipo Likert. Las primeras son un grupo preguntas compuestas que buscan obtener resultados que se puedan interrelacionar y analizarlos de manera conjunta. Por otro lado, las segundas preguntas imitan la escala de respuestas de las preguntas de escala Likert, sin presentarse el intento de los investigadores en interrelacionar las preguntas y sus respuestas para obtener una escala compuesta. Ambos tipos poseen un método de análisis diferente, por lo que es recomendable definir el modelo que se seguirá en la encuesta para la elaboración de preguntas correspondiente. Una vez definido el tipo de preguntas a realizar y el modelo aplicado, se procede a la redacción de las preguntas.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2015), la elaboración de preguntas de las cuales se puede extraer información útil es una tarea difícil, y muchas veces se cometen errores que entorpecen el proceso de análisis de la información. En la Figura 5, se puede apreciar que los errores más comunes se pueden clasificar en cuatro categorías diferentes: error de formulación, cuando la pregunta está mal formulada; error de precisión, cuando no se especifica lo suficiente la pregunta; error de población, cuando la pregunta no es la adecuada para la población encuestada; y errores de respuesta, cuando existen errores en las opciones de respuestas planteadas.

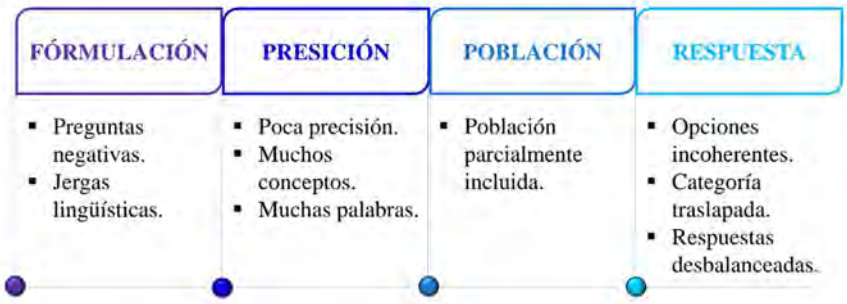


Figura 5. Errores comunes en la elaboración de preguntas

Fuente: Adaptado de Hernández, Fernández y Baptista (2015).

2.3.5.3.3. Implementación de encuestas.

Las encuestas realizadas pueden aplicarse de manera remota, mediante cuestionarios realizados de forma remota o presencial con entrevistas personalizadas. La primera opción permite conseguir un número más elevado de encuestas, aumentando rápidamente la base de datos con la que cuenta una empresa para realizar su análisis de datos. Sin embargo, como lo mencionan Medina, De Pablos, Jiménez, De Marcos, Barchino, Rodríguez y Gómez (2013), la digitalización del proceso conlleva a problemas en el tipo de respuestas obtenidos, como cuando algún encuestado responde con todos los valores con la calificación mínima o máxima. Otro de los problemas recurrentes de este tipo de modalidad es la falta de personalización de los cuestionarios en función al cliente. Por otro lado, la elaboración de encuestas personalizadas

y de forma presencial conllevan a una inversión mayor para su implementación, pero rinde una mayor confiabilidad a los resultados obtenidos.

2.3.5.3.4. Análisis de resultados.

Para analizar los resultados obtenidos es importante normalizar la data, sin importar si se realizaron preguntas abiertas o cerradas. En el caso de las respuestas de preguntas abiertas, y según nos demuestra Medina et al (2013), se pueden adaptar a un modelo Likert siguiendo un análisis morfológico de las raíces de las palabras para clasificarlas en alguno de los cinco tipos genéricos de respuesta. Una vez finalizado el proceso de separación, se emplea la Tabla 3 para analizar la información obtenida de acuerdo al tipo de preguntas que se hayan realizado.

Tabla 3. Procedimientos sugeridos para el análisis de datos

	Datos de tipo Likert	**Datos de esquema Likert**
Tendencia central	Mediana o moda	Media
Variabilidad	Frecuencia	Desviación estándar
Asociaciones	Coeficiente tau-b de Kendall	R de Pearson
Otras estadísticas	Chi-cuadrado	ANOVA, Prueba T, regresión

Fuente: Boone & Boone (2012).

2.3.5.4. Registro de observaciones.

El registro de observaciones es una lista de hallazgos obtenidos durante el proceso de control de calidad de un producto. Si bien esta herramienta está centrada principalmente en el enfoque de la gestión de calidad, el análisis estadístico de las observaciones registradas da hincapié a percibir los errores comunes que se cometen en el proceso de elaboración de producto. Es por ello que, las empresas que poseen un sistema de gestión de calidad, aplican indirectamente esta herramienta.

2.3.5.4.1. Criterios de revisión.

Antes de iniciar con el establecimiento de los criterios de revisión, hay que mencionar la imposibilidad de que un producto o servicio cuente con una perfección absoluta durante su entrega. Entre más complejo y grande sea el producto final, mayor será la posibilidad de encontrar errores o desperfectos. Sin embargo, esto no implica que la presencia de cualquier error en el producto final conlleve al rechazo total del mismo invalidando los recursos invertidos en su elaboración. Por ejemplo, en la compra de un mueble de madera de 50 cm x 90 cm donde el comprador no suele preocuparse si el producto final mide 0.5 cm adicional en uno de los lados.

Identificar la existencia de las tolerancias de admisión de un producto es un proceso clave que permite, de manera indirecta, mejorar el rendimiento general de la producción, reduciendo las piezas individuales rechazadas y reduciendo el tiempo empleado para llegar a una precisión innecesaria. No obstante, es importante conocer tanto las tolerancias como su magnitud permitida. Exagerando un poco el ejemplo anterior, el comprador hubiera podido quejarse si el mueble que pidió cuenta con 10 cm menos de largo, rechazando el producto en su totalidad. En consecuencia, los criterios de aceptación de un control de calidad es cuando el producto analizado pasa las tolerancias impuestas por la empresa.

Establecer las tolerancias no es un proceso sencillo, según mencionan Etienne, Dantan, Jawad & Siadat (2008), existen tres conceptos durante el establecimiento de tolerancias. El primer concepto, la representación de las tolerancias, tiene como propósito establecer las definiciones de aceptabilidad en diversas partes del proceso. El segundo concepto, el análisis de tolerancias, evalúa los efectos de las variaciones geométricas en partes individuales con respecto al producto final. Finalmente, el tercer concepto, la asignación de tolerancias, evalúa

las tolerancias aceptables del producto final para asignar el porcentaje de tolerancias finales a sus componentes individuales según su contribución.

2.3.5.4.2. Procesos de control de calidad.

Las inspecciones en distintos puntos de control son el método más efectivo para controlar la calidad del producto final. Este método es el acto para determinar la conformidad con los requisitos especificados (ISO 9000:2015). Estas inspecciones no solo son realizadas en la parte previa a la entrega del producto al cliente, sino que se realizan en varios hitos intermedios y previamente definidos, con el fin de reducir los costos de subsanación de observaciones o de descarte.

Dentro del proceso de manufactura de un producto existen diversos parámetros importantes que se deben medir. Debido a esto, según se aprecia en la Figura 6, existen diversos métodos para realizar las mediciones de estos criterios. De todos estos, el método visual es el más utilizado de todos, este consiste en encontrar defectos en un producto de manera visual.



Figura 6. Estrategias de control de calidad

Fuente: Czimmermann, Ciuti, Milazzo, Chiurazzi, Roccella, Oddo y Dario (2020).

Fernández (como se citó en Del Solar, 2014) afirma que el aseguramiento de la calidad es un conjunto de actuaciones planificadas para proporcionar la confianza de un producto según las exigencias establecidas. Esto nos da a entender que el proceso de control de calidad

mediante inspecciones debe adquirir un carácter formal y debe establecerse con lo anteriormente planeado. Así mismo, las inspecciones realizadas deben ser desarrolladas con un previo conocimiento de los criterios a evaluar y registrando la evidencia del cumplimiento de estándares de calidad conocidos.

2.3.5.4.3. Criterios registrados.

Las inspecciones realizadas deben ser debidamente registradas en un documento propio de la empresa, donde se deje constancia que se realizó dicha revisión. Así mismo, cualquier incidente encontrado durante un control de calidad debe ser debidamente registrado para poder realizar un análisis respectivo de la causa. Entre los datos mayormente utilizados para la identificación del incidente y su análisis se busca responder a las preguntas de: ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿A cargo de quién?, ¿Qué pasó? y ¿Cómo pasó?

2.3.5.4.4. Análisis estadístico.

Una vez obtenida la "Base de datos" de incidencias encontradas, se pueden aplicar una o más herramientas estadísticas para identificar patrones en las incidencias encontradas. Un ejemplo de dichas herramientas es el Diagrama de Pareto, este identifica las causas más frecuentes de las incidencias encontradas y así permitir a las empresas a centrar sus esfuerzos en corregirlas (Chávez, De La Rosa, Manjarres, Valbuena, y Becerra, 2024). Otro ejemplo es la herramienta de Análisis de modos y efectos de falla (AMEF), el cual se centra en identificar fallas de procesos y calificar sus efectos y causas (Torres & Rodríguez, 2021). Ambos métodos se enfocan en resolver los problemas de manufactura con distintos enfoques y ninguno de ellos es excluyente del otro, permitiendo realizar un análisis paralelo.

2.3.5.5. Lecciones aprendidas.

Las lecciones aprendidas se aplican siguiendo las instancias de las normas ISO, donde indican que la toma de conciencia de los trabajadores de una empresa es importante para que puedan contribuir con eficacia al sistema de gestión. Es también mediante esta línea de pensamiento que la alta gerencia incita a sus trabajadores a proponer mejoras o innovaciones en los procesos que tienen con el fin de aumentar la calidad del producto. Estas propuestas de innovación suelen ser aplicadas a base de experiencias con los procesos o productos generados por la empresa, y pueden ser transmitidos desde una planta en particular a todas las plantas de la empresa, con el fin de que la mejora o experiencia sea adquirida de forma global.

2.3.5.5.1. Clasificación de mejoras.

Según Organización de cooperación y desarrollo económicos [OCDE] (2005), existen cuatro tipos principales de innovación o mejoras. El primer tipo, la innovación del producto, se centra el cambio del bien brindado causando mejoras en el material, el diseño o entregando un producto nuevo. El segundo tipo de innovación, la innovación de proceso, se centra en la mejora del proceso de elaboración de un producto, ya sea por la mejoría de procedimientos, utilización de nuevas técnicas o empleo de nuevos equipos. El tercer tipo de innovación, la innovación de mercadotécnica, implica mejoras en procesos de comercialización y promoción del producto. Finalmente, la innovación de organización basada en la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas de la organización.

Es importante notar que la simple supresión de un proceso, método de organización o de comercialización de un producto no cuentan como mejoras. Así mismo, los cambios derivados por las variaciones de precios o los cambios cíclicos no implican un proceso de innovación

alguno. Para que sea considerado innovación, la mejora debe incluir un elemento de novedad para la empresa, sin necesidad que este sea "nuevo para el mercado" (OCDE, 2005).

2.3.5.5.2. Análisis de lecciones aprendidas.

El propósito principal de instaurar las lecciones aprendidas es optimizar procesos existentes en la empresa mediante la eliminación de defectos. Estos imperfectos son analizados a profundidad para poder encontrar las causas raíces del problema y buscar una solución a ellos. En la Figura 7 se puede apreciar una de las herramientas más comunes del análisis, el diagrama de Ishikawa o conocido también como el diagrama de pez, el cual disgrega los componentes de un problema existente en diversos componentes para analizar el origen del problema.

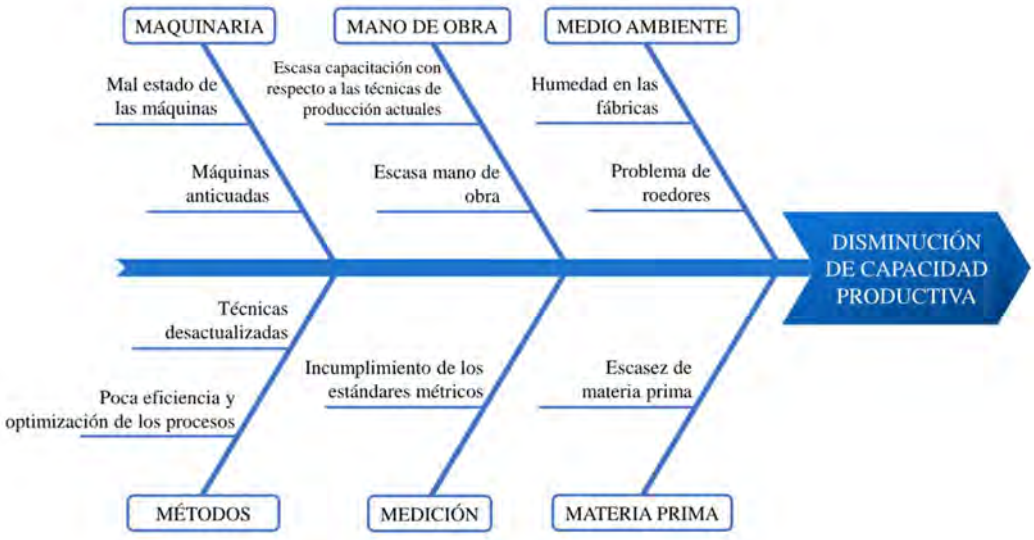


Figura 7. Diagrama Ishikawa

Fuente: propia

2.3.5.5.3. Difusión empresarial.

Para que una lección aprendida tenga un impacto significativo en la empresa y no solo se convierta en un informe de levantamiento de observaciones, la mejora planteada debe difundirse a todas las áreas de la empresa y compañías hermanas. La difusión puede realizarse

mediante cambios de procedimientos, charlas de difusión o comunicados generales. De esta manera, una sede de la empresa no solo será beneficiada por sus propias experiencias, sino también por los datos recibidos por las otras sedes, por eventos pasados e incluso por información proveniente de empresas colaborativas.

CAPITULO III: DOCUMENTACIÓN ADQUIRIDA DE LA EMPRESA

3.1. Información general

3.1.1. Empresa inmobiliaria.

La empresa constructora encargada de la construcción del proyecto a analizar cuenta con más de veinticinco años desde su fundación y tuvo sus orígenes en el ámbito minero, posteriormente se fue especializando en el desarrollo inmobiliario e infraestructura vial. Actualmente cuenta con más de veinte proyectos entregados, siendo varios de ellos destinados al programa Fondo MIVIVIENDA.

La empresa se encuentra dividida en dos rubros: inmobiliaria y construcción. A su vez, el sector construcción está subdividida en siete áreas, las cuales reparten las responsabilidades y tienen líneas de mando independientes las unas de las otras. La primera área es la de "Desarrollo Tecnológico", encargada de gestionar y desarrollar un proyecto optimizado a través de un proceso de ingeniería. En segundo lugar, se encuentra el área denominada "Jefe de Obra", la cual se encarga de gestionar y ejecutar la construcción del proyecto. La tercera es denominada "PMO", encargada de gestionar la información documentada. La cuarta área es conocida como "Calidad", encargada de verificar el cumplimiento de los estándares establecidos previamente en el proyecto. La quinta área es conocida como "Seguridad", encargada del cumplimiento de las normas de salud ocupacional y medidas preventivas establecida por la empresa dentro de los proyectos. El área de "Procura" es la sexta, destinada a la adquisición de información de diversos materiales necesarios durante la etapa de construcción. El área de "Maquinaria y equipos" es un homólogo del área de "Procura", pero centrándose en su rubro de especialización de maquinarias y equipos. La séptima y última área

es conocida como “Administración”, la cual está encargada de verificar y controlar la emisión de facturas de la empresa.

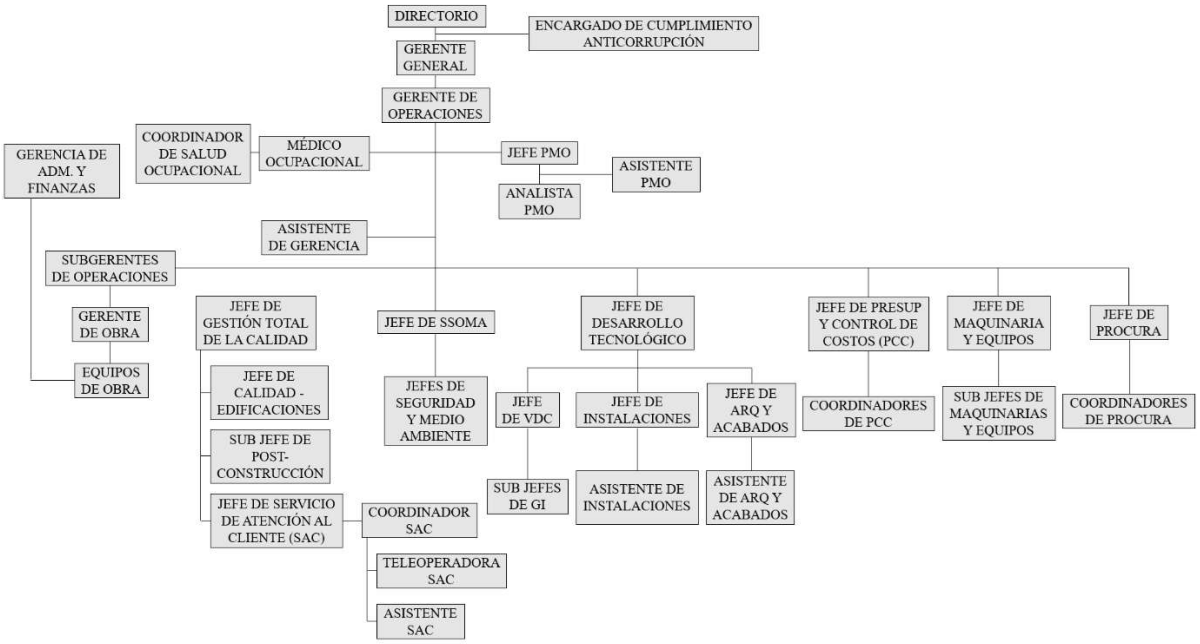


Figura 8. Organigrama de sección de construcción

Fuente: Datos de una empresa de construcción (2022).

Como se puede apreciar en el organigrama mostrado en la Figura 8, si bien existe una jefatura de cada una de las áreas, existe también una línea de mando interna dentro de los equipos de obra. Estos equipos tienen potestad directa sobre el proyecto al que dirigen, asegurándose de que los parámetros y los objetivos de sus respectivas áreas sean cumplidos. Entre los equipos usualmente presentes en campo se encuentra el área de Seguridad y Salud Ocasional (SSOMA), el área de producción (PROD), el área de la gestión total de la calidad (GTC), el área de oficina técnica (OT), el área de administración (ADM) y el área de Bienestar social (BS). Sin embargo, desde el año 2021, se consideran dentro para las evaluaciones internas del SIG el área de Procura (PROC) y el área de Maquinaria y Equipos (ME).

3.1.2. Proyecto.

El proyecto inmobiliario a que se analiza en la presente tesis se encuentra ubicado en el distrito de El Agustino en el departamento de Lima. Este proyecto, inicialmente ejecutado por una empresa constructora distinta, fue concebido como un conjunto de dieciocho torres, las cuales hubieran sido divididas en seis etapas de tres torres cada una. Sin embargo, después de seis torres construidas, en 2016 la empresa originalmente encargada del proyecto quebró y fue comprada por otra empresa inmobiliaria para la continuación del proyecto. Las doce torres restantes fueron sectorizadas por la empresa en etapas de dos torres cada una.

3.2. SIG en el proyecto a inicios del proyecto

La trayectoria del sistema de gestión de la empresa constructora no siempre tuvo como esquema las normas ISO. Para el año 2013, la empresa aún contaba con la elaboración de manuales basados en PMBOK, donde cada área especificaba las actividades a realizar desde el inicio hasta el fin del proyecto. En 2014, el enfoque del sistema de gestión de la empresa comenzó a cambiar, centrándose más en los procesos y estandarizando los anexos encontrados en los manuales, así mismo se comenzó a digitalizar la información. A partir del año 2015 la empresa comenzó a implementar la norma ISO 9001, verificando su seguimiento y mejorándolo constantemente gracias a la aplicación de inspectorías. Finalmente, en el año 2018 la empresa es certificada oficialmente con la Trinorma de ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 por una empresa auditora certificada. Si bien a lo largo de los últimos cinco años, el SIG de la empresa ha sufrido modificaciones y expansiones, estos cambios se mantienen fieles a las

políticas y objetivos que la empresa promueve. En la Figura 9 se muestra de manera gráfica el recorrido de la empresa durante la mejora de su SIG.

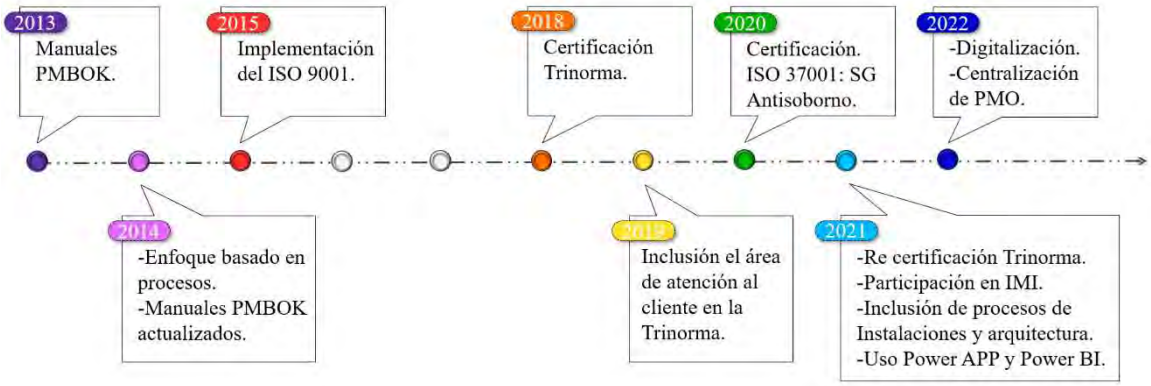


Figura 9. Línea temporal de la evolución del sistema integrado de gestión

Fuente: Adaptado de Curva PMO, datos de una empresa de construcción (2022).

3.2.1. Políticas.

"Una política es una directriz amplia para la toma de decisiones que relaciona la formulación de la estrategia con su implementación" (Wheelen & Hunger, 2007). Esta definición insinúa que las políticas empresariales tienen la función de guiar las acciones de los trabajadores de la empresa para que se alineen con los objetivos de la misma. De esta manera, se puede apreciar que los conceptos de política y objetivos están estrechamente alineados.

Las políticas del SIG de la empresa tienen como finalidad promover una cultura de prevención en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad y antisoborno. Estas políticas se subdividen en seis principios primordiales: La protección de sus empleadores y la eliminación de peligros en sus áreas de trabajo; la cobertura integral del cumplimiento legal y de las políticas nacionales; promover la participación e integración de los trabajadores de la empresa; el establecimiento y búsqueda constante de la mejora continua para mejorar el rendimiento; la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus demandas y expectativas; y el potenciar la innovación mediante la aplicación de nuevas tecnologías.

3.2.2. Objetivos.

Los objetivos establecidos por la empresa se pueden agrupar según la política que aportan. Para el inicio del año 2023, y según se puede apreciar en la Figura 10; el SIG de la empresa a analizar cuenta con un total de diez objetivos específicos distribuidas de acuerdo cada uno de las políticas establecidas.

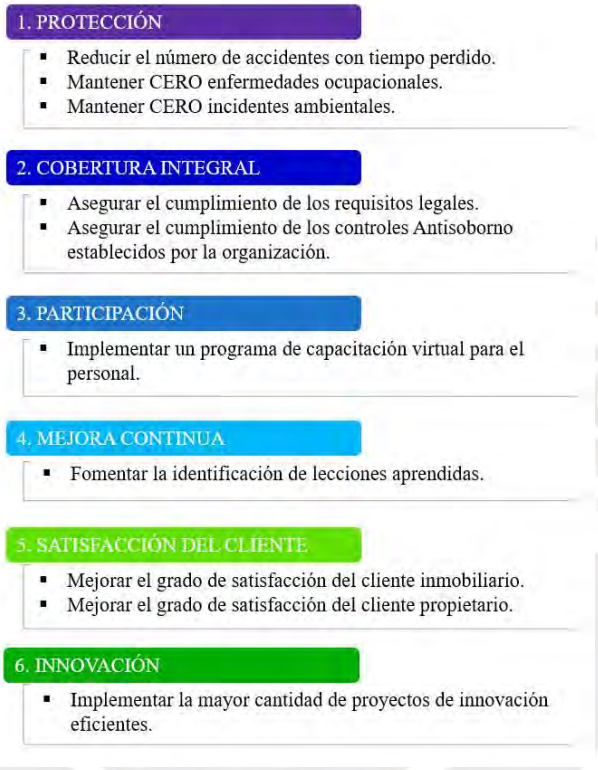


Figura 10. División de los objetivos del SIG de acuerdo a las políticas de la empresa

Fuente: Datos de una empresa de construcción (2023).

3.2.2.1. Objetivos de política de protección.

La política de protección, bajo la jurisdicción principal de SSOMA, tiene tres objetivos parciales para lograr los compromisos de la empresa con los trabajadores y con el medio ambiente. El primer objetivo es reducir el número de accidentes con tiempo perdido, asegurando de esta forma la integridad física de los trabajadores. El segundo objetivo es mantener cero enfermedades ocupacionales como la asbestosis (causada por inhalación de

fibras de asbesto) o silicosis (causada por una exposición prolongada a bajas cantidades de polvo de sílice). El último objetivo referente al ámbito de la protección es mantener en cero los incidentes ambientales como los producidos por una mala eliminación de desechos.

3.2.2.2. Objetivos de política de cobertura integral.

La empresa tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales encargados principalmente del área de SSOMA y PMO. Dichos requerimientos legales suelen ser ligados, principalmente, a las políticas nacionales sobre Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Paralelamente, la empresa tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de los controles antisoborno establecidos por la organización, supervisado por la oficina de cumplimiento.

3.2.2.3. Objetivos de política de participación.

Fomentar la participación del personal mediante capacitaciones en obra es el objetivo establecido por la empresa para el cumplimiento de su política de participación. La supervisión del cumplimiento de este objetivo es el trabajo en conjunto del área de SSOMA, con charlas de seguridad; el área de GTC, con las charlas de capacitación; y el área de PMO con la difusión de la nueva documentación y la capacitación respectiva de su utilización.

3.2.2.4. Objetivos de política de mejora continua.

El objetivo específico de fomentar la identificación de lecciones aprendidas está bajo la supervisión del área de PMO. Mediante el control del cumplimiento y la capacitación de la correcta identificación de la mejora permite a la empresa cumplir con su política establecida.

3.2.2.5. Objetivos de política de satisfacción del cliente.

Existen dos objetivos claves que permite el cumplimiento de la política de satisfacción al cliente. El primero es mejorar el grado de satisfacción del cliente inmobiliario, esto es medido con encuestas al área inmobiliaria de la empresa. El segundo es mejorar el grado de satisfacción del cliente propietario, mapeado mediante encuestas post venta a los compradores y futuros dueños de los productos.

3.2.2.6. Objetivos de política de innovación.

La empresa inmobiliaria tiene el objetivo de implementar la mayor cantidad de proyectos de innovación eficientes para poder garantizar el cumplimiento de su política de innovación, establecido desde el año 2021. La supervisión del cumplimiento de este objetivo esta brindado por el área de Innovación, y se mide mediante el comparativo entre el número total de proyectos implementados versus el número total de proyectos propuestos.

3.2.3. Herramientas de mejora continua.

La empresa comparte un mismo sistema de gestión integrado para la totalidad de sus obras, retroalimentando al resto de sus proyectos con ocurrencias o incidentes producidos en cada una de ellas. Es por ello que, a pesar de que la empresa posea diversas herramientas de mejora continua o un control de avances, no todas ofrecen informaciones pertinentes al objeto de estudio de esta tesis. A continuación, se procederá a la descripción de aquellas utilizadas durante la ejecución del proyecto de estudio y los resultados de los mismos.

3.2.3.1. Auditoría e inspecciones.

La auditoría en una empresa de construcción tiene como finalidad verificar que cada uno de sus proyectos cumplan de manera efectiva con lo estipulado en el SIG. Si esta es evaluada por los jefes de cada área será una auditoría interna, mientras que, si es evaluada por personal certificado externo a la empresa, esta será una auditoría externa. Ambos tipos de auditorías son realizadas, como se puede apreciar en la Figura 11, siguiendo un plan de auditoría establecido desde los finales del año previo.

INSPECCIONES												
PROCESO/ÁREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GTC			X			X			X			X
SSOMA			X			X			X			X
PROD			X			X			X			X
OT			X			X			X			X
BS			X			X			X			X
ADM			X			X			X			X
GI			X			X			X			X
AUDITORÍA												
PROCESO/ÁREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Planificación estratégica									X		X	
Mejor continua									X		X	
Viabilidad del proyecto									X		X	
Gestión de ingeniería									X		X	
Ejecución del proyecto									X		X	
Cierre del proyecto									X		X	
Seguimiento y control									X		X	
Aseguramiento y control de la calidad									X		X	
Gestión de procura									X		X	
Gestión de contratistas									X		X	
Gestión de maquinaria y equipos									X		X	
Gestión de personal administrativo									X		X	
Gestión del personal obrero									X		X	
Gestión de bienestar social									X		X	
Gestión del desarrollo tecnológico									X		X	
Gestión de tecnología de la información									X		X	
Control de la información documentaria									X		X	
Gestión SSOMA									X		X	

Nota: El programa considera el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas.

Figura 11. Programación anual de auditorías e inspecciones

Fuente: Datos de una empresa de construcción (2019).

Las auditorías evalúan a cada una de las áreas involucradas en el proyecto de manera individual, brindando posteriormente un resultado global del proyecto específico. Estas auditorías se realizan mediante una revisión documental con participación del auditado, donde el auditor realiza las revisiones mediante una ficha de control o rúbrica, como se puede apreciar en la Figura 12, la cual lista los puntos clave a revisar y que deben ser cumplidos

obligatoriamente por parte de la empresa. Al finalizar la revisión, el auditor coloca un puntaje correspondiente según el nivel de porcentaje de cumplimiento del SIG por cada área, siendo un valor menor al 95% un valor alarmante.

[redacted]

FORMATO
INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD

CODIGO: [redacted]
VERSIÓN: 07
FECHA: 30/03/2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	[redacted]
SUB-JEFE DE GTC:	[redacted]

PUNTAJE PONDERADO	100.00%

Item	Puntos de Evaluación	Calificación		Observaciones	Fecha de Levantamiento	Compromiso y Acción Preventiva
		E	-			
Resultados de la Planificación		**100%**	-			
1	Cumplimiento de PLAN DE CALIDAD Y SUS ANEXOS APROBADO E IMPLEMENTADO ***Criterio: Verificar la aprobación del Plan de Calidad y cumplimiento de capacitación con registro de capacitación.*	1				
2	Cumplimiento de TOLERANCIAS y REVISION DE MATERIALES CRÍTICOS difundidos. ***Criterio: Verificar la difusión de los documentos y el cumplimiento con los registros de capacitación.*	1	0			
Resultados de Gestión		**100%**	-			
3	Verificación del cumplimiento semanal del REPORTE DE CALIDAD ***Criterio: Verificar el cumplimiento de la presentación de la gestión de calidad en el comité de obra*	1	0			
4	Cumplimiento del envío del INFORME MENSUAL en fecha establecida ***Criterio: Verificar cumplimiento del envio en fecha acordada por OT.*	1	0			
5	Verificación del cumplimiento del GRADO DE SATISFACCIÓN MENSUAL ***Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).*	1	0			
Uso de Protocolos		**100%**	-			
6	Verificación de la aplicación del formato [redacted]_REGISTRO DE APLICACIÓN DE PROTOCOLOS ***Criterio: Verificar la actualización del registro de los protocolos ejecutados.*	1	0			
7	Verificación del correcto uso de los PROTOCOLOS ***Criterio: Verificar que todo protocolo se encuentre correctamente llenado y firmado.*	1	0			
8	Verificación del status de PROTOCOLOS, cerrados al 90% del total generado ***Criterio: Verificar la actualización del registro de los protocolos ejecutados y cerrados.*	1	0			

Figura 12. Formato de inspección de gestión total de la calidad

Fuente: Datos de una empresa de construcción (2022).

La herramienta de mejora continua Auditoría e inspecciones de la empresa estudiada tiene una clasificación, según el método de Pavnaskar, como la mostrada en la Figura 13. Esta herramienta abarca el análisis de la totalidad del SIG, evaluando desde un nivel global de obra hasta un nivel individual del personal obrero. Así mismo, el proceso de evaluación del proyecto se centra en la fase de construcción del proyecto, en el proceso de inicio, desarrollo y culminación de actividades. Las auditorías evalúan el desempeño durante las actividades de gestión y la aplicación de los elementos trabajados analizando la utilización de todos los recursos empleados en el proceso de construcción. Adicionalmente, la herramienta evalúa los

desperdicios generados debido a errores de desempeño de las personas, las actividades realizadas y la inconsistencia en los resultados obtenidos, permitiendo identificar los motivos de los errores.


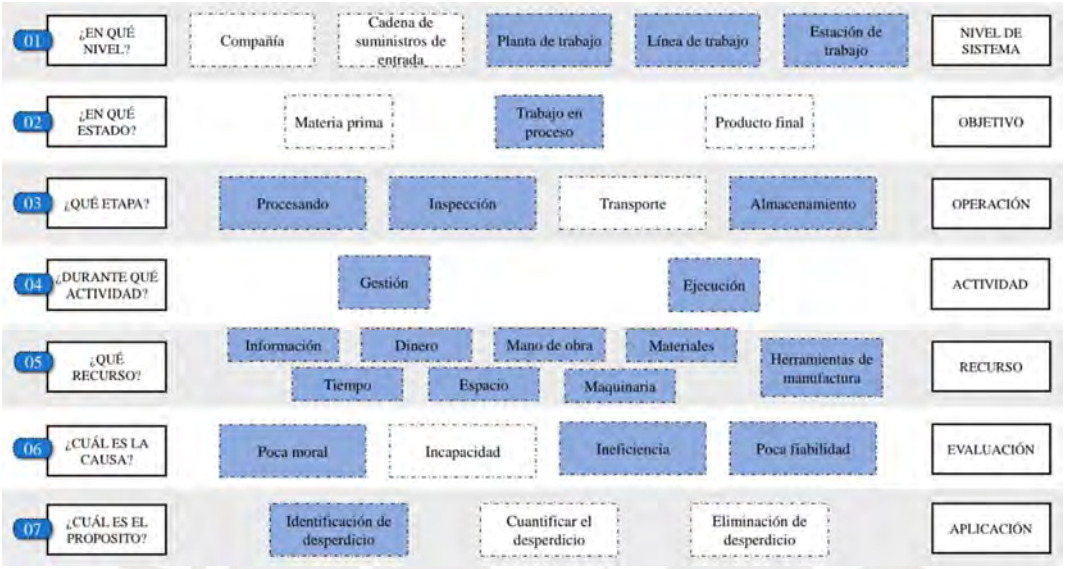


Figura 13. Clasificación de auditorías e inspecciones

Fuente: propia.

3.2.3.2. Encuestas de satisfacción.

Las encuestas de satisfacción de la empresa de construcción esta constituidas, como se muestra en la Figura 14, por preguntas tipo Likert. Estas preguntas están elaboradas para cerrar la brecha entre las especificaciones del producto y la realidad del producto terminado. Sin embargo, las encuestas de satisfacción se pueden realizar en tres momentos. Si bien esta herramienta es realizada de forma presencial en tres momentos diferentes; para el trabajo de investigación, solo se tomará en cuenta las encuestas de opinión realizadas por la inmobiliaria sobre el servicio brindado por la empresa constructora ante los entregables o peticiones realizadas.

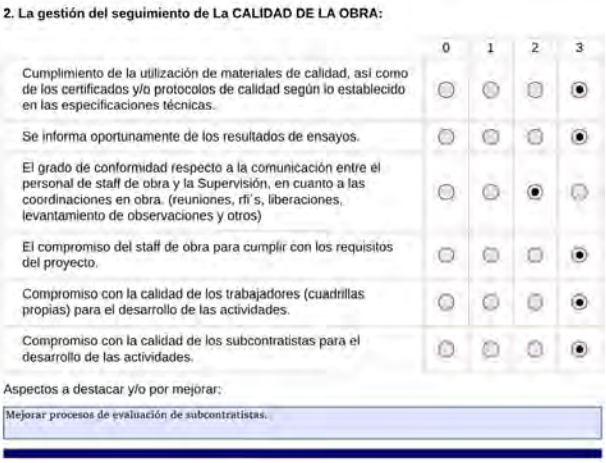

2. La gestión del seguimiento de La CALIDAD DE LA OBRA:

	0	1	2	3
Cumplimiento de la utilización de materiales de calidad, así como de los certificados y/o protocolos de calidad según lo establecido en las especificaciones técnicas.	○	○	○	◉
Se informa oportunamente de los resultados de ensayos.	○	○	○	◉
El grado de conformidad respecto a la comunicación entre el personal de staff de obra y la Supervisión, en cuanto a las coordinaciones en obra. (reuniones, rfi´s, liberaciones, levantamiento de observaciones y otros)	○	○	◉	○
El compromiso del staff de obra para cumplir con los requisitos del proyecto.	○	○	○	◉
Compromiso con la calidad de los trabajadores (cuadrillas propias) para el desarrollo de las actividades.	○	○	○	◉
Compromiso con la calidad de los subcontratistas para el desarrollo de las actividades.	○	○	○	◉

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

Mejorar procesos de evaluación de subcontratistas.

Figura 14. Formato de encuesta de satisfacción al cliente

Fuente: Datos de una empresa de construcción (2019).

La herramienta de mejora continua Encuestas de satisfacción de la empresa estudiada tiene una clasificación, según el método de Pavnaskar, como la mostrada en la Figura 15. Esta herramienta abarca el análisis de la totalidad del SIG, evaluando desde un nivel de proyecto de construcción. Así mismo, el proceso de evaluación del proyecto se centra en la fase de producto terminado, en el proceso previo a la entrega de los inmuebles a los compradores. Las encuestas evalúan el desempeño durante las actividades construcción, analizando la utilización de la disponibilidad de los ingenieros a cargo de área de construcción ante problemas emergentes en la fase de postventa. Adicionalmente, esta herramienta evalúa los desperdicios generados debido a la poca fiabilidad de los procesos, permitiendo identificar las fallas en los servicios brindados y recibir sugerencias de cómo eliminarlos.

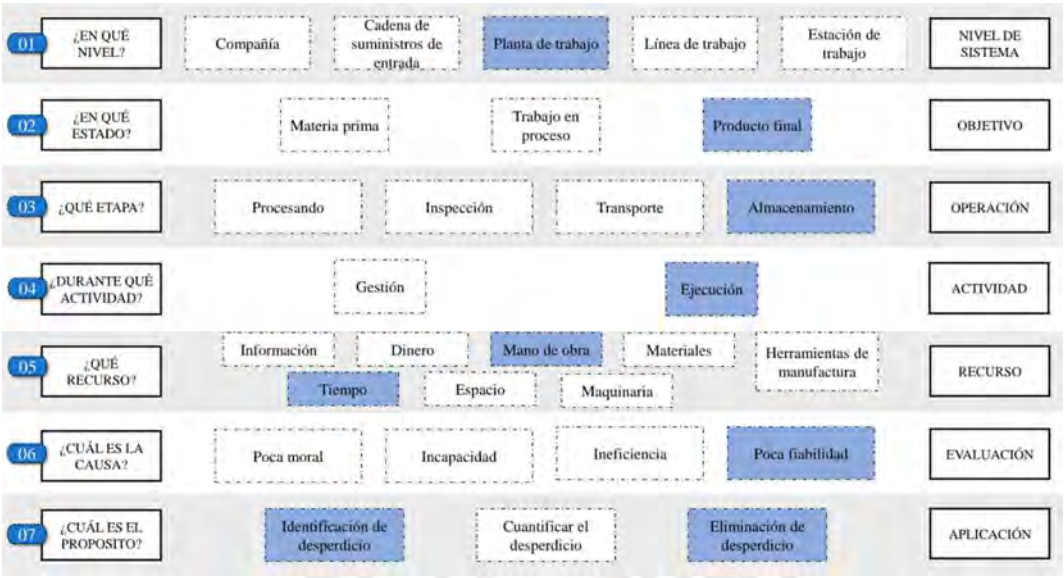


Figura 15. Clasificación de encuesta de satisfacción

Fuente: propia.

3.2.3.3. Registro de observaciones.

El registro de observaciones de la empresa de construcción es un formato que permite registrar las observaciones encontradas durante el proceso de control de calidad realizado en la obra. Las revisiones son realizadas por el ingeniero encargado del área de Calidad, el cual verifica mediante métodos no destructivos la conformidad de la partida terminada con las tolerancias y especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. Posteriormente, las observaciones deben ser registradas en los protocolos de calidad de su respectiva partida para que quede constancia de su existencia y levantamiento.

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN: 00
FECHA: 00/09/2021

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	[redacted]
SUB-JEFE DE GTC:	[redacted]
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	[redacted]

Mes	Año	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Type	Sheet	Location	Root Cause	# Photos	Archived	Start Date	Due Date	Schedule Impact Amount (days)	List	Closed On
NOV	2020	2	FB	Estructura	Dimensión incorrecta	18 de noviembre de 2020, 19:00:00	closed	Planned Work	E-19	Torre7-Pilote5	Error en procedimiento	1	No	18 de noviembre de 2020	20 de noviembre de 2020	Unspecified	Estructuras	20 de noviembre de 2020, 08:32:35
DIC	2020	6	BA	Estructura	Trabajo inconcluso	3 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	Planned Work	E-19	Torre7-Pilote2	Error en procedimiento	2	No	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	Unspecified	Estructuras	15 de diciembre de 2020, 16:09:07
DIC	2020	7	BA	Estructura	Trabajo inconcluso	3 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	Planned Work	E-19	Torre 7-Pilote 5	Error en procedimiento	2	No	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	Unspecified	Estructuras	15 de diciembre de 2020, 16:09:11
DIC	2020	8	CB	Estructura	Tiempo de espera mayor al aceptable	3 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	Planned Work	E-19	Torre7-Pilote5	Error en procedimiento	1	No	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	Unspecified	Estructuras	15 de diciembre de 2020, 16:09:22
DIC	2020	9	CB	Estructura	Tiempo de espera mayor al aceptable	3 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	Planned Work	E-19	Torre7-Pilote7	Error en procedimiento	1	No	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	Unspecified	Estructuras	15 de diciembre de 2020, 16:09:31
DIC	2020	10	CB	Estructura	Exudación excesiva del concreto	3 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	Planned Work	E-20	Torre 8-Pilote 32	Error en procedimiento	2	No	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	Unspecified	Estructuras	17 de diciembre de 2020, 07:46:06
DIC	2020	11	CB	Estructura	Exudación excesiva del concreto	3 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	Planned Work	E-20	Torre 8-Pilote 34	Error en procedimiento	3	No	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	Unspecified	Estructuras	17 de diciembre de 2020, 07:46:12
DIC	2020	13	CB	Estructura	Trabajo inconcluso	4 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	Planned Work	E-20	Torre8-Pilote31	Error en procedimiento	3	No	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	Unspecified	Estructuras	17 de diciembre de 2020, 07:46:17
DIC	2020	14	BA	Estructura	Desalineamiento	6 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	Planned Work	E-19	Torre7-P22	Error en procedimiento	2	No	7 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	Unspecified	Estructuras	17 de diciembre de 2020, 07:46:35
ENE	2021	23	BA	Estructura	Falla en procedimiento	4 de enero de 2021, 19:00:00	closed	Planned Work	E-20	Platea torre 8	Observación común	2	No	4 de enero de 2021	8 de enero de 2021	Unspecified	Estructuras	13 de enero de 2021, 15:38:09
ENE	2021	24	BE	Estructura	Daño en material	4 de enero de 2021, 19:00:00	closed	Planned Work	A-01	Platea torre 8	Observación común	4	No	5 de enero de 2021	8 de enero de 2021	Unspecified	Estructuras	12 de enero de 2021, 17:12:39

Figura 16. Formato del registro de observaciones

Fuente: Datos de una empresa de construcción (2021).

Como se puede apreciar en la Figura 16, algunos de los datos indispensables para el registro de las observaciones es la descripción del error encontrado, la causa raíz del error cometido, información sobre la ubicación y fecha de su registro, e información sobre el documento al que esta adjuntado dicha observación. Para facilitar su posterior análisis, se emplean palabras claves para poder agrupar datos como la causa raíz o la descripción del error encontrado. Así mismo, se le asigna un plazo máximo para el levantamiento de la observación, dependiendo de la urgencia o severidad del caso.

La herramienta de mejora continua del registro de observaciones de la empresa estudiada tiene una clasificación, según el método de Pavnaskar, como la mostrada en la Figura 17. La herramienta abarca el análisis de la totalidad del SIG, evaluando desde un nivel de partida terminada. Así mismo, el proceso de evaluación del proyecto se centra en la fase de construcción del proyecto y en el proceso de inspección de trabajos. Esta herramienta evalúa el desempeño durante las actividades construcción analizando la utilización de la mano de obra para el levantamiento de observaciones, así como la mano de obra y los materiales necesarios para corregir la observación. Adicionalmente, la herramienta evalúa los desperdicios generados

debido a la poca fiabilidad de los procesos, la ineficiencia de estos y los errores de mano de obra, permitiendo identificar las fallas más comunes y cuantificarlas.

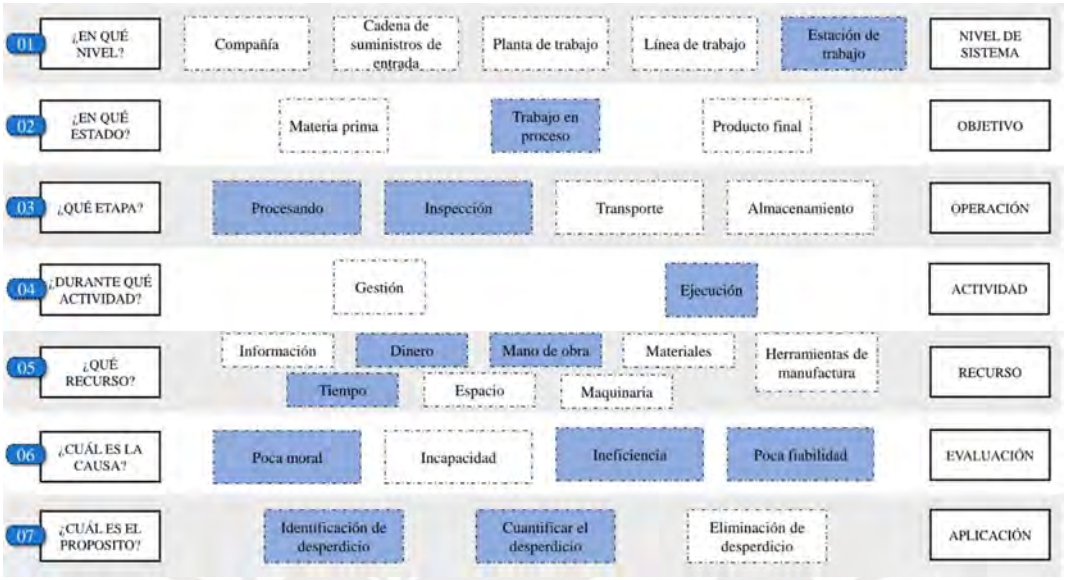


Figura 17. Clasificación del registro de observaciones

Fuente: propia.

3.2.3.4. Lecciones aprendidas.

Las lecciones aprendidas son una herramienta de mejora continua que compele a las diferentes áreas de trabajo a proponer una innovación al SIG de la empresa de forma proactiva. Estas innovaciones, solicitadas por cuota mínima de cada área, usualmente son basadas en errores cometidos en el proyecto de construcción. Como se puede apreciar en la Figura 18, el formato de presentación para las lecciones aprendidas debe especificar el problema causante del análisis, la solución del problema y la mejora extraída del análisis de causa raíz. Finalmente, las lecciones aprendidas son difundidas mensualmente en una reunión general a las diversas obras de la empresa.

[redacted] **LECCIÓN APRENDIDA**

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	11/02/21
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	PROCEDIMIENTO: Protección de ductos de desagüe antes del cerramiento de drywall		

¿QUÉ PASÓ?

Presencia de daños en accesorios y/o tuberías en ductos de desagüe por caída de objetos e instalación de ladrillo sílico calcáreo.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se colocó plancha de madera o metálica (Tapa ducto) como protección cada 2 o 3 pisos hasta que las actividades de tabiquería hayan terminado (áreas comunes). Se retiran los tapa ductos previo al cerramiento de drywall.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Establecer la colocación de protección, así como las verificaciones en ductos de montantes de desagüe previo al cerramiento de drywall, donde se compartan actividades de instalación de ladrillo.



Figura 18. Formato de lecciones aprendidas

Fuente: Datos de una empresa de construcción (2018).

La herramienta de mejora continua lecciones aprendidas de la empresa estudiada tiene una clasificación, según el método de Pavnaskar, como la mostrada en la Figura 19. La herramienta abarca el análisis de la totalidad del SIG, evaluando desde un nivel general de actividad especifica que se puede mejorar. Así mismo, el proceso de evaluación del proyecto se centra en la fase de construcción y en el proceso de construcción. La herramienta de mejora continua evalúa el desempeño durante las actividades la fase de planeamiento, analizando la utilización de la información manejada. Adicionalmente, la herramienta evalúa los desperdicios generados debido a la incapacidad e ineficiencia de los procesos, permitiendo eliminar los desperdicios encontrados.

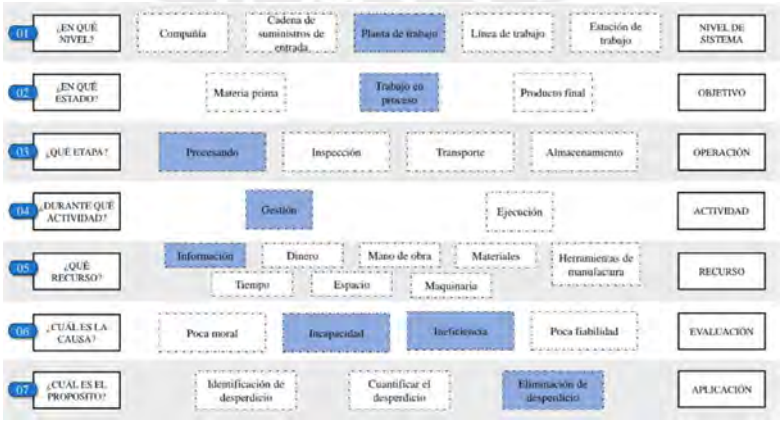


Figura 19. Clasificación de lecciones aprendidas

Fuente: propia.

CAPITULO IV: ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

4.1. Clasificación de hallazgos

Como se ha podido apreciar en el capítulo anterior, existen diversas herramientas de mejora continua que permiten recolectar información sobre la eficiencia y la exactitud con la que se sigue el SIG. Sin embargo; para poder compararlos, se clasificarán los hallazgos encontrados por cada herramienta según una de las siguientes clasificaciones:

- Las *oportunidades de mejora* son hallazgos positivos que representan un aspecto ajeno al SIG, pero que apoyan al funcionamiento positivo de este y a adquirir buenos resultados.
- Las *fortalezas* son hallazgos positivos que representan un aspecto propio del SIG, que respaldan un resultado positivo y que posiblemente puedan ser implementados en otros aspectos.
- Las *observaciones* son hallazgos negativos que consisten en pequeñas desviaciones u omisiones del SIG. Tienden a ser rápidamente corregibles y conllevan un riesgo leve a la empresa y/o trabajadores.
- Las *no conformidades* son hallazgos negativos que consisten en faltas graves al SIG, que conllevan a un esfuerzo mayor en sus correcciones o conllevan a un riesgo elevado a la empresa y/o trabajadores.

Mediante esta clasificación se analizarán los resultados obtenidos por cada uno de las herramientas de mejora continua empleadas.

4.2. Hallazgos de auditoría e inspecciones

Para el propósito de la investigación de esta tesis, se procedió a analizar los resultados obtenidos durante las auditorías y las inspecciones de los últimos 5 años mostrados en la Tabla 4. Esta tabla muestra un compilatorio de los resultados de las 87 evaluaciones de auditorías e inspecciones, dividas en 14 periodos de tiempo y realizadas en las de 9 áreas involucradas directamente al proyecto. Se puede apreciar que la frecuencia de la aplicación de esta herramienta de mejora continua es mayor durante los primeros años de implementación alcanzando un pico de 4 periodos de auditorías e inspecciones por año, coincidiendo con la fecha de implementación de la Tri norma indicados en la Figura 9. Así mismo, se tiende a notar una mejora paulatina en los resultados de estos, indicando que los problemas raramente se vuelven a repetir, debido a que el mismo SIG ayuda a corregir los problemas detectados por su causa raíz en lugar de simplemente aliviando los síntomas.

Tabla 4. Resultados de las inspecciones por área

FECHA	SSOMA	PROC	ME	ADM	BS	OT	GTC	PROD	SIG	TOTAL
2018-1	96.00%	N.A.	N.A.	N.A.		66.00%	78.00%	62.00%	N.A.	76.00%
2018-2	77.00%	N.A.	N.A.	79.00%	100.00%	100.00%	61.10%	67.00%	N.A.	81.00%
2018-3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	92.70%	N.A.	N.A.	93.00%
2018-4	N.A.	N.A.	N.A.	83.00%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83.00%
2019-1	99.00%	N.A.	N.A.	95.00%	100.00%	98.00%	92.00%	94.00%	82.00%	94.00%
2019-2	96.00%	N.A.	N.A.	87.00%	100.00%	95.00%	69.70%	76.00%	86.00%	87.00%
2019-3	96.00%	N.A.	N.A.	95.00%	100.00%	66.00%	94.00%	92.00%	97.00%	91.00%
2019-4	94.00%	N.A.	N.A.	100.00%	95.00%	100.00%	74.90%	80.00%	95.00%	91.00%
2021-1	93.00%	100.00%	N.A.	100.00%	88.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N.A.	97.29%
2021-2	96.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00%	98.00%	95.00%	100.00%	N.A.	97.63%
2022-1	94.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	100.00%	N.A.	99.00%
2022-2	98.00%	86.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.00%	80.80%	91.00%	N.A.	93.60%
2023-1	91.00%	95.00%	98.00%	98.00%	100.00%	94.00%	96.00%	100.00%	N.A.	96.50%
2023-2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N.A.	100.00%

Fuente: Elaboración propia.

4.2.1. Oportunidades de mejora en auditorías e inspecciones.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos, se clasificó a las oportunidades de mejora cuando se le daba puntaje completo en una categoría evaluada y se establecía un comentario positivo por parte del auditor. Adicionalmente, los comentarios positivos debían ser ajenos a algún concepto del SIG en sí mismo, como por ejemplo la compra de un equipo nuevo o implementación de una nueva metodología. Bajo dichos parámetros, según se puede apreciar en la Figura 20, se obtuvieron un total 4 oportunidades de mejora mapeadas en las inspecciones de los últimos 5 años.

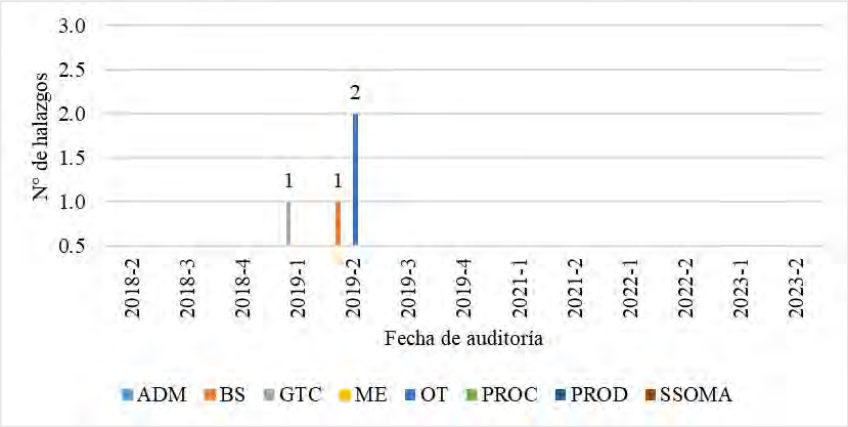


Figura 20. Oportunidades de mejora durante auditorías e inspecciones

Fuente: Elaboración propia.

El área de Administración presenta la mayor cantidad de oportunidades de mejora con un total de 2 mapeados durante 12 periodos de inspección en los que participaron. De manera análoga, el área de Maquinarias y Equipos identifico un total de 1 oportunidad de mejora en 5 periodos de evaluación; y el área de Gestión Total de la Calidad identifico un total de 1 oportunidad de mejora en 13 periodos de inspecciones realizadas. Adicionalmente, fue en el periodo de evaluación del 2019-2 se identificaron la mayor cantidad de oportunidades de mejora, con un total de 3 mapeadas durante dicho periodo.

4.2.2. Fortalezas en auditorías e inspecciones.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos, se clasificó como fortalezas a las categorías que obtuvieron puntaje completo y se establecía un comentario positivo por parte del auditor. Adicionalmente, los comentarios positivos debían estar relacionados a algún aspecto del SIG como por ejemplo la correcta y temprana aplicación de un procedimiento de trabajo. Bajo dichos parámetros, según se puede apreciar en la Figura 21, se identificaron un total de 7 fortalezas en un total de todas las inspecciones realizadas en los resultados de los 5 últimos años.

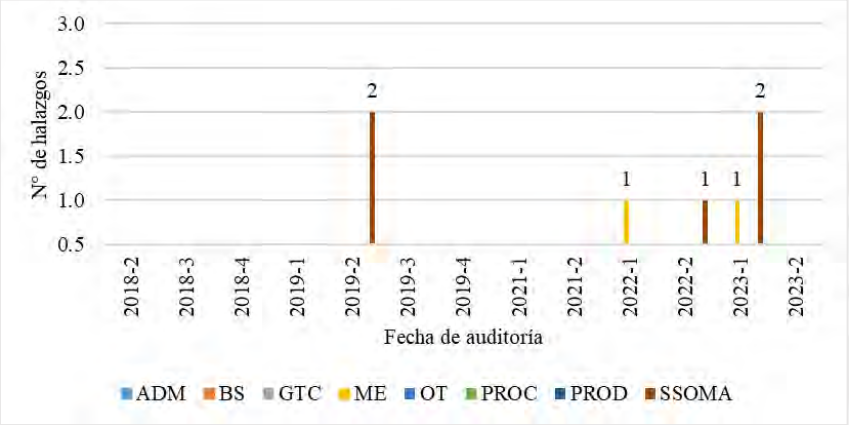


Figura 21. Fortalezas durante auditorías e inspecciones

Fuente: Elaboración propia.

De estas, el área de SSOMA presenta el mayor número de fortalezas mapeadas, con un total de 5 distribuidos en un periodo de 12 fechas de evaluación. De manera análoga, el área de Maquinaria y Equipo presentó 2 fortalezas registradas en un plazo de 5 evaluaciones. Adicionalmente, se identificó que el periodo de evaluación del 2023-1 fue en el cual se encontró el mayor número de fortalezas, alcanzando un total de 3 registradas.

4.2.3. Observaciones en auditorías e inspecciones.

Se clasificó a las observaciones cuando, durante la inspección, se le daba puntaje parcial o nulo en una categoría evaluada. Adicionalmente, los comentarios negativos debían implicar una variación menor al 10% del valor meta de dicha categoría o implicar errores subsanables mínimos, como por ejemplo la actualización de un formato. Bajo dichos parámetros, según se puede apreciar en la Figura 22, se mapearon un total de 143 observaciones en las inspecciones realizadas durante los últimos 5 años.

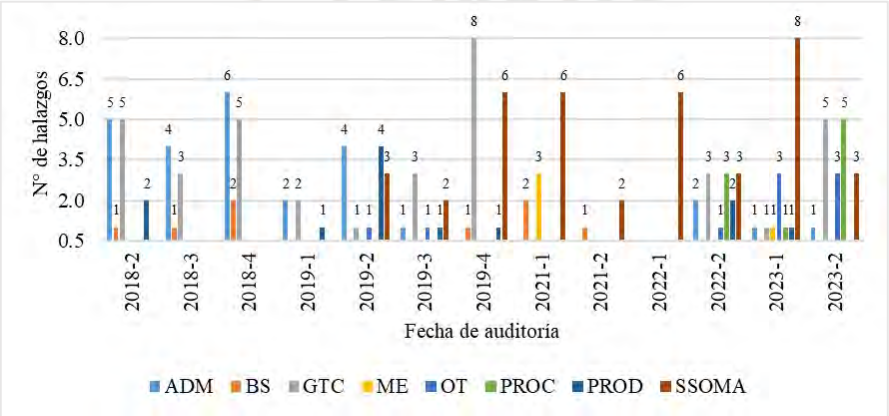


Figura 22. Observaciones durante auditorías e inspecciones

Fuente: Elaboración propia.

De estas, el área de SSOMA presenta el mayor número de observaciones mapeadas, con un total de 39 distribuidos en un periodo de 12 fechas de evaluación. De manera análoga, el área de Gestión Total de la Calidad presentó un total de 36 observaciones en un periodo de 13 evaluaciones; el área de Administración presento 26 en 12 evaluaciones; Producción presento 12 distribuidas en 12 evaluaciones; Oficina Técnica presento 9 en 12 evaluaciones; Procura presento 9 distribuidas en 6 evaluaciones; Bienestar Social presento 8 distribuida en 11 evaluaciones; y Maquinaria y Equipo presento 4 observaciones registradas en un plazo de 5 evaluaciones. Adicionalmente, en el periodo de evaluación del 2023-2 fue en el que se identificó el mayor número de observaciones, alcanzando un total de 17 registradas.

4.2.4. No conformidades en auditorías e inspecciones.

Se clasificó a las no conformidades cuando, durante la inspección, se le daba puntaje parcial o nulo en una categoría evaluada. Adicionalmente, los comentarios negativos debían implicar una variación mayor al 10% del valor meta de dicha categoría o implicar errores graves a la aplicación de los formatos del SIG evaluados, como por ejemplo el no tener la documentación obligatoria requerida en el procedimiento evaluado. Bajo dichos parámetros, según se puede apreciar en la Figura 23, se identificó un total de 21 no conformidades en todas las inspecciones realizadas.

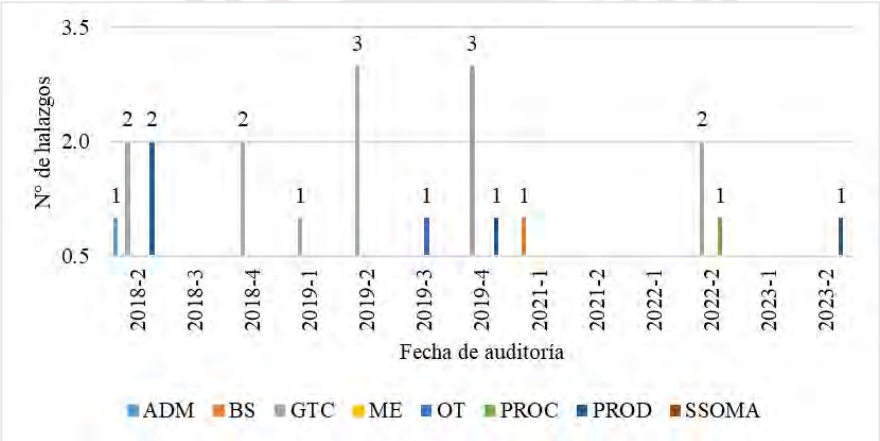


Figura 23. No conformidades durante auditorías e inspecciones

Fuente: Elaboración propia.

De estas, el área de GTC presenta el mayor número de no conformidades mapeadas, con un total de 13 distribuidos en un periodo de 13 fechas de evaluación. De manera análoga, el área de Producción presentó un total de 4 no conformidades en un periodo de 12 evaluaciones; el área de Administración presentó 1 distribuidas en 12 evaluaciones; Bienestar Social presento 1 en 11 evaluaciones; Oficina Técnica presento 1 distribuidas en 12 evaluaciones; y el área de Procura presentó 1 no conformidad distribuida en 6 evaluaciones. Adicionalmente, se identificó que el periodo de evaluación del 2018-2 fue en el cual se identificaron el mayor número de no conformidades, alcanzando un total de 5 registradas.

4.2.5. Recopilado de hallazgos en auditorías e inspecciones.

Con lo previamente clasificado, y tomando en cuenta que cada evaluación a un área es considerada como una inspección independiente, se procedió a obtener un resumen presentado en la Tabla 5.

Tabla 5. Hallazgos clasificados de las inspecciones

Hallazgos	Cantidad
Número de inspecciones	79
Oportunidad de mejora	4
Fortaleza	7
Observaciones	143
No conformidad	21

Fuente: Elaboración propia.

4.3. Hallazgos de las encuestas de satisfacción

Para el propósito de la investigación de esta tesis, se procedió a analizar los resultados obtenidos durante las encuestas de satisfacción realizadas en los últimos 5 años mostrados en la Tabla 6. Estas encuestas corresponden a los hitos de entrega de las torres construidas al equipo de inmobiliaria. Cabe resaltar que los resultados obtenidos en la sección E suele ser un consolidado de los resultados de las secciones A, B, C y D; por ello, no se procederá a incluir en el análisis si no se identifica información adicional especificada en dicha sección.

Tabla 6. Resultados de las encuestas de satisfacción

Resumen de encuestas área construcción	2018-1	2019-1	2019-2	2020-3	2021-1	2022-1	2023-1
1. Personal de la organización (A)	100%	89%	67%	100%	100%	100%	100%
2. Calidad de obra (B)	94%	67%	61%	94%	89%	92%	100%
3. Seguridad de obra (C)	100%	83%	83%	100%	100%	100%	100%
4. Organización y servicio del personal (D)	100%	56%	67%	100%	100%	78%	100%
5. Grado de satisfacción general (E)	100%	67%	67%	100%	89%	89%	100%
Total	99%	72%	69%	99%	96%	92%	100%

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1. Oportunidades de mejora en encuestas de satisfacción.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos, se clasificó a las oportunidades de mejora cuando los encuestados proporción un puntaje de 2 o mayor y establecen comentarios sobre posibilidades de mejora ajenos al alcance inicial del proyecto. Un ejemplo de ello es la sugerencia de instaurar un plan de manejos de residuos para facilitar el cumplimiento de las condiciones del bono Mi Vivienda.

Según se puede apreciar en la Figura 24, se obtuvieron un total de 3 oportunidades de mejora dispersadas en un total 7 encuestas realizadas durante los últimos 5 años. De los cuales, 2 corresponden a la categoría de Seguridad de obra y el restante corresponde a la categoría de Calidad de obra. Adicionalmente, no se puede apreciar un periodo de evaluación en el cual se perciba un incremento excepcional de este tipo de hallazgo.

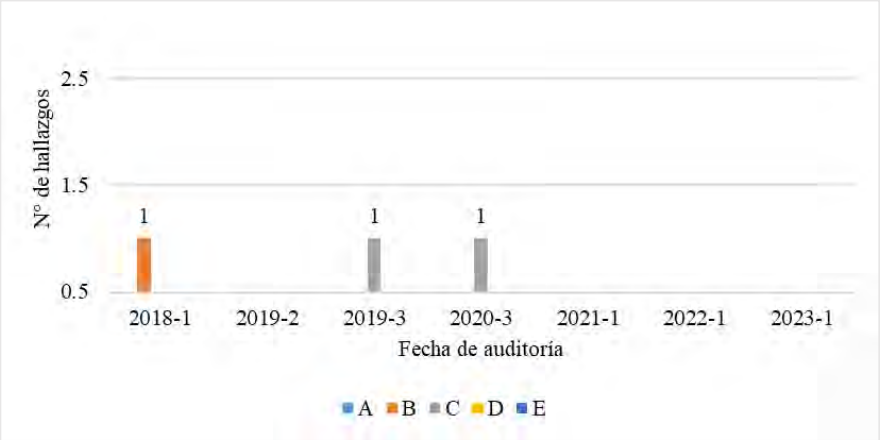


Figura 24. Oportunidades de mejora en encuestas de satisfacción

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2. Fortalezas en encuestas de satisfacción.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos, se clasificó a las fortalezas cuando los encuestados proporción un puntaje de 2 o mayor y establecen comentarios sobre aspectos positivos dentro del alcance del proyecto y que se cumplieron notoriamente. Un ejemplo de ello es el recalco por la mejora en el tiempo de transmisión de información.

Según se puede apreciar en la Figura 25, se obtuvieron un total de 3 fortalezas dispersadas en un total 7 encuestas realizadas durante los últimos 5 años. De los cuales, 2 corresponden a la categoría de Calidad de obra (B) y el restante corresponde a la categoría de Seguridad de obra (C). Adicionalmente, se identificó que el periodo de evaluación del 2021-1 fue donde se identificaron el mayor número de fortalezas, alcanzando un total de 2 registradas durante ese periodo.

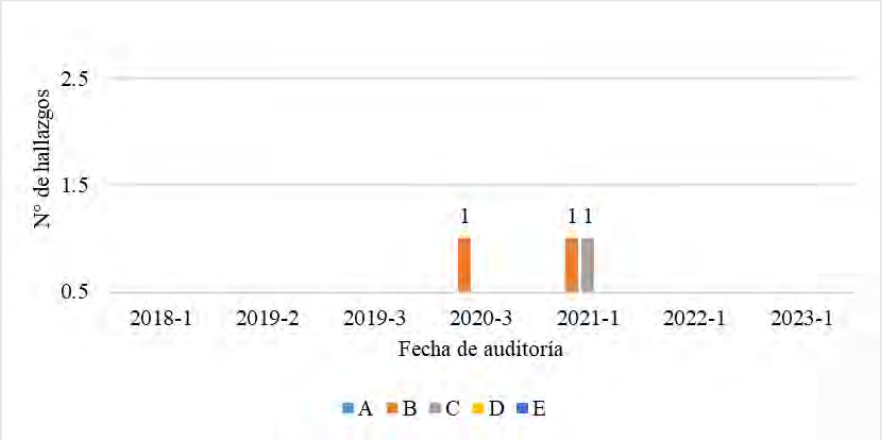


Figura 25. Fortalezas en encuestas de satisfacción

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3. Observaciones en encuestas de satisfacción.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos, se clasifico a las observaciones cuando los encuestados proporcionan un puntaje de 1 o menor y establecen comentarios sobre observaciones con un impacto mayor de 3 días útiles en su corrección. Un ejemplo de ello es la observación sobre la falta de orden y limpieza una vez finalizado los trabajos de subcontratas durante el proceso de entregas.

Según se puede apreciar en la Figura 26, se obtuvieron un total de 9 observaciones dispersadas en un total 7 encuestas realizadas durante los últimos 5 años. De los cuales, 5 corresponden a la categoría de Seguridad de obra (C); 3 a la categoría de Calidad de obra (B); y 1 a la categoría de Grado de satisfacción general (E), el cual hace referencia a una observación diferente a la registrada previamente en dicha encuesta. Adicionalmente, se identificó que el periodo de evaluación del 2019-2 fue en el cual se identificaron el mayor número de observaciones, alcanzando un total de 6 registradas durante ese periodo.

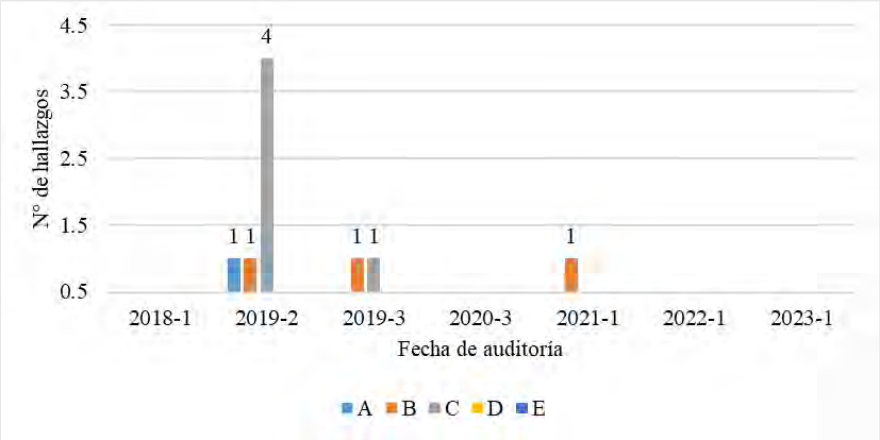


Figura 26. Observaciones en encuestas de satisfacción

Fuente: Elaboración propia.

4.3.4. No conformidades en encuestas de satisfacción.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos, se clasifico a las no conformidades cuando los encuestados proporcionan un puntaje de 1 o menor y establecen comentarios sobre observaciones con un impacto mayor de 3 días útiles en su corrección. Un ejemplo de ello es la observación sobre los plazos de los acuerdos no respetados.

Según se puede apreciar en la Figura 27, se obtuvieron un total de 4 no conformidades dispersadas en un total 7 encuestas realizadas durante los últimos 5 años. De los cuales, 2 corresponden a la categoría de Calidad de obra (B) y los 2 restantes corresponden a la categoría de Organización y Servicio del personal (D). Adicionalmente, se identificó de que los periodos de evaluación del 2019-2 y 2022-1, son los periodos en los cuales se identificaron las observaciones, alcanzando un total de 2 registradas en cada uno.

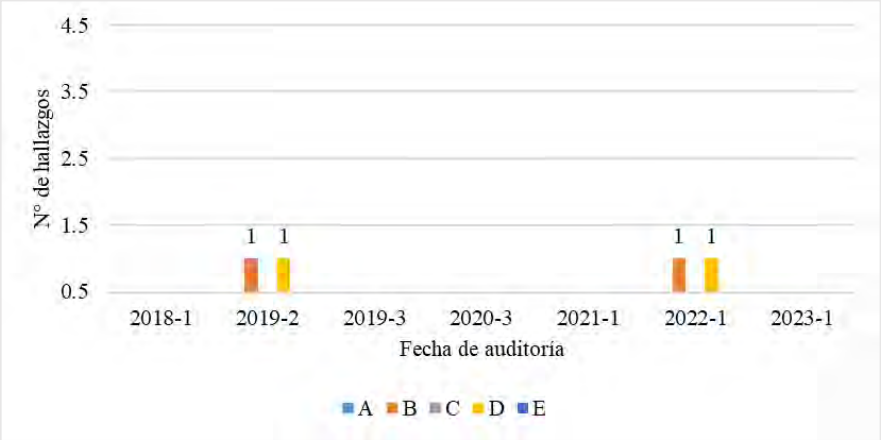


Figura 27. No conformidades en encuestas de satisfacción

Fuente: Elaboración propia.

4.3.5. Recopilado de hallazgos en encuestas de satisfacción.

Con lo previamente clasificado, y tomando en cuenta de que cada encuesta es considerada como una revisión independiente, se procedió a realizar el cuadro resumen presentado en la Tabla 7.

Tabla 7. Hallazgos por encuestas de satisfacción

Hallazgos	Cantidad
Número de revisiones	7
Oportunidad de mejora	3
Fortaleza	3
Observaciones	9
No conformidad	4

Fuente: Elaboración propia.

4.4. Hallazgos del registro de observaciones

Para el propósito de la investigación de esta tesis, se procedió a analizar los registros de observaciones elaborados en las últimas 5 etapas del proyecto, cada una con un total de 2 edificios de 20 pisos por etapa desarrollada. Según se puede apreciar en la Tabla 8, para cada una de las etapas se realizaron más de 5500 revisiones, alcanzando un total de 28582 revisiones

realizadas en el transcurso del proyecto. En estas revisiones, las que corresponden al número de protocolos elaborados en cada una de las etapas, son donde se identifican las diferencias con los parámetros de calidad o las tolerancias indicadas por la empresa a inicios del proyecto al cliente. Según se puede apreciar en la Tabla 8, el número de hallazgos durante cada etapa constructiva supero los 1000, alcanzando un total de 8226 repartidas en las diferentes especialidades.

Tabla 8. Hallazgos del registro de observaciones, sin filtro

	Etapa II (torre 11 y 12)	**Etapa III (torre 13 y 14)**	**Etapa IV (torre 7 y 8)**	**Etapa V (torre 15 y 16)**	**Etapa VI (torre 17 y 18)**	**Total**
Número de revisiones	5500	5500	5519	6088	5975	28582
Número de registros en estructura	80	78	58	72	12	300
Número de registros en arquitectura	517	1544	795	1035	506	4397
Número de registros en acabados	1046	769	635	221	551	3222
Número de registros en instalaciones	13	8	135	3	129	288
Número de registros no especificados	19	0	0	0	0	19
Número total de registros	1675	2399	1623	1331	1198	8226

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, debido a la naturaleza repetitiva de las revisiones, han existido varias ocasiones en las que el registro de las observaciones no aporta información relevante para su análisis. Durante el procesamiento de información se aplicó un filtro a los hallazgos obtenidos, omitiendo registros repetitivos de las diversas partidas durante la misma semana. Finalmente, como se puede apreciar en la Tabla 9, el número de hallazgos durante cada etapa constructiva no supero los 850, alcanzando un total de 2074 repartidas en las diferentes especialidades.

Tabla 9. Hallazgos del registro de observaciones, con filtro

	Etapa II (torre 11 y 12)	**Etapa III (torre 13 y 14)**	**Etapa IV (torre 7 y 8)**	**Etapa V (torre 15 y 16)**	**Etapa VI (torre 17 y 18)**	**Total**
Número de revisiones	5500	5500	5519	6088	5975	28582
Número de registros en estructura	72	65	49	57	10	253
Número de registros en arquitectura	217	486	200	179	167	1249
Número de registros en acabados	129	277	87	24	161	678
Número de registros en instalaciones	13	8	19	3	65	108
Número de registros no especificados	19	0	0	0	0	19
Número total de registros	217	836	355	263	403	2074

Fuente: Elaboración propia.

4.4.1. Oportunidades de mejora en registro de observaciones.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos no se encontró algún elemento que sea considera una oportunidad de mejora. Esto se debe a que ninguno de los hallazgos registrados por la herramienta se les considera como un refuerzo positivo e innovador a algún parámetro o procedimiento del SIG.

4.4.2. Fortaleza en registro de observaciones.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos no se encontró algún elemento que sea considera una fortaleza. Esto se debe a que ninguno de los hallazgos registrados por la herramienta se les considera como un refuerzo positivo no innovador a algún parámetro u procedimiento del SIG.

4.4.3. Observaciones en registro de observaciones.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos, se denominó las observaciones como los registros cuya solución no implicaba un retraso mayor a 3 días útiles en el tren de avance. Un ejemplo de lo mencionado es el amolado de protuberancias encontradas durante la revisión de la culminación del proceso de solaqueo.

Según se puede apreciar en la Figura 28, se obtuvieron un total de 2059 observaciones dispersadas en un total 5 etapas realizadas durante los últimos 5 años. De los cuales, 1249 corresponden a la categoría de registros en Arquitectura; 665 a la categoría de registros de Acabados de obra; 248 a la categoría de registro en Estructuras; 99 en registros en Instalación y 19 en registrados no especificados. Adicionalmente, se identificó que el periodo de la Etapa III (Torre 13 y 14) es el periodo donde se presentaron el mayor número de observaciones, alcanzando un total de 833, siendo un 58% de estas correspondientes a Arquitectura.

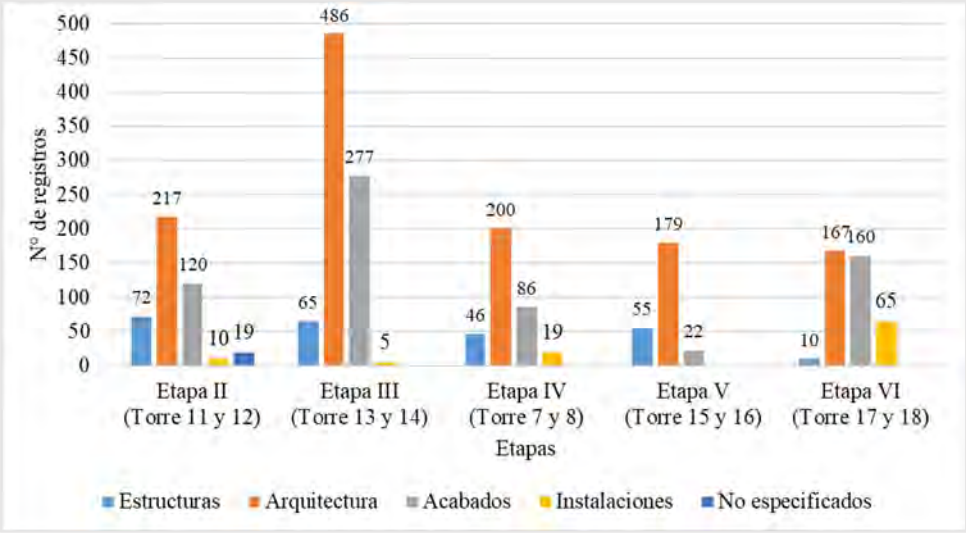


Figura 28. Observaciones del registro de observaciones

Fuente: Elaboración propia.

4.4.4. No conformidades en registro de observaciones.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos, se denominó las no conformidades como los registros cuya solución implicaba un retraso mayor a tres días útiles en el tren de avance. Adicionalmente, estas observaciones son retiradas del registro de observaciones, realizándose un análisis separado para obtener la causa raíz y tomar medidas que eviten su repetición. Un ejemplo de lo mencionado es la presencia de cajoneo masivo en la Torre 7, que tras ser sometido a un análisis de causa se descubrió que fue provocado por un mal procedimiento de emporrado por parte del personal de la subcontrata.

Según se puede apreciar en la Figura 29, se obtuvieron un total de 27 no conformidades dispersadas en un total 5 etapas realizadas durante los últimos 5 años. De los cuales, 13 corresponden a la categoría de registros en Acabados; 9 a la categoría de registros de Instalaciones de obra y 5 a la categoría de registro en Estructuras. Adicionalmente, se identificó que el periodo de la Etapa II (Torre 11 y 12) es el periodo donde se presentaron el mayor número de no conformidades, alcanzando un total de 12, siendo un 75% de estas correspondientes a Acabados.

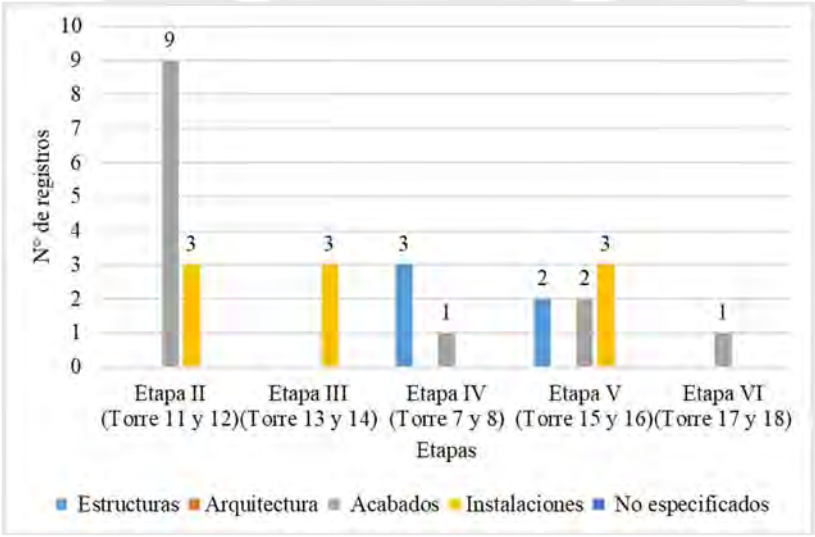


Figura 29. No conformidades del registro de observaciones

Fuente: Elaboración propia.

4.4.5. Recopilado de hallazgos en registro de observaciones.

Tomando en cuenta que una revisión se considera de forma independiente, aunque se puedan encontrar dos o más hallazgos por revisión, y utilizando los criterios de clasificación previamente mencionados, se procedió a realizar obtener el cuadro resumen presentado en la Tabla 10.

Tabla 10. Hallazgos clasificados del registro de observaciones

Hallazgos	Cantidad
Número de revisiones	28582
Oportunidad de mejora	0
Fortaleza	0
Observaciones	2059
No conformidad	27

Fuente: Elaboración propia.

4.5. Hallazgos de las lecciones aprendidas

Para el propósito de la investigación de esta tesis, se procedió a analizar las lecciones aprendidas recopiladas desde su periodo de inicio en el año 2018. Sin embargo, y para facilitar al análisis de la información, se procedió a agrupar las lecciones aprendidas según su aporte brindado al SIG:

- La categoría de *Modificación de proceso*, como su nombre lo indica, hace referencia a la alteración de un proceso previamente establecido en el SIG para obtener mejores resultados, como el caso de la implementación de rodanas como separadores en los muros de concreto.
- La categoría *Oportunidades Nuevas*, son las lecciones aprendidas que buscan el aprovechamiento de un recurso ya existente para destinarlo a una función

adicional, como es el caso de aplicar la sanción de realizar labores de limpieza a los trabajadores que entran con tardanza.

- La categoría de *Seguimiento* hace referencia a la implementación de nuevas tecnologías de control, como la aplicación de un nuevo formato para dar la aprobación de compra por caja chica.
- La categoría de *Coordinación con terceros* implica el hacer un refuerzo en los procedimientos de trabajo con personal externo a la empresa, como el brindar charlas de inducción al personal de subcontratas que entran para trabajos puntuales.
- La categoría de *Nueva responsabilidades* implica la asignación de un nuevo personal responsable de una actividad, por implicancias entre dicha actividad y el trabajo realizado por el nuevo personal responsable. Un ejemplo de ello es la asignación del área de BS como responsable de verificar la limpieza diaria en áreas comunes.
- La categoría de *Difusión de información* implica la implementación de nuevos requerimientos de capacitaciones sobre un tema en específico que ocasiona observaciones repetitivas. Un ejemplo de ello es la propuesta de brindar charlas de seguridad de altura al personal nuevo encargado del vaciado de concreto.
- La categoría de *Instalaciones nuevas* hace referencia a la implementación de equipos nuevos y no contemplados previamente para el cumplimiento de labores según el SIG. Un ejemplo de ello es la propuesta de adquirir un medido de humedad de madera para poder realizar la revisión del material que viene a obra.

Según se aprecia en la Tabla 11, se puede apreciar un aumento continuo en las lecciones aprendidas empleadas, debido a que las áreas que requieren presentar un número mínimo de lecciones aprendidas al mes han ido aumentando.

Tabla 11. Hallazgos por registro de observaciones

Descripción	2018	2019	2021	2022
Modificación de proceso	3	7	14	15
Oportunidades nuevas	1	1	0	1
Seguimiento	2	4	5	16
Coordinación con terceros	2	3	9	17
Nueva responsabilidad	1	2	0	0
Difusión de información	1	1	7	18
Instalaciones nuevas	0	0	0	1
Total	10	18	35	68

Fuente: Elaboración propia.

4.5.1. Oportunidades de mejora en lecciones aprendidas.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos, se clasifico a las oportunidades de mejora cuando los hallazgos contemplan elementos ajenos al SIG de manera positiva. Las lecciones aprendidas en las categorías de “Modificación de proceso”, “Seguimiento”, “Coordinación de terceros” e “Instalaciones nuevas”, son las que encajan en el presente perfil. Un ejemplo de ello se encuentra en la instauración de la restricción a anclarse en puntales, siendo únicamente posible anclarse en elementos fijos como acero de viga o columna.

Según se puede apreciar en la Figura 30, se obtuvieron un total de 16 oportunidades de mejora dispersadas en un total de 140 lecciones aprendidas realizadas durante los últimos 5 años. De los cuales, 33 fueron propuestos por el área de Producción; 27 fueron propuestos por el área de GTC; 18 por el área de Oficina técnica; 11 por el área de SSOMA; 11 por el área de Bienestar social; y 6 por el área de Administración. Adicionalmente, se identificó que fue en el año 2022, periodo correspondiente a finales de la Etapa IV (Torre 7 y 8) e inicios de la Etapa

V (Torre 14 y 15) en donde se presentaron el mayor número de oportunidades de mejora a raíz de esta herramienta, alcanzando un total de 49.

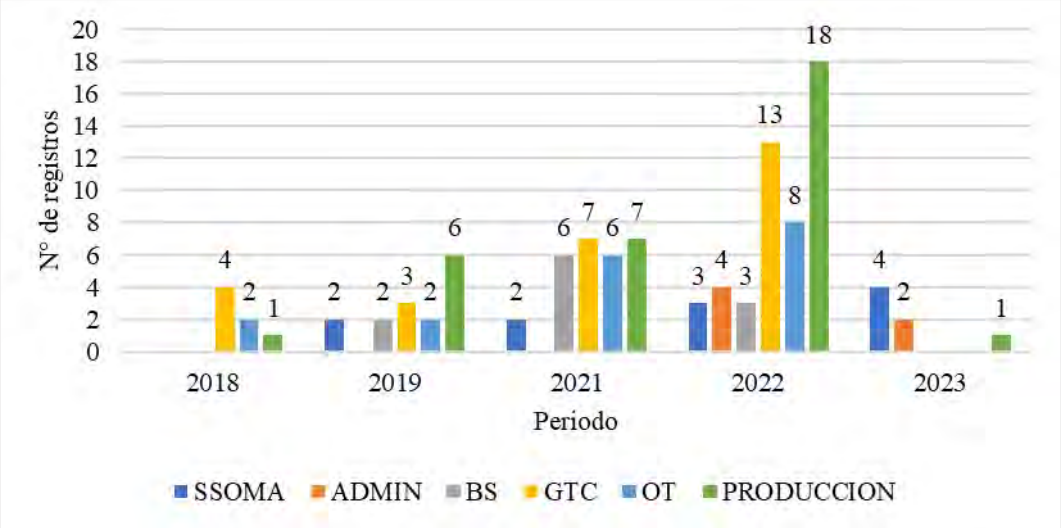


Figura 30. Oportunidades de mejora de lecciones aprendidas

Fuente: Elaboración propia.

4.5.2. Fortaleza en lecciones aprendidas.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos, se clasifico a las fortalezas cuando los hallazgos contemplan elementos pertenecientes al SIG de manera positiva. Las lecciones aprendidas en las categorías de "Difusión de información", "Nueva responsabilidad" y "Oportunidades nuevas", son las que encajan en el presente perfil. Un ejemplo de ello fue el emplear la información recopilada de los accidentes sin tiempos perdidos durante la Torre 7, para realizar charlas informativas sobre los peligros a contemplar en la Torre 8.

Según se puede apreciar en la Figura 32, se obtuvieron un total de 34 oportunidades de mejora dispersadas en un total de 140 lecciones aprendidas realizadas durante los últimos 5 años. De los cuales, 22 fueron propuestos por el área de SSOMA; 8 fueron propuestos por el área de Bienestar social; 2 por el área de GTC; 1 por el área de Administración y 1 por el área de Oficina técnica. Adicionalmente, se identificó que fue en el año 2022, periodo

correspondiente a finales de la Etapa IV (Torre 7 y 8) e inicios de la Etapa V (Torre 14 y 15) en donde se presentaron el mayor número de oportunidades de mejora a raíz de esta herramienta, alcanzando un total de 19.

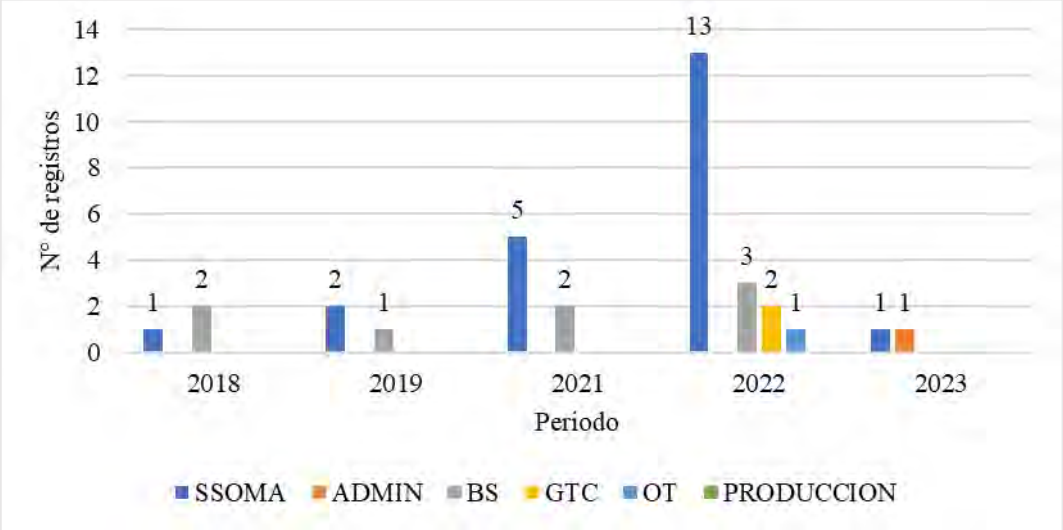


Figura 31. Fortalezas de lecciones aprendidas

Fuente: Elaboración propia.

4.5.3. Observaciones en lecciones aprendidas.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos no se encontró algún elemento que sea considera una observación. Esto es debido a que ninguno de los hallazgos registrados por la herramienta se les considera como una desviación y omisión leve de lo establecido en el SIG.

4.5.4. No conformidades en lecciones aprendidas.

Durante la categorización de los hallazgos obtenidos no se encontró algún elemento que sea considera una no conformidad. Esto es debido a que ninguno de los hallazgos registrados por la herramienta se les considera como una desviación y omisión grave de lo establecido en el SIG.

4.5.5. Recopilado de hallazgos en lecciones aprendidas.

Con lo previamente clasificado, y tomando en cuenta que cada lección aprendida postulada cuenta como una revisión independiente, se procedió a realizar obtener el cuadro resumen presentado en la Tabla 12.

Tabla 12. No conformidades en del registro de observaciones

Hallazgos	Cantidad
Número de revisiones	131
Oportunidad de mejora	67
Fortaleza	64
Observaciones	0
No conformidad	0

Fuente: Elaboración propia.

CAPITULO V: RESULTADOS

5.1. Eficacia de obtención de hallazgos

Las herramientas de mejora continua analizadas han sido las más relevantes empleadas en el proyecto de construcción a analizar, siendo la mayor fuente de hallazgos que permitieron generar opciones de mejora en el SIG de la empresa. Sin embargo, como se puede apreciar en la Tabla 13, estas herramientas no brindan resultados parejos entre las cuatro categorías de hallazgo debido a que su mismo funcionamiento los hace focalizarse en ciertos aspectos característicos del SIG, obteniendo hallazgos predominantes en ciertas categorías. Un ejemplo de lo ocurrido con la herramienta del registro de observaciones, el cual tiende a centrarse en obtener hallazgos en las categorías de observaciones y no conformidades.

Tabla 13. Resumen de hallazgos categorizados

Herramienta de mejora continua	Número de revisiones	Oportunidad de mejora	Fortaleza	Observaciones	No conformidad
Registro de observaciones	28582	0	0	1665	18
Encuestas de satisfacción	7	3	3	9	4
Auditorías e inspecciones	79	4	7	143	21
Lecciones aprendidas	131	67	64	0	0

Fuente: Elaboración propia.

Con la intención de entender qué tan efectiva es la ejecución de las herramientas de mejora continua analizadas, se compara la proporción entre el número de hallazgos y la cantidad de veces que fue implementada la herramienta utilizando la siguiente ecuación:

$$\text{RATIO DE HALLAZGOS} = \frac{\text{N° DE HALLAZGOS}}{\text{N° DE REVISIONES}}$$

5.1.1. Ratio de oportunidades de mejora según herramientas.

Tras realizar el cálculo de los ratios de hallazgos de oportunidades de mejora, se obtuvo como resultado los valores de la Figura 32. Según se puede apreciar, se obtiene que la herramienta de mejora continua más probable en conseguir una oportunidad de mejora en su aplicación es la herramienta de lecciones aprendidas con un ratio de 0.511 de hallazgos por vez aplicada. De manera análoga, se obtuvo que la herramienta de encuestas de satisfacción obtuvo un ratio de 0.429; auditorías e inspecciones obtuvo un ratio de 0.051 y no se obtuvieron oportunidades de mejora durante la implementación del registro de observaciones.

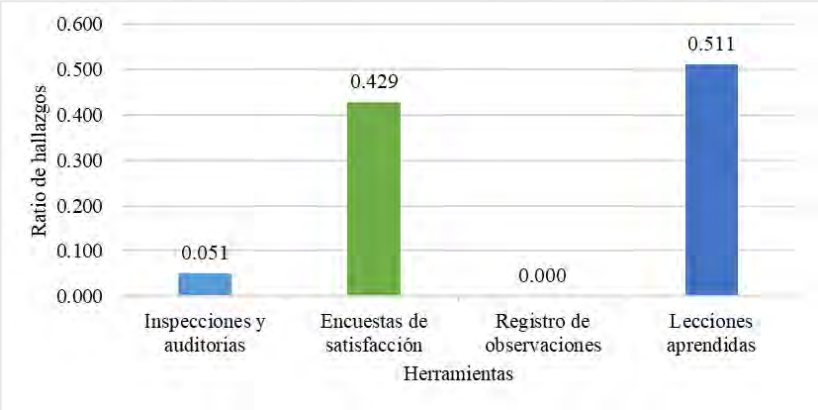


Figura 32. Ratio de oportunidades de mejora según herramientas

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2. Ratio de fortalezas según herramientas.

Tras realizar el cálculo de los Ratios de hallazgos de fortalezas, se obtuvo como resultado los valores de la Figura 34. Según se puede apreciar, se obtiene que la herramienta de mejora continua más probable en conseguir una fortaleza en su aplicación es la herramienta de lecciones aprendidas con un ratio de 0.489 de hallazgos por vez aplicada. De manera análoga, se obtuvo que la herramienta encuestas de satisfacción obtuvo un ratio de 0.429; auditorías e

inspecciones obtuvo un ratio de 0.089 y no se obtuvieron fortalezas durante la implementación del registro de observaciones.

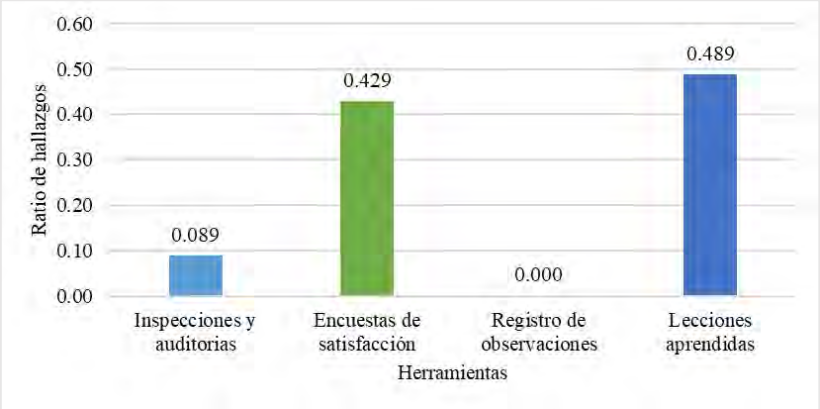


Figura 33. Ratio de hallazgos de fortalezas por herramientas

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3. Ratio de observaciones según herramientas.

Tras realizar el cálculo de los Ratios de hallazgos de observaciones, se obtuvo como resultado los valores de la Figura 34. Según se puede apreciar, se obtiene que la herramienta de mejora continua más probable en conseguir una observación en su aplicación es la herramienta de auditorías e inspecciones con un ratio de 1.810. De manera análoga, se obtuvo que la herramienta encuestas de satisfacción obtuvo un ratio de 1.286; el registro de observaciones obtuvo un ratio de 0.072 y no se obtuvieron observaciones durante la implementación de la herramienta lecciones aprendidas.

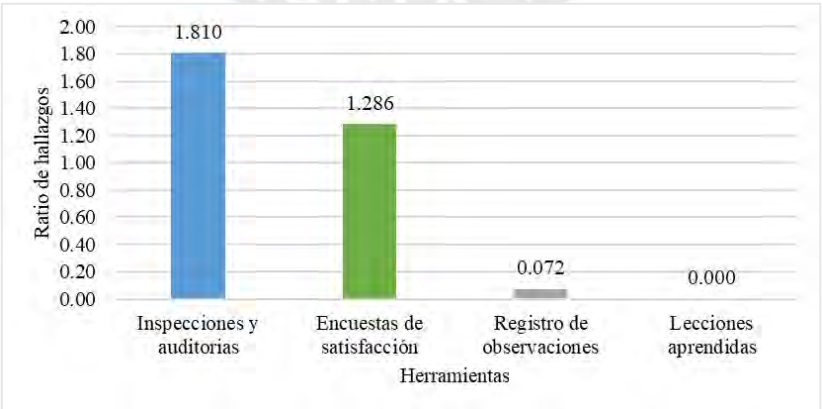


Figura 34. Ratio de hallazgos de observaciones según herramientas

Fuente: Elaboración propia.

5.1.4. Ratio de no conformidades según herramienta.

Tras realizar el cálculo de los Ratios de hallazgos de no conformidades, se obtuvo como resultado los valores de la Figura 35. Según se puede apreciar, se obtiene que la herramienta de mejora continua más probable en conseguir una no conformidad en su aplicación es la herramienta de encuestas de satisfacción con un ratio de 0.571. De manera análoga, se obtuvo que la herramienta auditorías e inspecciones obtuvo un ratio de 0.266; el registro de observaciones obtuvo un ratio de 0.001 y no se obtuvieron no conformidades durante la implementación de la herramienta lecciones aprendidas.

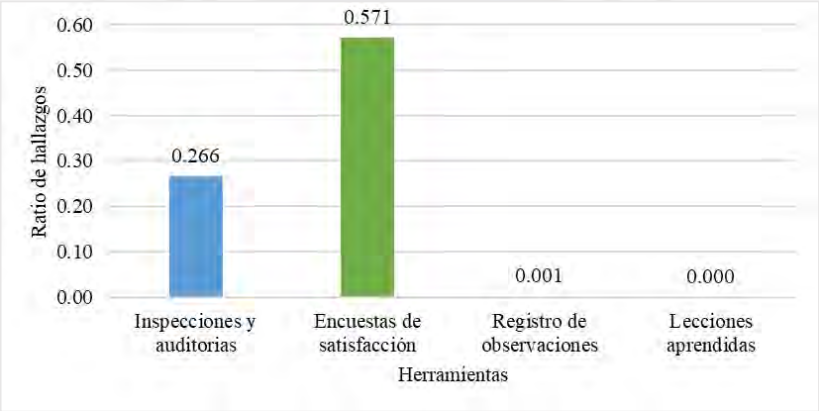


Figura 35. Ratio de hallazgos de no conformidades según herramientas

Fuente: Elaboración propia.

5.1.5. Recopilado de hallazgos en lecciones aprendidas.

Utilizando la suma de los ratios obtenidos en las secciones anteriores, se obtuvo la Tabla 14, en esta se puede apreciar que la herramienta con mayor eficacia en el momento de obtener hallazgos son las encuestas de satisfacción, la cual obtuvo un total de 2.215 hallazgos por revisión realizada. De manera análoga, la herramienta auditorías e inspecciones tiene un ratio de 2.215 hallazgos por revisión realizada; lecciones aprendidas tiene un ratio de 1.00; y el del registro de observaciones tiene un ratio de 0.073.

Tabla 14. Resumen de ratios de categoría de hallazgos

Categoría	Ratios				total
	Oportunidad de mejora	Fortalezas	Observaciones	No conformidad	
Auditorías e inspecciones	0.051	0.089	1.810	0.266	2.215
Encuestas de satisfacción	0.429	0.429	1.286	0.571	2.714
Registro de observaciones	0.000	0.000	0.072	0.001	0.073
Lecciones aprendidas	0.511	0.489	0.000	0.000	1.000

Fuente: Elaboración propia.

5.2. Comparación de horas hombre (H.H.) empleadas

La implementación de las herramientas de mejora continua conlleva un costo adicional, ya sea de H.H. o por implementación de tecnologías. Generar un sobrecosto excesivo en la búsqueda de la optimización, incluso dejado de lado el cumplimiento de las funciones regulares de la empresa, es un concepto que va en contra del ideal de la mejora continua. Como se observa en la Tabla 15, el tiempo promedio de las últimas revisiones realizadas por el personal responsable es útil para conocer el consumo esperado de los recursos por la herramienta empleada. Además, en este caso de estudio, se puede apreciar que la herramienta encuestas de satisfacción es la revisión más rápida, mientras que la herramienta auditorías e inspecciones es la más larga.

Tabla 15. Resumen de horas hombre (H.H.) por hallazgo

Herramienta de mejora continua	N° de revisiones	H.H. por revisión	H.H. empleadas
Auditorías e inspecciones	79	6	474
Encuestas de satisfacción	7	0.25	1.75
Registro de observaciones	28582	0.5	14291
Lecciones aprendidas	131	5	655

Fuente: Elaboración propia.

Utilizando la fórmula:

$$\text{H. H. TOTAL} = \text{NÚMERO DE REVISIONES} * \text{H. H. POR REVISIÓN}$$

Es posible obtener el tiempo exacto que se emplea en la búsqueda de hallazgos por parte de las herramientas de mejora continua.

Tabla 16. Comparación de H.H. empleadas en las herramientas de mejora continua

Herramienta de mejora continua	H.H. por oportunidad de mejora	H.H. por fortaleza	H.H. por observaciones	H.H. por no conformidad
Auditorías e inspecciones	118.50	67.71	3.31	22.57
Encuestas de satisfacción	0.58	0.58	0.19	0.44
Registro de observaciones	N.A.	N.A.	6.94	529.30
Lecciones aprendidas	9.78	10.23	N.A.	N.A.

Fuente: Elaboración propia.

Según la Tabla 16, la herramienta en la que mayor cantidad de H.H. se invierte viene a ser en el del registro de observaciones, debido a la gran cantidad de revisiones que requiere. Así mismo, se identifica que la herramienta con menor cantidad de H.H. es la herramienta de encuestas de satisfacción, la cual demora solo 15 minutos por revisión.

$$\text{H. H. TOTAL} = \text{N° DE REVISIONES} * \text{H. H. POR REVISIÓN}$$

$$\text{H. H. POR HALLAZGOS} = \frac{\text{H. H. TOTAL}}{\text{N° DE HALLAZGOS}}$$

CONCLUSIONES

La empresa constructora posee varias herramientas de mejora continua, pero son cuatro las que cumplen con solo emplear información extraída del proyecto analizado. Estas son las auditorías e inspecciones, las encuestas de satisfacción, los registros de observaciones y las lecciones aprendidas.

Se identificó que el impacto de las herramientas de mejora continua para generar situaciones de mejora radica en la capacidad para obtener hallazgos que permiten implementar cambios graduales del sistema de gestión de la empresa a largo plazo. De acuerdo a cada herramienta se obtuvo lo siguiente:

Auditorías e inspecciones. Esta herramienta registró 175 hallazgos, de estos, la mayoría fueron observaciones simples.

Encuestas de satisfacción. Esta herramienta registró 26 hallazgos, de estos, la mayoría fueron observaciones simples.

Registro de observaciones. Esta herramienta registró 2086 hallazgos, de estos, la mayoría fueron observaciones simples.

Lecciones aprendidas. Esta herramienta registró 131 hallazgos, de estos, la mayoría fueron oportunidades de mejora.

Se identificó que el tiempo empleado para la implementación de las herramientas de mejora continua varía dependiendo de cada una de estas. Sin bien, es difícil cuantificar el tiempo de gestión previa a las herramientas, se puede calcular el tiempo requerido para su

ejecución en campo en base a horas hombre del personal encargado. De acuerdo a cada herramienta se obtuvo lo siguiente:

Auditorías e inspecciones. Esta herramienta empleó 474 H.H. en su implementación durante todo el proyecto de construcción.

Encuestas de satisfacción. Esta herramienta empleó 1.75 H.H. en su implementación durante todo el proyecto de construcción.

Registro de observaciones. Esta herramienta empleó 14291 H.H. en su implementación durante todo el proyecto de construcción.

Lecciones aprendidas. Esta herramienta empleó 655 H.H. en su implementación durante todo el proyecto de construcción.

Para identificar cuál de las herramientas de mejora continua tiene mejor desempeño se compara la facilidad de obtener un tipo específico de hallazgo por cada revisión implementada obteniendo lo siguiente:

Oportunidades de mejora. La herramienta de mejora continua que ofrece el mejor ratio para la obtención de este tipo de hallazgo es la lección aprendida con 0.511 hallazgos por revisión.

Fortalezas. La herramienta de mejora continua que ofrece el mejor ratio para la obtención de este tipo de hallazgo es la lección aprendida con 0.489 hallazgos por revisión.

Observaciones. La herramienta de mejora continua que ofrece el mejor ratio para la obtención de este tipo de hallazgo es la auditoría e inspecciones con 1.810 hallazgos por revisión.

No conformidades. La herramienta de mejora continua que ofrece el mejor ratio para la obtención de este tipo de hallazgo es la encuesta de satisfacción con 0.571 hallazgos por revisión.

Adicionalmente, un parámetro para identificar cuál de las herramientas presenta un mejor desempeño, es medir la eficiencia con la cuál la herramienta encuentra un hallazgo en general:

Auditorías e inspecciones. Esta herramienta emplea un promedio de 2.215 H.H por hallazgo encontrado.

Encuestas de satisfacción. Esta herramienta emplea un promedio de 2.714 H.H por hallazgo encontrado.

Registro de observaciones. Esta herramienta emplea un promedio de 0.073 H.H por hallazgo encontrado.

Lecciones aprendidas. Esta herramienta emplea un promedio de 1.0 H.H por hallazgo encontrado.

Otro parámetro para identificar cuál de las herramientas presenta un mejor desempeño, es medir la eficiencia con la cuál la herramienta encuentra un hallazgo de un tipo específico respecto al tiempo empleado obteniendo lo siguiente:

Oportunidades de mejora. La herramienta de mejora continua que emplea el menor número de H.H. para la obtención de este tipo de hallazgo es la encuesta de satisfacción empleando 0.58 H.H. por oportunidad de mejor encontrada.

Fortalezas. La herramienta de mejora continua que emplea el menor número de H.H. para la obtención de este tipo de hallazgo es la encuesta de satisfacción empleando 0.58 H.H. por oportunidad de mejor encontrada.

Observaciones. La herramienta de mejora continua que emplea el menor número de H.H. para la obtención de este tipo de hallazgo es la encuesta de satisfacción empleando 0.19 H.H. por oportunidad de mejor encontrada.

No conformidades. La herramienta de mejora continua que emplea el menor número de H.H. para la obtención de este tipo de hallazgo es la encuesta de satisfacción empleando 0.44 H.H. por oportunidad de mejor encontrada.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que las encuestas de satisfacción son las herramientas que obtienen resultados con un menor consumo de recursos; sin embargo, su aplicación por hitos limita la cantidad de información extraída por ella.

Las auditorías e inspecciones son la herramienta que obtiene de forma más consistente hallazgos de desperfectos en el funcionamiento del SIG.

Las lecciones aprendidas son la herramienta que obtiene de forma más consistente los hallazgos de mejoramiento al funcionamiento del SIG.

COMENTARIOS

Las cuatro herramientas de mejora continua están enfocadas en el proceso de ejecución de la obra, por lo que la herramienta de auditorías e inspecciones solo toma en cuenta los resultados derivados de las inspecciones internas en la obra, dejando de lado los resultados obtenidos de auditorías globales.

La herramienta de encuesta de satisfacción usualmente debería ser analizada como parte de un conjunto de múltiples encuestas utilizando variables estadísticas; sin embargo, la reducida población objetiva limita la posibilidad de realizar un análisis más global y obliga a analizar la respuesta de cada pregunta de manera individual.

El registro de observaciones y las lecciones aprendidas están bastante ligadas entre sí. Son usualmente las observaciones con un impacto económico o de plazo importante las que son escogidas para realizar un análisis de causas y promover la lección aprendida. Sin embargo, esta herramienta puede ser simplemente innovaciones puras que se intentan aplicar.

Los tipos de hallazgos más importantes son las oportunidades de mejora y las no conformidades, puesto que casi siempre implica una modificación en el SIG, ya sea para conservar el cambio o asegurarse de que no se repita el error.

RECOMENDACIONES

Se recomienda repetir el estudio en otras empresas de construcción para poder validar los resultados obtenidos.

Basados en las ratios de efectividad para encontrar un hallazgo, se recomienda implementar la herramienta de encuesta de satisfacción de forma prioritaria en una empresa de construcción. Así mismo, se recomienda implementarla de forma presencial y de ser posible, personalizadas. Esto se debe a que, si bien es la herramienta con menor costo de implementación, la información brindada puede inducir más fácilmente al error.

Si lo que se desea es eliminar problemas en el SIG de una empresa de forma más consistente, se recomienda la aplicación de la herramienta auditorias e inspecciones.

Si lo que se desea es implementar mejoras en el SIG de una empresa, se recomienda la aplicación de la herramienta encuesta de satisfacción.

BIBLIOGRAFÍA

Arzapalo Amaro, P. W. (2020). Implementación del ciclo PHVA en la mejora del cumplimiento del plan mensual de avances – AESA RAURA. [Tesis de titulación, Universidad Continental] Repositorio Institucional Continental. Recuperado de: https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/7839

Bolívar Cárdenas, S. E. & Chinchila Royero, J. R. (2014). Diseño de un sistema integrado de gestión a partir de las normas ISO 9001:2008, ISO 22000:20055 Y OHSAS 18001:2007 para la empresa Inversiones Galavis S.A.S. Recuperado de: https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/31810

Boone Jr., H. N. & Boone, D. A. (2012). Analyzing Likert Data. Vol. 50. Asunto 2. Recuperado de: 10.34068/joe.50.02.48

Bustamante Zulueta, N. W., Sosa Vergara, J. C. (2022). Modelo de optimización basado en la metodología Lean Manufacturing y PDCA para mejorar la productividad del proceso de ejecución de enchapado en un edificio multifamiliar. Facultad de Ingeniería Industrial. Recuperado: https://hdl.handle.net/20.500.12867/7142

Camisón, C., Cruz, S. y González, T. (2006). Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. Madrid. Pearson Educación. Recuperado de: https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/64db843c11c52aaf913a5322feafd3d8.pdf

Castillo Pinzón, D. M. y Martínez Tobo, J. C. (2010). Enfoque para combinar e integrar la gestión de sistemas. Colombia. Editorial Icontec.

Chávez, L. F., De La Rosa, S. E., Manjarres, J. C., Valbuena, S. G., y Becerra Torres, M. (2024). Diagrama de Pareto. Perspectiva de la Asignatura de Control de la Calidad. Boletín De Innovación, Logística Y Operaciones, 6(1), 51–56. https://doi.org/10.17981/bilo.6.1.2024.07

Czimmermann, T. Ciuti, G., Milazzo, M.,Chiurazzi, M., Roccella, S., Oddo, C. M. y Dario, P. (2020). Visual-Based Defect Detection and Classification Approaches for Industrial Applications—A SURVEY. https://doi:10.3390/s20051459

Del Solar Serano, Patricia (2014). Sistemas de Gestión de la Calidad. Metodología para implementar proyectos de mejora continua para la reducción de los defectos de construcción en edificacion de viviendas. Tesis doctoral. Escuela técnica Superior de Edificación. Recuperado de: https://oa.upm.es/29365/1/PATRICIA_DEL_SOLAR_SERRANO.pdf

Escobedo Moreno, E., Mendoza De Los Santos, A., Oblitas Cruz, J. (2020). Assessing Development and Sustainability of a Research Management System: Deming's cycle in a Peruvian University. Direction of Research, Innovation and Social Responsibility. Recuperado de: 10.1109/EDUNINE48860.2020.9149511

Etienne, A., Dantan, J., Jawad Q., A & Siadat, A. (2008). Variation management by functional tolerance allocation and manufacturing process selection. Recuperado de: 10.1007/s12008-008-0055-3

Galgano, A. (1995). Los 7 instrumentos de la Calidad Total. Ediciones Díaz de Santos, Madrid.

Guerrero Aguiar, M. y Soler González, R. H. (2012). Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la empresa de diseño e ingeniería de Cienfuegos. Universidad de

Cienfuegos Carlos Rafael Rodriguez. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Cuba.

Hernández Alvares (2016). Estructuración de un programa de mejora continua para una institución de educación superior. Tesis para obtener el grado de maestría y gestión de Calidad. Universidad Iberoamericana Puebla. Facultad de ingeniería. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.11777/2121

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (2015). Metodología de la investigación. Quinta edición. Mc Graw Hill. México.

Huayamave Lainez, E. C. (2013). Modelo para la implementación de un sistema integrado de gestión en calidad, seguridad y salud ocupacional basado en las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001: 2007 en la división de pilotaje de una empresa constructora. Tesis de grado previo a la obtención del título de Magister en Sistemas integrados de Gestión de la Calidad. Universidad Politécnica Salesiana. Posgrados Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad. Ecuador. Recuperado de: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5361

Javanmardi, A., He, C., Hsiang, S. M., Abbasian Hosseini, A. y Liu, M. (2023). "Enhancing Construction Project Workflow Reliability through Observe–Plan–Do–Check–React Cycle: A Bridge Project Case Study". Buildings 2023, 13, 2379. Recuperado de: https://doi.org/10.3390/buildings13092379

Marín Fonseca, R. A., Quintero Montenegro, D. Y. y Medina Valencia, J. (2023). El rol de la gestión del conocimiento en la implementación de un Sistema Integrado de Gestión.

Revista Logos Ciencia & Tecnología ISSN 2145-549X, Vol. 4. No. 2, Enero – Junio, 2013, pp. 33-41.

Medina Merodio, J. A., De Pablos Heredero, C., Jiménez Rodríguez, M. L., De Marcos Ortega, L., Barchino Plata, R., Rodríguez García, D. y Gómez Aguado, D. (2013). *Analysis of customer satisfaction using surveys with open questions*. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de minas.

Martínez, R., Agüero, B., Penabad, A., Montero R. (2011). Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Ambiental en un centro biotecnológico. Vaccimonitor vol.20 no.2 Ciudad de la Habana. Mayo-ago. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-028X2011000200005

Mejía Coneo, O. (2015) "Importancia de la implementación de un sistema de gestión integral en las empresas colombianas". Universidad de San Buenaventura Cartagena. Facultad de ciencias administrativas y contables. Cartagena de Indias.

Men, J. (2014). "Application of safety management system in building construction based on BIM and PDCA". ISSN 2663-1563 Vol. 4, Issue 2: 16-21, DOI: 10.25236/AJAGE.2022.040204

Montesinos González, S., Vázquez Cid de León, C., Maya Espinoza, I., Gracida Gracida, E. (2020). Mejora Continua en una empresa en México: estudio desde el ciclo Deming. 1863. Universidad del Zulia (LUZ). Revista Venezolana de Gerencia (RVG). Año 25 No. 92, 2020, 1863-1883 ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423

OCDE-Organización de cooperación y desarrollo económicos (2005). Manual de Oslo. Tercera edición. Recuperado de: https://acceso.prochile.cl/servicios/manualdeoslo.pdf

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION (2015). “Sistema de Gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario” (ISO 9000)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION (2015). “Sistema de Gestión de la calidad – Requisitos” (ISO 9001)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION (2005). “Sistema de gestión de la calidad, directrices para los planes de la calidad.” (ISO 10005)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION (2015). “Sistema de Gestión ambiental” (ISO 14001)

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1985).A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Vol. 49, No. 4 (Autumn, 1985), pp. 41-50 (10 pages). Published By: Sage Publications, Inc. Recuperado de: https://www.jstor.org/stable/1251430

Pastor de Céspedes, E. B., Noriega Araníbar, M. T., Díaz Garay, B., Kleeberg Hidalgo, F. (2010). Mejora continua de los procesos: Herramientas y técnicas. Lima. Universidad de Lima.

Pavnaskar, S. J., Gershenson, J. K., y Jambekar, A. B. (2003). Classification scheme for lean manufacturing tools. International Journal of Production Research, 41(13), 3075–3090.

Torres Goyes, S. A., Rodríguez Borges, C. G. (2021). Método AMEF: estrategias para su empleo en el mantenimiento en plantas purificadoras de agua. Pol. Con (Edición núm59) Vol. 6, No. 6.

Wheelen, Thomas Y Hunger, J. David (2007). “Administración Estratégica y política de negocios. Conceptos y Casos”. Décima Edición. Pearson Educación, México, 2007.

ANEXOS

1. Auditorías e inspecciones

2. Registro de observaciones

3. Encuestas de satisfacción

4. Lecciones aprendidas

ANEXOS

1. AUDITORÍAS E INSPECCIONES

[redacted]	FORMATO **INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]		
RESPONSABLE EN OBRA:	[redacted]	**FECHA:**	19/04/2018

PUNTAJE PONDERADO	**79%**

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVATAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
RECURSOS HUMANOS					
1	Entrega del tareo semanal todos los lunes al medio dia (JA)	1	No al mediodía debido al input		
2	Presentación de las solicitudes de liquidación del personal obrero al área de Capital Humano de manera oportuna, esta entrega deberá hacerse efectiva solo los dias viernes, dicho(s) documento(s) deben contener las firmas de los responsables.	0			
3	Custodiar el cargo de presentación del tareo semanal con las firmas respectivas.	0			
4	La información del Tareo debe ser revisado y no contener errores	1			
5	Tener actualizado el file personal de los trabajadores (obreros).	0	Derecho habientes, documentos personales		
6	Enviar semanalmente la matriz de contratistas a la Jefatura de Administración con copia al Jefe y Superintendente de Obra (la información presentada debe encontrase actualizada en los diferentes *items* solicitados)	0			
7	Informar oportunamente las incidencias diarias por ausencia (enfermedad) a las areas correspondientes.	1			
8	Tener actualizada y empastadas las boletas de pago del personal obrero, las cuales deben contener la firma del trabajador.	1			
9	Llevar el registro de asistencia del personal (obrero) actualizado.	1			
10	Entregar oportunamente los DM originales del personal de obra: 1) Personal obrero: al area de Bienestar Social. 2) Personal Staff: a la Jefatura de Administración de Obras.	1			
11	Tener actualizadas las polizas de SCTR del personal staff y obrero	1			
12	Informar oportunamente todo cese del personal obrero y de limpieza	N.A.			
13	Cumplir con el cronograma de entrega de informe de personal para el RO	1	CAMBIAR FORMATO		
TESORERÍA					
14	Entregar el fondo fijo para las firmas respectivas todos los viernes por la tarde.	1			
15	El fondo fijo no debe contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
16	Cumplir con la entrega del fondo fijo a la OP todos los viernes	N.A.			
17	Todo arqueo de caja chica no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
18	Las compras a través de la caja chica deben efectuarse sólo a proveedores con los cuales no contamos con línea de crédito.	1			
19	Mantener una adecuada custodia del file del fondo fijo.	1			
CONTABILIDAD					
20	Entrega de las facturas semanales para las firmas respectivas todos los viernes por la tarde.	1			
21	Las facturas no deben contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			

[redacted]	FORMATO **INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

22	Entrega de las facturas a la OP todos los viernes.	1			
23	Mantener una adecuada custodia del file de las facturas presentadas semanalmente.	1			
24	Cumplir con el cronograma de recepción de las facturas (sólo los viernes)	N.A.			
25	No deben permanecer en obra facturas de meses anteriores.	1			
26	Todas las guias de remisión(original) deben contener el sello de recepción del área de Almacén.	1			
27	Las facturas de concreto que se presentan para pago deberán presentar el cuadro " Resumen de concreto"	N.A.			
28	Cumplir con el envio de la programacion de pagos semanal a la Jefatura de Administración (todos los viernes).	1			
ALMACENES					
29	Entrega de los informes de inventario los primeros 4 días hábiles del mes	1			
30	Llevar un adecuado control en la emisión de las Guías de Remisión	1			
31	Registro diario de los ingresos y salidas de almacén en el S10	1			
32	Actualización diaria de las Bincard	0			
33	Llevar un ambiente de Almacén limpio y ordenado	1			
34	Tener actualizado el kardex de EPP tanto en fisico como via electrónica.	N.A.			
35	El inventario mensual no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
LOGISTICA					
36	Cumplir con el cronograma de compras(pedidos los miércoles).	N.A.			
GUARDIANÍA					
37	Toda incidencia presentada por el servicio de vigilancia debe ser primero canalizada por el area de administración de obra.	1			
38	Reunión quincenal con la empresa de vigilancia.	1			
39	Requizas a los ambientes de los subcontratistas.	0			
40	Requizas al personal obrero.	0			
	PROMEDIO PONDERADO	**79%**			

V.B. Inspector

V.B. Inspeccionado

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-[illegible]:	

PUNTAJE PONDERADO:	[redacted]

Ítem	Aspecto a Verificar	Calificación		Observaciones	Acciones Correctivas	Fecha de Cumplimiento
Requisitos de Gestión		**20%**				
1	Verificación del registro del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%)	1	1			
2	Cumplimiento del envío de [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del envío en fecha establecida	0	0			
3	Cumplimiento del envío de [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del envío en fecha establecida por OT	1	1			
4	Verificación del cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%)	0	0			
Registro de Asistencia		**20%**				
5	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de los protocolos aprobados.	0	0			
6	Verificación del correcto uso de los [redacted] **Criterio: Verificar que todo trabajador se encuentre correctamente identificado y firmado.	1	1			
Registro de Medición Diario		**20%**				
7	Verificación del cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%)	1	1			
8	Verificación del correcto uso del [redacted] **Criterio: Verificar que todo ingreso se encuentre correctamente firmado, fechado y con el código de ítem de pago especificado.	1	1			
Control de Materiales y Equipos		**20%**				
9	Verificación de la aplicación del formato [redacted] DE EQUIPOS **Criterio: Verificar la vigencia de certificados de calibración de equipos de medición propios y de sub-contratos.	1	1			
10	Verificación del cumplimiento de los ensay[redacted] **Criterio: Verificar la documentación de los ensayes del material de relleno (Densidad de Cono)	1	1			
11	Verificación del cumplimiento de curado de probetas y ensaye para ensaye **Verificar para el curado (Registro y pie), curado de probetas (cubiertas) y ensaye para ensayes (7 y 28 días).	1	1			
12	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de resultados de ensaye de equipos del proyecto	1	1			
Registro General de Calidad		**20%**				
13	Verificación del cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%)	1	1			
14	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del plan programado semanal	1	1			
15	Verificación del correcto uso del [redacted] **Criterio: Verificar que el formato se encuentre correctamente llenado y firmado	1	1			

[redacted]

[redacted]	FORMATO INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

Observaciones y No Conformidades		**[illegible]**				
18	Cumplimiento de INDICADORES DE NO CONFORMIDADES **Objetivo: Verificar el cumplimiento de la meta ≤ [illegible]%	N.A.	N.A.			
19	Verificación de la publicación del formato [redacted] **Objetivo: Verificar la actualización del registro de las No Conformidades, así como el cumplimiento a los compromisos y plazos de cada una.	N.A.	N.A.			
20	Verificación del [redacted] **Objetivo: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≤ [illegible])	0	0			
21	Verificación de la publicación del formato [redacted] OBSERVACIONES **Objetivo: Verificar la actualización del registro de las Observaciones.	1	1			
22	Verificación de planes vigentes en campo **Objetivo: Realizar que los planes en campo sean los vigentes y revisar el sello y fecha del acta de CO	1	1			
Cumplimiento de [illegible]		**[illegible]**				
23	Verificación del [redacted] **Objetivo: Verificar el cumplimiento del cronograma establecido en el formato [redacted], según aplicación de Grupo [redacted].	1	1			
24	Verificación del [redacted] **Objetivo: Verificar cumplimiento del cronograma anual de capacitación	0	0			
25	Verificación del [redacted] **Objetivo: Verificar cumplimiento de la planeación semanal.	0	0			
[illegible] de Calidad		**[illegible]**				
26	Verificación del [redacted] **Objetivo: Verificar la cuantificación de costos generados de la mes	0	0			
Calidad de [illegible]		**[illegible]**				
27	Verificación del [redacted] **Objetivo: Verificar el cumplimiento de la entrega del informe [illegible] con la información física y digital de todo el documento de soporte). Se deben tomarse acciones al cumplimiento del reporte de [illegible] de la documentación.	0	0			
28	Verificación del [redacted] **Objetivo: Verificar existencia fotográfica de las medidas de [illegible] de señales, capacitaciones, avances y pruebas del estado de la identificación e [illegible] de [illegible]	1	1			

Nota: 1. Cumple / 0: No Cumple / N.A. No Aplica

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE PRODUCCIÓN EN OBRA

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

OBRA:	[redacted]
RESPONSABLE DE PROD.:	FECHA: 27/04/18

PUNTAJE PONDERADO	64%

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVATAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
1	Se elabora el Look Ahead de Edificaciones y Obras exteriores, se actualiza semanalmente.	1			
2	Se elabora el Análisis de Restricciones semanal, considerando los tipos de restricciones (Proyecto, materiales, mano de obra, equipos, subcontratas y herramientas)	1			
3	El Programa Semanal ha sido elaborado en base al Look Ahead y ha pasado por un proceso de levantamiento de restricciones.	1			
4	El PPC semanal se aproxima al 100%.	0	Aprox 85%.		
5	Las causas de incumplimiento de lo programado son registrados en el formato de Análisis de Causas Incumplidas.	1			
6	El capataz hace uso de la programación diaria para la ejecución de las actividades.	1			
7	Se elabora el movimiento de personal diario. Se lleva el registro de los días anteriores.	1			
8	Se realiza el tareo diario. Se lleva a cabo a partir de las actividades del Look Ahead.	1			
9	Se realiza el pedido de material cumpliendo con las fechas límites	1			
10	Junto con la subcontrata, se realiza la conciliación de metrados. El acuerdo se encuentra firmado por el Jefe de Producción, Superintendente y Subcontrata.	1			
11	Se lleva el registro con los vales de salida de equipos y materiales en el almacén.	1			
12	El ISP se encuentra actualizado diariamente	0	Nop encuentra metrados		
13	Se elabora el ISP de forma semanal.	0	No se encuentra metrados		
14	El ISM se encuentra actualizado diariamente	0			
15	Se elabora el ISM de forma semanal.	0			
16	La curva de rendimiento se encuentra actualizada. Se identifica los altos y bajos rendimientos y se analizan las causas.	0	Metrados real elaborados. Curvas No Revisadas		
17	Se lleva a cabo de forma mensual la calificación a subcontratas.	1			
18	Se lleva el acta de las reuniones semanales	1			
19	Las actividades de producción se encuentran respaldas por los PETS respectivos.	0			
20	El Master Plan se encuentra actualizado (formato en MS Project)	0			
21	Se lleva un adecuado control en el pedido de recursos	1			
22	Se revisa, valida y firma valorizaciones al SC	1			
	PROMEDIO PONDERADO	64%			

[redacted] [redacted] [redacted]

Scanned by CamScanner

	FORMATO **INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:

PROYECTO:			
RESPONSABLE EN OBRA:		**FECHA:**	26/07/2018

PUNTAJE PONDERADO	**86%**

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CAPITAL HUMANO					
1	Entrega del tareo semanal todos los lunes al mediodía (JA)	1			
2	Presentación de las solicitudes de liquidación del personal obrero al área de Capital Humano de manera oportuna, dicho(s) documento(s) deben contener las firmas de los responsables.	1			
3	Custodiar el cargo de presentación del tareo semanal con las firmas respectivas.	1			
4	La información del Tareo debe ser revisado y no contener errores	1			
5	Tener actualizado el file personal de los trabajadores (obreros).	0			
6	Enviar semanalmente la matriz de contratistas a la Jefatura de Administración con copia al Jefe y Superintendente de Obra (la información presentada debe encontrase actualizada en los diferentes *items* solicitados)	0			
7	Informar oportunamente las incidencias diarias por ausencia (enfermedad) a las areas correspondientes.	1			
8	Tener actualizada y empastadas las boletas de pago del personal obrero, las cuales deben contener la firma del trabajador.	0			
9	Llevar el registro de asistencia del personal (obrero) actualizado.	0			
10	Entregar oportunamente los DM originales del personal de obra: 1) Personal obrero: al area de Bienestar Social. 2) Personal Staff: a la Jefatura de Administración de Obras.	1	regulizar	27-Jul	
11	Tener actualizadas las polizas de SCTR del personal staff y obrero	1			
12	Informar oportunamente todo cese del personal obrero y de limpieza	1			
13	Cumplir con el cronograma de entrega de informe de personal para el RO	0			
TESORERÍA					
14	Entregar el fondo fijo para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
15	El fondo fijo no debe contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
16	Todo arqueo de caja chica no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
17	Las compras a través de la caja chica deben efectuarse sólo a proveedores con los cuales no contamos con línea de crédito.	1			
18	Mantener una adecuada custodia del file del fondo fijo.	1			
19	Mantener actualizados el cuadro de garantías (Cartas Fianza, Letras de cambio)	1			
CONTABILIDAD					
20	Entrega de las facturas semanales para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
21	Las facturas no deben contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			

	FORMATO **INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:

22	Mantener una adecuada custodia del file de las facturas presentadas semanalmente.	1			
23	No deben permanecer en obra facturas de meses anteriores.	1			
24	Todas las guías de remisión(original) deben contener el sello de recepción del área de	1			
25	Las facturas de concreto que se presentan para pago deberán presentar el cuadro "	N.A.			
26	Presentación de entregables del mes (Kardex, ingreso y egresos)	1			
27	Presentación y custodia de las guías de remisión de Besco	1			
28	Envío de facturas (migración S10) los días miércoles	1			
ALMACENES					
29	Entrega de los informes de inventario los primeros 2 días hábiles del mes	1			
30	Llevar un adecuado control en la emisión de las Guías de Remisión	1			
31	Registro diario de los ingresos y salidas de almacén en el S10	1			
32	Actualización diaria de las Bincard	1			
33	Llevar un ambiente de Almacén limpio y ordenado	1			
34	Tener actualizado el kardex de EPP tanto en fisico como vía electrónica.	N.A.			
35	El inventario mensual no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
LOGÍSTICA					
36	Cumplir con el cronograma de compras(pedidos los miércoles).	N.A.			
GUARDIANÍA					
37	Toda incidencia presentada por el servicio de vigilancia debe ser primero canalizada por el area de administración de obra.	1			
38	Reunión quincenal con la empresa de vigilancia.	1			
39	Requizas a los ambientes de los subcontratistas.	1			
40	Requizas al personal obrero.	1			
	PROMEDIO PONDERADO	**86%**			

V.B. Inspector

V.B. Inspeccionado

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE BIENESTAR SOCIAL EN OBRA

[redacted]

[redacted]	25%
[redacted]	80%

[redacted] | [redacted] | 27/07/2018

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

#							
1	Gestión de información operativa y plataforma de llenado de informes del personal empleado y obrero	0	30%	-			
a)	*Se mantiene la socialización de la política del Área de Bienestar Social al ingreso del personal de la obra*			1			
b)	*Actualización del publicado mural (volantes, cronograma de actividades del mes, reconocimiento de la semana, alguna información, etc.)*			0	No se visualiza ninguna	04/08/2018	
2	Evaluación y control de las buenas calidad y condiciones de los alimentos para el personal obrero	0	30%	-			
a)	*Ubicación de papelería de fichas y controles de documentos existentes (Anexo 1 y anexo)*			1			
b)	*Inspecciones físicas mensual o llegar de preparación de alimentos, presentación de informes con los resultados (1 al mes)*			1			
c)	*Asistencias del encargado de la preparación de alimentos, capacitación del tema con las evidencias (1 por semana)*			0	Solo se anexo 1	04/08/2018	
d)	*Aplicación de la capacitación de los conceptos y controles generados con las deficiencias de la obra. (1 al mes)*			0	No se evidencia ninguna	04/08/2018	
3	Evaluación y control de las buenas condiciones y mantenimiento de los Servicios de Bienestar Social	0	0%				
a)	*Evaluación y APROBACIÓN del servicio de Bienestar Social de obra (Container, SSPA, sanitarios). (2 al mes)*			0	Se evidencio solo 1	04/08/2018	
b)	*Presentación de 02 informes claves del resultado de las evaluaciones de los Servicios de Bienestar Social de obra (Container, SSPA, sanitarios)*			N.A.			
4	Cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma de Actividades, aprobados en el Plan de Bienestar Social	2	100%				
a)	*Ejecución de las capacitaciones y talleres programados en el plan de bienestar social (control de temas de salud, evidencia de control a personal capacitado)*			1			
b)	*Registro de asistencia del personal obrero a las actividades y talleres programados (evidencia mínimo 75% del personal de obra)*			1			
5	Gestión del reconocimiento, apoyo y acompañamiento del personal obrero	1	100%	-			
a)	*Formatos y registro de evaluación y resultados de los personal de los controles propios y de los subcontratistas del Área de Calidad*			1			
b)	*Formatos y registro de evaluación y resultados de los personal de los controles propios del Área de Prevención*			1			
c)	*Solicitud con anticipación al Administrador de la obra, el permiso para la adquisición de los complementos a otorgarse*			1			
d)	*Registro de entrega del diploma y encuentro compartir con ganadores de las categorías propias y subcontratistas de Calidad*			1			
e)	*Registro de entrega de la cartilla de Inducción y Curso de capacitación de ingreso al proyecto de Prevención*			1			
f)	*Archivo en el Control de Personal (carpeta) donde reposa los soportes de los trabajadores vigentes, la cual debe ir de la que permanece, la entrega de los beneficios otorgados y los fechas de inicio y fin de cada uno*			1			
g)	*Amonestación del consolidado al empleado que no asista*			1			
6	Registro de las novedades en caso de emergencia / seguimiento de prevención y evidencias	N.A.	N.A.	-			
a)	*Amonestación en el consolidado mostrar al personal inconveniencias*			N.A.			
b)	*Registro permiso del trabajo de Acompañamiento medico en caso de accidentes*			N.A.			
c)	*Registro y envío del formato de capacitación del caso explicado*			N.A.			
7	Presentación del Resultado Operativo de Bienestar Social de la obra	1	100%	N.A.			
a)	*Anotación semanal al personal obrero para la participación de los ejes Fortalecimiento Obrero y Cultura de Vida (control)*						
b)	*Entrega y presentación del Semáforo Operativo de Bienestar Social de la obra, con fecha máxima del 2do día hábil del mes siguiente. Con copia a Gerencia de Capital Humano.*			1			
8	Emisión de los periodos de Vacaciones y demás prestaciones económicas y registros del personal obrero. (Excel N°1)	1	100%	-			
a)	*Registro y control de las vacaciones emitidas y las aceptadas a partir de 2 días, siguiendo el procedimiento establecido*			1			
b)	*Registro de las solicitudes del periodo y entrega del formato 8512 firmado y sellado (cargo de entrega)*			1			
c)	*Emisión, entrega y registro de los formatos por terceros, al personal obrero (cargo de entrega)*			N.A.			
d)	*Afiliar y registro a los diferentes beneficios del personal obrero (cargo de entrega)*			1			
e)	*Gestión de liquidación de los diferentes beneficios del personal obrero (Excel) (cargo de entrega)*			N.A.			
9	Gestión de atención de reclamos de Mandos calificados	N.A.	N.A.	-			
a)	*Presentación y registro en el Control de clasificación de reparaciones, el reclamo recibido*			N.A.			
b)	*Separación, análisis, gestión de los reclamos de acuerdo a los diferentes calificativos (Actos de responsabilidad por colaborador o Aprendizaje)*			N.A.			
c)	*Emisión de las Actas de compromisos por los reclamos realizados*			N.A.			
10	Registro y control del personal de la obra. Soporte a actividades dirigidas al personal	1	100%	-			
a)	*Administración de base de datos del personal obrero*			1			
b)	*Administración de base de datos del Asistente empleado (Hoja, Horario y personal de Disciplina,*			1			

c)	*Apoyo operativo y administrativo a los residentes encargados de servicio profesional (proceso, cumplimiento, entregables, y otros)*		1			
d)	*Perfil operativo de administrativo de soft-skills ACC y Staff para el Software y Bitácora (administrativo de apoyo en campo)*		1			
b1	**Información para validación con Oficina Central (Capital Humano)**	**1 100%**	-			
a)	*Coordinación con otras áreas, con apoyo a ACH*		1			
b)	*Calendarización apertura de talleres informativos en sitio a ACH*		1			
c)	*Envío apoyo de información requerida por la ACH y/o área Capital Humano*		1			
b2	**Gestión y seguimiento de altas del personal staff de obra**	**N.A. N.A.**	-			
a)	*Convocatoria apertura y proceso de reclutamiento para el llenado del requerido por subcontratista (contratistas, subcontratistas, comercializadoras y/o proveedores)*		N.A			
b)	*Seguimiento y solicitud de documentos para el trámite*		N.A.			
c)	*Presentación apertura del proceso a RRHH y Empleo (apoyo del área de Escuela)*		N.A.			
d)	*Seguimiento y cobro del tiempo para resultados del solicitado. Envío a cómo para el apoyo*		N.A.			

RESPONSABLE ÁREA: _____

JEFE DE ÁREA: _____

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE OFC.:	

PUNTAJE PONDERADO:	97.28%

Ítem	Puntos de Seguimiento	Calificación		Observaciones	Fecha de Levantamiento	Comentarios y Acciones Correctivas
Parámetros de Gestión		25%				
1	Verificacion del promedio del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).	1	1	97.28%		
2	Cumplimiento del envío del [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del envío en las dos fechas	1	1			
3	Cumplimiento del envío del [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del envío en fecha acordada por Of.	1	1			
4	Verificación del cumplimiento del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).	0	0	90.39%	31/09/19	
Uso de Protocolos		10%				
5	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de los protocolos ejecutados	1	1			
6	Verificación del correcto uso de los [redacted] **Criterio: Verificar que todo protocolo se encuentre correctamente llenado y firmado	1	1			
Registro de Muestras de Control		10%				
7	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de revisión de protocolos críticos ejecutados	1	1			
8	Verificación del correcto uso del [redacted] **Criterio: Verificar que los formularios se encuentren correctamente llenado, firmado y con la copia de la guía de remisión adjuntada en cada uno	1	1			
Control de Calidad de Equipos		10%				
9	Verificación en la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la vigencia de certificados de calibración de equipos, moldes y de laboratorio	1	1			
10	Verificación del cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar la documentación de los ensayos del material de cantera que ingresa a obra.	1	1			
11	Verificación del cumplimiento del curado de probetas y su envío para ensayo **Verificar para el curado (laguna y pk) curado de probetas [redacted]	N.A.	N.A.			
12	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de resultados de ensayos de control de calidad	1	1			
Seguridad y Salud en el Trabajo		10%				
13	Verificación del cumplimiento de [redacted] **Criterio : Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).	1	1			
14	Verificación de [redacted] **Criterio : Verificar cumplimiento del tema según programación mensual.	1	1			
15	Verificación del correcto uso del [redacted] **Criterio: Verificar que el formato se encuentre correctamente llenado y firmado	1	1			

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD

CÓDIGO [redacted]
VERSIÓN
FECHA

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUBJEFE DE GTC:	

PUNTAJE PONDERADO	97.78%

Ítem	Criterios de Evaluación	Peso	Nota	Observaciones	Fecha de Levantamiento	Compromiso y Acción
Observaciones y No Conformidades		**60%**	-			
16	Cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%)	0	0	66.67% (Pendiente levantamiento de 1 NC)	31/07/18	
17	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de las No Conformidades, así como el seguimiento a los compromisos y planes de acción propuestos.	1	1			
18	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%)	0	0	91.30%	31/08/18	
19	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de las Observaciones.	1	1			
20	Verificación de planos vigentes en campo **Criterio: Revisar que los planos en campo sean los vigentes y tengan el sello y firma del Jefe de OT.	1	1			
Cumplimiento de Responsabilidades		**100%**	-			
21	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento del área responsable en el formato [redacted] según notificación de la guía [redacted]	1	1			
22	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del área responsable de capacitación	1	1			
23	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento de la dotación semanal	1	1			
Copias de Calidad		**100%**				
24	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar la actualización de costos generados en el mes.	1	1			
Dossier de Calidad		**100%**	-			
25	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento y la actualización del avance (debera contarse con la información física y digital de toda la documentación requerida). Se deberá supervisar además el cumplimiento del esquema de ubicación de la documentación.	1	1			
26	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar evidencia fotográfica de ejecución de frentes de trabajo, capacitaciones, ensayos y pruebas así como de la identificación y levantamiento de NC	1	1			

Aplica: 1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

[redacted]

[redacted]

	FORMATO **INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:

PROYECTO:			
RESPONSABLE EN OBRA:		**FECHA:**	5/12/2018

PUNTAJE PONDERADO	**83%**

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVATAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CAPITAL HUMANO					
1	Entrega del tareo semanal todos los lunes al mediodía (JA)	1			
2	Presentación de las solicitudes de liquidación del personal obrero al área de Capital Humano de manera oportuna, dicho(s) documento(s) deben contener las firmas de los responsables.	1			
3	Custodiar el cargo de presentación del tareo semanal con las firmas respectivas.	1			
4	La información del Tareo debe ser revisado y no contener errores	1			
5	Tener actualizado el file personal de los trabajadores (obreros).	1			
6	Enviar semanalmente la matriz de contratistas a la Jefatura de Administración con copia al Jefe y Superintendente de Obra (la información presentada debe encontrase actualizada en los diferentes *items* solicitados)	0			
7	Informar oportunamente las incidencias diarias por ausencia (enfermedad) a las areas correspondientes.	1			
8	Tener actualizada y empastadas las boletas de pago del personal obrero, las cuales deben contener la firma del trabajador.	0			
9	Llevar el registro de asistencia del personal (obrero) actualizado.	1			
10	Entregar oportunamente los DM originales del personal de obra: 1) Personal obrero: al area de Bienestar Social. 2) Personal Staff: a la Jefatura de Administración de Obras.	1			
11	Tener actualizadas las polizas de SCTR del personal staff y obrero	0			
12	Informar oportunamente todo cese del personal obrero y de limpieza	1			
13	Cumplir con el cronograma de entrega de informe de personal para el RO	1			
TESORERÍA					
14	Entregar el fondo fijo para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
15	El fondo fijo no debe contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	0			
16	Todo arqueo de caja chica no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
17	Las compras a través de la caja chica deben efectuarse sólo a proveedores con los cuales no contamos con línea de crédito.	1			
18	Mantener una adecuada custodia del file del fondo fijo.	1			
19	Mantener actualizados el cuadro de garantías (Cartas Fianza, Letras de cambio)	1			
CONTABILIDAD					
20	Entrega de las facturas semanales para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
21	Las facturas no deben contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	0			

[redacted]	FORMATO **INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

22	Mantener una adecuada custodia del file de las facturas presentadas semanalmente.	1			
23	No deben permanecer en obra facturas de meses anteriores.	1			
24	Todas las guías de remisión(original) deben contener el sello de recepción del área de	1			
25	Las facturas de concreto que se presentan para pago deberán presentar el cuadro "	1			
26	Presentación de entregables del mes (Kardex, ingreso y egresos)	1			
27	Presentación y custodia de las guías de remisión de [redacted]	1			
28	Envío de facturas (migración S10) los días miércoles	N.A.			
ALMACENES					
29	Entrega de los informes de inventario los primeros 2 días hábiles del mes	1			
30	Llevar un adecuado control en la emisión de las Guías de Remisión	1			
31	Registro diario de los ingresos y salidas de almacén en el S10	1			
32	Actualización diaria de las Bincard	1			
33	Llevar un ambiente de Almacén limpio y ordenado	1			
34	Tener actualizado el kardex de EPP tanto en fisico como vía electrónica.	1			
35	El inventario mensual no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
36	Los materiales se colocan según recomendaciones del proveedor (caja)	1			
37	Los productos químicos cuentan con las Hojas MSDS	1			
LOGÍSTICA					
38	Cumplir con el cronograma de compras(pedidos los miércoles).	N.A.			
GUARDIANÍA					
39	Toda incidencia presentada por el servicio de vigilancia debe ser primero canalizada por el area de administración de obra.	1			
40	Reunión quincenal con la empresa de vigilancia.	1			
41	Requizas a los ambientes de los subcontratistas.	0			
42	Requizas al personal obrero.	0			
	PROMEDIO PONDERADO	**83%**			

V.B. Inspector

V.B. Inspeccionado

[redacted]

FORMATO
INSPECCIÓN MENSUAL DE BIENESTAR SOCIAL EN OBRA

[redacted]

[illegible]	[redacted]	FECHA	[illegible]
[illegible]		[illegible]	90%
[illegible]			
[illegible]			

[illegible]

[illegible]	Criterio	Resultado	Observaciones	Fecha de cumplimiento	Compromiso y acción preventiva
[redacted]	[illegible] BS	1			
	[illegible] Plan BS	1			
	[illegible]	1			
	[illegible]	1			
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	1			
	[illegible]	1			
	[illegible]	N.A.	[illegible] en obra		
	[illegible]	1	[illegible]		
	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	1			
	[illegible]	1			
	[illegible]	1			
	[illegible]	1			
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	1			
	[illegible]	N.A.			
	Informe R.D.	N.A.	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	1			
	[illegible]	N.A.	[illegible]		
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	N.A.		[illegible]	
	Plan BS	1			
	[illegible]	1			
	[illegible]	1			
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	1			
	[illegible]	1			
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	N.A.	[illegible]		
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	N.A.			
	[illegible]	N.A.			

[redacted]

[redacted]

Scanned by CamScanner

[redacted]	FORMATO **INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	

PUNTAJE PONDERADO	**67.59%**

Item	Puntos de Evaluación	Calificación E	Calificación -	Observaciones	Fecha de Levantamiento	Compromiso y Acción Preventiva
Resultados de Gestión		**25%**	-			
1	Verificación del promedio del [redacted] ***Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).*	0	0	85.20%		
2	Cumplimiento del envío d[redacted] ***Criterio: Verificar cumplimiento del envío los días lunes.*	0	0			
3	Cumplimiento del envío[redacted] ***Criterio: Verificar cumplimiento del envío en fecha acordada por OT.*	0	0			
4	Verificación del cumplimiento de[redacted] ***Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).*	1	1	96.80%		
Uso de Protocolos		**50%**				
5	Verificación de la aplicación del formato [redacted] ***Criterio: Verificar la actualización del registro de los protocolos ejecutados.*	0	0		**3/01/2019**	**Actualizar información en formato.**
6	Verificación del correcto uso de lo[redacted] ***Criterio: Verificar que todo protocolo se encuentre correctamente llenado y firmado.*	1	1			
Revisión de Materiales Críticos		**100%**				
7	Verificación de la aplicación del formato [redacted] ***Criterio: Verificar la actualización del registro de revisión de materiales críticos ejecutados.*	1	1			
8	Verificación del correcto uso del [redacted] ***Criterio: Verificar que todo informe se encuentren correctamente llenado, firmado y con la copia de la guía de remisión debidamente sellada.*	1	1			
Equipos de Medición y Ensayos		**100%**				
9	Verificación de la aplicación del formato [redacted] ***Criterio: Verificar la vigencia de certificados de calibración de equipos de medición propios y de sub-contratos.*	1	1			
10	Verificación del cumplimiento de los ensayos requerid[redacted] ***Criterio: Verificar la documentación de los ensayos del material de cantera que ingresa a obra.*	1	1			
11	Verificación del cumplimiento del curado de probetas y su envío para ensayo ***Verificar poza de curado (limpieza y ph), curado de probetas (codificación) y envío para ensayos (7 y 28 días).*	1	1			
12	Verificación de la aplicación del formato [redacted] ***Criterio: Verificar la actualización del registro de resultados de ensayos de resistencia del concreto.*	1	1			
Capacitaciones de Calidad		**100%**				
13	Verificación del cumplimiento de[redacted] ***Criterio : Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).*	1	1			
14	Verificación del [redacted] ***Criterio : Verificar cumplimiento del tema según programación mensual.*	1	1			
15	Verificación del correcto uso del [redacted] ***Criterio: Verificar que el formato se encuentre correctamente llenado y firmado.*	1	1			

[redacted]	FORMATO INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

Observaciones y No Conformidades		**67%**				
16	Cumplimiento de INDICADOR DE NO CONFORMIDADES ***Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).*	N.A.	N.A.	No registra no conformidades		
17	Verificación de la aplicación del formato [redacted] ***Criterio: Verificar la actualización del registro de las No Conformidades, así como el seguimiento a los compromisos y planes de acción propuestos.*	N.A.	N.A.	No registra no conformidades		
18	Verificación del [redacted] ***Criterio : Verificar el cumplimiento de la meta establecida (> 95%).*	0	0	55.61%		
19	Verificación de la aplicación del formato [redacted] ***Criterio: Verificar la actualización del registro de las Observaciones.*	1	1			
20	Verificación de planos vigentes en campo ***Criterio: Revisar que los planos en campo sean los vigentes y tengan el sello y firma del Jefe de OT.*	1	1			
Cumplimiento de Responsabilidades		**67%**				
21	Verificación del [redacted] ***Criterio: Verificar el cumplimiento del área responsable en el formato [redacted], según aplicación de la guía*	1	1			
22	Verificación del [redacted] ***Criterio: Verificar cumplimiento del área responsable de capacitación.*	1	1			
23	Verificación del [redacted] ***Criterio: Verificar cumplimiento de la dotación semanal.*	0	0	80.80%		
Costos de Calidad		**0%**				
24	Verificación del [redacted] ***Criterio: Verificar la actualización de costos generados en el mes.*	0	0		**3/01/2019**	**Actualizar información en formato.**
Dossier de Calidad		**100%**				
25	Verificación del [redacted] ***Criterio: Verificar el cumplimiento y la actualización del avance (deberá contarse con la información física y digital de toda la documentación requerida). Se deberá visualizar además el cumplimiento del esquema de ubicación de la documentación.*	1	1			
26	Verificación del [redacted] ***Criterio: Verificar evidencia fotográfica de liberación de frentes de trabajo, capacitaciones, ensayos y pruebas así como de la identificación y levantamiento de NC.*	1	1			

Nota: *1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica*

[redacted]	FORMATO INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
RESIDENTE DE OBRA:	

PUNTAJE PONDERADO	91.47%

Ítem	Punto de Evaluación	Calificación		Observaciones	Fecha de Levantamiento	Compromiso y Acción Preventiva
Recepción de Planos		25%	-			
1	[redacted] CALIDAD **Criterio: Verificar el cumplimiento de acuerdo establecido (≥ 95%)	0	0	90.68%		
2	Cumplimiento del envío [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del envío (1) mes antes.	0	0	Inicio suspendido por el envío del plano actualizado por el cliente	1/04/2019	Compromiso de cumplimiento del procedimiento
3	Cumplimiento del envío [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del envío de fecha acordada por OT.	0	0	Inicio suspendido por el envío del plano actualizado por el cliente	1/04/2019	Compromiso de cumplimiento del procedimiento
4	Verificación del cumplimiento [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la guía establecida (≥ 95%)	1	1	95.39%		
Uso de Protocolos		100%	-			
5	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de los protocolos aplicados	1	1	Permanente actualización de últimos registros	24/04/2019	Actualización de registros de protocolos
6	Verificación del correcto uso de los [redacted] **Criterio: Verificar que cada protocolo se encuentre completamente llenado y firmado	1	1	Correcto llenado de protocolos		[redacted]
Registro de Materiales Críticos		100%	-			
7	[redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de recepción de materiales críticos (concreto)	1	1			
8	[redacted] **Criterio: Verificar que todos los [redacted] se encuentren correctamente llenados (firmados) con el registro de la guía de aplicación debidamente señalada	1	1			
Equipos de Medición y Ensayos		100%	-			
9	Verificación de la ejecución del [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento de verificación de calibración de equipos de medición propios y de subcontratos	1	1	Falta concluir correos de mandamientos	5/04/2019	Compra de mandamientos para pruebas de calidad
10	Verificación del cumplimiento de los [redacted] **Criterio: Verificar el correcto llenado de los registros del manual de control con lugares claros.	1	1			
11	Verificación del cumplimiento del curado de probetas y su [redacted] **Verificar aplicación (temperatura y pH) curado de probetas (tradicional) y otros para ensayos (7 y 28 días)	1	1			
12	[redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de [redacted] de equipos de ensayos del concreto	1	1			
Capacitaciones de Calidad		100%	-			
13	Verificación del cumplimiento [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%.	1	1			
14	Verificación del CUMPLI[redacted]ION **Criterio: Verificar cumplimiento del inicio según programación mensual.	1	1			
15	Verificación del correcto uso del [redacted] **Criterio: Verificar que el [redacted] se encuentre correctamente llenado y firmado	1	1			

[redacted]

[redacted]

GESTOR

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD

CÓDIGO [redacted]
VERSIÓN
FECHA

Observaciones y No Conformidades		**100%**	-				
14	Cumplimiento de INDICADOR DE NO CONFORMIDADES **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (< 25%)	1	1	Falta verificar plan de ANS (prueba de registro)		Se realizará la inspección de hoy	
17	Verificación de la aplicación de [redacted] **Criterio: Verificar la elaboración del registro de las no conformidades, de cómo el seguimiento a los compromisos y plazos de cada (indicador).	1	1				
18	Verificación del CUMPLIMIENTO DEL EVALUADOR DE OBSERVACIONES GLOBALES **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (< 25%)	1	1	17.3%			
19	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de las observaciones	1	1	hacer cotizar con OBS.			
20	Verificación de planes especiales de campo **Criterio: Revisar que los planes estén acordes a los registros y trabajo diario y forma del Jefe de OT	1	1				
Cumplimiento de Responsabilidades		**100%**	-				
21	Verificación del CUMPLIMIENTO DEL RE [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento del documento descargable en el formato [redacted] de la guía	1	1				
22	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento de procedimiento de contratistas	1	1				
24	[redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento de la distancia de [redacted]	1	1				
Costos de Calidad		**100%**					
26	[redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de costos generados en el mes.	1	1	Falta incluir gasto de OT de gas etapa Regla de fechas: S/56,962.50	1/04/2019	Actualización de plan de calidad	
Gestión de Calidad		**100%**	-				
25	[redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento y la actualización de la matriz de calidad, contrastando con la información física y digital de toda la documentación requerida. Se deberá verificar además el cumplimiento del acceso de almacenar la documentación	N.A.	N.A.	Se cuenta con los formatos ordenados en Lima		Se realizará en la ejecución de la obra	
28	[redacted] **Criterio: Verificar evidencia fotográfica de ejecución en [redacted] (obras, capacitaciones, charlas y pruebas) en cumplimiento del procedimiento de IMC	1	1				

Anexo: 1 Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

[redacted]

[redacted]

[redacted]	FORMATO **INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA**	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

PROYECTO:	[redacted]		
RESPONSABLE EN OBRA:	[redacted]	**FECHA:**	17/04/2019

PUNTAJE PONDERADO	**95%**

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CAPITAL HUMANO					
1	Entrega del tareo semanal todos los lunes al mediodÍa (JA)	1			
2	Presentación de las solicitudes de liquidación del personal obrero al área de Capital Humano de manera oportuna, dicho(s) documento(s) deben contener las firmas de los responsables.	1			
3	Custodiar el cargo de presentación del tareo semanal con las firmas respectivas.	1			
4	La información del Tareo debe ser revisado y no contener errores	1			
5	Tener actualizado el file personal de los trabajadores (obreros).	0			
6	Enviar semanalmente la matriz de contratistas a la Jefatura de Administración con copia al Jefe y Superintendente de Obra (la información presentada debe encontrase actualizada en los diferentes *items* solicitados)	1			
7	Informar oportunamente las incidencias diarias por ausencia (enfermedad) a las areas correspondientes.	1			
8	Tener actualizada y empastadas las boletas de pago del personal obrero, las cuales deben contener la firma del trabajador.	1			
9	Llevar el registro de asistencia del personal (obrero) actualizado.	1			
10	Entregar oportunamente los DM originales del personal de obra: 1) Personal obrero: al area de Bienestar Social. 2) Personal Staff: a la Jefatura de Administración de Obras.	1			
11	Tener actualizadas las polizas de SCTR del personal staff y obrero	1			
12	Informar oportunamente todo cese del personal obrero y de limpieza	1			
13	Cumplir con el cronograma de entrega de informe de personal para el RO	1			
TESORERÍA					
14	Entregar el fondo fijo para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
15	El fondo fijo no debe contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
16	Todo arqueo de caja chica no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
17	Las compras a través de la caja chica deben efectuarse sólo a proveedores con los cuales no contamos con línea de crédito.	N.A.			
18	Mantener una adecuada custodia del file del fondo fijo.	1			
19	Mantener actualizados el cuadro de garantías (Cartas Fianza, Letras de cambio)	1			
CONTABILIDAD					
20	Entrega de las facturas semanales para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
21	Las facturas no deben contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
22	Mantener una adecuada custodia del file de las facturas presentadas semanalmente.	1			

[redacted]	FORMATO **INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA**	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

23	No deben permanecer en obra facturas de meses anteriores.	1			
24	Todas las guías de remisión(original) deben contener el sello de recepción del área de	1			
25	Las facturas de concreto que se presentan para pago deberán presentar el cuadro "	1			
26	Presentación de entregables del mes (Kardex, ingreso y egresos)	1			
27	Presentación y custodia de las guías de remisión de Besco	1			
28	Envío de facturas (migración S10) los días miércoles	1			
ALMACENES					
29	Entrega de los informes de inventario los primeros 2 días hábiles del mes	1			
30	Llevar un adecuado control en la emisión de las Guías de Remisión	1			
31	Registro diario de los ingresos y salidas de almacén en el S10	1			
32	Actualización diaria de las Bincard	1			
33	Llevar un ambiente de Almacén limpio y ordenado	1			
34	Tener actualizado el kardex de EPP tanto en fisico como vía electrónica.	1			
35	El inventario mensual no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
LOGÍSTICA					
36	Cumplir con el cronograma de compras(pedidos los miércoles).	N.A.			
GUARDIANÍA					
37	Toda incidencia presentada por el servicio de vigilancia debe ser primero canalizada por el area de administración de obra.	1			
38	Reunión quincenal con la empresa de vigilancia.	1			
39	Requizas a los ambientes de los subcontratistas.	0			
40	Requizas al personal obrero.	N.A.			
	PROMEDIO PONDERADO	**95%**			

V.B. Inspector

V.B. Inspeccionado

[redacted]

FORMATO
INSPECCIÓN MENSUAL DE BIENESTAR SOCIAL EN OBRA

[redacted]

OBRA	[redacted]	FECHA:	9/24/2018
CONTRATANTE / EC		PUNTAJE PONDERADO	100%
ÁREA DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA			

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

PUNTOS DE EVALUACIÓN					APLICA (SI/NO)	OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y ACCIÓN PREVENTIVA
Ítem	Código	Nombre Completo	Criterio	Alcance				
Logística	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Logística (Ítem 1.1)	SI			
				Logística (Ítem 1.2 Ítem 1.3)	SI			
				Unidad (s) residencial (es) amoblada	SI			
				Computador para cada residente	SI			
				Publicación de las políticas ambientales, seguridad y salud en el trabajo	SI			
				Presentación de periódicos murales (semanal / diario)	SI			
				Presentación de periódicos murales (semanal / diario)	SI			
				Lista actualizada para el obrero	SI			
				Lista actualizada para el staff	SI			
				Relación entregables (Lugar de entrega)	SI			
				Registro asistencia	SI			
				Registro visitas comunidad (Lugar, responsable, cubrimiento)	SI			
				Plan Transporte (Ítem 1.4 Ítem 1.5) - Plan	SI			
				Registro SST y validación Proveedores	SI			
				Gestión y actualización de matrices (riesgos)	SI			
				Capacitación inducción staff (Contratista, Aliados, visitantes)	SI			
				Socialización con trabajadores	SI			
				Recepción y validación del ATS	SI			
				Recepción y archivo de Carnet de Seguridad	SI			
				Evaluación conocimiento - Interno	SI			
				Evaluación conocimiento - Externo	SI			
				Acceso limitado/controlado	SI			
				Cláusulas ambientales, sociales y de seguridad (Verificar CO formatos de SEGURA)	SI	No se hace por este contrato		
				Informes PQR	SI			
				Encuesta	SI			
Cierre	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Retroalimentación	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
				Encuesta descriptiva (s)	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
Pre-C				Informe impacto comunidad (cierre)	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
				Registro (Ítem 4.1)	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
				Registro (Transporte Ítem 4.1)	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
				Directorio de vecinos cada (Cartas, Llamadas y volantes) - Inicio	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
				Carta de presentación del proyecto (subcontratista)	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
				Carta de verificación de autorización de ingreso de obra	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
				Encuesta interna	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
Cierre				Registro de Reclamos	N.A			
				Acta de vista - Vecinos (Documento de / acuerdo de vecinos / convocado)	N.A			
				Acta de conformidad	N.A			
Cierre				Planilla ATS	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
				Directorio de vecinos cada (Cartas, Llamadas y volantes) - Cierre	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
				Carta solicitud de autorización de ingreso para cierre de obra	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
				Acta de conformidad de cierre	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
				Comunicación cierre social de obra	N.A	Cláusula ambiental para cierre		
				Encuesta descriptiva (s)	N.A	Cláusula ambiental para cierre		

Encargado de Inspección
STEFANIE ATEHORTUA

BESCO S.A.S.
Doris Cecilia Muñoz
Jefe de Seguridad Industrial

Trabajadora social de obra
TANIA MECA

[redacted]

ANEXO

INSPECCIÓN MENSUAL DE OFICINA TÉCNICA (OBRAS PROPIAS)

[redacted]

[illegible]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE PRODUCCIÓN EN OBRA

[redacted]

OBRA	[redacted]		
RESPONSABLE DE PRO			
JEFE DE OBRA		FECHA:	12/04/19

PUNTAJE PONDERADO	100%
PONDERADO POR CRITERIOS	N.A.

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
		E					
		100%	N.A.	-			
1	Se elabora el Look Ahead de Edificaciones y Obras exteriores, se actualiza semanalmente.	1	#####	1			
2	Se elabora el Análisis de Restricciones semanal, considerando los tipos de restricciones (Proyecto, materiales, mano de obra, equipos, subcontratas y herramientas)	1	#####	1			
3	El Programa Semanal ha sido elaborado en base al Look Ahead y ha pasado por un proceso de levantamiento de restricciones.	1	#####	1			
4	El PPC semanal se aproxima al 100%.	1	#####	0			
5	Las causas de incumplimiento de lo programado son registrados en el formato de Análisis de Causas Incumplidas.	1	#####	1			
6	El capataz hace uso de la programación diaria para la ejecución de las actividades.	1	#####	1			
7	Se elabora el movimiento de personal diario. Se lleva el registro de los días anteriores.	1	#####	1			
8	Se realiza el tareo diario. Se lleva a cabo a partir de las actividades del Look Ahead.	1	#####	1			
9	Se realiza el pedido de material cumpliendo con las fechas límites	1	#####	1			
10	Junto con la subcontrata, se realiza la conciliación de metrados. El acuerdo se encuentra firmado por el Jefe de Producción, Superintendente y Subcontrata.	1	#####	N/A			
11	Se lleva el registro con los vales de salida de equipos y materiales en el almacén.	1	#####	1			
12	El ISP se encuentra actualizado diariamente	1	#####	—			
13	Se elabora el ISP de forma semanal.	1	#####	1			
14	El ISM se encuentra actualizado diariamente	1	#####	—			
15	Se elabora el ISM de forma semanal.	1	#####	1			
16	La curva de rendimiento se encuentra actualizada. Se identifica los altos y bajos rendimientos y se analizan las causas.	1	#####	1			
17	Se lleva a cabo de forma mensual la calificación a subcontratas.	1	#####	N/A			
18	Se lleva el acta de las reuniones semanales	1	#####	1			
19	Las actividades de producción se encuentren respaldas por los PETS respectivos.	1	#####	1			
20	El Master Plan se encuentra actualizado (formato en MS Project)			—			
21	Se lleve un adecuado controlen el pedido de recursos			1			
22	Se revise, valida y firma valorizaciones al SC			1			

[redacted]

15/16 = 94 %

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]		
RESPONSABLE EN OBRA:	[redacted]	**FECHA:**	27/06/2019

PUNTAJE PONDERADO	**87%**

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVATAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CAPITAL HUMANO					
1	Entrega del tareo semanal todos los lunes al mediodía (JA)	1			
2	Presentación de las solicitudes de liquidación del personal obrero al área de Capital Humano de manera oportuna, dicho(s) documento(s) deben contener las firmas de los responsables.	1			
3	Custodiar el cargo de presentación del tareo semanal con las firmas respectivas.	1			
4	La información del Tareo debe ser revisado y no contener errores	1			
5	Tener actualizado el file personal de los trabajadores (obreros).	1			
6	Enviar semanalmente la matriz de contratistas a la Jefatura de Administración con copia al Jefe y Superintendente de Obra (la información presentada debe encontrase actualizada en los diferentes *items* solicitados)	0			
7	Informar oportunamente las incidencias diarias por ausencia (enfermedad) a las areas correspondientes.	1			
8	Tener actualizada y empastadas las boletas de pago del personal obrero, las cuales deben contener la firma del trabajador.	1			
9	Llevar el registro de asistencia del personal (obrero) actualizado.	1			
10	Entregar oportunamente los DM originales del personal de obra: 1) Personal obrero: al area de Bienestar Social. 2) Personal Staff: a la Jefatura de Administración de Obras.	1			
11	Tener actualizadas las polizas de SCTR del personal staff y obrero	1			
12	Informar oportunamente todo cese del personal obrero y de limpieza	1			
13	Cumplir con el cronograma de entrega de informe de personal para el RO	1			
TESORERÍA					
14	Entregar el fondo fijo para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
15	El fondo fijo no debe contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
16	Todo arqueo de caja chica no debe presentar ningun tipo de observaciones.	0			
17	Las compras a través de la caja chica deben efectuarse sólo a proveedores con los cuales no contamos con línea de crédito.	N.A.			
18	Mantener una adecuada custodia del file del fondo fijo.	1			
19	Mantener actualizados el cuadro de garantías (Cartas Fianza, Letras de cambio)	1			
CONTABILIDAD					
20	Entrega de las facturas semanales para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
21	Las facturas no deben contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA

[redacted]

22	Mantener una adecuada custodia del file de las facturas presentadas semanalmente.	1			
23	No deben permanecer en obra facturas de meses anteriores.	1			
24	Todas las guías de remisión(original) deben contener el sello de recepción del área de	1			
25	Las facturas de concreto que se presentan para pago deberán presentar el cuadro "	1			
26	Presentación de entregables del mes (Kardex, ingreso y egresos)	1			
27	Presentación y custodia de las guías de remisión de [redacted]	1			
28	Envío de facturas (migración S10) los días miércoles	N.A.			
ALMACENES					
29	Entrega de los informes de inventario los primeros 2 días hábiles del mes	1			
30	Llevar un adecuado control en la emisión de las Guías de Remisión	1			
31	Registro diario de los ingresos y salidas de almacén en el S10	1			
32	Actualización diaria de las Bincard	1			
33	Llevar un ambiente de Almacén limpio y ordenado	0			
34	Tener actualizado el kardex de EPP tanto en fisico como vía electrónica.	1			
35	El inventario mensual no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
36	Los materiales se colocan según recomendaciones del proveedor (caja)	0			
37	Los productos químicos cuentan con las Hojas MSDS	1			
LOGÍSTICA					
38	Cumplir con el cronograma de compras(pedidos los miércoles).	N.A.			
GUARDIANÍA					
39	Toda incidencia presentada por el servicio de vigilancia debe ser primero canalizada por el area de administración de obra.	1			
40	Reunión quincenal con la empresa de vigilancia.	1			
41	Requizas a los ambientes de los subcontratistas.	1			
42	Requizas al personal obrero.	0			
	PROMEDIO PONDERADO	**87%**			

V.B. Inspector

V.B. Inspeccionado

[redacted]

FORMATO
INSPECCIÓN MENSUAL DE BIENESTAR SOCIAL EN OBRA

[redacted]

[redacted]		FECHA:	25/01/2019
		FOTOS AL FONDO/ATRÁS	SI/ON

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN					RIESGO ASOC.	OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES Y ACCIONES PREVENTIVAS
Proceso	Cargo	Actividad rutinaria	Código	Peligros				
Gestión	[redacted]	Uso de EPP	[redacted]	[redacted]	1	Se observa que [redacted] Todos los trabajadores deben usar el EPP adecuado para la actividad que realizan. Todos los trabajadores deben usar el EPP adecuado para la actividad que realizan. **Trabajar sin EPP adecuado genera riesgo de accidente de trabajo.**	[redacted]	Reportar a [redacted]
		Inducción y capacitación en obra			2			
		Operación de vehículos y equipos			3			
					4			
					5	[redacted]	[redacted]	[redacted]
					6			
					7			
					8			
					9			
					10			
					11			
					12			
		Registro de actividades (Incidentes)			13			
					14			
		Creación de generadores de riesgo			15			
					16			
		Supervisión de terceros (Contratistas)			17	[redacted]	[redacted]	[redacted]
					18			
		Supervisión de mantenimiento de obra			19			
					20			
					21			
					22	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		Soporte en atención médica de accidente			23	[redacted]		
		Informe mensual			24	[redacted]	[redacted]	[redacted]
					25			
Gestión		Elaboración de [redacted]			26			
		Presentación de [redacted]			27			
Proceso		Registro de [redacted]			28			
		Elaboración del Plan de [redacted]			29			
					30			
					31			
		Presentación de [redacted]			32			
					33			
					34			
					35			
					36			
Gestión		Medición de [redacted]			37			
					38			
					39			
Gestión		Elaboración de [redacted]			40			
					41			
		Presentación de [redacted]			42			
					43			
					44			
					45			
		Presentación de [redacted]			46			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]	FORMATO INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD	CÓDIGO [redacted] VERSIÓN FECHA: 24/07/2018

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
ÁREA DE OBRA:	
SUBÁREA DE GTC:	

PUNTAJE PONDERADO	0-10%
	07.41%

Ítem	Verificación del cumplimiento	Calificación		Observaciones	Fecha de verificación	Compromisos y acciones preventivas
Aseguramiento de Calidad		0%				
1	Verificación del proceso del [redacted] **Criterio: Verifica el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%)	0	0	Mayo 91.24 + 6.38 + 3.14 + 3.24 = 98.06 Abril 96.4 + 2.56 + 0.61 + 0.44 Marzo 98.7 + 0.43 = 92.13		33%
2	Cumplimiento del envío del [redacted] **Criterio: Verifica cumplimiento del envío de los días hábiles	0	0			
3	Cumplimiento del envío del [redacted] **Criterio: Verifica cumplimiento del envío en fecha acordada con GT	0	1			
4	Verificación del cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verifica el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%)	0	1	Abril 95.65 Mayo 95.61 Marzo 95.62	95.63	
Uso de Formatos		0%				
5	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verifica [redacted]	0	1			
6	Verificación del correcto uso de los [redacted] **Criterio: Verifica que [redacted]	0	0	Verificar codigos de / Faltan fotos del Plano Las intrucciones de medidas (Estructura)		
Aplicación Normativa Crítica		0%				
7	Verificación de la aplicación del [redacted] **Criterio: Verifica [redacted]	0	A			
8	Verificación del correcto uso de [redacted] **Criterio: Verifica que [redacted]	0	1			
Equipos de Medición y Ensayos		0%				
9	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verifica el registro de verificación de equipos de medición y ensayos	0	1			
10	Verificación del cumplimiento de los ensayos establecidos [redacted] **Criterio: Verifica la actualización del registro de control de ensayos que reposa en obra	0	1			
11	Verificación del cumplimiento del cuidado de probetas y su curado para ensayo **Verifica cada 15 días el curado de probetas (calificación y nota para ensayos ≥ 28 días)	0	N/A	Ya no se registran vaciados de concreto		
12	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verifica la actualización del registro de mantenimiento de equipos de medición de concreto	0	1			
Especificaciones de Calidad		0%				
13	Verificación del cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verifica el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%)	0	A			
14	Verificación del [redacted] **Criterio: Verifica cumplimiento de otras normas propias de la obra	0	A			
15	Verificación del correcto uso del [redacted] **Criterio: Verifica que el formato se encuentre diligenciado y firmado y firmado	0	A			

[redacted]	FORMATO INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

[redacted]						
15	Cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la matriz establecida (1 mes)		0	0	Por regularizar formatos	
17	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de los no conformidades ejecutado el seguimiento a los compromisos y plazos de ejecución establecidos		0	0	Por regularizar	
18	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la matriz establecida (1 mes)		0	1		
19	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de los Observadores		0	1		
20	Verificación de planes de mejoramiento **Criterio: Asegurar los planes se cumplan con los tiempos establecidos y formulados		0	0		
[redacted]						
21	Verificación del Cl [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la matriz establecida en el formato [redacted]		0	1		
22	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del líder responsable de cada criterio		0	1		
23	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento de la directriz anterior		0	0		
[redacted]						
24	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar la actualización de los [redacted] en el link		0	0	Por regularizar	
[redacted]						
25	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento y la actualización del anexo [redacted] con el fin de [redacted]		0	1	Dejar las observaciones - [redacted] - Retirado [redacted]	
26	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar mediante fotografías la ejecución de [redacted]		0	1		

Nota: 1 Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE OFICINA TÉCNICA (OBRAS PROPIAS)

[redacted]

OBRA	[redacted]
[illegible]	[redacted]
[illegible]	[redacted]
FECHA	[illegible]

[illegible]	[illegible] %
[illegible]	[illegible] %

[illegible]

Nº	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]			1			[illegible]
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
3	[illegible] [redacted]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
4	[illegible] [redacted]	[illegible]	[illegible]	1			
5	[illegible] [redacted]	[illegible]	[illegible]	1			[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible] [redacted]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
7	[illegible] [redacted]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]			[illegible]			
8	[illegible] [redacted]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible] [redacted]			1			
	[illegible]			1			
9	[illegible] [redacted]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]			1			
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]			[illegible]			
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]			1			
	[illegible] [redacted]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1			
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible] [redacted]			1			
	[illegible]			1			
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]			1			
	[illegible]			1			
	[illegible] [redacted]			1			
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]			1			
	[illegible] [redacted]			1			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE PRODUCCIÓN EN OBRA

[redacted]

OBRA:	
RESPONSABLE DE PRO:	
JEFE DE OBRA:	FECHA: 27-4-19

PUNTAJE PONDERADO	N.A.
	N.A.

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

#	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN 1	CALIFICACIÓN A	CALIFICACIÓN -	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	RESPONSABLE Y ACCIÓN PREVENTIVA
		N.A.	N.A.				
6	Se elabora el Look Ahead de Edificaciones o Obras exteriores, se actualiza semanalmente.	1		-			
7	Se elabora el Análisis de Restricciones semanal, considerando las tres dimensiones (Proyecto, mano obra, equipo, obra exterior, subcontratos y herramientas).	1					
8	El Programa Semanal ha sido elaborado en base al Look Ahead y ha pasado por un proceso de mantenimiento de restricciones.		NA				
9	El PPC semanal se aproxima al 100%.	0,5					
10	Las causas de incumplimiento de la programación están registradas en el formato de Análisis de Causas respectivo.	0					
11	El equipo cuenta con todo lo requerido para la ejecución de las actividades.	1					
12	Se entrega el mantenimiento del personal diario. Se lleva el registro de los días anteriores.		NA				
13	Se realiza el Tarea diario. Se lleva a cabo a partir de las restricciones del Look Ahead.	1					
14	Se realiza el acopio de material (cuadrillas) con las fechas límites.	1					
15	Antes cada subcontrata, se realiza la conciliación de interfaces. El supervisor encargado (Encargado del Jefe de Producción, Superintendente) y Subcontrata.		NA				
16	Se lleva el registro con los ratios de control de equipos y materiales en obra diario.	1					
17	La [illegible] se encuentra actualizada diariamente.		NA				
18	Se elabora el EEF de forma semanal.	0					
19	El EEMS se encuentra actualizado diariamente.		NA				
20	Se elabora el EIM de forma semanal.	1					
21	La planificación mensual se encuentra actualizada. Se identifican hitos y se reprograman y se analizan las causas.	0,5					
22	Se lleva a cabo en forma mensual la [illegible] subcontratas.		NA				
23	Se lleva el acta de las reuniones internas.	1					
24	Las actividades de producción se encuentran respaldadas por los PETS respectivos.	1					
25	El Mapeo de Flujo se encuentra actualizado.	1					
26	Se lleva un adecuado control de pedido de insumos.	1					
27	Se revisa, solicita y firma valorizaciones de SC.	1					

13

$\frac{13}{17} = 0{,}76 \rightarrow 76\ \%$

[redacted]

[redacted]

[redacted]	FORMATO **INSPECCIÓN SIG**	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

OBRA:	[redacted]		
JEFE DE OBRA:	[redacted]	**FECHA:**	25/06/2019

86%

1: Cumple / 0.5: Cumple Parcialmente / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
I. CONTROL DE DOCUMENTOS		**80%**			
1	Se mantiene actualizados los registros según la lista de registros (físico)	0.8	**GTC:** Se adecuará lista de registros según dossier **SSOMA:** El file 4 tiene más información de la debida. No se ha esta enviado el reporte de investigacion de accidentes en las 48 horas. **PROD:** Falta actualizar carpetas de PETS, Capacitaciones **BS:** Falta arreglar la numeracion de las carpetas y separar las por etapas	**GTC:** **SSOMA:** **PROD:** **BS:**	
2	Se mantiene actualizados los registros según la lista de registros (digital)	0.7	**GTC:** todavia no termina de pasar los documentos de [redacted] **SSOMA:** Faltan registros en la carpeta 12 de accidentes. Ademas, se encontro que no se cumple con un ECA, y no se ha registrado como una NC **PROD:** No se ha guardado en [redacted]	**GTC:** **SSOMA:** **PROD:**	Dar charla de concientizacion al personal sobre el uso de las capertas digitales
3	Se encuentra actualizada la lista de documentos externos	0.8	**ADM:** Falta actualizar lista de PQP	**ADM:**	
4	El personal respectivo tiene acceso a las carpetas del onedrive	0.8	**SSOMA:** No se utiliza la carpeta de [redacted] **PROD:** No se utiliza la carpeta de [redacted]	**SSOMA:** **PROD:**	
5	Se utilizan los formatos actualizados	1.0			
II. INFORME MENSUAL		**88%**			
1	El jefe de obra revisa los informes mensuales de cada área	1.0			
2	Se hace el envío del informe mensual según el plazo acordado	0.8			
3	Se cumple con las acciones correctivas y preventivas de los indicadores que no cumplen con la meta	0.8	**JO**: Falta especificar mejor las acciones correctivas / preventivas de los indicadores que no se cumplen	**JO:**	
III. GESTIÓN DEL RIESGO		**83%**			
1	Se actualiza de manera mensual la matriz de riesgos y oportunidades	1.0			
2	Se realiza el análisis correctamente	0.5	**JO:** No se han cerrado o no se han actualizado los riesgos que tienen fecha de enero, febrero, marzo	**JO:**	
3	Cuenta con las evidencias de la implementación de los controles adicionales aplicados	1.0			
IV. GESTIÓN DE LA OBRA		**92%**			
1	Se lleva acabo las reuniones semanales de la obra. Se cumple con los pendientes	1.0			
2	Se cumple con los pendientes de las reuniones semanales con el cliente	1.0			
3	El cuaderno de obras se encuentra actualizado	1.0			
4	Las lecciones aprendidas fueron implementadas	0.5	**JO:** Falta pasar las lecciones aprendias a un PETS o envio a personal para considerarse en otra etapa	**JO:**	
5	El jefe de obra genera compromiso con el SIG (difusión de la política, charlas, etc.)	1.0			
6	En los comités de obra se comentan los resultados de los indicadores mensuales	1.0			

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO: [redacted]
EDICIÓN:
FECHA:

OBRA:	[redacted]
RESPONSABLE DE SSOMA:	
JEFE DE OBRA:	FECHA: 25/06/19

PUNTAJE PONDERADO	86.0 %
PONDERADO POR CRITERIO	90.1 %

1) Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
		C	C				
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO		100%	N.A.	-			
1	El empleador proporciona los recursos necesarios para implementar una efectiva gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	*****	1			
2	Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	*****	1			
3	Se implementan acciones preventivas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para asegurar la mejora continua.	1	*****	1			
4	Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la cultura interna y su fomento el trabajo en equipo.	1	*****	1			
5	Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales en toda la empresa, entidad pública o privada.	1	*****	1			
6	Se promueven un buen clima laboral para reducir la brecha entre empleador y trabajador y viceversa.	1	*****	1			
7	Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo comprometido en el mejoramiento continuo de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	*****	1			
POLÍTICA, OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SSOMA		100%	N.A.	-			
8	Se publica y capacita al personal en la Política SSOMA. Se tienen registros del personal capacitado.	1	*****	1			
9	Existen objetivos de seguridad definidos y el personal los conoce.	1	*****	1			
10	Se cumple con la entrega del Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	*****	1			
11	Se encuentran identificados los requisitos legales y otros requisitos actualizados de seguridad.	1	*****	1			
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		100%	N.A.	-			
12	El Plan de SSOMA se encuentra actualizado y debidamente firmado por los accionistas y gerentes.	1	*****	1			
13	Se cumple el Plan de SSOMA establecido en la Obra. Deben evidenciarse medidas del no cumplimiento.	1	*****	1			
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES		100%	N.A.	-			
14	Se comunican los riesgos a los trabajadores por actividad y área de trabajo, así como las medidas de control en cada caso.	1	*****	1			
15	Existe un organigrama publicado de la Obra especificando cargos y responsabilidad.	1	*****	1			
16	La descripción de cargos incluyen las responsabilidades en materia de seguridad y salud ocupacional.	1	*****	1			
17	Las responsabilidades han sido debidamente difundidas al personal de supervisión y operativo.	1	*****	1			
18	La matriz IPERC se encuentra actualizada y publicada.	1	*****	1			
19	El mapa de riesgos y de evacuación se encuentra actualizado, publicado, y difundido al personal.	1	*****	1			
CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIAS		200%	N.A.	-			
20	Se cumple el Programa de capacitación establecido para la Obra.	1	*****	1	Se encuentra dentro del tiempo y publicado día programado		
21	Se cumple con la inducción al personal nuevo y/o transferido.	1	*****	1			
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		200%	N.A.	-			
22	Está formalizado el comité de Seguridad y Salud Ocupacional (Supervisor si fuera aplicable), se realizan reuniones periódicas y se manejan las actas respectivas.	1	*****	1	conforme Reunión ordinaria de obra (01-03)		
23	Los trabajadores de las diferentes áreas conocen quienes son sus representantes en el comité de seguridad y salud ocupacional.	1	*****	0	Reforzar difusión mediante carteles y panel de anuncios		
GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		100%	N.A.	-			
24	El empleador requiere mediante contrato particular de sus instalaciones desarrollen actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores garantía: La coordinación con la gestión preventiva y con los riesgos inherentes.	1	*****	1			
25	La seguridad y salud de las instalaciones.	1	*****	1			
26	La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.	1	*****	1			
27	La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas, entidad pública o privada que contratan su personal.	1	*****	1			
28	Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud para el trabajo sea que tengan una relación laboral con el titular o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.	1	*****	1			
GESTIÓN DEL CONTROL MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL		100%	N.A.	-			
29	El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores.	1	*****	1			
30	Los trabajadores son informados: A todas pruebas de los riesgos para los resultados de salud ocupacional.	1	*****	1			
31	A todo personal, sobre los resultados de los reconocimientos médicos relativos a su aptitud en su salud.	1	*****	1			

[redacted]

[redacted]

JEFE DE OBRA

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

[redacted]

32	Los trabajadores de las evidencias subjetivas no son pasibles para ejercer discriminación.	1	#####	/			
33	Los resultados de las auditorías realizadas son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.	1	#####	/			
34	Los trabajadores cuentan con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo vigente.	1	#####	/			
GESTIÓN DE LOS REGISTROS		100%	N.A.	-			
35	El personal posee la implementación de registros y documentos del sistema de gestión, actualización y su disposición del trabajador referido a: Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el cual debe constar la investigación y las medidas correctivas.	1	#####	/			
36	Registro de exámenes médicos ocupacionales.	1	#####	/	Solicitar el Listado de Exámenes Médicos		
37	Registro del mantenimiento de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.	1	#####	/	Plan de capacitación anual con auditoría		
38	Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.	1	#####	/			
39	Registro de estadísticas de seguridad y salud.	1	#####	/			
40	Registro de equipos de seguridad y emergencia.	1	#####	/			
41	Registro de capacitación, inducción, entrenamiento, y simulacros de emergencia.	1	#####	/			
42	Registro de accidentes.	1	#####	/			
43	Los registros mantenidos son: - Legibles e identificables. - Permite su seguimiento. - Son archivados y adecuadamente protegidos.	1	#####	/			
ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL EN OBRA		100%	N.A.	-			
44	Área de trabajo está limpia y libre de residuos y escombros.	1	#####	/			
45	Pasillos y pasadizos están despejados.	1	#####	/			
46	Materiales y equipos están ordenadamente ordenados.	1	#####	/			
47	Cables eléctricos, mangueras, cables combustibles para soldadura, etc. están en buen estado y ubicados para evitar riesgos de tropiezo.	1	#####	/			
48	Área libre de trocos de metal con puntas sobresalientes riesgos de pinchazos.	1	#####	/			
GESTIÓN AMBIENTAL		100%	N.A.				
49	En las áreas de trabajo hay provisión de agua potable y hay tachos para los vasos.	1	#####	/			
50	Hay contenedores y depósitos para los diferentes tipos de residuos.	1	#####	/			
51	Se ha identificado un espacio temporal de residuos sólidos convencionales y peligrosos.	1	#####	0	Acopio de documento presente		
52	Protecciones de árboles cuyas bateadas (tapacheras) o cintas colocar en lugar.	1	#####	/	de plásticos, fierros, latas		
53	Baños químicos limpios, con dispensación de jabón para manos, en cantidad suficiente y ubicados en	1	#####	/			
PREVENCIÓN EN EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS		100%	N.A.				
54	Se utilizan productos químicos en el trabajo? Si empresa	1	#####	/			
55	Los productos químicos cuentan con las Hojas MSDS y están ubicadas en el lugar indicado.	1	#####	/			
56	Los productos químicos se encuentran debidamente rotulados, con el envase original cerrado y en buen estado.	1	#####	/			
57	El almacén de los productos químicos debe estar en un lugar ventilado, limpio y ordenado.	1	#####	/			
POSICIONES / ACCIONES DE LA GENTE		100%	N.A.				
58	Las zonas de carga al mismo nivel o diferente se encuentran señalizadas, no se evidencia ductos sin tapa.	1	#####	/			
59	Si partículas cortantes que portan cuerpos punzocortantes están protegidas.	1	#####	/			
60	Se previene el sobreesfuerzo de los trabajadores (cuentas, empujan, tiran cuidadosa).	1	#####	/			
61	Las labores (cortes, etc.) de otros trabajadores están controladas.	1	#####	/			
62	No trabaja con riesgo innecesario.	1	#####	/			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		100%	N.A.				
63	Se cuenta con un registro de entrega y control de epp, en el cual se identifica el índice de rotación y disponibilidad de cada epp.	1	#####	/			
64	Casco de seguridad y barbiquejo son usados y mantenidos como se le indica.	1	#####	/			
65	Protección auditiva usada apropiadamente.	1	#####	/			
66	Protección ocular usada de manera correcta.	1	#####	/			
67	Botines de seguridad u otra protección requerida para los pies usados adecuadamente.	1	#####	/			
68	Mascarillas apropiadas y antiparras usadas adecuadamente.	1	#####	/			
69	Guantes son del tipo correcto y usados adecuadamente.	1	#####	/			
70	Ropa de trabajo ropas cómodas y holgadas con dobladillos adecuados.	1	#####	/			
71	Equipo de protección para soldadores usados adecuadamente.	1	#####	/			
72	Otros, especificar: Vestimenta adecuada a protección personal.	1	#####	/			
ILUMINACIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA		100%	N.A.	-			
73	Hay barreras, barandas instaladas y en buenas condiciones para prevenir caídas o limitar peligros de trabajadores expuestos a riesgos.	1	#####	/			
74	Medidas de precaución y/o prohibición instaladas, seguras de seguridad y en buenas condiciones.	1	#####	/			
75	Sistemas de Advertencia (Señalización, luces intermitentes y otros) limpios y visibles están colocados y son claros.	1	#####	/			
76	Protección de luces (Lámparas, Focos, Cercas de Tranquilidad y similares) en su lugar y en buenas condiciones.	1	#####	/			
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES		100%	N.A.	-			
77	Las herramientas son adecuadas para el trabajo (no hechizo).	1	#####	/			
78	Son usadas correctamente.	1	#####	/			
79	Están en condiciones seguras de mantenimiento.	1	#####	/			
80	Cables eléctricos – extensiones en condición e inspeccionados.	1	#####	/			
81	Mantenidos libres de aceite, del material extraño y corrosivo.	1	#####	/			
82	Discos de corte y cortante usados correctamente.	1	#####	/			
83	El personal designado para la utilización de herramientas peligrosas como soldadura cuenta con el certificado.	1	#####	/			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]	FORMATO INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

84	Herramientas, equipos de montaje, transportadas y almacenadas	1	[redacted]				
85	Tableros eléctricos según norma / resistencia y aterrizados.	1	[redacted]				
86	Equipos eléctricos (soldadoras, etc.) aterrizados.	1	[redacted]				
87	Los equipos de corrosión de barra están debidamente ajustados (3 mm). Seguro sello respectivo (la base del aparejo) y los nudos apropiadamente asegurados	1	[redacted]				
88	Las herramientas accionadas eléctricamente deben estar provistas de interruptores de activación (seguro) y deben ser de doble aislamiento.	1	[redacted]				
89	Conexiones eléctricas energizadas en forma adecuada y bajo estándar (NTC 2050).	1	[redacted]				
EXCAVACIONES		100%	N.A.				
90	Talud y entibado adecuado según norma (GSSO).	1	[redacted]				
91	Señalización de la excavación en su perímetro.	1	[redacted]				
92	Señalización de ancho y salida cada 7,5 metros.	1	[redacted]				
93	Diariamente se inspeccionan y se toman decisiones en control de los seguros.	1	[redacted]				
94	Existe protección contra caídas (Barreras Rígidas).	1	[redacted]				
95	Conservación a más de 1,20 mts. de profundidad, cuenta con viga.	1	[redacted]				
96	Encontramos a más de la mitad de la profundidad de la excavación en el día del hecho.	1	[redacted]				
ANDAMIOS Y ESCALERAS		100%	N.A.				
97	Construidos por especificaciones técnicas de fabricante.	1	[redacted]				
98	Cuentan con vías de acceso y salida apropiadas.	1	[redacted]				
99	Etiquetados correctamente (Negro No usar; Verde: Apto).	1	[redacted]				
100	Se movilizan en forma segura (no sufren accidentes).	1	[redacted]				
101	Escaleras adecuadas para el trabajo realizado / descansos en la ubicación.	1	[redacted]				
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		100%	N.A.				
102	Arnés de seguridad y respaldo y uso de manera adecuada.	1	[redacted]				
103	Las líneas de vida están debidamente aseguradas con soporte completo.	1	[redacted]				
104	Protección perimetral según estándar.	1	[redacted]				
105	Líneas de vida estáticas, cerradas, dobladas y soportan una fuerza mínima de 2 mil kg.	1	[redacted]				
106	Equipos de protección contra caídas con puntos adecuados para evitar caídas.	1	[redacted]				
107	Equipos de protección contra caídas con inspecciones y mantenidos en forma regular.	1	[redacted]				
108	Los trabajos a otro sistema medio mecánico, para conocedor de líneas de vida, cuenta con arnés de seguridad para asegurar su residencia.	1	[redacted]				
109	Líneas de vida con fabricante autorizado (debidamente firmada y soportada en documentos de seguridad).	1	[redacted]				
EQUIPOS DE LEVANTE DE CARGA		100%	N.A.				
110	Equipo de capacidad adecuada para el levante y con salida de carga en el equipo y en el terreno aspecto.	1	[redacted]				
111	Cable de izaje y seguro del gancho en buenas condiciones con inspección diaria.	1	[redacted]				
112	Accesorios de izaje (eslingas, grilletes, estrobos) en buenas condiciones y con inspección del mes.	1	[redacted]				
113	Medias caídas y otros protectores de eslingas usados como se requiere.	1	[redacted]				
114	Señalización de elementos inspeccionados (cinta plan). etc.).	1	[redacted]				
115	Aparejador/a calificado con certificación vigente.	1	[redacted]				
EQUIPOS MÓVILES DE CONSTRUCCIÓN		100%	N.A.				
116	Bocinas, frenos, bocinas, alarmas trabajando adecuadamente, cabina en buen estado.	1	[redacted]				
117	Equipos y vehículos cuentan con implementos de seguridad y extintor.	1	[redacted]				
118	Mantenimiento apropiado / Inspección diaria / Chequeo previo.	1	[redacted]				
119	Revisión técnica vigente.	1	[redacted]				
120	Equipo cuenta con alarmas reversa.	1	[redacted]				
121	Carga transportada en forma segura.	1	[redacted]				
122	Licencias internas de Operador/Conductor Vigentes.	1	[redacted]				
123	Vehículos livianos con pito de reversa audible en su interior.	1	[redacted]				
124	Equipos Móviles de Construcción con identificación con vigencia de Talleres reparados directos por técnicos de la barra.	1	[redacted]				
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		100%	N.A.				
125	Los materiales inflamables almacenados adecuadamente.	1	[redacted]				
126	Cilindros de oxígeno y gases combustibles se almacenan separados.	1	[redacted]				
127	Los cilindros y recipientes cerrados cuentan con tapones que contienen.	1	[redacted]				
128	Extintores señalizados, localizados e inspeccionados en fecha debida.	1	[redacted]				
129	Los elementos que contienen líquidos son almacenados y transportados adecuadamente.	1	[redacted]				
130	Construcción de trabajo en caliente y permisos para soldar cuando se requiere.	1	[redacted]				
131	Mantenimiento y válvulas en adecuado estado y en buenas condiciones.	1	[redacted]				
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES		100%	N.A.				
132	Cargas transportadas en forma segura, uso de vehículos apropiados.	1	[redacted]				
133	Cargas y materiales almacenados en forma segura.	1	[redacted]				
134	Se usan cuñas y separadores.	1	[redacted]				
135	Almacenamiento de materiales no tiene riesgo.	1	[redacted]				
136	Señalización de acuerdo a estándar (Rombo NFPA, Letreros de Accesorios).	1	[redacted]				
RESPUESTA A EMERGENCIAS		100%	N.A.				
137	Dentro del área de trabajo los trabajadores son capacitados en primeros auxilios. Se tiene organizada la brigada de emergencia.	1	[redacted]				
138	Trabajadores saben como actuar ante terremotos y sismos, etc.	1	[redacted]				
139	Trabajadores saben como actuar en caso de incendios.	1	[redacted]				
140	La alarma y con señales de emergencia y son conocidas todas las personas (gritos / Sirena evidencia diaria de revisión de la alarma de emergencia.	1	[redacted]				
141	Trabajadores conocen la ubicación de los puntos de refugio y/o reunión.	1	[redacted]				
142	Trabajadores conocen el flujo de comunicación en caso de incidentes (Teléfonos útiles en emergencia y urgencia médica).	1	[redacted]				
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIONES CORRECTIVAS		100%	N.A.				

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

145	El flujo de reporte de incidentes se encuentra publicado en un lugar visible y es de conocimiento personal	1	#####	0	Reforzar difusión de incidentes. Publicar flujo de comunicación.		
146	Se establecen registros de la investigación de los accidentes ocurridos en obra	1	#####	1			
147	Los accidentes son investigados por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y/o delegado al personal	1	#####	1			
148	Se evalúan las acciones correctivas y/o preventivas oportunamente y se verifica su eficacia. Se mantienen los registros claros y visibles	1	#####	1			
CONTROLES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		100%	N.A.	-			
149	El Señalamiento de trabajo y las medidas objetivas se encuentran visiblemente	1	#####	1			
150	Procesos constructivos, existen y cuidan en el lugar. Trabajadores cuentan bien en procesos constructivos	1	#####	1			
151	Se cuenta con los permisos específicos para realizar la tarea, de acuerdo al necesario (Trabajo en Altura, Espacio Confinado, Trabajo en Caliente, etc.)	1	#####	1			
152	Se encuentra el capataz y/o supervisor a cargo de la tarea en el lugar	1	#####	1			
153	El ART y Análisis de trabajo seguro (ATS) son de acuerdo (según entidad)	1	#####	1			
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		100%	N.A.				
154	La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es conveniente y efectivo	1	#####	1			
155	La investigación y auditorías permiten a la empresa, contar con política y objetivos bajos los fines previstos y determinar las acciones, cambios en la política y objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo	1	#####	1			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

01/07/19

[redacted]	FORMATO **INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO: [redacted]			
RESPONSABLE EN OBRA: [redacted]	**FECHA:**	28/10/2019	

PUNTAJE PONDERADO	**95%**

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CAPITAL HUMANO					
1	Entrega del tareo semanal todos los lunes al mediodía (JA)	1			
2	Presentación de las solicitudes de liquidación del personal obrero al área de Capital Humano de manera oportuna, dicho(s) documento(s) deben contener las firmas de los responsables.	1			
3	Custodiar el cargo de presentación del tareo semanal con las firmas respectivas.	1			
4	La información del Tareo debe ser revisado y no contener errores	1			
5	Tener actualizado el file personal de los trabajadores (obreros).	1			
6	Enviar semanalmente la matriz de contratistas a la Jefatura de Administración con copia al Jefe y Superintendente de Obra (la información presentada debe encontrase actualizada en los diferentes *items* solicitados)	1			
7	Informar oportunamente las incidencias diarias por ausencia (enfermedad) a las areas correspondientes.	1			
8	Tener actualizada y empastadas las boletas de pago del personal obrero, las cuales deben contener la firma del trabajador.	1			
9	Llevar el registro de asistencia del personal (obrero) actualizado.	1			
10	Entregar oportunamente los DM originales del personal de obra: 1) Personal obrero: al area de Bienestar Social. 2) Personal Staff: a la Jefatura de Administración de Obras.	1			
11	Tener actualizadas las polizas de SCTR del personal staff y obrero	1			
12	Informar oportunamente todo cese del personal obrero y de limpieza	1			
13	Cumplir con el cronograma de entrega de informe de personal para el RO	1			
TESORERÍA					
14	Entregar el fondo fijo para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
15	El fondo fijo no debe contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
16	Todo arqueo de caja chica no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
17	Las compras a través de la caja chica deben efectuarse sólo a proveedores con los cuales no contamos con línea de crédito.	N.A.			
18	Mantener una adecuada custodia del file del fondo fijo.	1			
19	Mantener actualizados el cuadro de garantías (Cartas Fianza, Letras de cambio)	1			
CONTABILIDAD					
20	Entrega de las facturas semanales para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
21	Las facturas no deben contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			

[redacted]	FORMATO **INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA**	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

22	Mantener una adecuada custodia del file de las facturas presentadas semanalmente.	1			
23	No deben permanecer en obra facturas de meses anteriores.	1			
24	Todas las guías de remisión(original) deben contener el sello de recepción del área de	1			
25	Las facturas de concreto que se presentan para pago deberán presentar el cuadro "	1			
26	Presentación de entregables del mes (Kardex, ingreso y egresos)	1			
27	Presentación y custodia de las guías de remisión de [redacted]	1			
28	Envío de facturas (migración S10) los días miércoles	1			
ALMACENES					
29	Entrega de los informes de inventario los primeros 2 días hábiles del mes	1			
30	Llevar un adecuado control en la emisión de las Guías de Remisión	1			
31	Registro diario de los ingresos y salidas de almacén en el S10	1			
32	Actualización diaria de las Bincard	1			
33	Llevar un ambiente de Almacén limpio y ordenado	0			
34	Tener actualizado el kardex de EPP tanto en fisico como vía electrónica.	1			
35	El inventario mensual no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
LOGÍSTICA					
36	Cumplir con el cronograma de compras(pedidos los miércoles).	N.A.			
GUARDIANÍA					
37	Toda incidencia presentada por el servicio de vigilancia debe ser primero canalizada por el area de administración de obra.	1			
38	Reunión quincenal con la empresa de vigilancia.	1			
39	Requizas a los ambientes de los subcontratistas.	0			
40	Requizas al personal obrero.	N.A.			
	PROMEDIO PONDERADO	**95%**			

V.B. Inspector

V.B. Inspeccionado

[redacted]	FORMATO INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	

PUNTAJE PONDERADO	93.93%

Ítem	Puntos de Inspección	Calificación		Observaciones	Fecha de Levantamiento	Compromisos y Acciones Correctivas
		P	-			
Resultados de la Planificación		100%	-			
1	Cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar la aprobación del Plan de Calidad y constatación de actividades con registro de ejecución.	1	1	Falta [redacted] Lista de documentos internos	20.09.19	
2	Cumplimiento de [redacted] **Criterio: Constatar la aprobación de los ITO's y el cumplimiento de Metas en los registros de ejecución.	1	1			
Resultados de Gestión		100%	-			
3	Verificación del permiso de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%)	1	1	98%		
4	Cumplimiento del envío de [redacted] en fecha establecida **Criterio: Verificar cumplimiento de envío en fecha acordada por GTC	1	1			
5	Cumplimiento del envío de [redacted] en fecha establecida **Criterio: Verificar cumplimiento de envío en fecha acordada por GTC	1	1			
6	Verificación del cumplimiento del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%)	1	1	100%		
Uso de Protocolos		100%	-			
7	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar el actualización del registro de protocolos ejecutados.	1	1	Son el mismo set de protocolos de cumplimiento mensual	20.09.19	
8	Verificación del correcto uso de l[redacted] **Criterio: Verificar que todos protocolos ingresados correspondan al formato y formato.	0	0	Inspección no permite la inspección realizada en los planos adjuntos		Publicación y uso de corrector, el formulario.
Revisión de Materiales Críticos		100%	-			
9	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de revisión de materiales críticos ejecutados	1	1			
10	Verificación del correcto uso del [redacted] **Criterio: Verificar que todos informes se encuentren correctamente llenados, firmados y con la copia de la guía de despacho correspondiente	1	1			Se debe registrar la hora de inspección, posterior al ingreso del lote.
Equipos de Medición y Ensayos		100%	-			
11	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar el registro de certificados de calibración de equipos de medición pesados y de uso constante.	1	1	Falta actualizar el registro.	19.06.19	
12	Verificación del cumplimiento de los ensayos requeridos para el [redacted] **Criterio: Verificar la ejecución completa de los ensayos del protocolo de control que corresponda.	1	1			
13	Verificación del cumplimiento del curado de probetas y su envío para ensayo **Verificar que se cumpla lo planificado y pdf. curado de probetas (certificación) envío para ensayo (7 y 28 días)	1	1			
14	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de resultados de ensayos de compresión del concreto.	1	1			
Especificaciones de Calidad		100%	-			
15	Verificación del cumplimiento del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).	1	1			
16	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del mismo según especialidad inspeccionada.	1	1			
17	Verificación del correcto uso de [redacted] **Criterio: Verificar que el formato se encuentre correctamente llenado y firmado.	1	1			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:

Observaciones y No Conformidades		**85%**	-			
18	Cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 85%)	1	1			
19	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento del uso de reporte de no conformidades, en caso de existir de ser así.	1	1			
20	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización vigente de los Equipos/Vehículos, conforme a requerimiento de mantenimiento y planes de acción y capacitación.	1	1	Falta digitalizar el NC 020 y 031		
21	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 85%).	1	1	85%		Cantidad y vol. con el inventario de materiales
22	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro y matriz de asistencia/entrenamiento de los colaboradores.	1	1			
23	Verificación de planes vigentes en campo **Criterio: Revisar que los planes de manejo sean los vigentes y tengan firma y fecha del Jefe de OT.	1	1			
24	Verificación de PETS vigentes en campo **Criterio: Revisar que los PETS en campo sean los vigentes y tengan la firma de los responsables.	1	1			
Cumplimiento de Responsabilidades		**100%**	-			
25	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento del área responsable en el formato [redacted], según aplicación de la guía [redacted].	1	1			
26	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar evidencia del área responsable de reportar fechas.	1	1			
27	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento de la actividad semanal.	1	1			
Costos de Calidad		**100%**	-			
28	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar la actualización de costos generados en el mes.	1	1			
Ensayos de Calidad		**100%**	-			
29	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento y la actualización del informe mensual cotejando con la información física y digital de todas las documentaciones requeridas. Se deberá visualizar además el cumplimiento del esquema de utilización de la documentación	1	1	Protocolos con errores, Falta digitalizar RP's, resultados de ensayos de mat. Cantera, resultados de ensayo de rotura de probetas, planos As Built.		
30	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar evidencia fotográfica de Formatos de Fichas de trabajos capacitaciones, charlas y charlas del comité de la identificación y entrenamiento de la [redacted]	1	1			
31	Verificación de elaboración de [redacted] **Criterio: Verificar la elaboración de las acciones correctivas para eventuales fallas.	N.A.	N.A			

Nota: 1 = Cumple / 0 = No Cumple / N.A = No Aplica

[redacted]

[redacted]	FORMATO INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	

PUNTAJE PONDERADO	86.66%

Item	Puntos de Evaluación	Calificación		Observaciones	Fecha de Levantamiento	Compromisos y Acciones Preventivas
		A	-			
Resultados de la Planificación		100%	-			
1	Cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar la aprobación del Plan de Calidad y cumplimiento de coordinación con registro de comunicación.	1	1			
2	Cumplimiento de PETS aprobados y difundidos. **Criterio: Verificar el cumplimiento de los PETS del cronograma de difusión con registros de comunicación.	1	1	Corregir Siempre de cemento dentro de zona de pernos con PETS ID validado (0 concreto.	16.07.19	
Resultados de Gestión		75%	-			
3	Verificación de cumplido del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%)	0	0	94%		
4	Cumplimiento del envío de [redacted] dentro del plazo establecido **Criterio: Verificar cumplimiento del envío los días hábiles.	1	1			
5	Cumplimiento del envío de [redacted] en fecha establecida **Criterio: Verificar cumplimiento del envío en fecha establecida por OT.	1	1			
6	Verificación del cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).	1	1	98%		
Uso de Protocolos		100%	-			
7	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de los protocolos ejecutados.	1	1			
8	Verificación del correcto uso de [redacted] **Criterio: Verificar que todos protocolos se encuentren correctamente llenados y firmados.	1	1			
Revisión de Materiales Críticos		100%	-			
9	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de revisión de materiales críticos ejecutados.	1	1			
10	Verificación del correcto uso de [redacted] **Criterio: Verificar que todo informe se encuentre correctamente llenado, firmado y con fotografía y que sea revisado oportunamente.	1	1			
Equipos de Medición y Ensayos		100%	-			
11	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la vigencia de certificados de calibración de equipos de medición propios y de subcontratos.	1	1			
12	Verificación del cumplimiento de los ensayos requeridos [redacted] **Criterio: Verificar la documentación de los ensayos de acuerdo al protocolo correspondiente.	1	1			
13	Verificación del cumplimiento del curado de probetas y su envío para ensayo. **Verificar cada 06 meses. Toma una y 07 curado de probetas (testigos) y envío para ensayos (7 y 28 días)	1	1			
14	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento del registro de resultados de ensayos de resistencia del concreto.	1	1			
Capacitaciones de Calidad		100%	-			
15	Verificación del cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).	1	1	100%		
16	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del tema según cronograma mensual.	1	1			
17	Verificación del correcto uso [redacted] **Criterio: Verificar que el formato se encuentre correctamente llenado y firmado.	1	1			

[redacted] [redacted] [redacted]

6/09/19

[redacted]

FORMATO
INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD

CÓDIGO [redacted]
VERSIÓN
FECHA

Observaciones y No Conformidades		75%	-			
18	Cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de [redacted]	N.A.	N.A.			
19	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento del [redacted]	N.A.	N.A.			
20	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de No Conformidades, así como el seguimiento a las actividades y plazos definidos y propuestos.	N.A.	N.A.			
21	Verificación de [redacted] **Criterio: Cumplimiento [redacted]	0	0	0.0%		Gestionar y socializar el cumplimiento de observaciones.
22	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro y cierre [redacted]	1	1			
23	Verificación de planos vigentes en campo **Criterio: Revisar que los planos en campo sean los vigentes y hagan parte del [redacted]	1	1			
24	Verificación de PETS vigentes en campo **Criterio: Revisar que los PETS en campo sean los vigentes y hagan parte [redacted]	1	1			
Cumplimiento de Responsabilidades		100%	-			
25	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento [redacted]	1	1			
26	Verificación [redacted] **Criterio: Verificar [redacted]	1	1			
27	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar [redacted]	1	1	Todavía está la definición de cumplir con la cantidad de [redacted]		
Comité de Calidad		N.A.				
28	Verificación [redacted] **Criterio: Verificar la actualización [redacted]	N.A.	N.A.	O.T. Todos hacemos los costos en la etapa 2.		
Dossier de Calidad		100%	-			
29	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento [redacted]	N.A.	N.A.			
30	Verificación [redacted] **Criterio: Verificar [redacted]	1	1			
31	Verificación de elaboración de LECCIONES APRENDIDAS **Criterio: Verificar la elaboración de las lecciones aprendidas en la ejecución.	N.A.	N.A.			

Nota: 1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

INSPECCIÓN MENSUAL DE ASESORÍA TÉCNICA (OBRAS PROPIAS)

[redacted]

[redacted]

N°	[illegible]	Lista de chequeo			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE PRODUCCIÓN EN OBRA

[redacted]

OBRA:	[redacted]
RESPONSABLE DE PRO.	
JEFE DE OBRA:	FECHA: 24/10/19

PUNTUE PONDERADO	100%
PONDERADO POR CRITERIO	N.A.

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN 1	CALIFICACIÓN N.A.	CALIFICACIÓN 0	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
		100%	N.A.				
1	Se elabora el Look Ahead de Obligaciones y Obras exteriores, se actualiza semanalmente.	1	1				
2	Se elabora el Análisis de Restricciones semanal, identificando los tipos de restricciones (Proyecto, materiales, mano de obra, equipos, subcontratos y otras causas).	1	1				
3	El Programa Semanal ha sido elaborado en base al Look Ahead y ha pasado por un proceso de levantamiento de restricciones.	1	1				
4	El PPC semanal se aproxima al 100%.	1	1				
5	Las causas de incumplimiento de lo programado son registradas en el formato de Análisis de Causas Incumplidas.	1	1				
6	El Capataz hace uso de la herramienta diaria para la ejecución de las actividades.	1	1				
7	Se elabora el reconocimiento de personal diario. Se lleva el registro de los días anteriores.	1	1				
8	Se realiza el tareo diario. Se lleva a cabo a cargo de las actividades del Look Ahead.	1	0		FALTA FIRMA		
9	Se realiza el pedido sin retraso y cumpliendo con las fechas límites.	1	1				
10	Junto con la subcontrata, se realiza la constatación de avances. El acuerdo se encuentra firmado por el Jefe de Producción, Superintendente y Subcontrata.	1	NA		ESTAN EN ETAPA DE NEGOCIACIÓN		
11	Se lleva el registro con los vales de salida de equipos y materiales en el almacén.	1	1				
12	El IDP se encuentra actualizado diariamente.	1	NA		-		
13	Se actualiza el ISP de forma semanal.	1	NA		-		
14	El ISM se encuentra actualizado diariamente.	1	NA		-		
15	Se actualiza el ISM de forma semanal.	1	NA		-		
16	Se cuenta con levantamiento de encuentros actualizado. Se identifican los altos y bajos rendimientos y se analizan las causas.	1	NA		-		
17	Se lleva a cabo de forma mensual la CRT conforme a lo previsto.	1	NA		-		
18	Se lleva el acta de las reuniones semanales.	1	1				
19	Las actividades de producción se encuentran respaldas por los PETS respectivos.	1	1				
20	El Master Plan se encuentra actualizado (formato de MS Project).	1	NA		NO APLICA CONFORME A ESTADO DE OBRA		
21	Se lleva un adecuado control en el uso de la maquinaria.	1	NA				
22	Se revisa, valida y firma valorizaciones al SC.	1	1				

13/12 = 92 %

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE PRODUCCIÓN EN OBRA

[redacted]

OBRA:	[redacted]
RESPONSABLE DE PRO:	
JEFE DE OBRA:	
FECHA:	21/12/19

PUNTAJE PONDERADO	100%
PONDERADO POR CRITERIOS	N.A.

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN 1	0	N.A.	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
		100%		N.A.			
1	Se elaboró el Look Ahead de Edificaciones y Obras exteriores, se actualiza semanalmente	1		1			
2	Se elaboró el Análisis de Restricciones semanal, considerando todos los factores (Proyectos, materiales, mano de obra, equipos, subcontratos y herramientas)	1		1			
3	El Programa Semanal ha sido elaborado en base al look Ahead y ha pasado por el proceso de levantamiento de restricciones	1		1			
4	El PPC semanal se aproxima al 100%	1		1			
5	Las causas de los incumplimientos de lo programado son registrados en el formato de Análisis de Causas Incumplidas	1		1			
6	El capataz hace uso de la encuestación diaria con la ejecución de las actividades	1		1			
7	Se elabora el movimiento de personal diario. Se lleva el registro de los días anteriores.	1		1			
8	Se realiza el parte diario. Se lleva a cabo a partir de las actividades del look Ahead	1		0			
9	Se realiza el pedido de material cumpliendo con las fechas límites	1		1			
10	Junto con la subcontrata, se realiza la inspección de protección. El acuerdo se encuentra firmado por el Jefe de Producción, Superintendente y Subcontrata	1		N.A.			
11	Se lleva el registro con las actas de entrega de equipos y materiales en el almacén.	1		1			
12	El ISP se encuentra actualizado diariamente	1		1			
13	Se elabora el ISP de forma semanal	1		1			
14	El ISPI se encuentra actualizado diariamente	1		1			
15	Se elabora el ISPI de forma semanal	1		1			
16	La zona de trabajo se encuentra ordenada. Se identifican los altos y bajos rendimientos y se anotan las causas	1		1			
17	Se lleva a cabo de forma mensual la verificación de los riesgos críticos	1		N.A.			
18	Se lleva el acta de las reuniones semanales	1		1			
19	Las actividades de producción se encuentran respaldas con los PETS respectivos	1		1			
20	El Master Plan se encuentra actualizado (Semanal en MS Project)	1		N.A.			
21	Se lleva un acta que controla el pedido de materiales	1		1			
22	Se revisa, valida y firma valorizaciones de SC	1		1			

19/18 = 95%

[redacted]

[redacted]

	FORMATO **INSPECCIÓN SIG**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:

OBRA:			
JEFE DE OBRA:		**FECHA:**	

PUNTAJE PONDERADO	**97%**

1: Cumple / 0.5: Cumple Parcialmente / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
I. CONTROL DE DOCUMENTOS		**87%**			
1	Se mantiene actualizados los registros según la lista de registros (físico)	0.6	GTC: Falta actualizar lista de registros de GTC PROD: No se encontraron los PETS firmados en campo. La lista de PETS no estaba actualizada OT: No se ha hecho seguimiento a RFI que tienen más de un mes		
2	Se mantiene actualizados los registros según la lista de registros (digital)	0.8	ADM: Falta guardar registros, tales como: la póliza CAR GP: No se hace uso de la carpeta GP		
3	Se encuentra actualizada la lista de documentos externos	1.0			
4	El personal respectivo tiene acceso a las carpetas del onedrive	1.0			
5	Se utilizan los formatos actualizados	1.0			
II. INFORME MENSUAL		**100%**			
1	El jefe de obra revisa los informes mensuales de cada área	1.0			
2	Se hace el envío del informe mensual según el plazo acordado	1.0			
3	Se cumple con las acciones correctivas y preventivas de los indicadores que no cumplen con la meta	1.0			
III. GESTIÓN DEL RIESGO		**100%**			
1	Se actualiza de manera mensual la matriz de riesgos y oportunidades	1.0			
2	Se realiza el análisis correctamente	1.0			
3	Cuenta con las evidencias de la implementación de los controles adicionales aplicados	1.0			
IV. GESTIÓN DE LA OBRA		**100%**			
1	Se lleva acabo las reuniones semanales de la obra. Se cumple con los pendientes	1.0			
2	Se cumple con los pendientes de las reuniones semanales con el cliente	1.0			
3	El cuaderno de obras se encuentra actualizado	1.0			
4	Las lecciones aprendidas fueron implementadas				
5	El jefe de obra genera compromiso con el SIG (difusión de la política, charlas, etc.)	1.0			
6	En los comités de obra se comentan los resultados de los indicadores mensuales	1.0			

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

[redacted]

OBRA	[redacted]
RESPONSABLE DE SSOMA	
JEFE DE OBRA	FECHA: 01/10/19

PUNTAJE PONDERADO	96 %
PONDERADO POR CRITERIO	

1 Cumple / 0 No Cumple / N.A. No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN P	CALIFICACIÓN P		OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO		100%	N.A.	-			
1	El empleador provee a los recursos necesarios para que se ejecute lo establecido en el sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	#¡VALOR!				
2	Se ha ejecutado lo planificado en los diferentes programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	#¡VALOR!				
3	Se implementan acciones preventivas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para asegurar la mejora continua.	1	#¡VALOR!				
4	Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la accesibilidad y se fomenta altos niveles de SSOA.	1	#¡VALOR!				
5	Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en forma extra laboral, familiar, entidad pública o privada.	1	#¡VALOR!				
6	Se promueve y se fomenta la salud para reforzar la empatía entre trabajador y trabajador y trabajador.	1	#¡VALOR!				
7	Existen evaluaciones de desempeño del personal proactivo relacionado a la implementación del sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	#¡VALOR!				
POLITICA, OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SSOMA		100%	N.A.				
8	Se publica y explica al personal la Política SSOMA. Se tiene registros y el personal lo comprende.	1	#¡VALOR!				
9	Existen objetivos de seguridad definidos y el personal los conoce.	1	#¡VALOR!				
10	Se cumple con la entrega del reglamento interno de seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente.	1	#¡VALOR!				
11	Se encuentran identificados los requisitos legales y otros aplicables a la organización.	1	#¡VALOR!				
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		100%	N.A.	-			
12	El Plan de SSOMA se encuentra actualizado y debidamente firmado por las autoridades competentes.	1	#¡VALOR!	0	Faltan planos SSOMA etapa 3 y Anexos Cronograma		
13	Se cumple el Plan de SSOMA establecido en la Obra. Existen evidencias válidas del cumplimiento	1	#¡VALOR!	1			
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES		100%	N.A.	-			
14	Se comunican los riesgos a los trabajadores por actividad a área de trabajo, así como las medidas de control en cada caso.	1	#¡VALOR!	1	Charla Inducción		
15	Actúan organismos públicos de la Obra especificando cargos y responsabilidad.	1	#¡VALOR!	1			
16	La descripción de cargos incluyen las responsabilidades en materia de seguridad y salud ocupacional.	1	#¡VALOR!	1			
17	Las responsabilidades han sido debidamente difundidas al personal de supervisión y operativo.	1	#¡VALOR!	1			
18	La matriz IPERC se encuentra actualizada y publicada.	1	#¡VALOR!	0	Matriz IPERC Falta Actualizar		
19	El mapa de riesgos y de evaluación se encuentra actualizado, publicado, y entendido al personal.	1	#¡VALOR!	1			
CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIAS		100%	N.A.	-			
20	Se cuenta un Programa de capacitación establecido para la Obra.	1	#¡VALOR!	1			
21	Se cumple con la inducción al personal nuevo y/o transferido.	1	#¡VALOR!	1			
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		100%	N.A.	-			
23	Está instalado el comité de Seguridad y Salud Ocupacional (supervisor y fiscalizador), se realizan reuniones periódicas y se manejan actas respectivas.	1	#¡VALOR!	1	Recomendación		
24	Los trabajadores de las diferentes áreas conocen quienes son sus representantes en el comité de seguridad y salud ocupacional.	1	#¡VALOR!	1			
GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		100%	N.A.	-			
24	El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollen actividades trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores garantiza: La coordinación de la gestión de prevención de riesgos laborales.	1	#¡VALOR!	1			
25	La seguridad y salud de los trabajadores.	1	#¡VALOR!	1			
26	La verificación de la cumplimiento de las seguridad exigida en ley por cada empleador.	1	#¡VALOR!	1			
27	La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que desplacen su personal.	1	#¡VALOR!	1			
28	Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.	1	#¡VALOR!	1			
GESTIÓN DE CONTROL MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL		100%	N.A.	-			
29	El empleador realiza los exámenes médicos pre-ocupacional, periódicos y al término de la relación laboral a los trabajadores.	1	#¡VALOR!	1			
30	Los trabajadores son informados: A título grupal de los resultados para los indicadores de salud ocupacional.	1	#¡VALOR!	1			
31	A título personal, sobre los resultados de los exámenes médicos relativos a la evaluación de su salud.	1	#¡VALOR!	1			
32	Los resultados [redacted] médicos no son usados para ejercer discriminación.	1	#¡VALOR!	1			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

35	Investigación de los exámenes médicos con consideración para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.	1	si(SN/SI)				
36	Los trabajadores cuentan con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo vigente	1	si(SN/SI)				
GESTIÓN DE LOS REGISTROS		**100%**	**N.A.**				
35	El empleador lleva implementado registros y procedimientos del sistema de gestión actualizados y el adecuado del trabajador sobre lo siguiente: Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y peligros identificados, a fin de que deben constar la investigación y las medidas correctivas	1	si(SN/SI)				
38	Registro de examenes médicos ocupacionales.	1	si(SN/SI)				
39	Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y factores de riesgo psicosociales.	1	si(SN/SI)				
40	Registro de inspección interna de seguridad y salud en el trabajo.	1	si(SN/SI)				
41	Registro de estadísticas de seguridad y salud	1	si(SN/SI)				
42	Registro de equipos de seguridad y emergencia	1	si(SN/SI)				
43	Registro de inducción, capacitación, entrenamiento, y plan contra de emergencia	1	si(SN/SI)				
44	Registro de auditorías	1	si(SN/SI)				
45	Los registros mencionados son: • Legibles e identificables. • Resguardados y protegidos. • Son archivados y adecuadamente protegidos	1	si(SN/SI)				
ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA		**100%**	**N.A.**				
46	Area de trabajo está limpia y libre de residuos y escombros.	1	si(SN/SI)		Falta limpieza en SSH		
47	Pasillos y pasadizos están despejados.	1	si(SN/SI)				
48	Materiales y equipos están debidamente ordenados.	1	si(SN/SI)				
49	Cables eléctricos, mangueras, cables conductores para soldadura, etc. se hallan en buen estado y elevados para evitar riesgos de tropiezo.	1	si(SN/SI)				
50	Existe libre de acceso de material combustible alrededor de extintores.	1	si(SN/SI)				
GESTIÓN AMBIENTAL		**100%**	**N.A.**				
51	En las áreas de trabajo hay presencia de aguas potable y baños móviles para los varios.	1	si(SN/SI)				
52	Hay contenedores y recipientes para los diferentes tipos de residuos.	1	si(SN/SI)		Faltan tachos, no clasificados y el lugar presenta desorden y suciedad no corresponde		
53	Se ha identificado un acopio temporal de residuos sólidos debidamente señalizado.	1	si(SN/SI)				
54	Protecciones de orillas adecuadas instaladas (pasadizos) y mantenidas en su lugar	1	si(SN/SI)				
55	Baños químicos limpios, con dispensador de agua para manos, en cantidad suficiente y ubicados al pie	1	si(SN/SI)				
PREVENCIÓN EN EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS		**100%**	**N.A.**				
56	Se utilizan productos químicos aislantes con la empresa	1	si(SN/SI)				
57	Los productos químicos cuentan con rotulado, MSDS y están almacenados en el lugar indicado	1	si(SN/SI)				
58	Los productos químicos se encuentran herméticos, con etiquetas correspondientes y en buen estado	1	si(SN/SI)				
59	El almacén de los productos químicos deberá estar ventilado, limpio y ordenado	1	si(SN/SI)				
POSICIONES Y ACCIONES DE LA GENTE		**100%**	**N.A.**				
60	Los obreros de cada nivel trabajan a diferente nivel encuentran enfrentados, no se encuentra a cubierto bajo	1	si(SN/SI)				
61	Superficies resbaladizas que podrían causar quemaduras están protegidas	1	si(SN/SI)				
62	Se previene el sobreesfuerzo de los trabajadores al levantar, empujar, tirar o cargar.	1	si(SN/SI)				
63	Los trabajos sobre o debajo de otros trabajadores están controlados	1	si(SN/SI)				
64	No trabaja con carga suspendida	1	si(SN/SI)				
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		**100%**	**N.A.**				
65	La empresa con un registro de entrega y control de epp, en el cual se identifique el tipo de dotación y oportunidad de cambio.	1	si(SN/SI)				
66	Cascos de seguridad y barbijos con filtros y mascarillas contra el polvo.	1	si(SN/SI)				
67	Protección auditiva cuando es necesario.	1	si(SN/SI)				
68	Protección ocular usada de manera apropiada.	1	si(SN/SI)				
69	Botines de seguridad u otra tecnología reservada para los pies usados adecuadamente	1	si(SN/SI)				
70	Mascarillas protectoras de aerosoles usadas adecuadamente	1	si(SN/SI)				
71	Guantes son del tipo correcto y usados adecuadamente	1	si(SN/SI)				
72	Ropa de trabajo como uniformes y chalecas con cintas reflectantes.	1	si(SN/SI)				
73	Equipo de protección para soldadores usados adecuadamente	1	si(SN/SI)				
74	Gafas, respiradores, vestimenta resistente a productos químicos.	1	si(SN/SI)				
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA		**100%**	**N.A.**				
75	Hay barreras/barreras instaladas y en buenas condiciones para proveer caídas cuando sea de una altura según se requiere	1	si(SN/SI)		Existe Cinta pero con mala ubicación Falta una señalización en la escalera		
76	Rutas de evacuación señaladas según se requiere y en buenas condiciones.	1	si(SN/SI)				
77	Letreros de advertencia : Materiales en mantenimiento y pasos peligrosos y señales están colocados y son claras.	1	si(SN/SI)		Falta letrero de prohibido el paso		
78	Protección de Equipos (Extintores, Poleas, Cables de Transmisión) y señales en su lugar y en buenas condiciones.	1	si(SN/SI)				
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES		**100%**	**N.A.**				
79	Las herramientas son adecuadas para el trabajo a efectuarse	1	si(SN/SI)				
80	Son usadas correctamente.	1	si(SN/SI)				
81	Están en condiciones seguras almacenadas.	1	si(SN/SI)				
82	Cables eléctricos – extensiones con conexión a tierra en el sitio.	1	si(SN/SI)				
83	Movimientos inseguros durante el uso de la herramienta.	1	si(SN/SI)				
84	Bordes de corte y dientes cubiertos correctamente.	1	si(SN/SI)				
85	El personal asignado para la utilización de herramientas eléctricas cuenta con la debida autorización y capacitación	1	si(SN/SI)				
86	Herramientas son debidamente transportadas y almacenadas.	1	si(SN/SI)				
87	Equipos eléctricos según normas y estándar y aislamiento.	1	si(SN/SI)				
88	Equipos [illegible]	1	si(SN/SI)				

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
VIGENCIA:

87	Los apoyos de concreto se fabricaron según requerimientos ajustados (5 mm. Separación respecto a la viga de apoyo) y los cuales están debidamente protegidos	1	B-DIV/DI	B			
88	Las herramientas (eléctricas, manuales) se almacenan adecuadamente en bolsos de actividad (Seguridad para no tropezar usuario).	1	B/DIV/DI	B			
89	Extintores seleccionados, ubicación en forma adecuada y bajo estándar y/o Norma NTC	1	B-DIV/DI	B			
EXCAVACIONES		**100%**	**N.A.**	-			
90	Talud y estibado ejecutado según norma GTC.	1	B-DIV/DI	B			
91	Estado señalización de la excavación en lugar visible.	1	B-DIV/DI	B			
92	Existen vías de acceso y salida cada 7,5 metros	1	B-DIV/DI	B			
93	Cuentan con escaleras y se mantienen en condiciones seguras.	1	B-DIV/DI	B			
94	Existe protección contra caídas (Barreras, Vigías)	1	B-DIV/DI	B			
95	Excavación a más de 1,20 mts. De profundidad, cuenta con vigía.	1	B-DIV/DI	B			
96	Personas a más de la mitad de la profundidad de la excavación en medida del borde.	1	B-DIV/DI	B			
ANDAMIOS Y ESCALERAS		**100%**	**N.A.**	-			
97	Construidos por especificaciones técnicas de fabricante.	1	B-DIV/DI	B			
98	Cuentan con vías de acceso y salida apropiadas.	1	B-DIV/DI	B			
99	Plataformas completamente (Según Norma vigente aplica).	1	B-DIV/DI	B			
100	Se mantienen en forma segura (no sufren mala maniobras).	1	B-DIV/DI	B	Andamio fuera servicio / Cerrado		
101	Escaleras apropiadas, construidas y realizado adecuadamente amarres.	1	B-DIV/DI	B			
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		**100%**	**N.A.**	-			
102	Arnés de seguridad en uso y cuenta con cuerda de anclaje adecuada.	1	B-DIV/DI	B			
103	Las líneas de vida están adecuadas e instaladas a la aprobación de calidad.	1	B-DIV/DI	B			
104	Protección perimetral rígida según estándar.	1	B-DIV/DI	B			
105	Líneas de vida estáticas, retráctiles, instalados y soportan una fuerza mínima de 2.400 Kg.	1	B-DIV/DI	B			
106	Equipos de protección contra caídas son usados solamente para este objetivo.	1	B-DIV/DI	B			
107	Equipos de protección contra caídas son inspeccionados y usados en forma segura.	1	B-DIV/DI	B			
108	Los bastones que conforman la baranda en obra, para colocación de línea de vida, están perfectamente anclados para asegurar su resistencia.	1	B-DIV/DI	B			
109	Líneas de vida cuentan con autorización de debidamente firmada y reporte en documento de seguridad.	1	B-DIV/DI	B			
EQUIPOS DE LEVANTE DE CARGA		**100%**	**N.A.**	-			
110	Estado de capacidad señalizada para el levante y con tabla de cargas en el equipo visible (cabina).	1	B-DIV/DI	B			
111	Cable en buen estado y seguro del gancho en buenas condiciones con especificación vigente	1	B-DIV/DI	B			
112	Accesorios de levante (eslingas, grilletes, estribos) en buenas condiciones y con la señalización del caso.	1	B-DIV/DI	B			
113	Medias caídas y otros protectores de eslingas usadas como corresponde	1	B-DIV/DI	B			
114	Se usan técnicas de levante apropiadas (según plan, etc.).	1	B-DIV/DI	B			
115	Equipo/Maquinaria con certificación vigente.	1	B-DIV/DI	B			
EQUIPOS MÓVILES DE CONSTRUCCIÓN		**100%**	**N.A.**	-			
116	Cucas, frenos, bocinas, alarmas trabajando en excelente estado, retiro en buen estado.	1	B-DIV/DI	B			
117	Equipos y vehículos cuentan con cinturones de seguridad y adecuados usos.	1	B-DIV/DI	B			
118	Mantenidos apropiado / Inspección Mensual / chequeo previos	1	B-DIV/DI	B			
119	Revisión técnica vigente.	1	B-DIV/DI	B			
120	Equipo usado adecuadamente.	1	B-DIV/DI	B			
121	Cargas transportadas en forma segura.	1	B-DIV/DI	B			
122	Licencias / cartas de operario / Condiciones vigentes.	1	B-DIV/DI	B			
123	Vehículos / Maquinaria con falla reportada y retirada de los frentes.	1	B-DIV/DI	B			
124	Equipos Móviles de Construcción con escalinata con vigía o señalero cuando distancia de visibilidad sea limitada.	1	B-DIV/DI	B			
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		**100%**	**N.A.**	-			
125	Los materiales inflamables almacenados adecuadamente.	1	B-DIV/DI	B			
126	Cilindros de oxígeno y gases combustibles se almacenan separados.	1	B-DIV/DI	B			
127	Los cilindros y materiales están adecuadamente etiquetados indicando su contenido.	1	B-DIV/DI	B			
128	Extintores en la cuadra, localizados e inspeccionados en forma debida.	1	B-DIV/DI	B			
129	Los cilindros de gas comprimido son almacenados y transportados adecuadamente.	1	B-DIV/DI	B			
130	Conexiones de trabajo en caliente e puntos para soldar con sus respectivos.	1	B-DIV/DI	B			
131	Manómetros y válvulas están completamente visibles y en buenas condiciones	1	B-DIV/DI	B			
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES		**100%**	**N.A.**	-			
132	Cargas transportadas en forma segura, uso de rachets y otros.	1	B-DIV/DI	B			
133	Cargas y materiales almacenados en forma segura.	1	B-DIV/DI	B			
134	Se usan cuñas y topes adecuados.	1	B-DIV/DI	B			
135	Altura de materiales no tiene riesgo.	1	B-DIV/DI	B			
136	Señalización de acuerdo a actividad (Riesgo, NEPA, Elementos de Actividades).	1	B-DIV/DI	B			
RESPUESTA A EMERGENCIAS		**100%**	**N.A.**	-			
137	Dentro del grupo trabajo hay trabajadores con preparación en primeros auxilios. Se tiene organizada la brigada de emergencia.	1	B-DIV/DI	B			
138	Trabajadores saben como actuar ante derrames o escapes, etc.	1	B-DIV/DI	B			
139	Trabajadores saben como actuar en caso de incendios.	1	B-DIV/DI	B			
140	En el área hay una estación de emergencia y esta contiene todos los elementos requeridos/ En caso de ausencia indicar en el plan de la atención de emergencia.	1	B-DIV/DI	B			
141	Trabajadores conocen la ubicación de las puertas de escape y/o reunión.	1	B-DIV/DI	B			
142	Trabajadores conocen el flujo de comunicación en caso de incidentes / Acciones a operarias en emergencia y reportes medios.	1	B-DIV/DI	B			
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES CONSECUTIVOS		**100%**	**N.A.**	-			
143	El flujo de reporte de incidentes es cuenta y utilizado en lugar visible y es de conocimiento del personal.	1	B-DIV/DI	B			
144	Se mantienen registros de la investigación de los accidentes ocurridos en obra.	1	B-DIV/DI	B	Falta registro inv. Incidentes 29/09		
145	Los accidentes son investigados por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y directivos a cargo.	1	B-DIV/DI	B			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

146	Se llevan las acciones correctivas y/o preventivas oportunamente y se verifica su eficacia. La metodología es la apropiada.	1	0 (NA/NI)	/			
ESPECIFICOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		100%	N.A.				
147	ATS en el lugar de trabajo y las medidas objetivas se encuentran implementadas	1	0 (NA/NI)	/			
148	Otros procedimientos, existen y están en el lugar. Trabajadores capacitados en procesos constructivos	1	0 (NA/NI)	/	Actualización		
149	Se cuenta con los permisos específicos para realizar la tarea, en caso de ser necesario (Trabajo en Altura, Espacio Confinado, Trabajo en Caliente, etc.).	1	0 (NA/NI)	/			
150	Se encuentra el capataz y/o supervisor a cargo de la tarea en el lugar.	1	0 (NA/NI)	/			
151	IPERC y Análisis de riesgo seguro (ATS) están en terreno (según criticidad).	1	0 (NA/NI)	/			
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		100%	N.A.				
152	La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiado y efectivo.	1	0 (NA/NI)	/			
153	La investigación y/o informes permiten a la dirección de la empresa, entre otras cosas, evaluar los fallos pasados y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo.	1	0 (NA/NI)	/			

[redacted]

R

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

PROYECTO:	[redacted]		
RESPONSABLE EN OBRA:	[redacted]	FECHA:	27/12/2019

PUNTAJE PONDERADO	100%

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CAPITAL HUMANO					
1	Entrega del tareo semanal todos los lunes al mediodía (JA)	1			
2	Presentación de las solicitudes de liquidación del personal obrero al área de Capital Humano de manera oportuna, dicho(s) documento(s) deben contener las firmas de los responsables.	1			
3	Custodiar el cargo de presentación del tareo semanal con las firmas respectivas.	1			
4	La información del Tareo debe ser revisado y no contener errores	1			
5	Tener actualizado el file personal de los trabajadores (obreros).	1			
6	Enviar semanalmente la matriz de contratistas a la Jefatura de Administración con copia al Jefe y Superintendente de Obra (la información presentada debe encontrase actualizada en los diferentes *items* solicitados)	1			
7	Informar oportunamente las incidencias diarias por ausencia (enfermedad) a las areas correspondientes.	1			
8	Tener actualizada y empastadas las boletas de pago del personal obrero, las cuales deben contener la firma del trabajador.	1			
9	Llevar el registro de asistencia del personal (obrero) actualizado.	1			
10	Entregar oportunamente los DM originales del personal de obra: 1) Personal obrero: al area de Bienestar Social. 2) Personal Staff: a la Jefatura de Administración de Obras.	1			
11	Tener actualizadas las polizas de SCTR del personal staff y obrero	1			
12	Informar oportunamente todo cese del personal obrero y de limpieza	1			
13	Cumplir con el cronograma de entrega de informe de personal para el RO	1			
TESORERÍA					
14	Entregar el fondo fijo para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
15	El fondo fijo no debe contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
16	Todo arqueo de caja chica no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
17	Las compras a través de la caja chica deben efectuarse sólo a proveedores con los cuales no contamos con línea de crédito.	1			
18	Mantener una adecuada custodia del file del fondo fijo.	1			
19	Mantener actualizados el cuadro de garantías (Cartas Fianza, Letras de cambio)	1			
CONTABILIDAD					
20	Entrega de las facturas semanales para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
21	Las facturas no deben contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			

	FORMATO INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:

22	Mantener una adecuada custodia del file de las facturas presentadas semanalmente.	1			
23	No deben permanecer en obra facturas de meses anteriores.	1			
24	Todas las guías de remisión(original) deben contener el sello de recepción del área de	1			
25	Las facturas de concreto que se presentan para pago deberán presentar el cuadro "	1			
26	Presentación de entregables del mes (Kardex, ingreso y egresos)	1			
27	Presentación y custodia de las guías de remisión de Besco	1			
28	Envío de facturas (migración S10) los días miércoles	N.A.			
ALMACENES					
29	Entrega de los informes de inventario los primeros 2 días hábiles del mes	1			
30	Llevar un adecuado control en la emisión de las Guías de Remisión	1			
31	Registro diario de los ingresos y salidas de almacén en el S10	1			
32	Actualización diaria de las Bincard	1			
33	Llevar un ambiente de Almacén limpio y ordenado	1			
34	Tener actualizado el kardex de EPP tanto en fisico como vía electrónica.	1			
35	El inventario mensual no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
36	Los materiales se colocan según recomendaciones del proveedor (caja)	1			
37	Los productos químicos cuentan con las Hojas MSDS	1			
LOGÍSTICA					
38	Cumplir con el cronograma de compras(pedidos los miércoles).	N.A.			
GUARDIANÍA					
39	Toda incidencia presentada por el servicio de vigilancia debe ser primero canalizada por el area de administración de obra.	1			
40	Reunión quincenal con la empresa de vigilancia.	1			
41	Requizas a los ambientes de los subcontratistas.	1			
42	Requizas al personal obrero.	1			
	PROMEDIO PONDERADO	**100%**			

V.B. Inspector

V.B. Inspeccionado

[redacted]

FORMATO
INSPECCIÓN MENSUAL DE BIENESTAR SOCIAL EN OBRA

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

OBRA:	[redacted]	FECHA:	27/10/2020
RESPONSABLE BS:		PUNTAJE PONDERADO	95%
JEFE DE OBRA:			
JEFE DE AREA:			

PUNTOS DE EVALUACIÓN					RESULTADO	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
Obra	Código	Procedimientos	Cumple	Preguntas				
Pre C	[redacted]	Planilla 65	[redacted]	[redacted]	1	[redacted]		
Pre C		Inducción correspondiente en obra			1			
Pre C					1			
Ejec I		Ejecución actividades Plan BS			1			
Ejec I					1			
Ejec I					1			
Ejec I					1			
Ejec I					1	[redacted]		
Ejec I					0	[redacted]		
Ejec I		Registros de ellas Cierre/cumplimiento			1			
Cierr		Gestión de prestaciones asociativas - Calidad			1			
Cierr					1			
Cierr					NA			
Cierr		Supervisión de servicios de apoyo			1			
Cierr					1			
Cierr					1			
Cierr		Supervisión de concesionario de cobro y aseo			1			
Cierr					1			
Cierr					1			
Cierr					1			
Cierr		Informe final estado ejecución			1			
Cierr					1			
Cierr		Presentación de Memoria descriptiva BS			NA			
Pre I		Aviso inicio de trabajos			1			
Pre I		Elaboración Matriz de RSE			1			
Pre I					1			
Pre I		Inducción viviendas colindantes - Inicio			1			
Pre I					1			
Pre I					NA			
Pre I					1			
Ejec I		Gestión con vecinos			NA			
Ejec I					NA			
Ejec I					NA			
Cierr		Inducción viviendas colindantes - Cierre			NA			
Cierr					NA			
Cierr					NA			
Cierr					NA			
Cierr		Presentación de Memoria descriptiva BS			NA			

[redacted]

[redacted]	FORMATO INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUPERVISOR DE GTC:	

PUNTAJE PONDERADO	74.82%

Item	Puntos de Evaluación	Calificación		Observaciones	Fecha de Levantamiento	Compromisos y Acciones Preventivas
		T	-			
Resultados de la Planificación		100%	-			
1	Cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar la aprobación del Plan de Calidad y cumplimiento de presentación con Hitos de Inspección*	1	1	Revisar el PPI	31/01/2020	Actualizar el PPI
2	Cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar la aprobación de los Planes de Calidad de los proveedores requeridos de especificación*	1	1			
Resultados de Gestión		75%	-			
3	Verificación del promedio de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de lo mínimo establecido (≥ 85%)*	0	0	81.06% Demora en levantamiento de observaciones Arquitectura.	26/12/2019	Realizar un análisis de causa raíz de las observaciones más predominantes
4	Cumplimiento del envío de [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del envío de los días hábiles*	1	1			
5	Cumplimiento del envío del [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del envío en fecha acordada por GTC*	1	1			
6	Verificación del cumplimiento [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de lo mínimo establecido (≥ 95%)*	1	1	97.6% Promedio de Limpieza y Seguridad		
Uso de Protocolos		50%	-			
7	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la implementación del registro de los protocolos aprobados*	1	1			
8	Verificación del correcto uso de los [redacted] **Criterio: Verificar que todo protocolo se encuentre correctamente llenado y firmado*	0	0	Se evidencia borrones y uso de correctores, falta Registros	26/12/2019	Rehacer todos los protocolos con datos errados
Recibido de Materiales Críticos		50%	-			
9	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la implementación del registro de recepción de materiales críticos*	1	1			
10	Verificación del correcto uso de [redacted] **Criterio: Verificar que todos los formatos se encuentren correctamente llenados y firmados y con la copia de la guía de remisión debidamente sellada*	0	0	Falta la entrega de Certificado de calidad de Materiales	30/12/2019	Regularizar los certificados de calidad de materiales
Equipos de Medición y Ensayos		75%	-			
11	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la ejecución de los ensayos de control de concreto de mezcla propia y de subcontrato*	1	1	Verificación de control de recepción de concreto	31/12/2019	Verificar resultados de campo
12	Verificación del cumplimiento de los ensayos según los para [redacted] **Criterio: Verificar la documentación de los ensayos del concreto contra los ingresos a obra*	0	0	Resultados de ensayos de resistencia de muros incompletos.	6/01/2019	Enviar muestras a laboratorio de UNI, y realizar los ensayos
13	Verificación del cumplimiento del cuadro de probetas y su envío para ensayo **Verificar copia del cuadro (Enviados y obs, cuadro de probetas identificadas) y envío para ensayos (7 y 28 días).*	1	1			
14	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de resultados de ensayos de resistencia del concreto*	1	1			
Capacitaciones de Calidad		100%	-			
15	Verificación del cumplimiento [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de lo mínimo establecido (≥ 85%)*	1	1			
16	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del Plan según programación anual*	1	1			
17	Verificación del correcto uso de [redacted] **Criterio: Verificar que el formato y evidencia cumplimiento de [redacted]					

[redacted]

[redacted]	NIBAVIO INSPECCIÓN DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD	CÓDIGO VERSIÓN FECHA [redacted]

Observaciones y No Conformidades		**37%**	-			
18	Corrección cinta co[redacted] **Criterio: Que hayan corregido en la cinta indicada en la OC - Calidad	0	0	Ok. OC N.C. cerradas	8/01/2020	Explorar Cerrar las N.C.
19	Verificación de[redacted] **Criterio: Verificar que los trabajadores conocen el procedimiento de [redacted] y son conscientes de su rol en el proceso.	1	1			
20	Verificación de la no inserción del bisel [redacted] **Criterio: Verificar la no inserción del bisel en el proceso de [redacted] (Si/No) (Fotografía de [redacted] y [redacted] en el proceso)	0	0	No se han resuelto todas las N.C.	6/02/2020	Cerrar las N.C.
21	Verificar Anclaje [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de [redacted] (Si/No)	0	0	0/180 [redacted]	20/12/2019	[redacted]
22	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio: Verificar la aplicación del formato y datos "Observaciones generales de las Observaciones"	1	1			
23	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar que [redacted] en campo están [redacted] y [redacted] Check del Anexo 07.	1	1	Hacer pendientes de actualización.	7/01/2020	Notificar oportunamente la falta de actualización de datos.
24	Verificación de [redacted] **Criterio: Revisar que los [redacted] en campo están en vigencia y [redacted]	1	1			
Cumplimiento de Responsabilidades		**67%**	-			
25	Verificación del C[redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento del [redacted] en el formato [redacted]	1	1	Registro incompleto	21/12/2019	Regularizar registro de Revisión de Materiales críticos
26	Verificación en C[redacted] **Criterio: verificar [redacted] del área responsable de conformidad.	1	1			
27	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar [redacted] de la calidad y ambiental.	0	0	Incumplimiento en detección de PEMC, Producción y I.O.	Permanente	[redacted]
Costos de Calidad		**100%**	-			
28	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar la correlación de costos generados en el [redacted]	1	1	Falta sustento de costo de proveedor.	23/12/2019	Aclarar con O.T. los costos de calidad y No Calidad
Diseño de Calidad		**N.A.**	-			
29	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento y actualización del [redacted] con la información física y registros de la documentación requerida. Se deberá coordinar además el cumplimiento del esquema de elevación de la documentación.	N.A	N.A			
30	Verificación [redacted] **Criterio: Verificar evidencia fotográfica de Operación de [redacted] especificaciones. Anexos y planos del [redacted]	N.A	N.A			
31	Verificación de elaboración [redacted] **Criterio: Verificar la elaboración de los [redacted]	N.A	N.A			

Nota: / Cumple / O No Cumple / N.A. No Aplica

[redacted]

[redacted]

FORMULARIO
DECLARACIÓN ANUAL DE RENTA PERSONAS NATURALES AÑO GRAVABLE 2019

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE PRODUCCIÓN EN OBRA

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

OBRA:	[redacted]
RESPONSABLE DE PROY:	
JEFE DE OBRA:	FECHA: 26/12/19

PUNTAJE POSIBLE(A)	100%
OTORGADO POR CRITERIO	N.A.

1= Cumple / 0= No Cumple / N.A.= No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
		1	0	N.A.			
1	Se elabora el Look Ahead de 3 semanas y Obras exteriores, se analiza semanalmente.	1	1				
2	Se elabora el Análisis de Restricciones semanal, considerando los rubros de mano de obra, materiales, mano de obra, equipos, subcontratos y herramientas.	1	1				
3	El Programa Semanal ha sido elaborado en base al Look Ahead y no pasado por un proceso de levantamiento de restricciones.	1	0				
4	El PPC semanal se acerca al 100%.	1	1				
5	Los causas de incumplimiento de la programación son registradas en el formato de Análisis de Causas Incumplidas.	1	1				
6	El Capataz hace uso de la programación diaria para la ejecución de las actividades.	1	1		NO SE PLANIFICA SEMANAL		
7	Se efectúa el reconteo de personal diario. Se lleva el registro de los días anteriores.	1	1		ACTUALIZAR EN FISICO		
8	Se realiza el tareo diario. Se lleva a cabo a partir de las actividades del Look Ahead.	1	1				
9	Se realiza el pedido de material cumpliendo con las fechas límites.	1	1				
10	Antes cada subcontrato, se realiza la conciliación de metrados. El acuerdo se encuentra firmado por el Jefe de Producción, Superintendente y Subcontrato.	1	0		LO HACE O.T.		
11	Se lleva el registro con los sellos de control de equipos y materiales en el almacén.	1	1				
12	El ISP se encuentra actualizado diariamente.	1	0		REVISAR INFORMACION		
13	Se elabora el ISP de forma semanal.	1	1				
14	El ISM se encuentra actualizado diariamente.	1	1				
15	Se elabora el ISM de forma semanal.	1	1				
16	La curva de rendimiento se encuentra actualizada. Se identifica los picos y bajos rendimientos y se analizan las causas.	1	1				
17	Se lleva a cabo de forma mensual la calificación a subcontratistas.	1	NA				
18	Se lleva el acta de las reuniones semanales.	1	1				
19	Las actividades de producción se encuentran respaldas por los PETS respectivos.	1	1				
20	El Master Plan se encuentra actualizado (formato en MS Project).	1	0				
21	Se lleva un adecuado control en el gestión de residuos.	1	0				
22	Se revisa, valida y firma valorizaciones a SC.	1	1				

21 17 ≈ 80%

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

[redacted]

OBRA:	[redacted]
RESPONSABLE DE SSOMA:	
JEFE DE OBRA:	FECHA: 19/12/19

PUNTAJE PONDERADO	94%
PONDERADO POR CRITERIOS	

1. Cumple / 0. No Cumple / N.A. / No Aplica

Nº	ASPECTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN 1	CALIFICACIÓN a		OBSERVACIONES	PLAZO DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO		100%	N.A.	-			
1	El empleador implementa los mecanismos necesarios para dar cumplimiento al sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	#####	1			
2	Se ha cumplido la planificación de los diferentes programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	#####	1			
3	Se implementan acciones preventivas en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para asegurar la mejora continua.	1	#####	1			
4	Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fortalece el trabajo en equipo.	1	#####	1			
5	Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.	1	#####	1			
6	Se promueve un buen clima laboral para informar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa.	1	#####	1			
7	Existen mecanismos de reconocimiento del personal por los aportes brindados en el mejoramiento continuo de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	#####	1	Presentación del Mes	hasta Oct. 2019	
POLITICA, OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SSOMA		100%	N.A.	-			
8	Se publica y conoce al personal en la Política SSOMA. Se tiene registros y el personal lo ha comprendido	1	#####	1	05/11		
9	Existen objetivos de seguridad definidos y el personal los conoce.	1	#####	1	06/11		
10	Se cumple con la entrega del Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	1	#####	1			
11	Se encuentran identificados los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización	1	#####	1			
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		100%	N.A.	-			
12	El Plan de SSOMA se encuentra actualizado y debidamente firmado por las autoridades competentes.	1	#####	1	Falta firmas para Plan SSOMA	Plan SSOMA terminar Etapa	
13	Se cumple el Plan de SSOMA establecido en la Obra. Evidencias en las actividades del cronograma	1	#####	1			
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES		100%	N.A.	-			
14	Se conocen los riesgos a los trabajos diarios por actividad y área de trabajo, así como las medidas de control en cada caso.	1	#####	1			
15	Existe un organigrama publicado de la Obra especificando cargos y responsabilidad.	1	#####	1			
16	La descripción de cargos incluyen las responsabilidades en materia de seguridad y salud ocupacional.	1	#####	1			
17	Las responsabilidades han sido debidamente difundidas al personal de supervisión y operativo.	1	#####	1			
18	El mapa de PERC se encuentra actualizado y publicado	1	#####	0	No esta actualizado		
19	El mapa de riesgos y de evaluación se encuentra actualizado, publicado, y difundido al personal.	1	#####	1			
CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIAS		100%	N.A.	-			
20	Se cumple el Programa de capacitación establecido para la Obra	1	#####	1	Falta capacit: Inter/Charlas Mayo 2019		
21	Se cumple con la inducción al personal nuevo y/o transferido	1	#####	1			
COMITÉ DE PREVENTIVO Y SALUD OCUPACIONAL		100%	N.A.	-			
22	Está formalizado el comité de Seguridad y Salud Ocupacional (Supervisar si fuere aplicable), se realizan reuniones periódicas y se manejan las actas respectivas.	1	#####	1			
23	Los trabajadores de las diferentes áreas conocen quienes son sus representantes en el comité de seguridad y salud ocupacional.	1	#####	1			
GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		100%	N.A.	-			
24	El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollen actividades, trabajadores de servicios, subcontratistas, empresas temporales de servicios o cooperativas de trabajadores asociados: La responsabilidad de la gestión en prevención de riesgos laborales.	1	#####	1			
25	La seguridad y salud de los trabajadores.	1	#####	1			
26	La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.	1	#####	1			
27	La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su personal.	1	#####	1			
28	Todos los trabajadores deben estar afiliados en riesgos laborales a la seguridad y salud en el trabajo, tengan o no tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.	1	#####	1			
GESTIÓN DE CONTROL MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL		100%	N.A.	-			
29	Planificación de exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores.	1	#####	1			
30	Los trabajadores son informados Actitud grupal de las personas por [redacted]	1	#####	0	No se evidencia charla o capacit		
31	Actitud consciente sobre los resultados [redacted] por relativos a la evaluación de su salud.	1	#####	1			

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

32	Las conexiones de las viviendas vecinas no son peligrosas para ejecutar (Observación).	1	*****	1			
33	Las medidas de las viviendas vecinas son consideradas para tomar posibles preventivos o correctivos si aplica.	1	*****	1			
34	Los trabajadores cuentan con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo vigente.	1	*****	1			
GESTIÓN DE LOS REGISTROS		**100%**	**N.A**	-			
35	El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión en el lugar y a disposición del trabajador referidos a: Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y actos inseguros, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.	1	*****	1			
36	Registro de exámenes médicos ocupacionales.	1	*****	1			
37	Registro del monitoreo de agentes físicos químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo ergonómicos.	1	*****	1	Se efectuó en Nov-Dic 2019 Agosto 2019		
38	Registro de inspecciones internas en seguridad y salud en el trabajo.	1	*****	1			
39	Registro de estadísticas de accidentes y salud.	1	*****	1			
40	Registro de equipos de seguridad e emergencia.	1	*****	1			
41	Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.	1	*****	1			
42	Registro de auditorías.	1	*****	1			
43	Los registros antes citados son: - Legibles e identificables. - Fácil de ser recuperados. - Son archivados y adecuadamente protegidos.	1	*****	1			
ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL EN OBRA		**100%**	**N.A**	-			
44	Área de trabajo limpia, libre de residuos y escombros.	1	*****	1			
45	Pasillos y pasadizos están despejados.	1	*****	1			
46	Materiales y equipos están debidamente ordenados.	1	*****	1	Ordenar y limpiar Constante y Falta de Contratistas		
47	Zonas eléctricas, con guardianes, están aseadas para mayor seguridad, con protección buen estado y elevadas para evitar riesgos de tropiezos.	1	*****	1			
48	Área libre de tropezones evitando accidentes por caídas.	1	*****	1			
GESTIÓN AMBIENTAL		**100%**	**N.A**	-			
49	En las áreas de trabajo hay provisión de agua potable y hay basureros para los mismos.	1	*****	1			
50	Hay contenedores y depósitos para los diferentes tipos de residuos.	1	*****	1			
51	Se ha identificado un acopio temporal de residuos sólidos debidamente señalizado.	1	*****	0	Sistema Inadecuado/Falta Visto del Contratista del Suelo		
52	Protectores de enfriadores instalados (tapa chorros) y mantenidas en su lugar.	1	*****	1			
53	Baños y vestidores limpios, con dispensadores de agua para manos, en cantidad suficiente y ventilados al aire.	1	*****	1			
PREVENCIÓN EN EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS		**100%**	**N.A**	-			
54	Solo se usan productos químicos autorizados por la empresa.	1	*****	1			
55	Los productos químicos existentes en las obras MSDS y están ubicados en el lugar indicado.	1	*****	0	Presencia de PQP en los casetas,		
56	Los productos químicos se encuentran rotulados, con el envase correspondiente y en buen estado.	1	*****	0	falta rotular del los contratistas, R2D de Contratista H&F, CALLIN, MUEBAC		
57	El almacén de los productos químicos debe estar en lugar ventilado, limpio y ordenado.	1	*****	1			
POSICIONES / ACCIONES DE LA GENTE		**100%**	**N.A**	-			
58	Las zonas de caída al mismo nivel o diferente (pendientes) se encuentran señalizadas con cinta de peligro.	1	*****	1			
59	Superficies de techos que presenten riesgo de caída están protegidas.	1	*****	1			
60	Se previene el sobreesfuerzo de los trabajadores al levantar, empujar, tirar o deslizar.	1	*****	1			
61	Los trabajos sobre o bajo de otros trabajadores están controlados.	1	*****	1			
62	No trabaja con cargas suspendidas.	1	*****	1			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		**100%**	**N.A**	-			
63	Se cuenta con un registro de entrega y cambio de epp, en el cual se identifique el tiempo de rotación y durabilidad de cada uno.	1	*****	1			
64	Cascos de seguridad y zapatos no son usados y mantenidos como se requiere.	1	*****	1			
65	Protección auditiva usada apropiadamente.	1	*****	1			
66	Protección ocular usada de manera apropiada.	1	*****	1			
67	Líneas de seguridad u otra protección requerida para los pies usadas adecuadamente.	1	*****	1			
68	Máscaras protectoras usadas adecuadamente.	1	*****	1			
69	Guantes son del tipo correcto y usados adecuadamente.	1	*****	1			
70	Ropa de trabajo como uniformes y chalecos con distintivos reflectantes.	1	*****	1			
71	Equipo de protección para soldadores usados adecuadamente.	1	*****	1			
72	Cinturones de seguridad, sistema anticaídas o medios similares.	1	*****	1			
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA		**100%**	**N.A**	-			
73	Hay barreras, barandas, instalaciones y en buenas condiciones para prevenir caídas a distinto nivel de trabajadores expuestos a riesgos.	1	*****	1			
74	Vallas de protección y señalización instaladas según se requiere y en buenas condiciones.	1	*****	1			
75	Letreros de advertencia - Mantenimiento en buen estado y convenientemente colocados y son claros.	1	*****	1			
76	Protección de la obra (Fregaderos, Tolvas, Cernidores y similares) en su lugar y en buenas condiciones.	1	*****	1			
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES		**100%**	**N.A**	-			
77	Las herramientas son adecuadas para el trabajo (no hechizos).	1	*****	1			
78	Son usadas correctamente.	1	*****	1			
79	Están en condiciones seguras e inspeccionadas.	1	*****	1			
80	Cables eléctricos - extensiones, en condición e inspección al día.	1	*****	1			
81	Protectores de seguridad del motor, adecuadamente.	1	*****	1			
82	Discos en buen y adecuado estado correctamente.	1	*****	1			
83	Cuenta con el registro para la utilización de herramientas por personal autorizado y debidamente capacitado.	1	*****	1			

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

[redacted]

84	Herramientas manuales en buen estado, transportadas y almacenadas	1	#####	/			
85	Tableros Electricos según norma (Señalizados y aterrizados.	1	#####	/			
86	Luminaria Electrica (portátiles-as, etc.) energizadas	1	#####	/			
87	Extensiones de energía de buen estado (sin daños aislamiento) Tipo. Separación mínima de la humedad, aislado y las fuentes correctamente conectadas	1	#####	/			
88	Los herramientas rotativas se retienen utilizan de protección al ojos (Careta) Uso de gafas de acrilo de hombre material.	1	#####	/			
89	Conexiones eléctricas aseguradas en forma adecuada y bajo estándar de la Norma 2050	1	#####	/			
EXCAVACIONES		100%	N.A.	-			
90	Talud y entibado adecuado según norma GOSC	1	#####	/			
91	Cinta señalización de la excavación en su perímetro	1	#####	/			
92	Existen vías de acceso y salida de más de 7,5 metros	1	#####	/			
93	Diariamente se inspeccionan y se las mantiene en condiciones seguras.	1	#####	/			
94	Cubre protección contra caídas (Barreras y otros)	1	#####	/			
95	[redacted] a más de 1.20 mts. de profundidad, cuentan con escala	1	#####	/	N/A		
96	Excavación a más de la mitad de la profundidad con la compactación mínima exigida	1	#####	/			
ANDAMIOS Y ESCALERAS		100%	N.A.	-			
97	Construidos con especificaciones técnicas del fabricante.	1	#####	/	[redacted]		
98	Cuentan con vías de acceso y salida apropiadas.	1	#####	/			
99	Estructura, barandas, puntos de Anclaje, Crucetas, Apoyo.	1	#####	/			
100	Se mantienen en forma segura (no sufren modificaciones).	1	#####	/			
101	Escaleras apropiadas para el trabajo que están? adecuadamente ubicadas.	1	#####	/			
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		100%	N.A.	-			
102	Arnés de seguridad en perfecto estado de manera adecuada	1	#####	/			
103	Las líneas de vida están adecuadamente aseguradas a un soporte anclado	1	#####	/			
104	Protección perimetral rígida visible y estable	1	#####	/			
107	Líneas de vida estáticas, cilíndricas (flexibles) y horizontales fuerza mínima de 1.450 kg.	1	#####	/			
105	Equipos de protección contra caídas son usados adecuadamente para el objetivo.	1	#####	/			
107	Equipos de protección contra caídas con inspeccionados y mantenidos en forma regular.	1	#####	/			
108	Los bastones tienen punta hecha en hierro, para colocación de líneas (1 pie), están perfectamente soldados para asegurar su resistencia.	1	#####	/			
109	Líneas de vida cuentan con autorización debidamente firmada y vigente en documentos de seguridad	1	#####	/			
EQUIPOS DE LEVANTE DE CARGA		100%	N.A.	-			
110	Equipo de capacidad colocada para el levante y con tabla de carga en el equipo y en idioma español	1	#####	/			
111	Cable de acero y ganchos en buenas condiciones con inspección vigente.	1	#####	/			
112	Accesorios de levante (eslingas, grilletes, estrobos) en buenas condiciones y con la resistencia exigida	1	#####	/			
113	Medidas cables y otros) preventivas de estigas usados como se requiere.	1	#####	/			
114	Se usan técnicas de levante apropiadas (guías, vientos, etc.)	1	#####	/			
115	Equipo [illegible] con certificación vigente.	1	#####	/			
EQUIPOS MÓVILES DE CONSTRUCCIÓN		100%	N.A.	-			
116	Luces, frenos, bocinas, alarmas trabajando adecuadamente, vidrios en buen estado.	1	#####	/			
117	Equipos y vehículos que van con elementos de seguridad y extintor con.	1	#####	/			
118	Inspección aprobada / Inspección Mensual / Chequeo previo.	1	#####	/			
119	Revisión técnica vigente	1	#####	/			
120	Equipo usado adecuadamente.	1	#####	/			
121	Carga transportada de forma segura.	1	#####	/	N/A		
122	Licencias Internas de Operador/Conductor Vigentes.	1	#####	/			
123	Vehículos livianos con placa control adecuados en su interior.	1	#####	/			
124	Equipos Móviles de Carga cuelgan son asegurados con vigía o señalero cuando circulan por sitios de la obra	1	#####	/			
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		100%	N.A.	-			
125	Los recipientes inflamables almacenados adecuadamente.	1	#####	/			
126	Cilindros de oxígeno y gases combustibles almacenan separados.	1	#####	/			
127	Los cilindros y recipientes están identificados indicando lo que contienen.	1	#####	/			
128	Extintores refrendados, localizados e inspeccionados en forma debida	1	#####	/	Falta Inspección extintores		
129	Los cilindros de gas comprimido son almacenados y transportados adecuadamente.	1	#####	/			
130	Coordinación de trabajo en caliente y permisos para soldar cuando se requiere.	1	#####	/			
131	Mantenimiento y utilidades están debidamente unidas y en buenas condiciones.	1	#####	/			
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES		100%	N.A.	-			
132	Carga transportada en forma segura, uso de ratchets y correas	1	#####	/			
133	Cargas mal apiladas almacenadas en forma segura	1	#####	/			
134	Se usan cuñas para calzar.	1	#####	/			
135	Altura de materiales no pasa límite	1	#####	/			
136	Señalización de acuerdo a estándar (Rombo NFPA, Letrero de Advertencia).	1	#####	/			
RESPUESTA A EMERGENCIAS		100%	N.A.	-			
137	Dentro del área de obra si hay trabajadores con preparación en primeros auxilios. Se tiene organizada la brigada de emergencia.	1	#####	/			
138	Trabajadores saben como actuar ante temblores, incendios, etc.	1	#####	/			
139	Trabajadores saben como actuar en caso de incendios.	1	#####	/			
140	En el área hay una señalización de ruta segura y este incluye todos los elementos requeridos y existe suficiente espacio de maniobra de la unidad de emergencia.	1	#####	/			
141	Trabajadores conocen la ubicación de los puntos de reunión y/o refugio.	1	#####	/			
142	Trabajadores conocen el flujo de evacuación en caso de incidentes (Incidentes internos en el proyecto y externos en la vía)	1	#####	/			
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES - ACCIONES CORRECTIVAS		100%	N.A.	-			

[redacted]

[redacted] | FORMATO
INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

143	El flujo vertical de incidentes se encuentra publicado en un lugar visible y es de conocimiento del personal.	1	#####	/		-	
144	Se mantienen registros de la investigación de los incidentes ocurridos con otra.	1	#####	/			
145	Los accidentes son investigados por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y difundidos al personal.	1	#####	/			
146	Se cierran las acciones correctivas y/o preventivas oportunamente y se verifica su eficacia. Se mantienen los registros correspondientes.	1	#####	/			
CONTROLES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		**SI/CUMPLE**	**N.A.**				
147	ATS en el lugar de trabajo y las medidas obtenidas en una evaluación de riesgo.	1	#####	/			
148	Procesos constructivos, oficios y están en el lugar. Trabajadores calificados en procesos constructivos.	1	#####	/	Falta Diligencia PETS de Besser.		
149	Se cuenta con los permisos específicos para realizar la tarea, en caso de ser necesario (Trabajo en Altura, Espacio Confinado, Trabajo en Caliente, etc.).	1	#####	/			
150	Se encuentra el supervisor y/o maestro de la obra en el lugar.	1	#####	/			
151	PERC y Análisis de trabajo seguro (ATS) está en terreno (registro obligatorio).	1	#####	/			
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		**SI/CUMPLE**	**N.A.**				
152	La alta dirección: Revisa y analiza cómo cumple el sistema de gestión para asegurar que es apropiado y efectivo.	1	#####	/			
153	La investigación y auditorías permiten a la alta gerencia de la empresa, entidad pública o privada lograr los resultados esperados y de acuerdo a ello en el caso, cumplir con la política y objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo.	1	#####	/			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]	FORMATO **INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO: [redacted]			
RESPONSABLE EN OBRA: [redacted]	**FECHA:**	8/03/2021	

PUNTAJE PONDERADO	**88%**

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVATAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO DIGITAL					
1	Actualización diaria de maestro de equipos propios	1			
2	Registro diario de salidas y entradas de equipos y herramientas [redacted]	1			
3	Registro diario de salidas y entradas de instrumentos y equipos topográficos [redacted]	1			
4	Registro de cargo de entrega y devolución de encofrados y andamios	n.a.			
5	Registrar de Flash Report de Equipos [redacted]	1			
6	Monitoreo diario de control de mantenimientos preventivos y correctivos	1			
7	Monitoreo mensual de mantenimientos preventivos de equipos mayores	1			
8	Procesamiento en S10 y registro documentario en físicio de facturas de compra de equipos o herramientas	1			
9	Procesamiento en S10 y registro documentario en físicio de facturas de compra de materiales y consumibles de taller	1			
VALORIZACIONES					
10	Valorización mensual de equipos propios de [redacted]	n.a.			
11	Valorización mensual de equipos alquilados de [redacted]	1			
12	Registro semanal de tareo en S10 movil de personal técnico de taller	n.a.			
GESTION DE TALLER					
13	Registro documentario de guías de remisión de ingresos y salidas de equipos	1			
14	Registro de calibración de intrumentos y equipo topográfico	1	Pendiente programa de calibración		
ALMACEN EQUIPOS					
15	Mantener ambiente de taller de Almacén de Equipos limpio y ordenado	0	Mejorar el orden y limpieza, se evidenció herramientas y equipos en diferente lugar		
16	Tener actualizado el kardex de repuestos y materiales de taller	0	No cuenta con bincar		
17	Gestión de caja chica y rendiciones al área de administración	1			
LOGÍSTICA					
18	Gestionar la compra de materiales, equipos o herramientas (cotizar, cuadro comparativo, recepción)	1			
GUARDIANÍA					
19	Chequeo de la calidad y operatividad de herramientas, materia eléctrico y equipos de trabajadores y sub contratas. Verificacion con GR	1	Falta implementar hacer un informe		
20	Requizas y custodia de herramientas o material eléctrico del personal obrero.	n.a.			
	PROMEDIO PONDERADO	**88%**			

V.B. Inspector

V.B. Inspeccionado

[redacted]	FORMATO **INSPECCIÓN DE PROCURA EN OBRA**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]		
RESPONSABLE EN OBRA:	[redacted]	**FECHA:**	11/02/2021

PUNTAJE PONDERADO	**92%**

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVATAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
PRODUCCIÓN					
1	Los pedidos de obra están consolidados al 80% del consumo total de la obra	1			
2	Los pedidos generados cuentan con cronogramas de entrega entre 7 a 15 días posteriores a la generación del pedido	1			
3	Se verifica el stock de almacén antes de la generación del pedido de compra	1			
4	Los pedidos de materiales de acabados cumplen con lo requerido por el cuadro de acabados de la obra	1			
5	Existe comunicación y verificación de espacio de almacén antes de la solictud de compra de materiales críticos	1			
ADMINISTRACIÓN					
6	Se han recepcionado guías que estén relacionadas a una orden de compra aprobada	1			
7	Revisión de guías pasado el crédito acordado: ¿Tienen guías de remisión sin facturar pasado el crédito establecido?	1			
8	Las facturas cumplen con el crédito y forma de pago acordado con el proveedor según	1			
9	Los proveedores tiene conocimiento de como presentar sus facturas y del proceso de facturación	1			
10	Tienen conocimiento del cronograma de entrega de los ordenes de compra solicitadas	1			
ALMACÉN					
11	Tienen cargo de los certificados de calidad y cartas de garantía emitadas por los proveedores	1			
12	¿Todo material que ingresa a almacén tienen orden de compra aprobada y guía relacionada?	1			
13	Las guías de materiales críticos poseen visto de revisión por parte del área de calidad	0	Se revisó el material crítico: extintores, y este no contaba con la revisión del responsable (Oficina Técnica)	16/02/2021	Capacitar al personal sobre la revisión de materiales y la recepción de materiales propios y de contratistas
	PROMEDIO PONDERADO	**92%**			

V.B. Inspector

V.B. Inspeccionado

[redacted]

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

[redacted]

OBRA:	[redacted]
RESPONSABLE DE OBRA:	
ACT DE OBRA:	
FECHA:	07-03-2021

PUNTAJE PONDERADO	2021
PORCENTAJE PONDERADO	100,00%

Nº	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES	HOJA DE LEVANTAMIENTO	CUMPLIMIENTO Y ACCIÓN PREVENTIVA
		%					
	COMPROMISO Y ENTENDIMIENTO	100%	N.A.				
1		1	ADECUADO	1			
2		1	ADECUADO	1			
3		1	ADECUADO	1			
4		1	ADECUADO	N.A.			
5		1	ADECUADO	1			
6		1	ADECUADO	1			
7		1	ADECUADO	NA			
	GESTIÓN, INSPECCIÓN Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD	100%	N.A.	-			
8		1	ADECUADO	1	[redacted]		
9		1	ADECUADO	1			
10		1	ADECUADO	1			
11		1	ADECUADO	NA			
	PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	100%	N.A.	-			
12		1	ADECUADO	1			
13		1	ADECUADO	1			
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES	100%	N.A.	-			
14		1	ADECUADO	1			
15		1	ADECUADO	1			
16		1	ADECUADO	1			
17		1	ADECUADO	1			
18		1	ADECUADO	1			
19		1	ADECUADO	1			
	CAPACITACIÓN, SUPERVISIÓN Y COMPETENCIAS	100%	N.A.	-			
20		1	ADECUADO	1			
21		1	ADECUADO				
	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	100%	N.A.	-			
22		1	ADECUADO	1			
23		2	ADECUADO	0	Reforzar		
	GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	100%	N.A.	-			
24		1	ADECUADO	0			No hay epp's de [redacted]
25		1	ADECUADO				
26		1	ADECUADO	1			
27		1	ADECUADO	1			Verificar (cubierta) y limpieza de [illegible]
28		1	ADECUADO	1			Cumplimiento en la [illegible]
	GESTIÓN DE CONTROL DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL	100%	N.A.				
29		1	ADECUADO	1			
30		1	ADECUADO	1			
31		1	ADECUADO	1			Falta el Medico Ocupacional
32		1	ADECUADO	1			
33		1	ADECUADO	1			Capacitacion en general con Metodos
34		1	ADECUADO				

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

[redacted]

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS							
01	El empleador ha implementado y mantiene la documentación del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST Registro de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incidentes peligrosos y otros indicadores, en el que estén incluidas la investigación y las medidas correctivas	100%	N.A.				
02	Registro de capacitaciones realizadas y ejecutadas	1	#¡DIV/0!	1			
03	Registro de suministro de elementos de protección personal, químicos, biológicos, disfrazados y hojas de vida de riesgo ergonómicos.	1	#¡DIV/0!	1			
04	Registro de actividades de medicina preventiva y del trabajo	1	#¡DIV/0!	1			
05	Registro de inspección de seguridad y salud	1	#¡DIV/0!	1			
06	Registro de inspección de seguridad y emergencia	1	#¡DIV/0!	1			
07	Registro de indicadores: reportes, accidentes, enfermedades y ausentismo laboral	1	#¡DIV/0!	1			
08	Registro de auditorías	1	#¡DIV/0!	1			
09	Los registros deben contener: Registros y documentos. Informes y seguimientos. Informes de accidentes y enfermedades profesionales.	1	#¡DIV/0!	1			
ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL EN OBRA		100%	N.A.				
10	El orden y limpieza en la obra es fundamental para la seguridad y salud de los trabajadores.	1	#¡DIV/0!	1			
11	Pasillos y puestos de trabajo despejados.	1	#¡DIV/0!	1			
12	Materiales y equipos están debidamente almacenados.	1	#¡DIV/0!	1			Hacer Limpieza y Orden
13	Cables y conductores energizados, deben encontrarse bien aislados, en buen estado y no estar expuestos a riesgos de impacto.	1	#¡DIV/0!	1			
14	Área libre de basuras y limpia con puntos adecuados para residuos ordinarios.	1	#¡DIV/0!	1			
GESTIÓN AMBIENTAL		100%	N.A.				
15	En las áreas de trabajo hay provisión de agua potable y hay lavamanos para los obreros	1	#¡DIV/0!	1			
16	Hay contenedores y basureros para la disposición de residuos.	1	#¡DIV/0!	1			No hay contenedores para separar residuos
17	Se ha identificado los aspectos ambientales significativos como derrames de combustibles.	1	#¡DIV/0!	1			
18	Protección de sumideros, cunetas y drenajes (costales, tablas, etc.)	1	#¡DIV/0!	1			
19	Baños químicos en buen estado y con dotación de agua para manos, jabón y papel o secadores de aire.	1	#¡DIV/0!	1			
PREVENCIÓN EN EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS		100%	N.A.				
20	Se evita el uso de sustancias químicas para el proyecto	1	#¡DIV/0!	1			
21	Las sustancias químicas cuentan con las hojas MSDS y están ubicadas en el lugar indicado.	1	#¡DIV/0!	1			
22	Las sustancias químicas se almacenan, rotulan, cuentan con extintor y son manipuladas por personal capacitado.	1	#¡DIV/0!	0			Falta implementar Hojas
23	El almacén de sustancias químicas cuenta con señalización de seguridad, ventilación y extintor.	1	#¡DIV/0!	1			
POSICIONES Y ACCIONES DE LA GENTE		100%	N.A.				
24	Las zonas de caída de trabajadores o de objetos están aisladas, señalizadas, con barandas, con advertencia o cubiertas con mallas.	1	#¡DIV/0!	1			
25	Usa el casco de seguridad con barbuquejo en todo momento en áreas de trabajo.	1	#¡DIV/0!	1			Hay tapas
26	Se promueve el autocuidado en las actividades rutinarias de trabajo, generando una cultura preventiva.	1	#¡DIV/0!	1			Hay Socialización
27	Los trabajadores cuentan con el carnet de salud ocupacional vigente.	1	#¡DIV/0!	1			
28	Los trabajadores cuentan con el carnet de inducción.	1	#¡DIV/0!	1			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		100%	N.A.				
29	Se cuenta con un recipiente de botiquín y extintor de agua.	1	#¡DIV/0!	1			
30	Casco de seguridad y Barbuquejo con ajustes a mentonera como se requiere.	2	#¡DIV/0!	1			
31	Protección auditiva cuando se requiere.	1	#¡DIV/0!	N/A			
32	Protección ocular usada de manera correcta.	1	#¡DIV/0!	1			
33	Botiquín de seguridad y elementos con vencimiento para su uso dentro del proyecto.	1	#¡DIV/0!	1			
34	Protección respiratoria cuando se requiere.	1	#¡DIV/0!	N/A			
35	Guantes de seguridad apropiados para cada actividad.	1	#¡DIV/0!	1			
36	Botas de caña alta con puntera antideslizante y resistente a golpes y perforaciones.	1	#¡DIV/0!	1			
37	Equipo de protección para caídas de altura cuando se requiere.	1	#¡DIV/0!	N/A			
38	Otros: especificar: ropa de trabajo, uniformes y más como: overol, delantal, camisetas.	1	#¡DIV/0!	1			
CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN EDUCATIVA		100%	N.A.				
39	Hay personal capacitado y calificado en cuanto con conocimiento, manejo, uso y mantenimiento de los equipos y maquinaria.	1	#¡DIV/0!	1			
40	Cuenta el personal con permisos de trabajo seguro en equipos y en la zona de trabajo.	1	#¡DIV/0!	1			
41	Señalización apropiada, visible y puesta en Mandatorio y consultorio y peligros están adaptados y ubicados.	1	#¡DIV/0!	1			
42	Protección de Equipos (Maquinas, Piezas, Cortes que Transmisión y similares) en equipos en operaciones.	1	#¡DIV/0!	N/A			
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MOVILES		100%	N.A.				
43	Las herramientas están entregadas para el trabajo (personal)	1	#¡DIV/0!	1			
44	Las herramientas en buen estado	1	#¡DIV/0!	1			
45	Usado en condiciones seguras y especificadas.	1	#¡DIV/0!	1			
46	Cuenta con protección - apantallados en condición y propósito de uso.	1	#¡DIV/0!	0			
47	Los elementos indicados de material más conveniente.	1	#¡DIV/0!	1			
48	Cuenta de cable y enchufe usados correctamente.	1	#¡DIV/0!	N/A			
49	El personal autorizado a la operación de las herramientas para portátiles de encendido, debidamente capacitado.	1	#¡DIV/0!	N/A			
50	Las herramientas con daño/averiado son separadas y almacenadas.	1	#¡DIV/0!	1			
51	Cuentan el personal seguro en uso / en dañar y alternados.	1	#¡DIV/0!	0			
52	Equipos (máquinas, automóviles, etc.) operados.	1	#¡DIV/0!	N/A			
53	Los equipos de suspensión de fuerza están diligenciados y aprobados (2 veces / capacitado) realizado por el jefe de trabajo y la cuenta con los datos actualizados.	1	#¡DIV/0!				
54	Las herramientas / objetos se deben ser el objeto de proporcionar el objeto de actividad (Lugar de trabajo / herramienta).	1	#¡DIV/0!	N/A			
55	Conductor es idóneo con asignación en forma adecuada y bajo estándar vía Normas OHSE	1	#¡DIV/0!				

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

[redacted]

N°	Descripción	100%	N.A.		Observaciones		
	[illegible]	100%	N.A.				
	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	ANDAMIOS Y ESCALERAS	100%	N.A.	-			
	[illegible]	1	#¡DIV/0!	O			falta diagrama de ... y diseño
98	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
99	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
100	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
101	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
	PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	100%	N.A.	-			
102	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
103	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
104	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
105	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
106	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
107	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
108	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
109	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
	EQUIPOS DE LEVANTE DE CARGA	100%	N.A.	-			
110	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
111	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
112	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
113	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
114	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
115	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	EQUIPOS MÓVILES DE CONSTRUCCIÓN	100%	N.A.	-			
116	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
117	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
118	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
119	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
120	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
121	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
122	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
123	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
124	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	100%	N.A.				
125	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
126	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
127	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
128	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
129	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
130	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
131	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
	ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES	100%	N.A.	-			
132	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
133	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
134	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
135	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
136	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	RESPUESTA A EMERGENCIAS	100%	N.A.	-			
137	[illegible]	1	#¡DIV/0!				Hay capacitación
138	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
139	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
140	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
141	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
* 142	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES - ACCIONES CORRECTIVAS	100%	N.A.	-			
* 143	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
144	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
145	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
146	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	[illegible]	100%	N.A.				
147	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
148	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
149	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
150	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			
151	[illegible]	1	#¡DIV/0!				
	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	100%	N.A.				
* 152	[illegible]	1	#¡DIV/0!	NA			

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

[redacted]

[redacted]	1	[redacted]		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]	FORMATO **INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]			**PUNTAJE PONDERADO**	**100%**
RESPONSABLE EN OBRA:	[redacted]		**FECHA:** 6/10/2021		

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVATAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CAPITAL HUMANO					
1	Entrega del tareo semanal todos los lunes al mediodía (JA)	1			
2	Presentación de las solicitudes de liquidación del personal obrero al área de Capital Humano de manera oportuna, dicho(s) documento(s) deben contener las firmas de los responsables.	1			
3	Custodiar el cargo de presentación del tareo semanal con las firmas respectivas.	1			
4	La información del Tareo debe ser revisado y no contener errores	1			
5	Tener actualizado el file personal de los trabajadores (obreros).	1			
6	Mantener actualizada la matriz de contratistas de forma mensual (la información debe encontrase actualizada en los diferentes *items* solicitados - Ubicación Onedrive de obra)	1			
7	Informar oportunamente las incidencias diarias por ausencia (enfermedad) a las areas correspondientes.	1			
8	Tener actualizada el cargo del envío de boletas de forma digital	1			
9	Llevar el registro de asistencia del personal (obrero) actualizado.	1			
10	Entregar oportunamente los DM originales del personal de obra: 1) Personal obrero: al area de Bienestar Social. 2) Personal Staff: a la Jefatura de Administración de Obras.	1			
11	Tener actualizadas las polizas de SCTR del personal staff y obrero	1			
12	Informar oportunamente todo cese del personal obrero y de limpieza	1			
13	Cumplir con el cronograma de entrega de informe de personal para el RO	1			
TESORERÍA					
14	Entregar el fondo fijo para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
15	El fondo fijo no debe contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
16	Todo arqueo de caja chica no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
17	Las compras a través de la caja chica deben efectuarse sólo a proveedores con los cuales no contamos con línea de crédito.	1			
18	Mantener una adecuada custodia del file del fondo fijo.	1			
19	Mantener actualizados el cuadro de garantías (Cartas Fianza, Letras de cambio)	1	USAR NUEVA VERSIÓN		

BESCO	FORMATO INSPECCIÓN MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA	CÓDIGO: BC.ADM.FO1 VERSIÓN: 06 FECHA: 17.02.2021

CONTABILIDAD					
20	Entrega de las facturas semanales para las firmas respectivas todos los Jueves por la tarde.	1			
21	Las facturas no deben contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
22	Mantener una adecuada custodia del file de las facturas presentadas semanalmente.	1			
23	Mantener actualizado el reporte de guías de remisión de meses anteriores	N.A.			
24	Todas las guías de remisión(original) deben contener el sello de recepción del área de Almacén.	1			
25	Presentación de entregables del mes (Kardex, ingreso y egresos)	N.A.			
26	Presentación y custodia de las guías de remisión de Besco - Miranda	1			
27	Envío de facturas (registro de compras S10) los días jueves	1			
ALMACENES					
28	Entrega de los informes de inventario los primeros 2 días hábiles del mes	1			
29	Llevar un adecuado control en la emisión de las Guías de Remisión	1			
30	Registro diario de los ingresos y salidas de almacén en el S10	1			
31	Actualización diaria de las Bincard	1			
32	Llevar un ambiente de Almacén limpio y ordenado	1			
33	Tener actualizado el kardex de EPP tanto en fisico como vía electrónica.	1			
34	El inventario mensual no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
35	Los materiales se colocan según recomendaciones del proveedor (caja)	1			
36	Los productos químicos cuentan con las Hojas MSDS	1			
LOGÍSTICA					
37	Cumplir con el cronograma de compras Enviar ordenes de compra y servicio aprobadas.	1			
GUARDIANÍA					
38	Toda incidencia presentada por el servicio de vigilancia debe ser primero canalizada por el area de administración de obra.	1			
39	Reunión quincenal con la empresa de vigilancia.	1			
40	Requizas a los ambientes de los subcontratistas.	1			
41	Requizas al personal obrero.	1			
	PROMEDIO PONDERADO	**100%**			

V.B. Inspector

V.B. Inspeccionado

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE BIENESTAR SOCIAL EN OBRA

[redacted]

OBRA:	[redacted]	CCHP:	
RESPONSABLE SST:		PLANTA PREFABRICADO	
JEFE DE OBRA:			
RESIDENTE:			

RUBRO DE EVALUACIÓN					PUNTAJE	OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
Ítem	Código	[redacted]	Código	[redacted]				
Ítem					1			
Ítem					1	Falta botiquín		
Ítem					1			
Ítem					1			
Ítem					1			
Ítem					1			
Ítem					NA			
Ítem					NA			
Ítem					NA			
Ítem					1			
Ítem					0	Falta extintores en la cocina		
Ítem					1			
Ítem					1			
Ítem					1			
Ítem					1	Ventana a la vía		
Ítem					0	Falta de señalización en la entrada vía Bosa		
Ítem					1			
Ítem					1			
Ítem					1			
Ítem					1			
Ítem					NA			
Ítem					1			
Ítem					1			
Ítem					1			
Ítem					1			
Ítem					NA			
Ítem					NA			
Ítem					NA			
Ítem					1			
Ítem					NA			
Ítem					NA			
Ítem					NA			
Ítem					NA			
Ítem					NA			
Ítem					NA			

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE PRODUCCIÓN EN OBRA

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

OBRA:	[redacted]
RESPONSABLE DE PRO:	
RRE DE OBRA:	
FECHA:	

PUNTAJE PONDERADO	100%
PONDERADO POR CAPITULO	N.A.

1) Cumple / 0) No Cumple / N.A.) No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN 1	CALIFICACIÓN 0	CALIFICACIÓN N.A.	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
		100%	N.A.				
1	Se elabora el Look Ahead de Edificaciones y Obras exteriores, se actualiza semanalmente.	1	1				
2	Se elabora el Análisis de Restricciones semanal, considerando los tipos de restricciones (Proyectos, materiales, mano de obra, equipos, subcontratos y herramientas).	1	1				
3	El Programa Semanal ha sido elaborado en base al Look Ahead y ha pasado por un proceso de levantamiento de restricciones.	1	1				
4	El PPC semanal se aproxima al 100%.	1	1				
5	Las causas de incumplimiento de lo programado son registrados en el formato de Análisis de Causas Incumplidas.	1	1				
6	El capataz hace uso de la programación diaria para la ejecución de las actividades.	1	1				
7	Se elabora el movimiento de personal diario. Se lleva el registro de los días anteriores.	1	1				
8	Se realiza el cargo diario. Se lleva a cabo a partir de las actividades del Look Ahead.	1	1				
9	Se revisa el pedido de material cumpliendo con las fechas límites.	1	1				
10	Junto con la subcontrata, se realiza la conciliación de metrados. El acuerdo se encuentra firmado por el Jefe de Producción, Superintendente y Subcontrata.	1	1				
11	Se lleva el registro con los vales de salida de equipos y materiales en el almacén.	1	1				
12	El ISP se encuentra actualizado diariamente.	1	1				
13	Se elabora el ISP de forma semanal.	1	1				
14	El ISM se encuentra actualizado diariamente.	1	1				
15	Se elabora el ISM de forma semanal.	1	1				
16	La curva de rendimiento se encuentra actualizada. Se identifica los altos y bajos rendimientos y se analizan las causas.	1	1				
17	Se lleva a cabo de forma mensual la calificación a subcontratas.	1	N/A				
18	Se lleva el acta de las reuniones semanales.	1	1				
19	Las actividades de producción se encuentran respaldas por los PETS respectivos.	1	1				
20	El Master Plan se encuentra actualizado (formato en MS Project).	1	N/A				
21	Se lleva un adecuado control en el pedido de recursos.	1	1				
22	Se revisa, valida y firma valorizaciones de SC.	1	1				

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO
INSPECCIÓN MENSUAL DE OFICINA TÉCNICA (OBRAS PROPIAS)

[redacted]

PLANILLA PRESENTADO	SÍ/C
OBSERVADO POR DEFECTOS	SÍ/C

Nº	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES	SOLUCIÓN (FECHA Y RESPONSABLE)	CUMPLIMIENTO Y ACCIÓN CORRECTIVA
PERSONAL TÉCNICO		CUMPL.	100%	–		
1	**Verificación del Personal Técnico y Mano [illegible]**	1	100%	–		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible]			0		
	[illegible]			1		
GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		**NO**	**50%**	1		
2	**Revisión de Inspección del Trabajo**	1	100%	–		
	[illegible]			1	Se ha emitido el requisito con fecha vencida	
	[illegible]			1		
	[illegible]			0		
3	[redacted]	1	100%	–		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	Revisión del Formulario de Control de [illegible] [redacted]	1	100%	1		
	[redacted]	1	100%	1		
4	**Revisión del Formulario de Control [illegible]**	1	100%	–		
5	**Revisión de Libro de Obra**					
	[illegible] [redacted]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
6	**Revisión del Formulario** [redacted]	1	100%	–		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible]			N.A.		
7	**Revisión del Formulario** [redacted]	1	100%	–		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
8	**Revisión de Formulario** [redacted]	1	100%	–		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
9	**Revisión de Análisis de Medios**	1	100%	1		
10	**Revisión de Informes Mensuales**	0	0%	–		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible]			0		
CONTROL DE DOCUMENTOS		**CUMPL.**	**100%**	–		
12	**Revisión Sistemática de Obra**		100%			
	[illegible]			1		
	[illegible] [redacted]			1		
	[illegible] [redacted]			N.A.		
	[illegible]			N.A.		
13	**Los Comparativos y Todos [illegible] de cada una de las adjudicaciones de materiales y subcontratas deberán estar archivados, en la [illegible] del proyecto.**	1	100%	1		
14	**Revisión del Registro de Subcontratas con las [illegible]**	1	100%	–		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible] [redacted]			1		
	[illegible]			–		
15	**El Equipo técnico en Comparativos debe estar [illegible] que [illegible] PCA con las Fases de las [illegible]. También [illegible] el área de Desarrollo Sostenible.**	1	100%	1		
CONTROL Y GESTIÓN DE SUBCONTRATAS		**100%**	**100%**			
16	**Revisión de Contratos**	1	100%			
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
17	**Revisión de Garantías**	1	100%			
	[illegible]			1		
	[illegible]			1		
	[illegible] [redacted]			1		
18	**Revisión de [illegible]**	1	100%			
	[illegible] [redacted]					

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE PRODUCCIÓN EN OBRA

[redacted]

OBRA:	
RESPONSABLE DE PRO:	[redacted]
RRE DE OBRA:	FECHA:

PUNTAJE PONDERADO	100%
PONDERADO POR CAPITULO	N.A.

1) Cumple / 0) No Cumple / N.A.) No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
		T 100%	P N.A				
1	Se elabora el Look Ahead de Edificaciones y Obras exteriores, se actualiza semanalmente.	1	1				
2	Se elabora el Análisis de Restricciones semanal, considerando los tipos de restricciones (Proyectos, materiales, mano de obra, equipos, subcontratas y herramientas).	1	1				
3	El Programa Semanal ha sido elaborado en base al Look Ahead y ha pasado por un proceso de levantamiento de restricciones.	1	1				
4	El PPC semanal se aproxima al 100%.	1	1				
5	Las causas de incumplimiento de lo programado son registrados en el formato de Análisis de Causas Incumplidas.	1	1				
6	El capataz hace uso de la programación diaria para la ejecución de las actividades.	1	1				
7	Se elabora el movimiento de personal diario. Se lleva el registro de los días anteriores.	1	1				
8	Se realiza el cargo diario. Se lleva a cabo a partir de las actividades del Look Ahead.	1	1				
9	Se revisa el pedido de material cumpliendo con las fechas límites.	1	1				
10	Junto con la subcontrata, se realiza la conciliación de metrados. El acuerdo se encuentra firmado por el Jefe de Producción, Superintendente y Subcontrata.	1	1				
11	Se lleva el registro con los vales de salida de equipos y materiales en el almacén.	1	1				
12	El ISP se encuentra actualizado diariamente.	1	1				
13	Se elabora el ISP de forma semanal.	1	1				
14	El ISM se encuentra actualizado diariamente.	1	1				
15	Se elabora el ISM de forma semanal.	1	1				
16	La curva de rendimiento se encuentra actualizada. Se identifica los altos y bajos rendimientos y se analizan las causas.	1	1				
17	Se lleva a cabo de forma mensual la calificación a subcontratas.	1	N/A				
18	Se lleva el acta de las reuniones semanales.	1	1				
19	Las actividades de producción se encuentran respaldas por los PETS respectivos.	1					
20	El Master Plan se encuentra actualizado (formato en MS Project).	1	N/A				
21	Se lleva un adecuado control en el pedido de insumos.	1	1				
22	Se revisa, valida y firma valorizaciones de SC.	1	1				

[redacted]

[redacted]

[redacted]	FORMATO INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

OBRA:	[redacted]		
RESPONSABLE DE SSOMA:			
JEFE DE OBRA:		FECHA:	14/07/21

PUNTAJE PONDERADO	8.00/100
PONDERADO POR CRITERIO	8.00/10

C: Cumple / N: No Cumple / N.A.: No Aplica

Nº	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN C	CALIFICACIÓN N	CALIFICACIÓN N.A.	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO							
1	El empleador proporciona a los recursos necesarios para ejecutar lo planificado en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente.			1			
2	Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.			1			
3	Se implementan las acciones preventivas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para asegurar la mejora continua.			1			
4	Se reconoce el desempeño de trabajador para mejorar la autoestima y reforzar el trabajo en equipo.			NA			
5	Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en todos los empleados, entidad pública y privada.			1			
6	Se promueve un buen clima laboral para reforzar la armonía entre empleador y trabajador y viceversa.			1			
7	Existe un mecanismo de participación del personal proactivo para asegurar el mejoramiento continuo de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.			1			
POLÍTICA, OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SSOMA		N.A.	N.A.				
8	Se establece y comunica al personal en la Política SSOMA. Se tiene registros y el personal la ha comprendido.			1			
9	Existen objetivos de seguridad establecidos y se generan indicadores.			1			
10	Se cumple con lo exigido en el Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiental.			1	SALUD, SALUD		
11	Se concluye con la identificación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización.			1			
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		N.A.	N.A.				
12	El Plan de SSOMA se encuentra actualizado y debidamente firmado por las autoridades correspondientes.			1			
13	Se cuenta con el Plan de Respuesta ante Emergencias. Existen evidencias físicas del cumplimiento.			1			
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES		N.A.	N.A.				
14	Se comunica a los trabajadores las actividades y áreas de trabajo, así como las medidas de control en cada caso.			1			
15	Existe un organigrama publicado de la Obra especificando los cargos y responsabilidad.			1			
16	La descripción de cargos incluyen las responsabilidades en materia de seguridad y salud ocupacional.			1			
17	Las responsabilidades han sido claramente entendidas al personal de supervisión y operativo.			1			
18	La matriz IPERC se encuentra actualizada y publicada.			1			
19	El mapa de riesgos y de evacuación se encuentra actualizado, publicado, y difundido al personal.			1			
CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIAS		N.A.	N.A.				
20	Se cumple el Programa de capacitación establecido para la Obra.			1			
21	Se cumple con la inducción al personal nuevo y/o transferido.			1			
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		N.A.	N.A.				
22	Está formalizado el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (Supervisor o Team up/Vigía) y se realizan reuniones periódicas y se cumplen los actos respectivos.			1			
23	Las actas/actas de las diferentes reuniones se encuentran firmadas en el comité de seguridad y salud ocupacional.			0			
GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		N.A.	N.A.				
24	El empleador que asume el contrato principal en cuya ejecución se desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores garantiza: La coordinación en la gestión de prevención de riesgos laborales.			1			
25	La seguridad y salud de los trabajadores.			-			
26	La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por parte del empleador.			1			
27	La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destaca al personal.			1			
28	Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en lo que tengan relación laboral con dicho empleador, con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.			1			
GESTIÓN DE CONTROL MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL		N.A.	N.A.				
29	El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores.			1			
30	Con relaciones con el Empleador: A título grupal, de los resultados de los exámenes de salud ocupacional.			1			
31	A título personal, sobre los resultados de los mismos en relación a la evaluación de su salud.			1			
32	Los resultados de los exámenes médicos son puestos para ejercer discriminación.			1			
33	Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas y correctivas al respecto.			1			
34	Las trabajadoras cuentan con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo vigente.			1			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

	GESTIÓN DE LOS RIESGOS	N.A.	N.A.				
33	El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y la afiliación del trabajador referidos a: Registro de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, incluyendo peligros y casi incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.			\			
34	Registro de mediciones médicas ocupacionales.			\			
35	Registro del mapa de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.			—			
36	Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.			\			
37	Registro de estadísticas de seguridad y salud.			\			
38	Registro de equipos de seguridad y de emergencia.			\			
39	Registro de inducción, capacitación, entrenamiento, y simulacros de emergencia.			\			
40	Registro de auditorías.			\			
41	Los registros mencionados son: - Legibles e identificables. - Permite su seguimiento. - Son archivados y adecuadamente protegidos.			\			
	ORDEN Y LIMPIEZA, BARRERAS, PINTURA	N.A.	N.A.	-			
42	Área de trabajo está limpia y libre de residuos y escombros.			\			
43	Pisos, rampas y pasillos están despejados.			\			
44	Materiales y equipos están debidamente ordenados.			\			
45	Cables eléctricos, mangueras, cables conductores para soldadura, encontrarse en buen estado y ubicados para evitar riesgos de tropiezo.			\			
46	Área de trabajo de orden con cintas autoadhesivas, colores de señalización.			\			
	GESTIÓN AMBIENTAL	N.A.	N.A.	-			
47	En los sitios de trabajo hay provisión de agua potable y hay consumo para los mismos.			NA			
48	Hay contenedores y bolsas rojas para los diferentes tipos de residuos.			\			
49	Se han identificado las zonas de punto de acopio y están debidamente señalizadas.			\			
50	Protecciones de material contaminado (aserrín) y mantenidas en su lugar.			\			
51	Baños químicos limpios, con dispensación de agua para manos, con jabón líquido y elementos de aseo.			\			
	PREVENCIÓN EN EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	N.A.	N.A.	-			
52	Se utilizan productos químicos suministrados por la empresa.			\			
53	Los productos químicos cuentan con las hojas MSDS y están ubicadas en el lugar indicado.			\			Solicitar del pol
54	Los productos químicos se encuentran rotulados, con el símbolo correspondiente y en buen estado.			\			
55	El almacén de los productos químicos debe estar en lugar ventilado, limpio y asegurado.			\			
	POSICIONES / ACCIONES DE LA GENTE	N.A.	N.A.	-			
56	Las zonas de caída al mismo nivel o diferente se encuentran señaladas, no se evidencia riesgos en tapa.			\			
57	Superficies cortantes que puedan ocasionar accidentes están protegidas.			\			
58	Se previene el sobreesfuerzo de los trabajadores a levantar, empujar, cargar o alcanzar.			\			
59	Los trabajos sobre o debajo de otros trabajadores están controlados.			O			
60	No trabaja con carga suspendida.			\			
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	N.A.	N.A.	-			
61	Se cuenta con un registro de entrega y control de epp.			\			Se tiene Kardex
62	Cascos de seguridad y bandas ajustables tienen barbuquejo y mentonera como se requiere.			\			
63	Protección auditiva cuando aplica adecuadamente.			\			
64	Protección ocular cuando de manera apropiada.			\			
65	Botines de seguridad cuentan protección requerida para cada uno adecuadamente.			\			
66	Mascaras y protectores o antiparras usados adecuadamente.			\			
67	Guantes son del tipo correcto y usados adecuadamente.			\			
70	Ropa de trabajo como uniformes y overoles con elementos reflectivos.			\			
71	Equipos de protección para condiciones usados adecuadamente.			\			
72	Otros, respiradores, mascarilla resistente a productos químicos.			\			
	SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA	N.A.	N.A.	-			
73	Hay barreras/barandas instaladas en buenas condiciones para prevenir caídas o choques para de trabajadores según se requiere.			\			Hacen falta de
74	Mallas de protección y/o cerchas están instaladas según se requiere y en buenas condiciones.			\			
75	Lesiones de movimiento (Músculo esq.) Movimiento y otros bienes y señales están colocados y son claros.			\			
76	Protección de Equipos (Engranajes, Poleas, Correas de Transmisión y similares) en uso y en buenas condiciones.			\			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	N.A.	N.A.	-			
77	Las herramientas son apropiadas para el trabajo (no hechizas)			\			
78	Son usadas sobre la tapada			\			
79	Están en condiciones seguras e inspeccionadas.			\			
80	Cables eléctricos - extensiones, en condición e inspección al día.			\			
81	Mantenimiento inapropiado del elemento está controlado.			\			
82	Objetos de corte y desbaste usados correctamente.			\			
83	El personal asignado para la actividad de riesgos eléctricos cuenta con los elementos adecuados para el mismo.			\			
84	Herramientas con aislamiento transportadas y almacenadas.			\			
85	Tableros eléctricos regulados, señalizados y aislados.			\			
86	Equipos eléctricos (soldadora, etc.) aterrizados.			\			
87	Los equipos de elevación de cargas están debidamente ajustados (Eslingas, Ganchos, etc.) de acuerdo al peso y se evidencia que están protegidos.			\			
88	Las herramientas eléctricas se disponen al daño de personal o fuga de corriente (Guarda de puesta de tierra, cuerdo).			\			
89	Conexiones eléctricas, asegurada[redacted] entender y/o Norma 8200.			\			

[redacted]

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO [redacted]
VERSIÓN
FECHA

EXCAVACIONES		N.A.	N.C.	-			
91	Talud y/o blindaje adecuados según sistema GEO			/			
92	Existe señalización de la excavación en su perímetro.			/			
93	Pasarelas de acceso y salida cada 7,5 metros			/			
94	Iluminación adecuada y señalización en condiciones seguras.			/			
95	Existe protección contra caídas (Barandas y guías)			/			
96	Excavación circular 1,30 mts. alejada del borde del cuerpo de gas			/			
97	Se cuenta con la profundidad de la excavación en el sitio de trabajo			/			
ANDAMIOS Y ESCALERAS		N.A.	N.C.	-			
97	Construido por especificaciones técnicas de fabricante.			/			
98	Cuentan con vías de acceso y salida apropiadas.			/			
99	Están anclados correctamente (Rojo= No uso; Verde= Apto).			/			Hacen mengo de Estabilidad
100	Son usados en forma segura (no sufren modificaciones).			/			
101	Escaleras apropiadas para el trabajo realizado y apoyadas en forma segura.			/			
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		N.A.	N.C.	-			
102	Áreas de seguridad señalizadas y cuadro de alturas adecuado.			/			
103	Los líneas de vida están exclusivamente asegurados a un soporte apropiado.			/			Ya se le dio Mantenimiento
104	Protección perimetral (baranda) existente.			/			Mejorar
105	Líneas de vida estáticas colocadas, tensionadas y soportan una fuerza mínima de 2.400 kg.			/			
106	Equipos de protección contra caídas son usados solamente para este objetivo.			/			
107	Equipos de protección contra caídas son inspeccionados y mantenidos en forma regular.			/			Se tiene registro
108	Los huecos u otro sistema hecho en obra para colocar línea de vida, están previamente calculados para asegurar su resistencia.		/				
109	Líneas de vida certificadas con autorización debidamente diligenciada y reposa en documentos de seguridad.			/			Certificada
EQUIPOS DE LEVANTE DE CARGA		N.A.	N.A.	-			
110	Cuadro de operación visible, claro para el operario y con letrero de cargas en el equipo en idioma español.			/			
111	Carro en cuna y seguro del gancho en buenas condiciones con la inspección vigente.			/			
112	Accesorios de levante (eslingas, estrobos) en buenas condiciones y con la inspección vigente.			/			
113	Medias cañas y otras protecciones (eslingas, cuadros) contra cortaduras.			/			
114	Se usan ganchos de levante apropiados (ojo pato, etc.).		/				
115	Riggers/Maniobristas con certificación vigente.			/			Faltando el vigente
EQUIPOS MÓVILES DE CONSTRUCCIÓN		N.A.	N.A.	-			
116	Cuerno, frenos, cadenas, alarmas (reversa) en buen estado, vidrios en buen estado.			/			
117	Conocen y cumplen con las señales de seguridad y velocidad.			/			
118	Mantenimiento apropiado / Inspección diaria / Chequeo previo.			/			
119	Revisión técnica vigente			/			
120	Equipo cuenta con extintor.			/			
121	Carga transportada en forma segura.			/			
122	Licencias internas de Operador/Conductor vigentes			/			
123	Vehículos livianos con pico-placa cumplen con la restricción.			/			
124	Equipos Móviles de Construcción son estacionados en vía o señalizados cuando trabajan por razones de la tarea.			/			
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		N.A.	N.A.	-			
125	Los materiales inflamables y explosivos almacenados en forma adecuada.			/			
126	Cilindros de oxígeno y gas combustible almacenados separados.			/			
127	Los extintores y recipientes están debidamente cargados / dentro de la vigencia.			/			
128	Extintores señalizados, localizados e inspeccionados en forma debida.			/			
129	Los cilindros de gas comprimido son almacenados y transportados adecuadamente.			/			
130	Combustión de trabajo en caliente y permisos para soldar cuando se requiere.			/			
131	Monitoreos y valores están debidamente medidos y en buenas condiciones.			/			
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES		N.A.	N.A.	-			
132	Carga transportada en forma segura, sin derrames o caídas.			/			
133	Carga y materiales almacenados en forma segura.			/			
134	Se usan cuñas y separadores.			/			
135	Altura de material no hace riesgo.			/			
136	Señalización de acuerdo a estándar (Rombo NFPA, Etiqueta de Advertencia)			/			
RESPUESTA A EMERGENCIAS		N.A.	N.A.	-			
137	Dentro del área de trabajo hay trabajadores con preparación en primeros auxilios. Se tiene botiquín y brigada de emergencia.			/			
138	Trabajadores saben como actuar para incendios o sismos, etc.			/			
139	Trabajadores saben como actuar en caso de incendios.			/			
140	En el área hay una cartelera de emergencias y existe el plano con las alarmas visibles / Existe evidencia diaria de revisión de la cartelera de emergencia.			/			
141	Trabajadores conocen la ubicación de los puntos de refugio y/o reunión.			/			Punto de reunión
142	Trabajadores conocen el flujo de comunicación en caso de incidentes (Acciones operativas en emergencia y vigencia salud).			/			
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES - ACCIONES CORRECTIVAS		N.A.	N.A.	-			
144	El Reporte inmediato de incidentes se encuentra publicado en lugar visible y es de conocimiento del personal.			/			
144	Se mantienen registros de la investigación de los accidentes ocurridos en obra.			/			
145	Los accidentes son investigados por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y/o líderes de personal.			/			
146	Se toman las acciones correctivas y/o preventivas oportunamente y de manera eficaz. Se mantienen los registros correspondientes.			/			
CONTROLES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		N.A.	N.A.	-			
147	ATS en el lugar de trabajo y las tareas críticas se encuentran diligenciadas.			/			
148	Procesos constructivos, socios y aliados en el lugar. Responsabilidades capacitados en procesos constructivos.			/			falta socio PT en el lugar
149	Se identifican los peligros específicos para realizar la actividad como de los trabajadores (Trabajo en Altura, Espacio Confinado, Trabajo en Caliente, etc.)			/			
150	Se encuentra el supervisor y/o superior a cargo de la tarea en el lugar.			/			
151	PTAR y Análisis de trabajo seguro (ATS) son en terreno (según aplicación)			/			
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		N.A.	N.A.	-			

[redacted]

[redacted]

[redacted]	FORMATO INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

50	La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es adecuado y efectivo			NO			
51	La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada cumplir los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo.			NO			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PRIVADA
INSPECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]		
RESPONSABLE EN OBRA:	[redacted]	FECHA:	23/03/2022

PUNTAJE PONDERADO	#¡DIV/0!

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVATAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CAPITAL HUMANO					
1	Entrega del tareo semanal todos los lunes al mediodía (JA)	1			
2	Presentación de las solicitudes de liquidación del personal obrero al área de Capital Humano de manera oportuna, dicho(s) documento(s) deben contener las firmas de los responsables.	1			
3	Custodiar el cargo de presentación del tareo semanal con las firmas respectivas.	1			
4	La información del Tareo debe ser revisado y no contener errores	1			
5	Tener actualizado el file personal de los trabajadores (obreros).	1			
6	Mantener actualizada la matriz de contratistas de forma mensual (la información debe encontrase actualizada en los diferentes *items* solicitados - Ubicación Onedrive de obra)	1			
7	Informar oportunamente las incidencias diarias por ausencia (enfermedad) a las areas correspondientes.	1			
8	Tener actualizada el cargo del envío de boletas de forma digital	1			
9	Llevar el registro de asistencia del personal (obrero) actualizado.	1			
10	Entregar oportunamente los DM originales del personal de obra: 1) Personal obrero: al area de Bienestar Social. 2) Personal Staff: a la Jefatura de Administración de Obras.	1			
11	Tener actualizadas las polizas de SCTR del personal staff y obrero	1			
12	Informar oportunamente todo cese del personal obrero y de limpieza	1			
13	Cumplir con el cronograma de entrega de informe de personal para el RO	1			
TESORERÍA					
14	Entregar el fondo fijo para las firmas respectivas todos los miércoles por la tarde.	1			
15	El fondo fijo no debe contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
16	Todo arqueo de caja chica no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
17	Las compras a través de la caja chica deben efectuarse sólo a proveedores con los cuales no contamos con línea de crédito	1			
18	Mantener una adecuada custodia del file del fondo fijo.	1			
19	Mantener actualizados el cuadro de garantías (Cartas Fianza, Letras de cambio)	1	[redacted]		

CONTABILIDAD					
20	Entrega de las facturas semanales para las firmas respectivas todos los Jueves por la tarde.	1			
21	Las facturas no deben contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
22	Mantener una adecuada custodia del file de las facturas presentadas semanalmente.	1			
23	Mantener actualizado el reporte de guias de remisión de meses anteriores	1			
24	Todas las guías de remisión(original) deben contener el sello de recepción del área de Almacén.	1			
25	Presentación de entregables del mes (Kardex, ingreso y egresos)	1			
26	Presentación y custodia de las guías de remisión de Besco - Miranda	1			
27	Envio de facturas (registro de compras S10) los días jueves	1			
ALMACENES					
28	Entrega de los informes de inventario los primeros 2 días hábiles del mes	1			
29	Llevar un adecuado control en la emisión de las Guías de Remisión	1			
30	Registro diario de los ingresos y salidas de almacén en el S10	1			
31	Actualización diaria de las Bincard	1			
32	Llevar un ambiente de Almacén limpio y ordenado	1			
33	Tener actualizado el kardex de EPP tanto en físico como via electrónica.	1			
34	El inventario mensual no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
35	Los materiales se colocan según recomendaciones del proveedor (caja)	1			
36	Los productos quimicos cuentan con las Hojas MSDS	1			
LOGÍSTICA					
37	Cumplir con el cronograma de compras Enviar ordenes de compra y servicio aprobadas.	1			
GUARDIANÍA					
38	Toda incidencia presentada por el servicio de vigilancia debe ser primero canalizada por el area de administración de obra.	1			
39	Reunión quincenal con la empresa de vigilancia.	1			
40	Requizas a los ambientes de los subcontratistas.	1			
41	Requizas al personal obrero.	1			
	PROMEDIO PONDERADO	**#¡DIV/0!**			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

INSPECCIÓN DE [illegible]

[redacted]

OBRA:	[redacted]	FECHA:	[illegible]
[illegible]		[illegible]	#¡DIV/0!
[illegible]			
[illegible]			

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

PUNTOS DE EVALUACIÓN		RESULTADO	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMENTARIO Y ACCIÓN PREVENTIVA
Clase	[redacted]				
Pro E		1			
		1			
Pro E		1			
		1			
Contl		1			
		1			
		1			
		1			
		NA			
		1			
		NA			
Contl		1			
		1			
Contl		1			
		1			
Contl		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
Contl		1			
Contl		1			
		1			
Pro C		1			
Pro C		1			
		1			
Pro E		1			
		NA			
		NA			
		NA			
		1			
Contl		1			
		1			
Emerg		NA			
		NA			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] DE GESTIÓN TOTAL DE LA CIUDAD

[redacted]

PUNTOS POSIBLES | [redacted]

		N.A.				
1	[redacted] **Criterio:** Verificar la ejecución del Plan de Calidad y cumplimiento de inducción con registro de capacitación.	1				
2	[redacted] difundidos. **Criterio:** Verificar la difusión de los documentos y el cumplimiento con los registros de capacitación.	1				
		N.A.				
3	Verificación del cumplimiento [redacted] **Criterio:** Verificar el cumplimiento de la presentación de la gestión de calidad en el comité de obra	1				
4	Cumplimiento del envío [redacted] **Criterio:** Verificar cumplimiento del envío en fichas técnicas por OT.	1				
5	Verificación del cumplimiento [redacted] **Criterio:** Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).	1				
		N.A.				
6	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio:** Verificar la aplicación del formato de las protección electrónica.	1				
7	Verificación del correcto uso de [redacted] **Criterio:** Verificar que todo personal se encuentre correctamente uniformado y firmado.	1				
8	Verificación del estado de [redacted] acto **Criterio:** Verificar la actualización del registro de los simulacros ejecutados y cerrados	1				
		N.A.				
9	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio:** Verificar la ocurrencia del registro de recibo de inducción visitas ocasionales.	1				Actualizar el estandar de visitas al revisar la matriz de riesgos.
10	Verificación del correcto uso de [redacted] **Criterio:** Verificar que todo personal se encuentre correctamente firmado, firmado y con la copia de la guía de servicio debidamente salida.	1				
		N.A.				
11	Verificación de la aplicación del formato [redacted] **Criterio:** Verificar la vigencia de certificados de calibración de equipos de medición propios y de sub-contratos.	1				
12	Verificación del cumplimiento de los [redacted] **Criterio:** Verificar la actualización de los mapas de material de cantera que ingresa a obra.	1				
13	Verificación del cumplimiento en la sincronización del servidor de registros **Criterio:** Verificar en la web de Kizeo y App Smartbook que todos los servicios estén sincronizados (a las 23 horas).	1				
14	[redacted] **Criterio:** Verificar la actualización del registro de resultados de encuesta de satisfacción del cliente del proyecto.	1				
		N.A.				
15	Verificación del cumplimiento [redacted] **Criterio:** Verificar el cumplimiento de la meta establecida (≥ 95%).	1				
16	Verificación del [redacted] **Criterio:** Verificar cumplimiento de toma según programación mensual	1				
17	Verificación del correcto uso de [redacted] **Criterio:** Verificar que el personal se encuentre correctamente firmado y firmado.	1				

[redacted]

[redacted]		N.A.	-			
18	Cumplimiento de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la meta establecida (1: 85%)	1				
19	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento del apoyo a las observaciones de programa	1				
20	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar la cumplimiento de la meta establecida (1: 85%) en el último informe semestral	1				
21	Verificación [redacted] **Criterio: Verificar la presentación del reporte y analizar desviaciones presentadas en las Observaciones	1				
22	Verificación de [redacted] **Criterio: Revisar que los planes de capacitación vigentes y tengan el sello firma del Jefe de DT Seccional	1				
23	Verificación [redacted] **Criterio: Revisar que las PPD en trámite sean las vigentes y tengan la firma de la supervisión	1				
24	Verificación de [redacted] **Criterio: Revisar que se han presentado análisis de causas según las incidencias presentadas	1				
Cumplimiento de Responsabilidades		N.A.	-			
25	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento del área responsable por Recursos [redacted]	1				
26	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del área responsable de capacitación	1				
27	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la actualización del área responsable de [redacted]	1				
Gestión de Calidad		N.A.	-			
28	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento y la actualización del archivo físico conforme con la información física y digital de toda la documentación requerida. Se deberá [redacted]	1				
29	Verificación de elaboración de [redacted] **Criterio: Verificar la elaboración de los informes generados por especialización	1				

Nota: 1: Cumple / 0: No Cumple / N.A: No Aplica

[redacted]

[redacted]

PROCESO
INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]		
RESPONSABLE EN OBRA:	[redacted]	FECHA:	15.07.24

PUNTAJE PONDERADO	104 /

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO DIGITAL					
1	Actualización diaria de ingreso de equipos propios	1	~~Ayer ya estaba consolidado (procedimiento)~~		
2	Registro [redacted]	1			
3	[redacted]	0 1	~~Mejorar [redacted] Si sirve (Falta una firma)~~		
4	Registro de carga de entrega y devolución de epp´s para trabajos	NO	Registro conforme, solo se pide hacer	11/07/24 2/5	Para mañana "Enero"
5	Registro [redacted]	1	Registro Falta la firma		
6	Monitoreo diario de control de mantenimientos preventivos y correctivos	NO	~~Se envía formato de la semana~~		
7	Monitoreo mensual de mantenimiento preventivo de equipos propios	1			
8	Procesamiento en SID y registro documentario en físico de facturas de compra de equipo o herramienta	NA			
9	Procesamiento en SID y registro documentario en físico de facturas de compra de materiales y consumibles de taller	NA			
VALORIZACIONES					
10	Valorización mensual de equipos propios [redacted]	NA 1	~~Mensual registro diario de HM~~		
11	Valorización mensual de equipos alquilados [redacted]	1			
12	Registro semanal de tareo en SID móvil de personal técnico de taller	NA	Se envía captura de pantalla		
GESTIÓN DE TALLER					
13	Registro documentario de guías de remisión de ingreso y salida de equipos	1			
14	Registro de calibración de instrumentos y equipo topográfico	1	En coord. con administración de Obra		
ALMACEN EQUIPOS					
15	Mantener ambiente de taller de Almacen de Equipos limpio y ordenado	1			
16	Tener actualizado el cardex de repuestos y materiales de taller	NO			
17	Gestión de caja chica y rendiciones al día de administrativo	NO			
LOGISTICA					
18	Gestionar la compra de materiales, equipos y herramientas (cotizar, cuadro comparativo, rotulación)	1			
SEGURIDAD					
19	Chequeo de la calidad y condiciones de herramientas, materia eléctrico y equipos de trabajadores y sub contratas. Verificación con SH	NO	[redacted]		
20	Políticas y custodia de herramientas o material eléctrico del personal obrero.	NA			
	PROMEDIO PONDERADO				

[redacted]

FORMATO

INSPECCIÓN MENSUAL DE OBRA NO TÉCNICA (OBRAS MENORES)

[redacted]

OBRA:	[redacted]		
CONTRATISTA:			
CONTRATO No.		FECHA:	11/05/2021

[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

El criterio / El No cumple / N.A. se aplica

No.	ELEMENTOS EVALUADOS	CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN (SUPERVISOR)
		CUMPLE	PORCENTAJE			
1	**Ejecución del Programa de Obra y Socio Ambiental**	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible]			1		
	Criterio 3 – [illegible]			1		
	Criterio 4 – [illegible]			1		
	Criterio 5 – [illegible]			1		
MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD		**CUMPLE**	**PORCENTAJE**			
7	**Ejecución de Excavación de Zanjas**		100%			
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible]			1		
	Criterio 3 – [illegible]			1		
8	**Instalación del Tendido de Red de Baja Tensión (Cableado)** [redacted]	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible]			1		
	Criterio 3 – [illegible]			1		
	Criterio 4 – [illegible]			1		
	Criterio 5 – [illegible]			1		
9	**Instalación del Transformador** [redacted]	1	100%	1		
10	**Montaje** [redacted]	1	100%	1		
C	**Instalación de Accesorios de Obra**	1	100%			
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible]			1		
	Criterio 3 – [illegible]			1		
	Criterio 4 – [illegible]			1		
2	**Instalación del Transformador** [redacted]	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			N.A.		
	Criterio 2 – [illegible]			N.A.		
	Criterio 3 – [illegible]			1		
	Criterio 4 – [illegible]			N.A.		
3	**Instalación de Fusibles** [redacted]	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible]			N.A.		
4	**Instalación de Transformador** [redacted]	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible]			1		
	Criterio 3 – [illegible]			1		
5	**Instalación de Cuchillas de Seccionamiento**	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible]			N.A.		
	Criterio 3 – [illegible]			1		
6	**Instalación de Pararrayos**	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			N.A.		
	Criterio 2 – [illegible]			1		
	Criterio 3 – [illegible]			1		
CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN		**CUMPLE**	**PORCENTAJE**			
11	**Instalación de Luminarias**	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible]			1		
	Criterio 3 – [illegible]			1		
	Criterio 4 – [illegible]			1		
12	**Instalación de Luminarias**	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible]			1		
	Criterio 3 – [illegible]			1		
	Criterio 4 – [illegible]			1		
13	**Las Luminarias Leer y Cotizadas en la vía son de las características de [illegible] y se encuentran [illegible] en la red del proyecto.**	1	100%	1		
14	**Revisión del Registro de Interruptor de cuchilla (FCO)**	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible]			1		
	Criterio 3 – [illegible] [redacted]			1		
	Criterio 4 – [illegible]			1		
15	**El [illegible] (Cableado) [illegible] para [illegible] [illegible]**	1	100%	1		
CRITERIO Y CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN		**CUMPLE**	**PORCENTAJE**			
16	**Revisión de Cortinales**	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible]			1		
	Criterio 3 – [illegible]			1		
17	**Revisión de Cortinales 2**	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible]			1		
	Criterio 3 – [illegible] [redacted]			1		
18	**Revisión de Cortinales 3**	1	100%	-		
	Criterio 1 – [illegible]			1		
	Criterio 2 – [illegible] [redacted]			1		

[redacted]

[redacted]

FORMATO
INSPECCIÓN DE PROCURA

CODIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

PROYECTO:	[redacted]
RESPONSABLE EN OBRA:	[redacted] FECHA: 23/03/2022

PUNTAJE PONDERADO	100 %

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVATAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
PRODUCCIÓN [redacted]					
1	Los pedidos de obra están consolidados al 80% del consumo total de la obra	1			
2	Los pedidos generacos cuentan con cronogramas de entrega entre 7 a 15 días posteriores a la generación del pedido	1			
3	Se verifica el stock de almacén antes de la genereción del pedido de compra	1			
4	Los pedidos de materiales de acabados cumplen con lo requerido por el cuadro de acabados de la obra	1			
5	Existe comunicación y verificación de espacio de almacén antes de la solictud de compra de materiales criticos	1			
ADMINISTRACIÓN					
6	Se han recepcionado guías que estén relacionadas a una orden de compra aprobada	1			
7	Revisión de guías pasado el crédito acordado: ¿Tienen guias de remisión sin facturar pasado el crédito establecido?	1			
8	Las facturas cumplen con el crédito y forma de pago acordado con el proveedor según	1			
9	Los proveedores tiene conocimiento de como presentar sus facturas y del proceso de facturación	1			
10	Tienen conocimiento del cronograma de entrega de los ordenes de compra solicitadas	1			
ALMACÉN					
11	Tienen cargo de los certificados de calidad y cartas de garantía emitadas por los proveedores	1			
12	¿Todo material que ingresa a almacén tienen orden de compra aprobada y guía relacionada?	1			
13	Las guías de materiales críticos poseen visto de revisión por parte del área de calidad	1			
	PROMEDIO PONDERADO				

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] | FORMATO
INSPECCIÓN MENSUAL DE PRODUCCIÓN EN OBRA | Código: [redacted]
Versión:
Fecha:

OBRA:	[redacted]		
RESPONSABLE DE PRO:			
JEFE DE OBRA:		FECHA:	3- 08 23

PUNTAJE PONDERADO	100%
PONDERADO POR CRITERIOS	N.A.

1 Cumple / 0 No Cumple / N.A. / NO APLICA

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN 1	CALIFICACIÓN *	CALIFICACIÓN -	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
		100%	N.A.	-			
1	Se elabora el Look Ahead de Edificaciones y Obras exteriores, se actualiza semanalmente	1	1				
2	Se elabora el Análisis de Restricciones semanal, considerando los ítems de control: Diseños (Planos, memorias, manuales, fichas técnicas), Suministros y Herramientas	1	1		Mejorar fecha de levantamiento		
3	El Programa Semanal ha sido elaborado en base al Look Ahead y ha pasado por un proceso de levantamiento de restricciones	1	1				
4	El PPC semanal se aproxima al 100%	1	1				
5	Las causas de incumplimiento de la programación son registradas en el formato de Análisis de Causas Incumplidas	1	1				
6	El capataz hace uso de su programación como parte de la ejecución de las actividades	1	1				
7	Se elabora el requerimiento de personal diario. Se lleva el registro de los días extendidos	1	1				
8	Se elabora el [redacted] diario. Se lleva a cabo a partir de las actividades del Look Ahead.	1	1				
9	Se realiza el pedido de material cumpliendo con las fechas límites	1	1				
10	Sobre con la subcontrata, se realiza la coordinación de metrados. El acuerdo se encuentra firmado por el Jefe de Producción, Supervisor de obra y Subcontrata	1	N.A.				
11	Se lleva el registro con las cartas de salida de equipos y materiales en el almacén	1	1				
12	El EDP se encuentra actualizado diariamente	1	1				
13	Se elabora el EDP de forma semanal	1	1				
14	El EDP se encuentra actualizado diariamente	1	1				
15	Se elabora el CIV de forma semanal	1	1				
16	La curva de rendimiento se encuentra actualizada. Se identifica los altos y bajos rendimientos y se analizan las causas	1	1				
17	Se lleva a cabo de forma mensual la calificación a subcontratas	1	N.A.				
18	Se lleva el acta de las reuniones semanales	1	1				
19	Las actividades de producción se encuentran respaldas por los PETS respectivos	1	1		[redacted]		
20	El Master Plan se encuentra actualizado (formato en MS Project)	1	N.A.				
21	Se lleva un adecuado control en el pedido de recursos	1	1				
22	Se revisa, valida y firma valorizaciones al SC	1	1				

[redacted]

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

OBRA: [redacted]
RESPONSABLE DE SSOMA:
RESIDENTE DE OBRA:
FECHA: 13/03/2023

PUNTAJE PONDERADO	100%
PONDERADO POR CRITERIO	#¡DIV/0!

C: Cumple / O: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN ENCONTRADA
			C	O			
	COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO	100%	N.A.	-			
1	El empleador incorpora los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	#¡DIV/0!				Elaborar el reporte de
2	Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	#¡DIV/0!				
3	Se implementan acciones preventivas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para asegurar la mejora continua.	1	#¡DIV/0!				
4	Se reconoce el desempeño del trabajador para motivar la autocrítica y la formación del trabajo en equipo.	1	#¡DIV/0!	NA			Aporte de Abril
5	Se realizan actividades para fortalecer una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, en todos los niveles y turnos.	1	#¡DIV/0!				
6	Se promueve un ambiente laboral armonioso en la empresa entre empleador y trabajador y viceversa.	1	#¡DIV/0!				
7	Existen mecanismos de involucramiento del personal procurando incrementar el mejoramiento continuo de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente.	1	#¡DIV/0!	NA			
	POLITICA, OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SSOMA	100%	N.A.	-			
8	Se difunde y capacita al personal en la Política SSOMA. De ser necesario se ha procedido a los cumplimientos.	1	#¡DIV/0!				
9	Existen objetivos de seguridad definidos y el personal los conoce.	1	#¡DIV/0!				
10	Se cumple con la entrega del Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	#¡DIV/0!				Reglamento ya dejar entregado
11	Se encuentran identificados los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización.	1	#¡DIV/0!				Leyes actualizadas
	PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	100%	N.A.	-			
12	El Plan de SSOMA se encuentra actualizado y con los sellos emitido por las autoridades competentes.	1	#¡DIV/0!				
13	Se cumple el Plan de SSOMA establecido en fechas, tiempos efectivos y/o del cumplimiento.	1	#¡DIV/0!				
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES	100%	N.A.	-			
14	Se comunican los riesgos a los trabajadores por actividad y área de trabajo, así como las medidas de control en cada caso.	1	#¡DIV/0!			25.03.23	Pasar el de lenguaje
15	Existe un organigrama publicado de la Obra especificando cargos y responsabilidades.	1	#¡DIV/0!				
16	La descripción de cargos incluye las funciones básicas en materia de seguridad y salud ocupacional.	1	#¡DIV/0!				
17	Las reconocimientos han sido debidamente difundidos al personal de supervisión y operativo.	1	#¡DIV/0!				
18	La matriz IPERC se encuentra actualizada y publicada.	1	#¡DIV/0!			16.03.23	La Matriz de lenguaje
19	El mapa de riesgos y de evaluación se encuentra actualizado, publicado, y difundido al personal.	1	#¡DIV/0!				
	CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIAS	100%	N.A.	-			
20	Se cumple el Programa de capacitación establecido para la Obra.	1	#¡DIV/0!				
21	Se cumple con la inducción al personal nuevo y/o transferidos.	1	#¡DIV/0!				
	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	100%	N.A.	-			
22	Está conformado el comité de Seguridad y Salud Ocupacional (Supervisor de Área definitivo), se realizan reuniones periódicas y se levantan las actas respectivas.	1	#¡DIV/0!				
23	Los trabajadores de las diferentes áreas no cuentan con un representante ante el comité de seguridad y salud ocupacional.	1	#¡DIV/0!				
	GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	100%	N.A.	-			
24	El empleador que asume el contrato principal es quien instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores garantiza: La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.	1	#¡DIV/0!				
25	La seguridad y salud de los trabajadores de la actividad de la(s) contratista dentro de las instalaciones de titularidad de la empresa contratante [redacted]	1	#¡DIV/0!				
26	La verificación de la contratación de los seguros de accidentes y por cada empleado.	1	#¡DIV/0!				
27	La vigencia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, en caso sea así, el consultor debe detallar su personal.	1	#¡DIV/0!				Si ha ocurrido cierre de algún subcontrato
28	Todos los trabajadores deben el reconocimiento de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo con que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.	1	#¡DIV/0!		Contratos de los empleados		
	GESTIÓN DE CONTROL MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL	100%	N.A.	-			
29	El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores.	1	#¡DIV/0!				
30	Los trabajadores son informados: A título grupal, de los factores que afectan su estado de salud ocupacional.	1	#¡DIV/0!				

[redacted]

31	A título personal, sobre los riesgos asociados a los medios relativos a la enfermedad de su salud.	1	#¡DIV/0!				
32	Los resultados de los exámenes arbitrarios no son usados para ejercer discriminación.	1	#¡DIV/0!				
33	La vigilancia de los exámenes médicos son con finalidades para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.	1	#¡DIV/0!				
34	Los trabajadores cuentan con el seguro Complementario de Trabajo de Riesgo vigente	1	#¡DIV/0!				
GESTIÓN DE LOS REGISTROS		**100%**	**N.A.**	-			
35	El empleador lleva y actualiza los registros y documentos del sistema de gestión en soportes físicos y digitales de trabajo relacionado a: Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y actos inseguros, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas	1	#¡DIV/0!				
36	Registro de estadísticas de accidentes ocupacionales.	1	#¡DIV/0!				
37	Registro del examen médico ocupacional (físico, auditivo, visual, psicosensométrico y factores de riesgo ocupacional).	1	#¡DIV/0!				
38	Registro de inspecciones internas de seguridad y condiciones de trabajo.	1	#¡DIV/0!				
39	Registro de estadísticas de seguridad y salud.	1	#¡DIV/0!				
40	Registro de equipos de seguridad y emergencia.	1	#¡DIV/0!				
41	Registro de inducción, capacitación, entrenamiento, y simulacros de emergencia.	1	#¡DIV/0!				
42	Registro de contratos.	1	#¡DIV/0!	NA			
43	Los registros mencionados son: - Legibles e identificables. - Permiten su seguimiento. - Son archivados y adecuadamente protegidos.	1	#¡DIV/0!				
ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL EN OBRA		**100%**	**N.A.**	-			
44	Área de trabajo esta limpia y libre de residuos y escombros.	1	#¡DIV/0!				
45	Pasillos y pasillos están despejados.	1	#¡DIV/0!				
46	Materiales y equipos están correctamente ubicados.	1	#¡DIV/0!	O	27.07.22	Equipos de Emergencia	
47	Cables eléctricos, mangueras, cables conductores para soldadura, etc. están en buen estado y elevados para evitar riesgos de tropiezo.	1	#¡DIV/0!	O	25.07.22	Señalización	
48	Área libre de restos de metal con puntas poseen algún riesgo de pinchazo.	1	#¡DIV/0!				
GESTIÓN AMBIENTAL		**100%**	**N.A.**	-			
49	En las áreas de trabajo hay provisión de agua potable y hay basureros para los mismos.	1	#¡DIV/0!				
50	Hay ventiladores y depósitos para los diferentes tipos de residuos.	1	#¡DIV/0!	O	NO se cuenta	Se recomienda	25.07.22
51	Se ha identificado el acopio temporal de residuos sólidos convencionales peligrosos.	1	#¡DIV/0!				
52	Implementación de una estructura adecuada (temporal) y apropiada en el lugar.	1	#¡DIV/0!				
53	Baños químicos limpios, con dispensador de agua para lavado, en cantidad suficiente y ventilados al aire.	1	#¡DIV/0!	NA			
PREVENCIÓN EN EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS		**100%**	**N.A.**	-			
54	Se utilizan productos químicos autorizados por el departamento de seguridad de la empresa.	1	#¡DIV/0!				
55	Los productos químicos cuentan con la hoja SDS y están ubicados en el lugar indicado.	1	#¡DIV/0!	O	25.07.22		
56	Los productos químicos se encuentran rotulados, con el envase original cerrado y en buen estado.	1	#¡DIV/0!				
57	Los residuos de los productos químicos están en un lugar ventilado, limpio y ordenado.	1	#¡DIV/0!				
POSICIONES / ACCIONES DE LA OBRA		**100%**	**N.A.**	-			
58	Los trabajos en altura cuentan con el permiso correspondiente para realizar. Caso de evidencia buenos un lugar.	1	#¡DIV/0!				
59	Soporte de cuerda vital, que podrían ser usados por trabajadores están probados con.	1	#¡DIV/0!				
60	Se previene el sobreesfuerzo de cargas manuales al levantar, empujar, tirar o cargar.	1	#¡DIV/0!				
61	Los trabajos sobre o cerca de superficies peligrosas están controlados.	1	#¡DIV/0!				
62	No trabaja con carga suspendida.	1	#¡DIV/0!				
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		**100%**	**N.A.**	-			
63	Se cuenta con un registro de entrega y control de EPP.	1	#¡DIV/0!				
64	Cascos de seguridad y barbiquejos son usados y mantenidos como se requiere.	1	#¡DIV/0!				
65	Protección auditiva usada apropiadamente.	1	#¡DIV/0!				
66	Protección ocular usada de manera apropiada.	1	#¡DIV/0!	O	Faltan	Soporte	
67	Guantes de seguridad u otra protección requerida para tareas están disponibles.	1	#¡DIV/0!				
68	Mascaras protectoras o respiradores usados adecuadamente.	1	#¡DIV/0!				
69	Guantes son del tipo correcto y tallas apropiadas.	1	#¡DIV/0!				
70	Ropa de trabajo como uniformes y chalecos con distintivos reflectantes.	1	#¡DIV/0!				
71	Equipo de protección para soldadores usados adecuadamente.	1	#¡DIV/0!	NA			
72	Otros equipos, vestimenta de trabajo para tareas específicas.	1	#¡DIV/0!				
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA		**100%**	**N.A.**	-			
73	Hay barreras, barandas instaladas y en buenas condiciones para prevenir caídas de trabajadores según se requiere.	1	#¡DIV/0!				
74	Área de excavación adecuadamente asegurada según se requiere y en buenas condiciones.	1	#¡DIV/0!				
75	Letreros de advertencia / Mecanismos de Movimiento y otros peligros y señales están colocadas y son claras.	1	#¡DIV/0!				
76	Protección de tránsito (Vigilantes, Balizas, Conos de Tránsito) y desviaciones en lugares de cuerpo de trabajadores.	1	#¡DIV/0!				
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES		**100%**	**N.A.**	-			
77	Las herramientas son adecuadas para el trabajo a (no hechizas)	1	#¡DIV/0!				
78	Son usadas correctamente.	1	#¡DIV/0!				
79	Están en condiciones seguras de operatividad.	1	#¡DIV/0!				
80	Cables eléctricos - extensiones conectados a tomacorrientes con	1	#¡DIV/0!				
81	Mangueras neumáticas están de material aprobado.	1	#¡DIV/0!				
82	Uso de cortes y desbastes cables correctamente.	1	#¡DIV/0!				
83	El personal es guiado para la utilización de herramientas para lo cual no se encuentra debidamente capacitado.	1	#¡DIV/0!				
84	Herramientas son almacenadas correctamente.						
85	Taladros / Martillos rotopercutores / esmeriles y esmeriles						
86	Equipos Eléctricos (soldadores, etc.) energizados						

[redacted]

N°	Ítem	Ptje.	Resultado	Cumple	Observación		
87	Los apoyos de esmeriles de banco están debidamente ajustados (3 mm. Separación máxima a la base de apoyo) y las muelas apropiadamente protegidas.	1	#DIV/0!	1			
88	Las herramientas eléctricas se detienen al dejar de presionar el botón de activación (seguro de parada de hombre muerto).	1	#DIV/0!	1			
89	Conexiones eléctricas apropiadas en forma adecuada y bajo estándar (Vía Norma ECOS).	1	#DIV/0!	1			
ESCAVACIONES		100%	N.A.	-			
90	Talud y entibado adecuado según norma NCh.	1	#DIV/0!	NA			
91	Existe señalización de la excavación en su perímetro.	1	#DIV/0!	1			
92	Existen vías de acceso y salida cada 7,5 metros.	1	#DIV/0!	1			
93	Diariamente se inspeccionan y se las mantiene en condiciones seguras.	1	#DIV/0!	1			
94	Tienen protección contra caídas (barreras rígidas).	1	#DIV/0!	1			
95	Excavación a más de 1,20 mts de profundidad, cuenta con vigía.	1	#DIV/0!	1			
96	Escombros a más de la mitad de la profundidad de la excavación con respecto al borde.	1	#DIV/0!	1			
ANDAMIOS Y ESCALERAS		100%	N.A.	-			
97	Construidos por especificaciones técnicas de fabricante.	1	#DIV/0!	1			
98	Cuentan con vías de acceso y arneses apropiados.	1	#DIV/0!	1			
99	Etiquetado de inspección (Rojo No Usar, Verde Usar).	1	#DIV/0!	1			
100	Se construyen en forma segura (no sufren modificaciones).	1	#DIV/0!	1			
101	Escaleras apropiadas para el trabajo realizado/ adecuadamente aseguradas.	1	#DIV/0!	1			
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		100%	N.A.	-			
102	Áreas de seguridad requeridas y usadas de manera adecuada.	1	#DIV/0!	1			
103	Las líneas de vida están adecuadamente aseguradas a un soporte apropiado.	1	#DIV/0!	1			
104	Protección perimetral/rígida según se indica.	1	#DIV/0!	1			
105	Líneas de vida estáticas, diseñadas, instaladas y soportan una fuerza mínima de 2.450 kg.	1	#DIV/0!	1			
106	Equipos de protección contra caídas son usados solamente para este propósito.	1	#DIV/0!	1			
107	Equipos de protección contra caídas son inspeccionados y mantenidos en forma regular.	1	#DIV/0!	1			
108	Los bastones y otros dispositivos anclajes, para conexión de líneas de vida, están previamente calculados para asegurar su resistencia.	1	#DIV/0!	1	[illegible]		
109	Líneas de vida cuentan con autorización debidamente firmada y soporte en documentos de seguridad.	1	#DIV/0!	1			
EQUIPOS DE LEVANTE DE CARGA		100%	N.A.	-			
110	Equipo de capacidad adecuada para el levante y con tabla de carga en cabina y en idioma español.	1	#DIV/0!	1			
111	Cable de izaje y seguro del gancho en buenas condiciones con inspección vigente.	1	#DIV/0!	1			
112	Accesorios de levante (eslingas, grilletes, estrobos) en buenas condiciones y con la inspección del mes.	1	#DIV/0!	1			
113	Medias cañas y otros protectores de eslingas usados como se requiere.	1	#DIV/0!	1			
114	Se usan técnicas de levante apropiadas (rigging plan, etc.).	1	#DIV/0!	1			
115	Rigger/Señalero con certificación vigente.	1	#DIV/0!	1			
EQUIPOS MÓVILES DE CONSTRUCCIÓN		100%	N.A.	-			
116	Luces, frenos, bocinas, alarmas de retroceso funcionando, vidrios en buen estado.	1	#DIV/0!	1			
117	Existen y vehículos cuentan con cinturones de seguridad y estos se usan.	1	#DIV/0!	1			
118	Mantención apropiada / Inspección Mensual / Chequeo previo.	1	#DIV/0!	1			
119	Revisión técnica vigente.	1	#DIV/0!	1			
120	Equipo usado adecuadamente.	1	#DIV/0!	1			
121	Carga transportada en forma segura.	1	#DIV/0!	1			
122	Licencia Interna de Operador/Conductor Vigentes.	1	#DIV/0!	NA			
123	Vehículos Livianos con pértiga/baliza [illegible].	1	#DIV/0!	NA			
124	Equipos Móviles de Construcción con [illegible] cuando transitan por caminos de la faena.	1	#DIV/0!	1			
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		100%	N.A.	-			
125	Los materiales inflamables almacenados adecuadamente.	1	#DIV/0!	1			
126	Cilindros de oxígeno y gases combustibles en almacenaje separado.	1	#DIV/0!	1			
127	Los cilindros y recipientes están rotulados indicando lo que contienen.	1	#DIV/0!	1			
128	Extintores señalizados, localizados e inspeccionados en forma mensual.	1	#DIV/0!	1			
129	Los cilindros de gas comprimido son almacenados y transportados adecuadamente.	1	#DIV/0!	1			
130	Contenedor de trabajo en caliente y cortafuegos para soldar como se requiere.	1	#DIV/0!	NA			
131	Manómetros y válvulas están debidamente instalados y en buenas condiciones.	1	#DIV/0!	NA			
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES		100%	N.A.	-			
132	Carga transportada en forma segura, uso de cubiertas u otros.	1	#DIV/0!	NA			
133	Carga y materiales almacenados en forma segura.	1	#DIV/0!	1			
134	Se usan cuñas y separadores.	1	#DIV/0!	NA			
135	Altura de materiales no tiene riesgo.	1	#DIV/0!	1			
136	Señalización de avanzada y posterior (banderín, cinta, lámparas de advertencia).	1	#DIV/0!	1			
RESPUESTA A EMERGENCIAS		100%	N.A.	-			
137	Dentro del área de trabajo hay trabajadores con preparación en primeros auxilios, se tiene organizada la brigada de emergencia.	1	#DIV/0!	1	[redacted]		
138	Trabajadores saben cómo actuar ante temblores o sismos, etc.	1	#DIV/0!	1			[illegible]
139	Trabajadores saben cómo actuar en caso de incendios.	1	#DIV/0!	1			
140	En el área hay una estación de emergencia y esta contiene todos los elementos exigidos / Existe registro diario de revisión de la estación de emergencia.	1	#DIV/0!	1			
141	Trabajadores conocen la ubicación de los puntos de refugio y/o reunión.	1	#DIV/0!	1			
142	Trabajadores conocen el flujo de comunicación en caso de incidentes (Acciones a realizar en emergencia y reporte de [illegible]).	1	#DIV/0!	1			
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES - ACCIONES CORRECTIVAS		100%	N.A.	-			
143	El flujo de reporte de incidentes se encuentra publicado en el lugar visible y es de conocimiento del personal.	1	#DIV/0!	1			
144	Se mantienen registros de la investigación de los incidentes ocurridos en obra.	1	#DIV/0!	1			
145	Los accidentes son investigados por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y difundidos al personal.	1	#DIV/0!	1	[redacted]		[redacted]
146	Se cierran las acciones correctivas y preventivas oportunamente y se verifica su eficacia. Se mantienen los registros correspondientes.	1	#DIV/0!	1			
CONTROLES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		100%	N.A.	-			

147	ATS en el lugar de trabajo y los medios obligatorios se encuentran limpios y en uso.	1	MENSUAL	I			Verificar permanentemente el lugar
148	Procesos constructivos, oficios y estructuras (por Trabajadores capacitados en reconocer peligros y riesgos.	1	TRIMESTRAL	II			
149	Se cuenta con los permisos especiales para realizar la tarea, en caso de ser necesario (Trabajos en Altura, Espacio Confinado, Trabajo en Caliente, etc.).	1	MENSUAL	I			
150	Se encuentra el espacio y/o superficie a cargo de la tarea en el lugar.	1	MENSUAL	I			
151	HSEC y Ambiente de trabajo seguro (ATS) están en terreno (según criticidad).	1	MENSUAL	O		15.09.22	Personal de aseo no [illegible] en el proyecto
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		100%	N.A.				
152	La alta dirección: Revisa y actualiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiado y efectivo.	1	TRIMESTRAL	III			
153	La investigación y acciones permiten a la dirección de la empresa, entidad público o privada (igual los fines previstos y esperados de servicios, cambios en la política y objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo).	1	TRIMESTRAL	III			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO
INSPECCION DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN N°:
FECHA:

PROYECTO:	[redacted]		
RESPONSABLE EN OBRA:		FECHA:	

PUNTAJE PONDERADO	01	95%

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVATAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CAPITAL HUMANO					
1	Entrega del tareo semanal todos los lunes al mediodía (JA)	1			
2	Presentación de las solicitudes de liquidación del personal obrero al área de Capital Humano de manera oportuna, dicho(s) documento(s) deben contener las firmas de los responsables	1	Con retraso (Miércoles)		
3	Custodiar el cargo de presentación del tareo semanal con las firmas respectivas.	1			
4	La información del Tareo debe ser revisado y no contener errores	1			
5	Tener actualizado el file personal de los trabajadores (obreros).	1			
6	Mantener actualizada la matriz de contratistas de forma mensual (la información debe encontrase actualizada en los diferentes items solicitados - Ubicación Onedrive de obra)	1			
7	Informar oportunamente las incidencias diarias por ausencia (enfermedad) a las áreas correspondientes.	1			
8	Tener actualizada el cargo del envio de boletas de forma digital	1			
9	Llevar el registro de asistencia del personal sin observaciones en el Geovictoria	0	[redacted]		
10	Tener actualizadas las polizas de SCTR del personal staff y obrero	0			
11	Informar oportunamente todo cese del personal obrero y de limpieza	1			
12	Cargar el informe mensual en el power app el 3er día hábil del mes.	1			
TESORERÍA					
13	Cargar en el ERP el fondo fijo para aprobación de la gerencia de obra (semanal).	1			
14	El fondo fijo no debe contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
15	Todo arqueo de caja chica no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
16	Las compras a través de la caja chica deben efectuarse sólo a proveedores con los cuales no contamos con línea de crédito. (dependiendo la cantidad de compra)	1			
17	Mantener una adecuada custodia del file del fondo fijo	1			
18	Mantener actualizados el cuadro de garantías (Cartas Fianza, Letras de cambio)	1			

CONTABILIDAD					
19	Registrar en el ERP las facturas semanales al cierre de la semana.	1			
20	Cargar en el sharepoint las facturas y los sustentos al cierre semanal	1			
21	Las facturas no deben contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).	1			
22	Mantener una adecuada custodia del file de las facturas presentadas semanalmente.	1			
23	Mantener actualizado el reporte de guías de remisión de meses anteriores	1			
24	Todas las guias de remision(original) deben contener el sello de recepción del área de Almacén.	1			
25	Presentación de entregables del mes [redacted]	1			
26	Presentación y custodia de las guias de remisión de [redacted]	1			
ALMACENES					
28	Entrega de los informes de inventario el 1er dia habiles del mes	1			
29	Llevar un adecuado control en la emisión de las Guias de Remisión	1			
30	Registro diario de los ingresos y salidas de almacén en el ERP	1			
31	Actualización diaria de las Bincard	1			
32	Llevar un ambiente de Almacén limpio y ordenado	1			
33	Tener actualizado el kardex de EPP en fisico	1			
34	El inventario mensual no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
35	Los materiales se colocan según recomendaciones del proveedor (caja)	1			
36	Los productos quimicos cuentan con las Hojas MSDS	1			
LOGÍSTICA					
37	Cumplir con el cronograma de compras. Enviar ordenes de compra y servicio aprobadas.	1			
GUARDIANÍA					
38	Toda incidencia presentada por el servicio de vigilancia debe ser primero canalizada por el área de administración de obra	1			
39	Reunión mensual con la empresa de vigilancia.	1			
40	Requisas a los ambientes de los subcontratistas de manera mensual	1			
41	Requisas al personal obrero de manera mensual	1			
	PROMEDIO PONDERADO	#¡DIV/0!			

[redacted]

[redacted] [illegible] [redacted]

[illegible]	[redacted]	[illegible]	13/05/22
[illegible]	[redacted]	[illegible]	[illegible] 100%
[illegible]	[redacted]		
[illegible]	[redacted]		

[illegible]

[illegible]					RESULTADO	OBSERVACIONES	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	✓ ✓			
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	✓ ✓			
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	✓			
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	✓			
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	✓			
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	[illegible]		
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	✓			
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	✓ ✓			
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	✓			
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	✓			
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	✓ N.A. N.A.			
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N.A. N.A. N.A.			
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N.A. N.A.			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE OTE:	

PUNTAJE PONDERADO	80,83 %

Item	Puntos de Evaluación	Calificación		Observaciones	Fecha de levantamiento	Compromiso y Acción Preventiva
Resultados de la Planificación		0%	-			
1	[redacted] **Criterio: Verificar la aprobación del Plan de Calidad y cumplimiento de capacitación con registro de asistencia.	1	B	Reinducción plan de calidad.		
2	[redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de elaboración y aprobación del presupuesto de calidad.	1	B	Faltan actas de 2 meses.		
3	[redacted] **Criterio: Verificar la consistencia de costos asociados a no conformidades.	0	M		29/09/22	
Resultados de Gestión		0%	-			
4	[redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de la documentación de la gestión de no conformidades en el proyecto de obra.	1	B			
5	[redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del envío oficio mensual por UT.	1	B			
6	[redacted] **Criterio: Medición del cumplimiento de lo mínimo establecido (> 90%).	1	B	May 95.03 Jun 96.82 Jun 95.98 Ago 95.93 = 95.65 %		
Procesos		0%	-			
7	[redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de los procesos auditados.	1	B	Act 15/09		
8	[redacted] **Criterio: Verificar que todos procesos se encuentren correctamente llenados y firmados por el responsable asignado.	0	B	No se encuentran en el fotos- No se cumple observación -		Evidencias de las
9	[redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de los procesos ejecutados y cerrados.	1	B	ET 5 = 98%	ET 4 = 98%	
Revisión de Materiales Críticos		0%	-			
10	[redacted] **Criterio: Verificar la existencia del registro de revisión de materiales críticos ejecutados.	1	B			
11	[redacted] **Criterio: Verificar que todos los documentos correspondientes (Informe, Ensayo y copia de la guía de remisión) estén correctamente cargados.	1	B			
Equipos de Medición y Ensayos		0%	-			
12	[redacted] **Criterio: Verificar la vigencia de certificados de calibración de equipos en terreno (propios y de subcontratos).	1	B			
13	[redacted] **Criterio: Verificar la disponibilidad de los ensayos del resumen de laboratorio vigente a obra.	0	B	- No se cuenta con información de ensayo de aprobado (mat. control)		
14	[redacted] **Criterio: Verificar en el archivo físico y App Telefónica que todos los equipos estén documentados (Hoja de vida).	1	B			
15	[redacted] **Criterio: Verificar la actualización del registro de resultados de ensayos de materiales de laboratorio de la obra.	1	B			
Capacitaciones de Calidad		0%	-			
16	[redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento de % de asistencia (> 90%).	1	B	May 100 Jun 100 Jun 100 Ago 100		
17	[redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento de capacitación mensual.	1	B			
18	[redacted] **Criterio: Verificar que el personal de obra cuente con las capacitaciones básicas de calidad.	1	B			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Observaciones		0%				
19	Cumplimiento [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento de lo mala establecido y todos	1	0	Mes 85% Jun 88.67 Jun Bajo Bajo 87.84 = 86.84		
20	Verificación de [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento del registro de mantenimiento preventivo	0	0	NO se evidencia mantenimiento de tasa (falta fotos)		
21	Verificación de la [redacted] **Criterio: Verificar correctividad del registro de mantenimiento preventivo de las Observaciones	0	0	NO se evidencia cierre de tasa con fotografías del mantenimiento		
22	Verificación de [redacted] **Criterio: Revisar que se han asignado medios de causas asociadas hallazgos registrados	1	1			
Cumplimiento de Responsabilidades		0%	-			
23	Verificación del [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento del plan responsable de capacitación	1	0			
24	Verificación [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento del plan responsable de capacitación	1	0			
25	Verificación [redacted] **Criterio: Verificar cumplimiento de la acción de mejora	1	0	Bajo 100% Jul 100%	Jun 100% Mayo 100%	
Manual de Funciones y PETS		0%				
26	Verificación [redacted] **Criterio: Revisar que los planes se cumplan con las especificaciones y tengan el sello y firma del jefe de QT por cambio	1	0			
27	Verificación [redacted] **Criterio: Revisar que los PETS se cumplan con los requisitos y cargados y mas de los responsables	1	0			
Dossier de Calidad		0%	-			
28	Verificación [redacted] **Criterio: Verificar el cumplimiento y actualización del dossier de calidad contenga con la información física y digital de todo la documentación requerida. Se deberá actualizar cuando se cambie el Reglamento del equipo de elaboración de la documentación	0	0	Falta Actu		
29	Verificación [redacted] **Criterio: Verificar la actualización de los documentos vencidos por cada validación	1	1			

Notas: 1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

[redacted]

[redacted]

[redacted]

INSPECCIÓN DE OFICINA TÉCNICA

[redacted]

OBRA:	[redacted]
RESPONSABLE DE OT:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	[redacted] FECHA: 09/06/2022

PUNTAJE PONDERADO	88%
PONDERADO POR CRITERIO	100%

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
PRESUPUESTOS		100%	100%	-			
1	Revisión del Presupuesto Meta y Venta (Almacenado):	1	100%	-			
	Criterio 1.- Presupuesto elaborado en Software Presupuestario S10 (CMS).			1			
	Criterio 2.- [redacted]			1			
	Criterio 3.- Presupuesto bien valorizado en distribuye de presupuestos (D)			1			
	Criterio 4.- [redacted]			1			
	Criterio 5.- Cronograma [redacted]			1			
	Criterio 6.- Presentación del Cronograma Valorizado de presupuesto Venta			1			
GESTION Y CONTROL DE COSTOS		90%	88%	-			
2	Revisión de Valorización Mensual y al cierre Inmobiliario:	1	100%				
	Criterio 1.- Las Valorizaciones de Subcontratos se envían el día 25 de cada mes con copia al Gerente de Operaciones y Jefe de Presupuestos y Control de Costos.			1			
	Criterio 2.- Las valorizaciones son bien elaboradas y ordenadas, siguiendo el orden del contrato al formato [redacted]			1			
	Criterio 3.- Las Valorizaciones de cuenta de Obra para la Obra [redacted] se envían el día 25 de cada mes al Gerente de Proyectos y/o Jefe de Proyectos con copia al Gerente de Operaciones y Jefe de Presupuestos y control de Costos.			1			
3	Revisión [redacted]	0	80%				
	Criterio 1.- Los resultados de la columna de Costo Unitario Individuales se trasladan del EdP Dynamics y deben corresponder con los datos exportados del Dynamics, los gastos generales, directos e indirectos y el resultado, los precios base de costos deben provenir desde Dynamics.			1			
	Criterio 2.- [redacted]			1			
	Criterio 3.- Distribución de gastos generales por el Modo Directo y/o Comerciales, y aprobados por Administración y Mandantes.			1			
	Criterio 4.- Columna de Presupuesto de la Actualización debe ser igual al presupuesto Venta (Contrato) y/o Modificaciones.			1			
	Criterio 5.- Una vez [redacted] operados el cuadro Contable del mes, se envía la Producción y Costo Directo a el Jefe de Presupuestos y control de Costos.			0			
4	Revisión del [redacted]	1	100%	1			
5	Revisión del [redacted]	1	100%	1			
6	Revisión de Anticipos de Obra:	1	100%				
	Criterio 1.- Los Anticipos documentos con un Vale Autogenerado y se encuentran en condiciones (Legalidades y/o condición) Ingresados en el Software [redacted]			1			
	Criterio 2.- Los Anticipos deben tener las firmas y sus respectivas de aprobación (original y copia) Jefe de Oficina Técnica, Gerente de Operaciones y Administración.			1			
	Criterio 3.- La factura debe estar con el respectivo timbre, sin enmendaduras y con el detalle de partidas solicitadas y con retenciones.			1			
	Criterio 4.- Se debe contar con la Orden de Compra [redacted] Factura y OT.			1			
7	Revisión del Formato [redacted]	1	100%				
	Criterio 1.- Solicitud a Contabilidad, Costo total registrados en el módulo de Contabilidad (Proveedores, Cuentas por Pagar).			1			
	Criterio 2.- Indicadores de la diferencia entre el costo de Contabilidad y el costo de Obra			N.A.			
	Criterio 3.- Envío al Área de Presupuestos y control de costos del Formato (Compatibilización Mensual de Horas Hombre, Subcontratos, Gastos Generales, Suministros, Maquinarias y Herramientas).			1			
	Criterio 4.- Disponibilidad del cuadro de distribución de consumo de materiales por dimensión (maquinaria, de acuerdo al tiempo de vida operativa de los equipos, el inicio del proyecto y controles mensuales de consumo controlados por dimensiones, los cuales se deben identificar claramente en el mismo).			N.A.			
8	Revisión de Formato [redacted]	1	100%	-			
	Criterio 1.- Formato actualizado de las provisiones a ser [redacted] Contabilidad con los días establecidos según el Formato de provisiones del Departamento de Contabilidad.			1			
	Criterio 2.- Carga de Provisiones ejecutado por Obra y Área de Finanzas y control de Obra.			1			
9	Revisión del Formato [redacted]	1	100%	-			
	Criterio 1.- Envío de Formato a [redacted] Contador General y Analista de Contabilidad General con copia a Jefe de Proyectos y Jefes y control de costos, Gerente de Obras.			1			
	Criterio 2.- Gastos de personal [redacted] por contabilidad coherencia con el mismo enviado en Formato de provisiones.			1			
	Criterio 3.- Considerar [redacted]			1			
10	Revisión de Análisis de Brechas:	1	100%	-			
	Criterio 1.- Formato de [redacted]			1			
	Criterio 2.- Se debe presentar el Resultado de Brecha Comercial junto con los Reportes Operativos.			1			
11	Revisión de Informes Mensuales:	1	100%				
	Criterio 1.- Todos los informes del proyecto deben estar subidos al Power BI al Primer día hábil.			1			
	Criterio 2.- El Reporte Operativo [redacted] Cronograma en Ejemplares (COE).			1			
	Criterio 3.- Se debe presentar el Resultado Contable de Obra [redacted]			1			
CONTROL DE DOCUMENTOS			100%	-			
12	Revisión de Los planos de obra:		100%	-			

[redacted]

	Criterio 1.- Estar incluido y guardado en la RED en la carpeta de Obra Terminada			1			
	Criterio 2.- Se debe [redacted]			2			
	Criterio 3.- Se debe [redacted]			3			
	Criterio 4.- Comparativo con los precios de obra estimados (VUP o Lista Of) y cotizaciones base de ejecución del PLAN ORO			4			
15	Las Comparativas y Cotizaciones de cada una de las adquisiciones de materiales y subcontratos deberán estar archivadas en la red del proyecto.	1	100%	1			
16	Revisión del Registro de Solicitudes de cambio (RSC):	1	100%	-			
	Criterio 1.- Está dentro de la RED			1			
	Criterio 2.- Registrados en PLANEO y con sus firmas de todos los involucrados (Residente y Cliente)			1			
	Criterio 3.- Debe de contar [redacted] actualizado.			1			
	Criterio 4.- Se debe contar [redacted]			1			
17	El Expediente de Compras no debe estar impreso y en formato PDF con las firmas de los involucrados. Somete de forma al área de Presupuestos y Control de Costos	1	100%	1			
GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS SC		100%	100%	-			
18	Revisión de Contratos	1	100%	-			
	Criterio 1.- [redacted]			1			
	Criterio 2.- Todos los contratos deberán estar [redacted]			1			
	Criterio 3.- Todos los contratos deberán estar [redacted]			1			
	Criterio 4.- Se debe [redacted]			1			
	Criterio 5.- Verificación que el SC tenga la Aptitud (Original) y Documentación referida a Invalidez (I.P.R.F), accidentes/robo y Póliza vigente al Terminarse			N.A.			
19	Revisión de Contratos 2:	1	100%	-			
	Criterio 1.- Todos estén aprobados (confirmed, desde excel) y en Negativo en [redacted]			1			
	Criterio 2.- Todas las subcontratas deben encontrarse cargadas al sistema [redacted]			1			
	Criterio 3.- Toda subcontrata [redacted]			1			
	Criterio 4.- Revisión del [redacted]			1			
20	Revisión de Contratos 3:	1	100%	-			
	Criterio 1.- Todo el cronograma consultado de [redacted]			N.A			
	Criterio 2.- [redacted]			1			
	Criterio 3.- [redacted]			1			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

INSPECCIÓN DE PRODUCTO

[redacted]

PROYECTO: [redacted]		PUNTAJE PONDERADO	86%
RESPONSABLE EN OBRA: [redacted]	FECHA: 13/04/22		

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
PRODUCCIÓN					
1	Los pedidos de obra están consolidados al 80% del consumo total de la obra	1	No se verifica dicho ítem		
2	Los pedidos generados cuentan con cronogramas de entrega entre 7 a 15 días posteriores a la generación del pedido	1			
3	Se verifica el stock de almacén antes de la generación del pedido de compra	1			
4	Los pedidos de materiales de acabados cumplen con lo requerido por el cuadro de acabados de la obra	1			
5	Existe comunicación y verificación en espera de almacén antes de la salida de compra de materiales críticos	0	No se verifica lo que?		
6	Se cumple los pedidos estratégicos en los tiempos o plazos definidos en el formato "Lead time" del proyecto	1	Incluido en ítem 13		
7	Las Solicitudes de compra cuentan con la aprobación del área de soporte correspondiente (SSOMA, Calidad y Equipos)	1			
8	Las Solicitudes de compra cuentan con el formato "Sustento de Pedidos de Materiales" actualizado	0	No hay sustento		
9	Las Solicitudes de compra cuentan con el formato "Control de Pedidos y Llegada de Materiales" actualizado	1			
10	Se cuenta con vales de consumo con fecha de vencimiento mayores a 1 o 2 días	1			
ADMINISTRACIÓN					
10	Se han exceptuado guías que estén relacionadas a una orden de compra aprobada	1			
11	Revisión de guías pasado el crédito acordado: ¿Tienen guías de remisión sin facturar pasado el crédito establecido?	1			
12	Las facturas cumplen con el crédito y forma de pago acordado con el proveedor según su orden de compra	1			
13	Los proveedores tienen conocimiento de cómo presentar sus facturas y del proceso de facturación	1			
14	Tienen conocimiento del cronograma de entrega de las órdenes de compra solicitadas para atención	1			
15	Se cuenta con confirmación de llegada o recepción de facturas al proveedor.	1			
16	Se Cerraron y/o Cancelaron las Pedidos de [redacted] proyecto en coordinación con el área de Producción	N.A.			
ALMACÉN					
17	Tienen carpeta de los certificados de calidad y cartas de garantía emitidas por los proveedores	1	Falta levantado		
18	¿Todo material que ingresa a almacén tienen orden de compra aprobada y guías relacionadas?	1			
19	Las guías de materiales críticos poseen visto de revisión por parte del área de calidad	0	Fue firmado por producción		
20	Se realiza el apilamiento del material recepcionado según las indicaciones del proveedor.	1			
21	Se cuenta con vales de consumo con fecha posterior al ingreso (1 o 2 días posterior a la emisión) pendientes de registro de almacén	1			
22	Se realiza seguimiento a los materiales con solicitud de cambio o rechazo por parte de obra.	1			
	[redacted] POSITIVADO				

[redacted]

V.B. Inspeccionado

[redacted]

[redacted]

[redacted]

INSPECCIÓN DE PRODUCCIÓN

[redacted]

21/23

OBRA:	[redacted]
RESPONSABLE DE PRO:	
JEFE DE OBRA:	FECHA:

PUNTAJE	91%

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
PLANIFICACIÓN DE LA OBRA					
1	Cuenta con el plan de producción aprobado [redacted]	1	Actualizar.		
2	No elaborad[redacted]	1			
3	La curva de [redacted] ente de obra y validad por el jefe de OT (concuerda con las HH del presupuesto de la obra)	1			
4	Ha hecho llegar al área de Maquinaria y Equipos el Listado de maquinarias y equipos requeridos para el proyecto.	1			
SOLICITUD DE MATERIALES					
1	Elabora el BS.PROD.FO18 Sustento de pedido de materiales, identificando los materiales a necesidad y las fechas a requerir	1			
2	Se encuentran elaborados lo[redacted]	1			
3	Los requerimientos se encuentran validados por el asistente de producción, jefe de producción y jefe de OT; y aprobados por el gerente de obra.	0	Fechas de pedido muy próximas a la salida.		
4	Descarga status de pedidos en ERP. Hace seguimiento en el mismo Dynamics	1			
5	Se lleva el registro con los vales de salida de equipos y materiales en el almacén.	1			
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN					
1	Se elabora el Look Ahead de Edificaciones y Obras exteriores, se actualiza semanalmente.	1			
2	Se elabora el Análisis de Restricciones semanal, considerando los tipos de restricciones (Proyecto, materiales, mano de obra, equipos, subcontratas y herramientas).	0	NO se ha considerado	actividades de octubre obra se sde	
3	El Programa Semanal ha sido elaborado en base al Look Ahead y ha pasado por un proceso de levantamiento de restricciones.	1			
4	El PPC semanal se aproxima al 100%.	1			
5	Las causas de incumplimiento de lo programado son registrados en el formato de Análisis de Causas Incumplidas.	1			
6	El capataz hace uso de la programación diaria para la ejecución de las actividades.	1			
7	Se elabora el movimiento de personal diario. Se lleva el registro de los días anteriores.	1			
8	Se realiza el Tarjeo diario. Se lleva a cabo a partir de las actividades del Look Ahead.	1			
9	Junto con la subcontrata, se realiza la conciliación de metrados.	N/A			
10	Las actividades de producción se encuentran respaldas por los PETS respectivos.	1			
SEGUIMIENTO Y CONTROL					
1	Se ha subido el informe mensual y no hay registro de indicadores pendientes.	1			
2	El ISP se encuentra actualizada	1			
3	El ISM se encuentra actualizada	1			
4	La curva de rendimiento se encuentra actualizada. Se identifica los altos y bajos rendimientos y se analizan las causas.	1			
5	Se lleva el acta de las reuniones semanales con los capataces	1			

[redacted]

[redacted]

Escaneado con CamScanner

[redacted]

[redacted] DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE [redacted]

98%

OBRA:	[redacted]
RESIDENTE DE SSOMA:	[redacted] FECHA:
RESIDENTE DE OBRA:	

PUNTAJE PONDERADO	%(E1)
PROMEDIO POR CRITERIOS	%(EF)

1. Cumple / 0. No Cumple / N.A. No Aplica

Nº	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
		1	2				
	COMPROMISO E MEJORAMIENTO	100%	100%	-			
1	El empleador compromete los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	100%	1			
2	Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	100%	1			
3	Se implementan acciones preventivas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para mejorar la mejora continua y la prevención de riesgos.	1	100%	1			
4	Se promueve el desempeño del trabajador para mejorar la cultura Zero y se fomenta el trabajo en equipo para un buen clima laboral.	1	100%	1			
5	Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interactuando en el mejoramiento continuo de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	100%	1			
	POLÍTICA, OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SSOMA	100%	100%	-			
6	Se publica y capacita al personal en la Política SSOMA. Se tienen registros y el personal la ha memorizado.	1	100%	1			
7	Existen objetivos de seguridad definidos y el personal los conoce.	1	100%	1			
8	Se cumple con lo exigido del Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	100%	1			
9	Se encuentran identificados los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la seguridad en	1	100%	1			
	PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	100%	100%	-			
10	El Plan de SSOMA se encuentra actualizado y coordinadamente firmado por los responsables competentes.	1	100%	0	No está firmado por [redacted]		
11	Se cumple el Plan de SSOMA establecido en la Obra. Existen evidencias sólidas del cumplimiento.	1	100%	0	No existen PETS Actividades [redacted]		
12	Existe un organigrama publicado de la Obra especificando cargos y responsabilidad.	1	100%	1			
13	Las descripciones de cargos incluyen las responsabilidades en materia de seguridad y salud ocupacional.	1	100%	1			
14	Las responsabilidades están debidamente difundidas al personal de supervisión y operativo.	1	100%	1			
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES	100%	100%	-			
15	Se ha realizado la capacitación del procedimiento de IPERC a los responsables de la identificación de peligros y evaluación de riesgos.	1	100%	1	[redacted]		
16	La identificación de Peligros, evaluación de los riesgos e implementación de controles se realiza en conjunto con los Trabajadores.	1	100%	1			
17	Se han identificado correctamente los peligros, evaluado los riesgos y se cumplen sus controles según las actividades desarrolladas en la obra.	1	100%	1			
18	Se realiza la revisión trimestral verificando la implementación de los controles indicados en la Matriz IPERC.	1	100%	1			
19	Se ha realizado la capacitación de la Matriz IPERC al personal responsable de la realización de actividades en la obra.	1	100%	1			
20	La matriz IPERC se encuentra actualizada y publicada.	1	100%	1			
21	El mapa de riesgos y de evacuación se encuentra actualizado, publicado, y difundido al personal.	1	100%	1			
	CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIAS	100%	100%	-			
22	Se cumple el Programa de capacitación establecido para la Obra.	1	100%	1			
23	Se cumple con la inducción al personal nuevo y/o trasferido.	1	100%	1			
	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	100%	100%	-			
24	Está conformado el comité de Seguridad y Salud Ocupacional (Supervisor difusor instalado), se realizan reuniones periódicas y se manejan las actas respectivas.	1	100%	-			
25	Los trabajadores de las diferentes áreas nombran quienes son sus representantes en el comité de seguridad y salud ocupacional.	1	100%	-			
	GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	100%	100%	-			
26	Los proveedores y contratistas cumplen con los lineamientos de SSOMA para la realización de actividades dentro de la obra.	1	100%	1			
27	La verificación de la contratación de los seguros de invalidez y vida personal empleados	1	100%	1			
28	Se realiza el seguimiento al cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo de los subcontratistas que ingresan a la obra	1	100%	1			
29	Se evidencia la diligencia y corrección de EPPs en los subcontratistas que desarrollen sus actividades dentro de la obra	1	100%	1			
	GESTIÓN DE CONTROL MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL	100%	N.A.	-			
30	El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores.	1	#¡DIV/0!	1			
31	Los trabajadores son informados: A título grupal, de los riesgos en los exámenes de salud ocupacional	1	#¡DIV/0!	1			
32	A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud.	1	#¡DIV/0!	1			
33	Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar decisiones preventivas y correctivas al respecto.	1	#¡DIV/0!	1			
34	Los trabajadores cuentan con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo vigente	1	#¡DIV/0!	1			
	GESTIÓN DE LOS REGISTROS	100%	N.A.	-			
35	El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y se difunden al trabajador oportunamente. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas	1	#¡DIV/0!	1			
37	Registro de exámenes médicos ocupacionales	1	#¡DIV/0!	1			
38	Registro de inspecciones de equipos (luces, cuidados, brigadas, accesibilidad y señales de riesgo de organizaciones	1	#¡DIV/0!	1			
39	Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.	1	#¡DIV/0!	1			

40	Registro de estadísticas de seguridad y salud.	1	B(BV/D)	1			
41	Registro de equipos de seguridad o emergencia.	1	B(BV/D)	1			
42	Registro de inducción, capacitación, entrenamiento, y simulacros de emergencia.	1	B(BV/D)	1			
43	Los registros mencionados son: - Legibles e identificables. - Permite su rápido uso. - Son archivados y adecuadamente protegidos.	1	B(BV/D)	1			
44	Se mantienen actualizados los carnets de COVID-19 en el transcurso de la obra.	1	B(BV/D)	1			
ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL EN OBRA		100%	N.A.	-			
45	Área de trabajo está limpia y libre de residuos y escombros.	1	B(BV/D)	1			
46	Pasillos y pasadizos están despejados.	1	B(BV/D)	1			
47	Materiales y equipos están debidamente distribuidos.	1	B(BV/D)	1			
48	Cables eléctricos, mangueras, cables conductores para soldadura, etc. están en buen estado y elevados para evitar riesgos de tropezón.	1	B(BV/D)	1			
49	Protectores de soldaduras instaladas (cortinas) y mantenidas en su lugar.	1	B(BV/D)	1			
50	Arnés libre de tramos de metal con puntas salientes o riesgos de electrocución.	1	B(BV/D)	1			
GESTIÓN AMBIENTAL		100%	N.A.	-			
51	En las áreas de trabajo hay presencia de agua potable (puntos de hidratación)	1	B(BV/D)	1			
52	Hay conteiners o depositos para el basurero con de residuos.	1	B(BV/D)	1			
53	Se está realizando la segregación de residuos de forma correcta en los depósitos por tipo de residuo	1	B(BV/D)	1			
54	Se ha identificado un depósito temporal de residuos peligrosos debidamente señalizado.	1	B(BV/D)	1			
55	Señalización: Equipos, con implementos de seguridad necesarios, en cantidad suficiente y adecuados al peligro.	1	B(BV/D)	1			
56	Se ha realizado la capacitación del proceso inicial de IAAS a los responsables de la identificación de peligros y evaluación de riesgos.	1	B(BV/D)	1			
57	La identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales e implementación de controles se realiza en conjunto con la línea de mando	1	B(BV/D)	1			
58	Se han identificado y evaluado correctamente los aspectos e impactos ambientales y se controlan sus controles, según las actividades desarrolladas en la obra.	1	B(BV/D)	1			
59	Se realiza la revisión trimestral verificando la implementación de los controles indicados en el manual IAAS	1	B(BV/D)	0	No se encuentra		
60	Se ha realizado la capacitación de la Matriz IAAS al personal responsable de la realización de actividades en la obra.	1	B(BV/D)	1			
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS		100%	N.A.	-			
61	Los productos químicos cuentan con las hojas SDS y están ubicados en el lugar indicado.	1	V(BV/D)	1	Yeso, Cemento, Pegamento		
62	Los productos químicos se encuentran en envases, con el envase correspondiente y en buen estado.	1	V(BV/D)	1			
63	El almacén de los productos químicos debe estar en lugar ventilado, limpio y ordenado	1	B(BV/D)	1			
64	El almacén de productos químicos cuenta con la señalización necesaria	1	B(BV/D)	1			
POSICIONES / ACCIONES DE LA GENTE		100%	N.A.	-			
65	Las zonas de caída al mismo nivel o diferente se encuentran señalizadas, no se evidencia cuerpos de agua.	1	B(BV/D)	1			
66	Superficies adicionales que podrían ocasionar tropiezos están protegidas.	1	B(BV/D)	1			
67	Se previene el sobresfuerzo de los trabajadores al levantar, empujar, tirar o deslizar.	1	B(BV/D)	1			
68	Los trabajos sobre o debajo de otros trabajadores están controlados.	1	B(BV/D)	1			
69	No trabajo con Carga suspendida.	1	B(BV/D)	1			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		100%	N.A.	-			
70	Se cuenta con un registro de entrega y control de EPP.	1	B(BV/D)	1			
71	Cuenta con equipo para los trabajos son usados y cuentan con control de recambio	1	B(BV/D)	1			
72	Protección auditiva usada correctamente.	1	B(BV/D)	1			
73	Protección ocular usada de manera apropiada.	1	B(BV/D)	1			
74	Botines de seguridad u otra protección requerida para los pies usada adecuadamente.	1	B(BV/D)	1			
75	Mascara protectora o antiparras usadas adecuadamente	1	B(BV/D)	1			
76	Guantes de tipo correcto y usados adecuadamente.	1	B(BV/D)	1			
77	Ropa de trabajo con uniformes y chalecos con distintivos fluorescentes	1	B(BV/D)	1			
78	Equipo de protección para soldadores usados adecuadamente.	1	B(BV/D)	1			
79	Cinto: neoprenos, ventilamiento, cerrado y productos químicos.	1	B(BV/D)	1			
SEÑALIZACIÓN E PROTECCIÓN COLECTIVA		100%	N.A.	-			
80	Pele barreras/barandas instaladas en las aberturas con pintura y cartelería impedir el paso de trabajadores según se requiere	1	B(BV/D)	1			
81	Mallas de protección y/o protección colectiva en el andamio y en buenas condiciones.	1	B(BV/D)	1			
82	Letreros de advertencia - Maquinaria en movimiento, cintas, tuberías, cables colocados y señalizadas.	1	B(BV/D)	1			
83	Protección de equipos de generador, tableros, botones de interconexión y señalización en su lugar y en buenas condiciones.	1	B(BV/D)	1			
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES		100%	N.A.	-			
84	Las herramientas son adecuadas para el trabajo a realizar	1	B(BV/D)	1			
85	Son usadas correctamente	1	B(BV/D)	1			
86	Están en condiciones seguras e inspeccionadas	1	B(BV/D)	1			
87	Cables eléctricos - extensiones en condiciones y protección a tierra	1	B(BV/D)	1			
88	Mecanismos de suspensión del material está en orden	1	B(BV/D)	1			
89	Cintas de corte y cortador usados correctamente.	1	B(BV/D)	1			
90	El personal cuenta con la calificación de herramientas para controles de maquinaria debidamente registrado	1	B(BV/D)	1			
91	Herramientas son debidamente transportadas y almacenadas.	1	B(BV/D)	1			
92	Taladros Eléctricos según normas / usados y almacenados.	1	B(BV/D)	1			
93	Tableros Eléctricos se encuentran señalizados, con la cinta de riesgo y con los cintos de seguridad			1	Falta cinta de riesgo		
94	Equipos Eléctricos (soldadoras, etc.) identificados.	1	B(BV/D)	1			
95	Los equipos de medición de gases están correctamente ajustados (Frecuencia respecto a la hoja de apoyo) y las puntas apropiadamente protegidas.	1	B(BV/D)	1			

96	Las herramientas eléctricas se deberán alejar de peligros al dejar de utilizarse (Señal de hombre muerto).	1	#¡DIV/0!	1			
97	Capacitación a Maestros asegurados en forma adecuada y bajo entender y/o Norma OHSAS	1	#¡DIV/0!	1			
EXCAVACIONES		1089	N.A.				
98	Malla y entibado adecuado según norma OHSAS	1	#¡DIV/0!	✓			
99	Existencia de escalera dentro de la excavación en un lugar próximo	1	#¡DIV/0!	1			
100	Prohibición de Altura y Ancho mayor 1.5 metros.	1	#¡DIV/0!				
101	Diariamente se inspecciona y se los mantiene en condiciones seguras	1	#¡DIV/0!				
102	La inspección de cada caída (Barreras y Luz)	1	#¡DIV/0!				
103	Protección a más de 1.20 m de profundidad, cuenta con esta	1	#¡DIV/0!	✓			

104	Encuentra a menos de la mitad de la profundidad de la excavación una escalera de fondo.	1	si/NO/NA	1			
ANDAMIOS Y ESCALERAS		100%	N.A.	-			
105	Los andamios cuentan con autorización e inspección para el tipo de trabajo.	1	si/NO/NA	1			
106	Construidos con especificaciones técnicas definidas.	1	si/NO/NA	1			
107	Cuentan con vías de acceso y salida apropiadas.	1	si/NO/NA	1			
108	Etiquetados correctamente (Rojo: No usar; Verde: Apto).	1	si/NO/NA	1			
109	Se mantienen en forma segura (sin modificaciones).	1	si/NO/NA	1			
110	Escaleras apropiadas para el trabajo realizado y adecuadamente aseguradas.	1	si/NO/NA	1			
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		100%	N.A.	-			
111	Áreas de seguridad señaladas y cubiertas de manera adecuada.	1	si/NO/NA	1			
112	Las líneas de vida están adecuadamente aseguradas a un soporte apropiado.	1	si/NO/NA	1			
113	Protección horizontal rígida según entidad.	1	si/NO/NA	1			
114	Líneas de vida eléctricas, cubiertas, instaladas y soportan una fuerza mínima de 2.450 kg.	1	si/NO/NA	1			
115	Equipos de protección contra caídas son usados solamente para este objetivo.	1	si/NO/NA	1			
116	Equipos de protección contra caídas son inspeccionados y mantenidos en forma segura.	1	si/NO/NA	1			
117	Las estructuras u otro sistema hecho en obra, para colocación de líneas de vida, están previamente calculadas para asegurar su resistencia.	1	si/NO/NA	NA			
118	Líneas de vida cuentan con señalización debidamente fijada y vigente en documento de seguridad.	1	si/NO/NA	1			
EQUIPOS DE LEVANTE DE CARGA		100%	N.A.	-			
119	Tienen la capacidad adecuada para el levante y con tabla de cargues al equipo y en idioma español.	1	si/NO/NA	1			
120	Cuentan con pasador de seguridad en buenas condiciones sin deformidades visibles.	1	si/NO/NA	NA			
121	Accesorios de levante (eslingas, grilletes, estrobos) en buenas condiciones y con la inspección del mes.	1	si/NO/NA	NA			
122	Ganchos cuentan con pestillos de seguridad y están sujetos para su levantamiento.	1	si/NO/NA	NA			
123	Se usan técnicas de levante apropiadas (eslinga plana, etc.).	1	si/NO/NA	1			
124	Riggers/Maniobristas con certificación vigente.	1	si/NO/NA	1	(Contratista)		
EQUIPOS MÓVILES DE CONSTRUCCIÓN		100%	N.A.	-			
125	Luces, frenos, bocinas, alarmas (reversa) en adecuado estado, visibles y en Buen estado.	1	si/NO/NA	N/A			
126	Equipos y vehículos cuentan con sistemas de seguridad y cinturones.	1	si/NO/NA	NA			
127	Mantenimiento apropiado / Inspección Vehicular / Check list previos.	1	si/NO/NA	N/A			
128	Bocinas técnica vigente.	1	si/NO/NA	1			
129	Equipo cuenta con extintor.	1	si/NO/NA	NA			
130	Carga transportada en forma segura.	1	si/NO/NA	N/A			
131	Licencias internas de Conductor/Conductor Vigentes.	1	si/NO/NA	[redacted] UTV			
132	Vehículos cuentan con kit contra incendios en su interior.	1	si/NO/NA	NA			
133	Equipos Móviles de Cuenta cuentan con sensor de reversa con vigía si el espacio cuenta con barreras por terrenos de la Zona.	1	si/NO/NA	[redacted] 1			
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		100%	N.A.	-			
134	Los materiales inflamables almacenados adecuadamente.	1	si/NO/NA	1			
135	Cilindros de oxígeno y gases combustibles se almacenan separados.	1	si/NO/NA	NA			
136	Los cilindros y recipientes están etiquetados indicando lo que contienen.	1	si/NO/NA	1			
137	Extintores señalizados, localizados e inspeccionados en forma debida.	1	si/NO/NA	1			
138	Los cilindros de gas comprimido son almacenados y transportados adecuadamente.	1	si/NO/NA	NA			
139	Conexión de trabajo en caliente y pantallas para soldar tienen su rótulo.	1	si/NO/NA	1			
140	Mangueras y válvulas están debidamente ubicadas y embuchadas correctamente.	1	si/NO/NA	1			
MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES		100%	N.A.	-			
141	Carga transportada en forma segura, sin daño a otros.	1	si/NO/NA	NA			
142	Carga y materiales almacenados en forma segura.	1	si/NO/NA	1			
143	Se usan cintas y separadores.	1	si/NO/NA	1			
144	Acceso de materiales sin libre riesgo.	1	si/NO/NA	1			
145	Señalización de acuerdo a sustancias (Rombos NFPA, Letreros de Advertencia).	1	si/NO/NA	1			
SEÑALIZACIÓN Y EMERGENCIAS		100%	N.A.	-			
146	Dentro del área de trabajo y trabajadores con propósitos en primeros auxilios. Se tiene organizada la brigada de emergencia.	1	si/NO/NA	1			
147	Trabajadores saben como actuar ante la alarma o sirena, etc.	1	si/NO/NA	1			
148	Trabajadores saben como actuar en caso de incendio.	1	si/NO/NA	1			
149	En el área hay una estación de emergencia y esta contiene todos los elementos exigibles / Para evidencia diario de ubicación de la estación de emergencia.	1	si/NO/NA	1			
150	Trabajadores conocen la ubicación de los puntos de refugio y/o reunión.	1	si/NO/NA	1			
151	Trabajadores conocen el flujo de comunicación en caso de incidentes (Accidentes laborales, emergencias) y urgencia médica.	1	si/NO/NA	1			
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES - ACCIONES CORRECTIVAS		100%	N.A.	-			
152	El flujo de reporte de incidentes y accidentes laborales es conocido por todo el personal.	1	si/NO/NA	1			
153	Se mantienen registros de la investigación de accidentes ocurridos en obra.	1	si/NO/NA	1			
154	Los accidentes son investigados por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Brigada de emergencia.	1	si/NO/NA	1			
155	Se cierran las acciones correctivas y/o preventivas oportunamente y acordes a su criticidad. Se mantienen los registros correspondientes.	1	si/NO/NA	1			
CONDICIONES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS		100%	N.A.	-			
156	ATS en el lugar de trabajo y las medidas objetivas se encuentran implementadas.	1	si/NO/NA	1			
157	Procesos constructivos, acorde y están en el lugar. Trabajadores capacitados en procesos constructivos.	1	si/NO/NA	1			
158	Se cuentan con los permisos específicos para realizar la tarea en caso de ser necesario (Trabajo en Altura, Espacio Confinado, Trabajo en Caliente, etc.).	1	si/NO/NA	1			
159	Se encuentra el capataz y/o supervisor a cargo de la tarea en el lugar.	1	si/NO/NA	1			

145	PETC y Análisis de trabajo seguro (ATS) está en formato (según criticidad)	1	#¡VALOR!			







[redacted]

INSPECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

[redacted]

OBRA	[redacted]	FECHA	22.03.23
RESPONSABLE SSO	[redacted]	PUNTAJE ASIGNADO	100%
GERENTE DE OBRA	[redacted]		
JEFE DE ÁREA	[redacted]		

1: Cumple / 2: No Cumple / N.A: No Aplica

PUNTOS DE EVALUACIÓN					RESULTADO	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
Etapa	Código	[illegible]	Cargo	[illegible]				
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[illegible]	[illegible]	

Encargado de Insp[redacted]

[redacted]

[redacted]

INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

[redacted]

PROYECTO	[redacted]
RESPONSABLE EN OBRA	FECHA: 26/4/23

PUNTAJE PONDERADO	98%

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A : No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVATAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO DIGITAL					
1	Registro diario de salidas y entradas de equipos y herramientas mediante sistema OnTrack	0.5	Un track Un equipo No estaban actualizados.		
2	Registro el RS [redacted]	1			
3	Monitoreo diario de control de mantenimientos preventivos y correctivos	1			
GESTIÓN DE TALLER					
4	Registro documentario de guías de remisión de ingresos y salidas de equipos propios y alquilados	1			
5	Registro de calibración de instrumentos y equipo topográfico	NA	Control de Obra (Calidad)		
ALMACÉN EQUIPOS					
6	Mantener ambiente de taller de Almacén de Equipos limpio y ordenado	1			
7	Tener actualizado el kardex de repuestos y materiales de taller	NA	Control de Almacén Obra		
8	Los equipos salen con la ficha de seguridad del mes.	1			
	PROMEDIO PONDERADO				

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO:
INSPECCIÓN DE PROCURA

[redacted]

PROYECTO:	
RESPONSABLE EN OBRA:	FECHA:

PUNTAJE PONDERADO	95 %

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
PRODUCCIÓN					
1	Los pedidos de obra están consolidados al 80% del consumo total de la obra	1			
2	Los pedidos generados cuentan con cronogramas de entrega entre 7 a 15 días posteriores a la generación del pedido	1			
3	Se verifica el stock de almacén antes de la generación del pedido de compra	1			
4	Los pedidos de materiales de acabados cumplen con lo requerido por el cuadro de acabados de la obra	1			
5	Existe comunicación y verificación de espacio de almacén antes de la solicitud de compra de materiales críticos	1			
6	Se cumple los pedidos estratégicos en los tiempos o plazos definidos en el formato "Lead Time" del proyecto	1			
7	Las Solicitudes de compra cuentan con la aprobación del área respectiva correspondiente (SSOMA, Calidad y Equipos)	1			
8	Las Solicitudes de compra cuentan con el formato "Sustento de Pedidos de Materiales" actualizado	1			
9	Las Solicitudes de compra cuentan con el formato "Control de Pedidos y Llegada de Materiales" actualizado	0	Falta actualizar pedidos anteriores		
10	Se cuenta con vales de consumo con fecha de vencimiento mayores a 1 o 2 días.	1			
ADMINISTRACIÓN					
11	Se han recepcionado guías que estén relacionadas a una orden de compra aprobada	1			
12	Revisión de guías pasado el crédito acordado: ¿Tienen guías de remisión sin facturar pasado el crédito establecido?	1			
13	Las facturas cumplen con el crédito y forma de pago acordado con el proveedor según su orden de compra	1			
14	Los proveedores tienen conocimiento de cómo presentar sus facturas y del proceso de facturación	1			
15	Tienen conocimiento del cronograma de entrega de las ordenes de compra solicitadas para atención	1			
16	Se cuenta con confirmación de llegada o recepción de facturas al proveedor	N/A			
17	Se Cierran y/o Cancelan los Pedidos de Compra en el ERP ERES que no utilizará el proyecto en coordinación con el Área de Procuración	N/A			
ALMACÉN					
17	Tienen cargo de los certificados de calidad y cartas de garantía emitidas por los proveedores	1			
18	¿Todo material que ingresa a almacén tienen orden de compra aprobada y guía relacionada?	1			
19	Las guías de materiales críticos poseen visto de revisión por parte del área de calidad	1			
20	Se realiza el apilamiento del material recepcionado según las indicaciones del proveedor.	1			
21	Se cuenta con vales de consumo con fecha posterior al vencimiento (1 o 2 días posterior a la emisión) pendientes de registro de albaran	1			
22	Se realiza seguimiento a los materiales con solicitud de cambio o rechazo por parte de obra.	1			
	PUNTAJE PONDERADO				

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO
INSPECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]
RESPONSABLE EN OBRA:	FECHA: 22.03.23

PUNTAJE PONDERADO	#¡DIV/0!

48

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVATAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
CAPITAL HUMANO					
1	Entrega del tareo semanal todos los lunes al mediodía (JA)	1			
2	Presentación de las solicitudes de liquidación del personal obrero al área de Capital Humano de manera oportuna, dicho(s) documento(s) deben contener las firmas de los responsables	1	USO DE FORMATOS OBSOLETOS (S.O.A.P.)		
3	Custodiar el cargo de presentación del tareo semanal con las firmas respectivas.	1			
4	La información del Tareo debe ser revisado y no contener errores	1			
5	Tener actualizado el file personal de los trabajadores (obreros).	1			
6	Mantener actualizada la matriz de contratistas de forma mensual (la información debe encontrase actualizada en los diferentes *items* solicitados - Ubicación Onedrive de obra)	1			
7	Informar oportunamente las incidencias diarias por ausencia (enfermedad) a las áreas correspondientes.	0	FALTARON TAREO JUEVES 16.03.23 (D.M.) 18.03.23		
8	Tener actualizada el cargo del envío de boletas de forma digital	1			
9	Llevar el registro de asistencia del personal sin observaciones en el Geovictoria	1			
10	Tener actualizadas las polizas de SCTR del personal staff y obrero	1			
11	Informar oportunamente todo cese del personal obrero y de limpieza	1			
12	Cargar el informe mensual en el power apo el 3er día hábil del mes.	1			
TESORERÍA					
13	Cargar en el ERP el fondo fijo para aprobación de la gerencia de obra (semanal).	1			
14	El fondo fijo no debe contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento)	1			
15	Todo arqueo de caja chica no debe presentar ningun tipo de observaciones.	1			
16	Las compras a través de la caja chica deben efectuarse sólo a proveedores con los cuales no contamos con lines de crédito. (dependiendo la cantidad de compra)	1			
17	Mantener una adecuada custodia del file del fondo fijo.	1			
18	Mantener actualizados el cuadro de garantías (Cartas Fianza, Letras de cambio)	1			

[redacted]

CONTABILIDAD					
19	Registrar en el ERP las facturas semanales al cierre de la semana.				
20	Cargar en el sharepoint las facturas y los sustentos al cierre semanal				
21	Las facturas no deben contener ningun tipo de observaciones(documentos sustento).				
22	Mantener una adecuada custodia del file de las facturas presentadas semanalmente.				
23	Mantener actualizado el reporte de guias de remisión de meses anteriores				
24	Todas las guias de remisión(original) deben contener el sello de recepción del área de Almacén.				
25	Presentación de entregables del mes (Kardex, ingreso y egresos)				
26	Presentación y custodia de las guías de remisión de Besco - Miranda				
ALMACENES					
28	Entrega de los informes de inventario el 1er día hábiles del mes				
29	Llevar un adecuado control en la emisión de las Guías de Remisión				
30	Registro diario de los ingresos y salidas de almacen en el ERP				
31	Actualización diaria de las Bincard				
32	Llevar un ambiente de Almacén limpio y ordenado				
33	Tener actualizado el kardex de EPP en fisico.				
34	El inventario mensual no debe presentar ningun tipo de observaciones.				
35	Los materiales se colocan según recomendaciones del proveedor (caja)				
36	Los productos químicos cuentan con las Hojas MSDS				
LOGÍSTICA					
37	Cumplir con el cronograma de compras. Enviar ordenes de compra y servicio aprobadas.				
GUARDIANÍA					
38	Toda incidencia presentada por el servicio de vigilancia debe ser primero canalizada por el área de administración de obra.				
39	Reunión mensual con la empresa de vigilancia.				
40	Requizas a los ambientes de los subcontratistas de manera mensual				
41	Requizas al personal obrero de manera mensual				
					#¡DIV/0!

[redacted]

[redacted]

FORMATO
INSPECCIÓN DE OFICINA TÉCNICA (OBRAS PROPIAS)

CODIGO [redacted]
VERSIÓN
FECHA

OBRA:	[redacted]
RESPONSABLE DE OT:	
JEFE DE OBRA:	[redacted]
FECHA:	7/03/2023

PUNTAJE PONDERADO	70%
PONDERADO POR CRITERIOS	94%

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN E	e	-	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
PRESUPUESTOS		**0%**	**83%**	-			
1	**Revisión del Presupuesto Meta y Venta (Actualizado):**	0	83%	-			
	Criterio 1.- Presupuesto elaborado en Software Presupuesto S10 VENTA.			1			
	Criterio 2.- Formato de [redacted] Presupuestos y Control de Costos y Gerencia de Operaciones.			1			
	Criterio 3.- Presupuesto Meta elaborado en el software de presupuestos S10.			1	Elaborar el presupuesto Meta		
	Criterio 4.- Formato d[redacted]			0	Presentar el presupuesto meta a fin de Marzo		
	Criterio 5.-Cronograma master Venta y sustento de elaboración de presupuesto de Obras Provisionales y Gastos Generales.			1			
	Criterio 6.- Presentación de Cronograma Valorizado del presupuesto Venta.			1			
GESTION Y CONTROL DE COSTOS		**80%**	**93%**	-			
2	**Revisión de Valorización del Banco y al cliente Inmobiliario:**	1	100%	-			
	Criterio 1.- Las Valorizaciones del Banco deberán ser enviadas el día 25 de cada mes al jefe de obra con copia al Gerente de Operaciones y Jefe de Presupuestos y Control de Costos.			1			
	Criterio 2.- Las valorizaciones del banco deberán estar archivadas digitalmente en la red de obra en el formato [redacted]			1			
	Criterio 3.- Las Valorizaciones de avance de Obra para la División Inmobiliaria deberán ser enviadas el día 25 de cada mes al Gerente de Proyectos y/o Jefe de Proyectos con copia al Gerente de Operaciones y Jefe de Presupuestos y control de Costos.			1	Se debe regularizar en otro correo.		
3	**Revisión del Formato d[redacted]**	1	100%	-			
	Criterio 1.- Los resultados de la columna de Costo Real Acumulado deben ser tomados del ERP Dynamic y estará compuesta por los datos exportados del Dynamic, las provisiones acumuladas enviadas a Contabilidad y si es necesario, las provisiones de costos incurridos y no registrados en Dynamic.			1			
	Criterio 2.- Sustento de p[redacted]4			1			
	Criterio 3.- Distinción de adicionales por a) Vicios Ocultos y b) Comerciales y separarlos por **Aprobados y No aprobados.**			1			
	Criterio 4.- Columna de Presupuesto Venta Actualizado debe ser igual al presupuesto Venta aprobado y al Módulo de Presupuestos S10.			1			
	Criterio 5.-Envio del Resultado Operativo el cuarto día hábil del mes al Jefe de Presupuesto y control de Costos con copia al Jefe de Presupuesto y control de Costos.			1	Corregir la fecha de entrega		
4	**Revisión del Forma[redacted]s no Amortizados". Revisar sustento.**	1	100%	1			
5	**Revisión del [redacted]**	1	100%	1			
6	**Revisión de Adicionales de Obra :**	1	100%				
	Criterio 1.- Los Adicionales debe contar con un file independiente con todos los adicionales (Aprobados y No aprobados [redacted]			1			
	Criterio 2.- Los Adicionales deben tener las firmas correspondientes de aprobación (original y / o digital) Jefe de Oficina Tecnica, Gerente d e Operaciones y Inmobiliaria.			1			
	Criterio 3.- Cada Adicional debe contar con el sustento correspondiente, sea un análisis de precios unitarios o una cotización.			1			
	Criterio 4.- Se debe contar con un Log de Adicionales Actualizado en digital e impreso. Debe tener firma de Jefe de OT.			1			
7	**Revisión del Formato "Compatibilización módulo Contabilidad vs Gerencia de proyectos y contabilidad "**	0	75%	-			
	Criterio 1.-Solicitar a Contabilidad, Costo total registrados en el modulo de Contabilidad del proyecto, archivo en Excel.			1	Solicito, pero no se entrega por contabilidad.		
	Criterio 2.- Sustento de la diferencia entre el costo de contabilidad y costo de obra.			0	Debes exigir compatibilizar los costo.		
	Criterio 3.- Envio al Area de Presupuestos y control de Costos del formato Compatibilización Mensual de Horas Hombre, todos los 4tos dias hábiles del mes. Sustentando las diferencias encontradas.			1			
	Criterio 4 .- Elaboración del cuadro de depreciación de compra de activos por dimensión financiera, de acuerdo al tiempo de vida operativa de los equipos, al inicio del proyecto y posterior control mensual de costo acumulado por depreciacion, cargado a la dimensión financiera correspondiente.			N.A.			

8	**Revisión de Formato "[redacted]**	1	100%	-			
	Criterio 1.- Formato actualizado de las provisiones acumuladas mensuales enviadas a Contabilidad el 1er dia hábil del mes es igual al formato de provisiones del Resultado operativo.			1			
	Criterio 2.- Carga de Provisiones tipo Articulo por Obra y área de Ppto y control de Obra.			N.A.			
9	**Revisión de Formato "[redacted]":**	1	100%	-			
	Criterio 1.- Envió de formato el 1er día útil de cada mes a contabilidad (Contador General y Analista de Contabilidad) en digital con copia a Jefe de presupuesto y control de costos. Sustento de correo.			1			
	Criterio 2.- Costos de provisiones tipo Gasto subidas al ERP por contabilidad coincide con el monto enviado en Formato de provisiones.			1			
	Criterio 3.- Corroborrar todos los meses el extorno de la provisiones del mes anterior en ERP Dynamic.			1			
10	**Revisión de Análisis de Brechas:**	0	50%	-			
	Criterio 1.- Formato de análisis de brechas actualizado (Mes).Su[redacted]			0			
	Criterio 2.- Se deben presentar: El Resumen de Brecha Gerencial junto con los Resultados Operativos.			1			
11	**Revisión de Informes Mensuales:**	1	100%	-			
	Criterio 1.- Todos los Informes del proyecto deben estar subidos en el Power Bi al 7mo día hábil.			1			
	Criterio 2.- El Reporte Operativo debe ser sustentado por Gerente de Obra al Gerente de Operaciones, según Cronograma de Entregables 2018.			1			
	Criterio 3.- Se deben presentar: El Resumen Consolidado de Obra junto con los Resultados Operativos.			1			
CONTROL DE DOCUMENTOS		**100%**	**100%**	-			
12	**Revisión de Los planos de obra:**	1	100%	-			
	Criterio 1.- Actualizados y guardados en la RED, en la carpeta de Oficina Tecnica.			1			
	Criterio 2.- Se debe contar con un [redacted]			1			
	Criterio 3.- Se debe contar con una carpeta adicional, donde se guardaran todos los Planos Asbuilt.			1			
	Criterio 4.- Comprobar que los planos de obra están con VºBº de Jefe OT y esten enla base de datos del PLAN GRID			1			
13	**Los Comparativos y Cotizaciones de cada una de las adquisiciones de materiales y subcontratas deberán estar archivadas en la red del proyecto.**	1	100%	1			
14	**Revisión del Registro de Solicitudes de cambio (RFI):**	1	100%	-			
	Criterio 1.- Actualizado a la fecha.			1			
	Criterio 2.- Registrados en PLAN GRD y con las firmas de todos los involucrados (File independiente)			1			
	Criterio 3.- Debe de contar con un [redacted] actualizados.			1			
	Criterio 4.- Se debe enviar Semanalmente (Día Viernes) al Área de PMO con copia al Area de DT y PPTO y Control de Costos. Sustento de correo.			1			
15	**El Expediente de Compromisos debe estar impreso y en formato PDF con las firmas de los involucrados. Sustento de envio al area de Presupuestos y Control de Costos.**	1	100%	1			
GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS SC		**100%**	**100%**	-			
16	**Revisión de Contratos:**	1	100%	-			
	Criterio 1.- Deben contar con la estructura planteada de acuerdo a los estándares del área legal y debe contener el cuadro comparativo con 03 propuestas como mínimo.			1			
	Criterio 2.- Todos los contratos deben contar con las firmas aprobadas y visadas (Original).			1			
	Criterio 3.- Todo contrato, debe estar almacenado en digital (PDF) como en físico (File Independiente por cada SC).			1			
	Criterio 4.- Se deben tener el correo de envio a los SC con los requisitos de Administración y SSOMA.			1			
	Criterio 5.- Verificación que el SC tenga la debida Diligencia y docuemntación referida a Lavados de Activos, anticorrupción y Financiamiento al Terrorismo.			1			
17	**Revisión de Contratos 2:**	1	100%	-			
	Criterio 1.- Todo contrato aprobados (con firmas) , deben encontrase cargados en el ERP (Modulos Subcontratos)			1			
	Criterio 2.- Todas las valorizaciones deben encontrase cargadas al sistema Dynamic (escenario de Subcontratos), así como también en físico.			1			
	Criterio 3.- Toda Valorización debe encontrarse con la firma correspondiente de los involucrados según el proceso de valorización ([redacted]sta) en físico.			1			
	Criterio 4.- Revisión del Cuadro Resumen de Valorizaciones para el control de Fondos de Garantía.			1			
18	**Revisión de Contratos 3:**	1	100%	-			
	Criterio 1.- Envio del cronograma actuializado de adquisiciones al area de Presupuestos y control de Costos.			1			
	Criterio 2.- Los cuadros comparativos de adquisiciones (para contratos) debe contar con un mínimo de 2 cotizaciones.			1			
	Criterio 3.- se debe contar con un log de contratos actualizados [redacted]			1			

[redacted]

FORMATO
INSPECCIÓN DE PRODUCCIÓN

[redacted]

OBRA:	[redacted]		
RESPONSABLE DE PRO:			
JEFE DE OBRA:		FECHA:	28/03/2023

PUNTAJE	100

1: Cumple / 0: No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE LEVANTAMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
PLANIFICACIÓN DE LA OBRA					
1	Cuenta con el plan de producción aprobado y actualizado				
2	Ha elaborado el [redacted] para el inicio de obra	1			
3	La curva de [redacted] revisada por el Gerente de obra y validad (por el jefe de OT (concuerda con las HH del presupuesto de la obra)	1	USO DE PUNTUSU DESDE CRUSU 2019		
4	Ha hecho llegar al Área de Maquinaria y Equipos el Listado de maquinarias y equipos requeridos para el proyecto	1			
SOLICITUD DE MATERIALES					
1	Elabora el [redacted] ales, identificando los materiales a necesidad y las fechas a requerir	1			
2	Se encuentran elaborados los requerimientos co[redacted] materiales	1			
3	Los requerimientos se encuentran validados por el asistente de producción, jefe de producción y jefe de OT; y aprobados por el gerente de obra	1			
4	Descarga status de pedidos en ERP. Hace seguimiento en el mismo Dynamics	1			
5	Se lleva el registro con los vales de salida de equipos y materiales en el almacén.	1			
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN					
1	Se elabora el Look Ahead de Edificaciones y Obras exteriores, se actualiza semanalmente.	1			
2	Se elabora el Análisis de Restricciones semanal, considerando los tipos de restricciones (Proyecto, materiales, mano de obra, equipos, subcontratas y herramientas).	1			
3	El Programa Semanal ha sido elaborado en base al Look Ahead y ha pasado por un proceso de levantamiento de restricciones.	1			
4	El PPC semanal se aproxima al 100%.	1			
5	Las causas de incumplimiento de lo programado son registradas en el formato de Análisis de Causas Incumplidas.	1			
6	El capataz hace uso de la programación diaria para la ejecución de las actividades.	1			
7	Se elabora el movimiento de personal diario. Se lleva el registro de los días anteriores.	1			
8	Se realiza el tareo diario. Se lleva a cabo a partir de las actividades del Look Ahead.	1			
9	Junto con la subcontrata, se realiza la conciliación de metrados	1			
10	Las actividades de producción se encuentran respaldas por los PETS respectivos.	1			
SEGUIMIENTO Y CONTROL					
1	Se ha subido el informe mensual y se has registro de indicadores pendientes.	1			
2	El ISP se encuentra actualizado	1			
3	El ISM se encuentra actualizado	1			
4	La curva de rendimiento se encuentra actualizada. Se identifica los altos y bajos rendimientos y se analizan las causes.	1			
5	Se lleva el acta de las reuniones semanales con los capataces	1			

[redacted]

[redacted]

[redacted]

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

[redacted]

OBRA:	[redacted]
RESPONSABLE DE SSOMA:	
CLIENTE DE OBRA:	FECHA: [redacted]

PUNTAJE PONDERADO	100%
CALIFICACIÓN OBTENIDA	0.00%

94

( ) Cumple / (0) No Cumple / N.A.: No Aplica

N°	PUNTOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	COMPROMISO Y ACCIÓN PREVENTIVA
		P.	A.			
	COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO	100%	N.A.			
1	El empleador proporciona los recursos necesarios para asegurar implementación y ejecución de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	N.A.			
2	Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiental.	0	#¡VALOR!	INCUMPLIMIENTO: EPP, PUNTOS CRITICOS, SSOMA		
3	Se implementan acciones preventivas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para asegurar la mejora continua y la prevención de riesgos	1	#¡VALOR!			
4	Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y el fomento al trabajo en equipo para un buen clima laboral	1	#¡VALOR!			
5	Existen medios formales de reconocimiento del personal propuesto y destacado en el mejoramiento continuo de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	1	#¡VALOR!			
	POLITICA, OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SSOMA	100%	N.A.			
6	Se publican y capacita al personal en la política SSOMA. Se tiene registros y el personal la ha comprendido.	1	#¡VALOR!	ACTUALIZAR EXISTE REGISTRO	FECHA OCT-2021	7/11
7	Existen objetivos de seguridad establecidos y el personal los conoce.	1	#¡VALOR!			
8	Se cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	1	#¡VALOR!			
9	Se encuentran identificados los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización	1	#¡VALOR!			
	PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	100%	N.A.			
10	El Plan de SSOMA se encuentra actualizado y debidamente firmado por las autoridades competentes.	1	#¡VALOR!			
11	Se cumple el Plan de SSOMA establecido en la Obra. Existen evidencias del cumplimiento.	1	#¡VALOR!			
12	Existe un organigrama aprobado de la Obra especificando cargos y responsabilidades	1	#¡VALOR!			
13	La descripción de cargos incluyen los roles establecidos en materia de seguridad y salud ocupacional.	1	#¡VALOR!			
14	Las responsabilidades han sido debidamente difundidas al personal de supervisión y operativo.	1	#¡VALOR!			
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES	100%	N.A.			
15	Se ha realizado la capacitación del procedimiento de IPERC a todas las personas de la identificación de peligros y evaluación de riesgos.	1	#¡VALOR!			
16	Se identifican los de Peligros, evaluación de los riesgos e implementación de controles se realizan en conjunto con los trabajadores	1	#¡VALOR!			
17	Se han identificado correctamente los peligros, evaluado los riesgos y se cumplen los controles según las actividades desarrolladas en la obra.	0	#¡VALOR!	[redacted] HACEN ENCUESTAS PERO SIN PROFUNDIZAR EN EVIDENCIA		
18	Se realiza la revisión rutinaria de la matriz de identificación de los controles indicados en la Matriz IPERC.	0	#¡VALOR!	LA ULTIMA ES DE 28.10.22 LO HAY EL SUPERVISOR		
19	Se normalizan las capacitaciones de la Matriz IPERC al personal involucrado de la realización de actividades en la obra.	1	#¡VALOR!			
20	La matriz IPERC se encuentra actualizada y publicada.	1	#¡VALOR!			
21	El mapa de riesgos y sus evaluaciones se encuentra actualizado, publicado y entendido el personal.	1	#¡VALOR!			
	CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIAS	100%	N.A.			
22	Se cumple el Programa de capacitación actualizado para la Obra.	1	#¡VALOR!	[redacted]		
23	Se cuenta con la inducción al personal nuevo y/o reubicado.	1	#¡VALOR!			
	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	100%	N.A.			
24	Está formalizado el comité de Seguridad y Salud Ocupacional (Supervisor si fuera aplicable), se realizan reuniones periódicas y se manejan las actas respectivas	1	#¡VALOR!			
25	Los trabajadores de las diferentes áreas cuentan con algún representante en el comité de seguridad y salud ocupacional	1	#¡VALOR!			
	GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	100%	N.A.			
26	Los proveedores y contratistas cumplen con los lineamientos de SSOMA para la realización de actividades dentro de la obra	0	#¡VALOR!	NO SE EVIDENCIA EN 2022 NI 2023		
27	La verificación de la contratación de los seguros de accidentes a los por cada empleador.	1	#¡VALOR!			
28	Se realiza el seguimiento al cumplimiento de la capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo de los subcontratistas que ingresan a la obra	0	#¡VALOR!	JEFE SSOMA. EVIDENCIAS		
29	Se suministra la dotación y supervisa uso de EPPS de los subcontratistas que desarrollen alguna actividad dentro de la obra	1	#¡VALOR!			
	GESTIÓN DE CONTROL MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL	100%	N.A.			
30	El empleador realiza exámenes ocupacionales antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores	1	#¡VALOR!			
31	Las evaluaciones son informadas: A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional	0	#¡VALOR!	NO SE EVIDENCIA ACCIONES DE CAPACITACIÓN		
32	A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud.	1	#¡VALOR!			
33	Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar decisiones preventivas o correctivas si necesario.	1	#¡VALOR!			
34	Los trabajadores cuentan con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo vigente	1	#¡VALOR!			
	GESTIÓN DE LOS REGISTROS	100%	N.A.			
35	El empleador ha implementado registros y elementos necesarios para su gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que se han ejecutado la investigación y las medidas correctivas.	1	#¡VALOR!			

37	Registro de asistencia médicos de especialistas	1	#¡DIV/0!				
38	Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo ergonómicos	0	#¡DIV/0!		REGISTRO NO MOVED 2023		
39	Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo	1	#¡DIV/0!				
40	Registros de estadísticas de seguridad y salud.	1	#¡DIV/0!				
41	Registros de equipos de seguridad o emergencia.	1	#¡DIV/0!				
42	Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.	1	#¡DIV/0!				
43	Los registros mencionados son: • Legibles e identificables. • Precisos y exhaustivos. • Son archivados y protegidos contra pérdida o daños.	1	#¡DIV/0!				
44	Se mantienen actualizadas las carpetas de SSOMA en el servidor de la obra	1	#¡DIV/0!				
ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL EN OBRA		100%	N.A.				
45	Área de trabajo está limpia y libre de residuos y escombros.	1	#¡DIV/0!		USUARIOS Y/ PASOS NEGROS		
46	Pasillos y pasadizos están despejados	1	#¡DIV/0!				
47	Materiales y equipos están debidamente almacenados	1	#¡DIV/0!				
48	Cables eléctricos, mangueras, cables conductores para soldadura, etc. están en buen estado y elevados para evitar riesgo de tropiezo.	1	#¡DIV/0!				
49	Protecciones de señalizaciones, vallados (especificarlo) y rondas son los mas bajos.	1	#¡DIV/0!				
50	Área de trabajo libre de material con puntas sobresalientes (riesgo de pinchazos).	1	#¡DIV/0!		SE REQUIERE ADOPTAR		
GESTIÓN AMBIENTAL		100%	N.A.				
51	En las áreas de trabajo hay provisión de agua potable (puesto de hidratación)	1	#¡DIV/0!				
52	Hay contenedores y depósitos para los diferentes tipos de residuos	1	#¡DIV/0!				
53	Se evita mezclar en la segregación de residuos de forma correcta en los depósitos por tipo de residuo	1	#¡DIV/0!		NO SE VERIFICA DEPOSITO DE LODO		
54	Se ha implementado un sistema integral de residuos sólidos debidamente señalizado	1	#¡DIV/0!				
55	Baños químicos disponen de agua para manos, en cantidad suficiente y mantenimiento	1	#¡DIV/0!				
56	Se ha realizado la capacitación del procedimiento de IAAs a los responsables de la identificación de peligros y evaluación de riesgos.	1	#¡DIV/0!				
57	La identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales e implementación de controles se realiza en conjunto con la línea de mando	1	#¡DIV/0!				
58	Se han identificado y evaluado correctamente los aspectos e impactos ambientales y se cumplen sus controles según las actividades desarrolladas en la obra.	1	#¡DIV/0!				
59	Se realiza inspección trimestral verificando la implementación de los controles indicados en el cuadro IAAs	1	#¡DIV/0!				
60	Se ha realizado la capacitación de la matriz IAAs al personal responsable de la realización de actividades en la obra.	1	#¡DIV/0!				
PREVENCIÓN EN EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS		100%	N.A.				
61	Los productos químicos cuentan con las hojas HDS y están almacenados en el lugar indicado.	1	#¡DIV/0!				
62	Los productos químicos se encuentran rotulados, con el envase con respectiva tapa y en buen estado.	0	#¡DIV/0!				
63	El almacén de los productos químicos de la obra está en lugar ventilado, limpio y ordenado.	1	#¡DIV/0!				
64	El almacén de productos químicos cuenta con el kit de derrames	1	#¡DIV/0!				
POSICIONES / ACTITUDES DE LA GENTE		100%	N.A.				
65	Las tareas de estas al mismo nivel o diferente se encuentran señalizadas, no se evidencia existencia de tapa.	1	#¡DIV/0!				
66	Superficies calientes que podrían causar un quemadura están protegidas.	1	#¡DIV/0!				
67	Se previene el sobreesfuerzo de los trabajadores al levantar, empujar, tirar o alcanzar	1	#¡DIV/0!				
68	Las rutinas sobre el trabajo de otros trabajadores están controladas	1	#¡DIV/0!				
69	No trabaja con carga suspendida	1	#¡DIV/0!				
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		100%	N.A.				
70	Se cuenta con los registros de entrega y conservación.	1	#¡DIV/0!		NO SE EVIDENCIA		
71	Guantes de seguridad y botas de trabajo son usados y mantenidos como se requiere.	1	#¡DIV/0!				
72	Protección auditiva usada apropiadamente.	1	#¡DIV/0!		NO HABITUALIDAD DE USO / NO SE EVIDENCIA		
73	Protección ocular usada de manera apropiada	1	#¡DIV/0!				
74	Equipos de seguridad contra protección respiratoria para los polvos y vapores apropiados en uso.	1	#¡DIV/0!				
75	Indicadores permanentes en ambientes con ruido ocupacional.	1	#¡DIV/0!				
76	Guantes con refuerzo contra el corte y soldar adecuadamente.	1	#¡DIV/0!				
77	Ropa de trabajo con la visibilidad y diseño con elementos reflectantes.	1	#¡DIV/0!				
78	Equipo de protección para soldadores usados adecuadamente	1	#¡DIV/0!				
79	Otros implementos, verificando realmente a problemas químicos	1	#¡DIV/0!				
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA		100%	N.A.				
80	Hay barreras y barandas instaladas y en buenas condiciones para prevenir caídas o impacto con de trabajadores según se requiera	1	#¡DIV/0!				
81	Malla de protección vial instalada según se requiere y en buenas condiciones.	1	#¡DIV/0!				
82	Letreros de advertencia: (Extintores en Botiquín y otros letreros verificar cantidad y condición).	1	#¡DIV/0!				
83	Protección de Equipos (Ergonómico, Pulsos, Cierre de Emergencia) y similares en su lugar y en buenas condiciones	1	#¡DIV/0!				
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES		100%	N.A.				
84	Los herramientas son adecuadas para el trabajo a realizar.	1	#¡DIV/0!				
85	Son usadas correctamente.	1	#¡DIV/0!				
86	Están en condiciones seguras e inspeccionadas.	1	#¡DIV/0!				
87	Cables eléctricos - extensiones en condición e inspección al día.	1	#¡DIV/0!		NO HABITUALIDAD DE USO / CABLES TRAMPA		
88	Movimientos inseguridades del material está controlado.	1	#¡DIV/0!				
89	Disco de corte / desbaste usado correctamente.	1	#¡DIV/0!				

104	Esta ubicado a más de 3 mt de la periferia de la excavación en función del talud	1	#¡DIV/0!				
ANDAMIOS Y ESCALERAS		100%	N.A.				
105	Los andamios cuentan con la certificación e inspección para el inicio de trabajo	1	#¡DIV/0!				
106	Construidos por especificaciones técnicas de fabricante	1	#¡DIV/0!				
107	Cuentan con kits de acceso y salida apropiados	1	#¡DIV/0!				
108	Encontrados correctamente (Rojo- Mitad Verde- Azul)	1	#¡DIV/0!				
109	Se monitorean en los libros según lo establecen modificaciones	1	#¡DIV/0!				
110	Escaleras apropiadas para el trabajo realizado/ adecuadamente aseguradas	1	#¡DIV/0!				
PROTECCION CONTRA CAIDAS		100%	N.A.				
111	Arnés de seguridad, inspección y uso de manera adecuada	1	#¡DIV/0!				
112	Las líneas de vida están adecuadamente amarradas a un soporte apropiado	1	#¡DIV/0!				
113	Protección perimetral rígida según estándar	1	#¡DIV/0!				
114	Elementos de anclaje estables, inamovibles, instalados y soportan una fuerza mínima de 2,000 lbs.	1	#¡DIV/0!				
115	Equipos de protección contra caídas con cuerda cuentan con anclaje para este objetivo	1	#¡DIV/0!				
116	Equipos de protección contra caídas son inspeccionados y registrados en forma regular.	1	#¡DIV/0!				
117	Los trabajos en altura donde no hay un sistema fijo de protección de línea de vida, están previamente establecidos para asegurar su realización.	1	#¡DIV/0!				
118	Líneas de vida cuentan con autorización debidamente firmada y vigente en documento de seguridad.	1	#¡DIV/0!				
EQUIPOS DE LEVANTE DE CARGA		100%	N.A.				
119	Equipo de capacidad adecuada para el levante y con tabla de carga en idioma y en idioma español.	1	#¡DIV/0!				
120	Cable de trabajo y seguro del gancho en buenas condiciones con inspección vigente.	1	#¡DIV/0!				
121	Aparejos de levante (eslingas, grilletes, estrobos) en buenas condiciones y con la inspección del mes	1	#¡DIV/0!				
122	Mantas, cintas y otros protectores de eslingas usados como se requiere.	1	#¡DIV/0!				
123	Se usan técnicas de levante seguras (Vuelo, cinta, etc.)	1	#¡DIV/0!				
124	Riggers/Montacarguistas con certificación vigente	1	#¡DIV/0!				
EQUIPOS MÓVILES DE CONSTRUCCIÓN		100%	N.A.				
125	Luces, frenos, bocinas, alarmas (reversa) y cinturones de seguridad, operativos en buen estado.	1	#¡DIV/0!				
126	Equipos y vehículos cuentan con cinturones de seguridad y en uso durante	1	#¡DIV/0!				
127	Mantención según plan / Inspección (Manual) / Checklist pre-uso	1	#¡DIV/0!				
128	Revisión técnica vigente	1	#¡DIV/0!				
129	Equipo usado adecuadamente.	1	#¡DIV/0!				
130	Carga es soportada en forma segura.	1	#¡DIV/0!				
131	Licencias a tareas de Operador/Conductor Vigentes.	1	#¡DIV/0!				
132	Vehículos / Móviles con pluma cuentan con señalización	1	#¡DIV/0!				
133	Equipos Móviles de Construcción que son operados con vigía o señalero cuando circulan por sectores de la Faena	1	#¡DIV/0!				
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		100%	N.A.				
134	Los materiales inflamables almacenados adecuadamente.	1	#¡DIV/0!				
135	Cilindros de oxígeno y gases combustibles se almacenan verticales.	1	#¡DIV/0!				
136	Los cilindros y recipientes están etiquetados con el gas que contienen.	1	#¡DIV/0!				
137	Extintores señalizados, localizados e inspeccionados en forma debida.	1	#¡DIV/0!				
138	Los cilindros de gas comprimido son almacenados y transportados adecuadamente	1	#¡DIV/0!				
139	Generación de trabajo en caliente y permisos para soldar cuenta con equipos	1	#¡DIV/0!				
140	Mangueras y válvulas están debidamente unidas y en buenas condiciones	1	#¡DIV/0!				
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES		100%	N.A.				
141	Carga es soportada en forma segura, uso de cuñas u otros.	1	#¡DIV/0!				
142	Carga y materiales almacenados en forma segura.	1	#¡DIV/0!				
143	Se usan cuñas y separadores.	1	#¡DIV/0!				
144	Altura de materiales no tiene riesgo.	1	#¡DIV/0!				
145	Señalización de acuerdo a estándar (Norma NFPA, Letreros de Advertencia).	1	#¡DIV/0!				
RESPUESTA A EMERGENCIAS		100%	N.A.				
146	Personal del área de trabajo han sido/serán capacitados en primeros auxilios. Se tiene organizada la brigada de emergencia	1	#¡DIV/0!				
147	Trabajadores saben como actuar ante temblores u otros. s.s.	1	#¡DIV/0!				
148	Trabajadores saben como actuar en caso de incendios.	1	#¡DIV/0!				
149	En el área hay una relación de cómo operar y cada contiene todo los elementos aplicables / Existe evidencia diaria de revisión de la carpeta de emergencia.	1	#¡DIV/0!				
150	Trabajadores conocen la ubicación de los puntos de refugio y/o reunión.	1	#¡DIV/0!				
151	Trabajadores conocen el flujo en caso existir en caso de incidentes (Acciones operativas en emergencia y urgencia médica).		#¡DIV/0!				
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES - ACCIONES CORRECTIVAS		100%	N.A.				
152	El flujo de reporte de incidentes se encuentra publicado en un lugar visible y es de conocimiento del personal.	1	#¡DIV/0!				
153	Se mantienen registros de la investigación de los accidentes ocurridos en obra	1	#¡DIV/0!				
154	Los accidentes son investigados por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y cuando lo amerita el personal	1	#¡DIV/0!	NO HUBO LOS DATOS			
155	Se toman las acciones correctivas y/o preventivas oportunamente y se verifica su eficacia. Se mantienen los registros pertinentes.	0	#¡DIV/0!	NO SE GENERO LA SEMANA DE ALCANCE DE 28/10/22			
CONTROLES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		100%	N.A.				
156	EPP en el lugar de trabajo y los medios objetivos se encuentran implementados	1	#¡DIV/0!				

90	El personal asignado para la utilización del mismo(manejo, aseo, cambio) se encuentra debidamente capacitado.	1	M/DIV/D				
91	Herramientas son debidamente transportadas y almacenadas	1	M/DIV/D				
92	Cableado Eléctrico según norma y estándar y aterrizados.	1	M/DIV/D				
93	Cableado Eléctrico se encuentra señalizado con la cinta del área y con los datos del encargado	1			SE EVIDENCIO UNA OBSERVACION		
94	Uso por Electricos (mantenimiento, etc.) entrenados.	1	M/DIV/D				
95	Los cocyotes de corriente de buena calidad deben estar ajustados (3 mm) separados mínimo a la base del enchufe y las puntas apropiadamente protegidas.	1	D/DIV/D				
96	Las herramientas rotatorias se detienen al dejar de presionar el botón de activación (aplicando al portal de cambio manual).	1	M/DIV/D				
97	Conexiones eléctricas empalmadas en forma adecuada y bajo aislación y/o Normas RETIE	1	M/DIV/D				
EXCAVACIONES		UNDS	N.A.				
98	Talud y entibado adecuado según norma (2350	1	D/DIV/D				
99	Señalización de la excavación en su perímetro.	1	M/DIV/D				
100	Escaleras de acceso y salida cada 7,5 metros.	1	M/DIV/D				
101	Diligenciamiento inspecciones y pausas activas condiciones seguras.	1	M/DIV/D		NA		
102	Cinta perimetral con malla (Barricada Rígida)	1	M/DIV/D				
103	Excavación a más de 1,20 mts de profundidad, cuenta con vigía.	1	M/DIV/D				

157	Procesos circundantes, de diario existen en el lugar. Trabajadores clasificados en peligros CONSTITUCIONS.	1	a) DIN/ISO				
158	Se cuenta con los permisos específicos para realizar la tarea, en caso de ser necesario (Trabajo en Altura, Espacio Confinado, Trabajo en Caliente, etc.).	1	a) UN/ISO				
159	Se encuentra el supervisor a cargo de la tarea en el lugar.	1	a) DIN/ISO				
160	[redacted] y Análisis de Trabajo Seguro (ATS) está en formato (según criticidad)	1	a) UN/ISO				

[redacted]

[redacted]

[redacted]

2. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

[redacted]

Su opinión es importante para nosotros, razón por la cual el área de Gestión Total de la Calidad de la empresa constructora [redacted], ha elaborado la siguiente encuesta de satisfacción, sobre la cual agradecemos de antemano su atención. A continuación se indican las instrucciones de llenado:

INSTRUCCIONES: Califique cada uno de los aspectos descritos según su percepción: 0: Malo, 1: Regular, 2: Bueno, 3: Muy Bueno. Asimismo, para nuestra empresa es importante conocer los aspectos que usted considera se destacan y en los que podemos mejorar, por ello le solicitamos incluirlos en donde se le solicite.

Proyecto: [redacted]

1. La gestión del PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN en el proyecto con respecto a:

	0	1	2	3
El seguimiento de la persona responsable de la Obra -Jefe de Obra- en cuanto a cumplimiento de acuerdos y compromisos a partir de Reuniones y Requerimientos contractuales.	○	○	○	Ø
El grado de satisfacción sobre la gestión del *staff* de obra, para solucionar de manera oportuna las necesidades del proyecto y solución de problemas es:	○	○	○	Ø
Las competencias técnicas del personal de *staff* asignado al proyecto es:	○	○	○	Ø

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

UN EQUIPO DE OBRA MUY COMPROMETIDO CON LOS OBJETIVOS

2. La gestión del seguimiento de La CALIDAD DE LA OBRA:

	0	1	2	3
Cumplimiento de la utilización de materiales de calidad, así como de los certificados y/o protocolos de calidad según lo establecido en las especificaciones técnicas.	○	○	○	✓
Se informa oportunamente de los resultados de ensayos.	○	○	○	✓
El grado de conformidad respecto a la comunicación entre el personal de staff de obra y la Supervisión, en cuanto a las coordinaciones en obra. (reuniones, rfi's, liberaciones, levantamiento de observaciones y otros)	○	○	✓	○
El compromiso del staff de obra para cumplir con los requisitos del proyecto.	○	○	○	✓
Compromiso con la calidad de los trabajadores (cuadrillas propias) para el desarrollo de las actividades.	○	○	○	✓
Compromiso con la calidad de los subcontratistas para el desarrollo de las actividades.	○	○	○	✓

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

NIVELAR PROCESOS DE EVALUACIÓN DE SUBCONTRATISTAS

3. Gestión sobre el seguimiento de La SEGURIDAD DE LA OBRA:

	0	1	2	3
El compromiso de la Empresa para aplicar el manejo ambiental, seguridad y salud ocupacional es:	○	○	○	✓
El cumplimiento en el uso de equipos de protección colectiva (EPC) así como de los equipos de protección personal (EPP) es:	○	○	○	✓
El compromiso con la señalización y medidas de seguridad en el proyecto es:	○	○	○	✓
El compromiso del staff de obra para cumplir con los requisitos del proyecto.	○	○	○	✓
El cumplimiento del orden y limpieza en las instalaciones de la obra es:	○	○	○	✓

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

UNA OBRA MUY ORDENADA Y SEGURA.

4. LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA:

	0	1	2	3
La atención recibida de parte de la Gerencia y personal de la empresa es:	○	○	○	⊘
La conformidad con que se da atención y solución a los requerimientos, así como propuestas de mejora de optimización, durante la etapa de Gestión de Ingeniería (en caso aplique) es:	○	○	○	⊘
La conformidad con que se da atención y solución a los requerimientos durante la etapa de Ejecución de Obra (cuando los haya tenido) es:	○	○	○	⊘

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

5. GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA:

	0	1	2	3
A la fecha, la satisfacción general con el servicio recibido es:	○	○	○	⊘
A la fecha, la satisfacción general con el producto recibido es:	○	○	○	⊘
Si tuviese la oportunidad de referir nuestra empresa, la referiría como una empresa:	○	○	○	⊘

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

¡Gracias!

[redacted]

[redacted]

Su opinión es importante para nosotros, razón por la cual el área de Gestión Total de la Calidad de la empresa constructora [redacted] ha elaborado la siguiente encuesta de satisfacción, sobre la cual agradecemos de antemano su atención. A continuación se indican las instrucciones de llenado.

INSTRUCCIONES: Califique cada uno de los aspectos descritos según su percepción: 0: Malo, 1: Regular, 2: Bueno, 3: Muy Bueno. Asimismo, para nuestra empresa es importante conocer los aspectos que usted considera se destacan y en los que podemos mejorar, por ello le solicitamos incluirlos en donde se le solicite.

Proyecto: [redacted]

1. La gestión del PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN en el proyecto con respecto a:

	0	1	2	3
El seguimiento de la persona responsable de la Obra -Jefe de Obra- en cuanto a cumplimiento de acuerdos y compromisos a partir de Reuniones y Requerimientos contractuales.	○	○	○	⊗
El grado de satisfacción sobre la gestión del *staff* de obra, para solucionar de manera oportuna las necesidades del proyecto y solución de problemas es:	○	○	⊗	○
Las competencias técnicas del personal de *staff* asignado al proyecto es:	○	○	○	⊗

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

ENTREGAR INFORMACIÓN SOLICITADA Y LA OBRA EN LAS FECHAS PACTADAS EN LAS ACTAS DEL COMITÉ DE OBRA (PLANOS AS BUILT, etc)

2. La gestión del seguimiento de La CALIDAD DE LA OBRA:

	0	1	2	3
Cumplimiento de la utilización de materiales de calidad, así como de los certificados y/o protocolos de calidad según lo establecido en las especificaciones técnicas.	○	○	⊗	○
Se informa oportunamente de los resultados de ensayos.	⊗	○	○	○
El grado de conformidad respecto a la comunicación entre el personal de staff de obra y la Supervisión, en cuanto a las coordinaciones en obra. (reuniones, rfi´s, liberaciones, levantamiento de observaciones y otros)	○	○	⊗	○
El compromiso del staff de obra para cumplir con los requisitos del proyecto.	○	○	○	⊗
Compromiso con la calidad de los trabajadores (cuadrillas propias) para el desarrollo de las actividades.	○	○	⊗	○
Compromiso con la calidad de los subcontratistas para el desarrollo de las actividades.	○	○	⊗	○

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

- ENTREGAR A TIEMPO DOSSIER DE CALIDAD (SE DETECTARON 2 MESES)
- EN LAS VISITAS SEMANALES NO SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE INGENIEROS DE CAMPO SUPERVISANDO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

3. Gestión sobre el seguimiento de La SEGURIDAD DE LA OBRA:

	0	1	2	3
El compromiso de la Empresa para aplicar el manejo ambiental, seguridad y salud ocupacional es:	○	○	○	⊗
El cumplimiento en el uso de equipos de protección colectiva (EPC) así como de los equipos de protección personal (EPP) es:	○	○	○	⊗
El compromiso con la señalización y medidas de seguridad en el proyecto es:	○	○	⊗	○
El cumplimiento del orden y limpieza en las instalaciones de la obra es:	○	○	⊗	○

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

- MEJORAR SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA COLINDANTE A LA ZONA ENTREGADA A PROPIETARIOS Y ZONA EXISTENTE
- LIMPIEZA POSTERIOR A LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LOS SOTANOS
- MEJORAR EL CONTROL DE LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS (SOLADOS, Y OTROS)
- RESPETAR HORARIOS DE TRABAJO SEGÚN LICENCIA.

4. LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA:

	0	1	2	3
La atención recibida de parte de la Gerencia y personal de la empresa es:	○	⊗	○	○
La conformidad con que se da atención y solución a los requerimientos, así como propuestas de mejora de optimización, durante la etapa de Gestión de Ingeniería (en caso aplique) es:	○	○	⊗	○
La conformidad con que se da atención y solución a los requerimientos durante la etapa de Ejecución de Obra (cuando los haya tenido) es:	○	○	⊗	○

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

- RESPETAR LOS PLAZOS ACORDADOS EN LOS COMITÉS DE OBRA.

5. GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA:

	0	1	2	3
A la fecha, la satisfacción general con el servicio recibido es:	○	○	⊗	○
A la fecha, la satisfacción general con el producto recibido es:	○	○	⊗	○
Si tuviese la oportunidad de refenr nuestra empresa, la referiría como una empresa:	○	○	⊗	○

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

- MAYOR TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN,
- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.
- A DESTACAR : EL GRADO DE COMPROMISO DEL STAFF DE OBRA.

¡Gracias!

[redacted]

[redacted]

Su opinión es importante para nosotros, razón por la cual el área de Gestión Total de la Calidad de la empresa constructora [redacted], ha elaborado la siguiente encuesta de satisfacción, sobre la cual agradecemos de antemano su atención. A continuación se indican las instrucciones de llenado:

INSTRUCCIONES: Califique cada uno de los aspectos descritos según su percepción: 0: Malo, 1: Regular, 2: Bueno, 3: Muy Bueno. Asimismo, para nuestra empresa es importante conocer los aspectos que usted considera se destacan y en los que podemos mejorar, por ello le solicitamos incluirlos en donde se le solicite.

Proyecto: [redacted]

1. La gestión del PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN en el proyecto con respecto a:

	0	1	2	3
El seguimiento de la persona responsable de la Obra -Jefe de Obra- en cuanto a cumplimiento de acuerdos y compromisos a partir de Reuniones y Requerimientos contractuales.	○	○	⊘	○
El grado de satisfacción sobre la gestión del *staff* de obra, para solucionar de manera oportuna las necesidades del proyecto y solución de problemas es:	○	○	⊗	○
Las competencias técnicas del personal de *staff* asignado al proyecto es:	○	○	⊗	○

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

[redacted]

2. La gestión del seguimiento de La CALIDAD DE LA OBRA:

	0	1	2	3
Cumplimiento de la utilización de materiales de calidad, así como de los certificados y/o protocolos de calidad según lo establecido en las especificaciones técnicas.	○	○	⊗	○
Se informa oportunamente de los resultados de ensayos.	○	⊗	○	○
El grado de conformidad respecto a la comunicación entre el personal de staff de obra y la Supervisión, en cuanto a las coordinaciones en obra. (reuniones, rfi's, liberaciones, levantamiento de observaciones y otros)	○	○	⊗	○
El compromiso del staff de obra para cumplir con los requisitos del proyecto.	○	○	⊗	○
Compromiso con la calidad de los trabajadores (cuadrillas propias) para el desarrollo de las actividades.	○	○	⊗	○
Compromiso con la calidad de los subcontratistas para el desarrollo de las actividades.	○	○	⊗	○

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

Se tiene que exigir limpieza post trabajo a subcontratos - caso: goteo de pintura. En porcentajes de ejecución

3. Gestión sobre el seguimiento de La SEGURIDAD DE LA OBRA:

	0	1	2	3
El compromiso de la Empresa para aplicar el manejo ambiental, seguridad y salud ocupacional es:	○	○	⊗	○
El cumplimiento en el uso de equipos de protección colectiva (EPC) así como de los equipos de protección personal (EPP) es:	○	○	○	⊗
El compromiso con la señalización y medidas de seguridad en el proyecto es:	○	○	○	⊗
El cumplimiento del orden y limpieza en las instalaciones de la obra es:	○	○	⊗	○

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

Se adjunta un plan de manejo de residuos solicitado por el perdo anterior para el V°B°, Sin embargo aún no se tiene respuesta. mejorar los tiempos de respuesta a documentos que aperturan con el proyecto.

4. LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA:

	0	1	2	3
La atención recibida de parte de la Gerencia y personal de la empresa es:	○	○	⊗	○
La conformidad con que se da atención y solución a los requerimientos, así como propuestas de mejora de optimización, durante la etapa de Gestión de Ingeniería (en caso aplique) es:	○	○	⊗	○
La conformidad con que se da atención y solución a los requerimientos durante la etapa de Ejecución de Obra (cuando los haya tenido) es:	○	○	⊗	○

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

5. GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA:

	0	1	2	3
A la fecha, la satisfacción general con el servicio recibido es:	○	○	⊗	○
A la fecha, la satisfacción general con el producto recibido es:	○	○	⊗	○
Si tuviese la oportunidad de referir nuestra empresa, la referiría como una empresa:	○	○	⊗	○

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

Mejorar tiempo de respuesta y solicitudes - Solicitar mejores garantías y mejorar tiempos de respuesta a proveedores y subcontratos - Exigir a proveedores y subcontratos a responder a las causas por sus trabajos garantizados.

¡Gracias!

[redacted]

Su opinión es importante para nosotros, razón por la cual el área de Gestión Total de la Calidad de la empresa constructora BESCO S.A.C., ha elaborado la siguiente encuesta de satisfacción, sobre la cual agradecemos de antemano su atención. A continuación se indican las instrucciones de llenado.

INSTRUCCIONES: Califique cada uno de los aspectos descritos según su percepción: 0: Malo, 1: Regular, 2: Bueno, 3: Muy Bueno. Asimismo, para nuestra empresa es importante conocer los aspectos que usted considera se destacan y en los que podemos mejorar, por ello le solicitamos incluirlos en donde se le solicite.

Proyecto: [redacted]

1. La gestión del PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN en el proyecto con respecto a:

	0	1	2	3
El seguimiento de la persona responsable de la Obra -Jefe de Obra- en cuanto a cumplimiento de acuerdos y compromisos a partir de Reuniones y Requerimientos contractuales.	○	○	○	◉
El grado de satisfacción sobre la gestión del *staff* de obra, para solucionar de manera oportuna las necesidades del proyecto y solución de problemas es:	○	○	○	◉
Las competencias técnicas del personal de *staff* asignado al proyecto es:	○	○	○	◉

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

2. La gestión del seguimiento de La CALIDAD DE LA OBRA:

	0	1	2	3
Cumplimiento de la utilización de materiales de calidad, así como de los certificados y/o protocolos de calidad según lo establecido en las especificaciones técnicas.	○	○	○	◉
Se informa oportunamente de los resultados de ensayos	○	○	◉	○
El grado de conformidad respecto a la comunicación entre el personal de staff de obra y la Supervisión, en cuanto a las coordinaciones en obra. (reuniones, rfi´s, liberaciones, levantamiento de observaciones y otros)	○	○	○	◉
El compromiso del staff de obra para cumplir con los requisitos del proyecto.	○	○	○	◉
Compromiso con la calidad de los trabajadores (cuadrillas propias) para el desarrollo de las actividades.	○	○	○	◉
Compromiso con la calidad de los subcontratistas para el desarrollo de las actividades.	○	○	○	◉

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

Ha mejorado la transparencia en la transmisión de información, la cual permite tomar decisiones

3. Gestión sobre el seguimiento de La SEGURIDAD DE LA OBRA:

	0	1	2	3
El compromiso de la Empresa para aplicar el manejo ambiental, seguridad y salud ocupacional es:	○	○	○	◉
El cumplimiento en el uso de equipos de protección colectiva (EPC) así como de los equipos de protección personal (EPP) es:	○	○	○	◉
El compromiso con la señalización y medidas de seguridad en el proyecto es:	○	○	○	◉
El cumplimiento del orden y limpieza en las instalaciones de la obra es:	○	○	○	◉

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

Se puede mejorar la señalización y limpieza de la zona de influencia de la obra (exteriores) en sus

4. LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA:

	0	1	2	3
La atención recibida de parte de la Gerencia y personal de la empresa es:	○	○	○	◉
La conformidad con que se da atención y solución a los requerimientos, así como propuestas de mejora de optimización, durante la etapa de Gestión de Ingeniería (en caso aplique) es:	○	○	○	◉
La conformidad con que se da atención y solución a los requerimientos durante la etapa de Ejecución de Obra (cuando los haya tenido) es:	○	○	○	◉

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

5. GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA:

	0	1	2	3
A la fecha, la satisfacción general con el servicio recibido es:	○	○	○	◉
A la fecha, la satisfacción general con el producto recibido es:	○	○	○	◉
Si tuviese la oportunidad de referir nuestra empresa, la referiría como una empresa:	○	○	○	◉

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

¡Gracias!

[redacted]

Su opinión es importante para nosotros, razón por la cual el área de Gestión Total de la Calidad de la empresa constructora BESCO S.A.C., ha elaborado la siguiente encuesta de satisfacción, sobre la cual agradecemos de antemano su atención. A continuación se indican las instrucciones de llenado:

INSTRUCCIONES: Califique cada uno de los aspectos descritos según su percepción: 0: Malo, 1: Regular, 2: Bueno, 3: Muy Bueno. Asimismo, para nuestra empresa es importante conocer los aspectos que usted considera se destacan y en los que podemos mejorar, por ello le solicitamos incluirlos en donde se le solicite.

Proyecto: [redacted]

1. La gestión del PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN en el proyecto con respecto a:

	0	1	2	3
El seguimiento de la persona responsable de la Obra -Jefe de Obra- en cuanto a cumplimiento de acuerdos y compromisos a partir de Reuniones y Requerimientos contractuales.	○	○	○	◉
El grado de satisfacción sobre la gestión del *staff* de obra, para solucionar de manera oportuna las necesidades del proyecto y solución de problemas es:	○	○	○	◉
Las competencias técnicas del personal de *staff* asignado al proyecto es:	○	○	○	◉

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

2. La gestión del seguimiento de La CALIDAD DE LA OBRA:

	0	1	2	3
Cumplimiento de la utilización de materiales de calidad, así como de los certificados y/o protocolos de calidad según lo establecido en las especificaciones técnicas.	○	○	◉	○
Se informa oportunamente de los resultados de ensayos	○	○	○	◉
El grado de conformidad respecto a la comunicación entre el personal de staff de obra y la Supervisión, en cuanto a las coordinaciones en obra. (reuniones, rfi´s, liberaciones, levantamiento de observaciones y otros)	○	○	○	◉
El compromiso del staff de obra para cumplir con los requisitos del proyecto.	○	○	◉	○
Compromiso con la calidad de los trabajadores (cuadrillas propias) para el desarrollo de las actividades.	○	○	○	◉
Compromiso con la calidad de los subcontratistas para el desarrollo de las actividades.	○	○	○	◉

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

importante no realizar cambios sin consulta previa (piso áreas comunes torre 14) excelente

3. Gestión sobre el seguimiento de La SEGURIDAD DE LA OBRA:

	0	1	2	3
El compromiso de la Empresa para aplicar el manejo ambiental, seguridad y salud ocupacional es:	○	○	○	◉
El cumplimiento en el uso de equipos de protección colectiva (EPC) así como de los equipos de protección personal (EPP) es:	○	○	○	◉
El compromiso con la señalización y medidas de seguridad en el proyecto es:	○	○	○	◉
El cumplimiento del orden y limpieza en las instalaciones de la obra es:	○	○	○	◉

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

Obra impecable

4. LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA:

	0	1	2	3
La atención recibida de parte de la Gerencia y personal de la empresa es:	○	○	○	◉
La conformidad con que se da atención y solución a los requerimientos, así como propuestas de mejora de optimización, durante la etapa de Gestión de Ingeniería (en caso aplique) es:	○	○	○	◉
La conformidad con que se da atención y solución a los requerimientos durante la etapa de Ejecución de Obra (cuando los haya tenido) es:	○	○	○	◉

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

5. GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA:

	0	1	2	3
A la fecha, la satisfacción general con el servicio recibido es:	○	○	○	◉
A la fecha, la satisfacción general con el producto recibido es:	○	○	◉	○
Si tuviese la oportunidad de referir nuestra empresa, la referiría como una empresa:	○	○	○	◉

Aspectos a destacar y/o por mejorar:

¡Gracias!

[redacted]

POSICIÓN	PROVEEDOR	PUNTUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	CALIDAD DE OBRA	SEGURIDAD DE OBRA	LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS OBRAS	GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL	Proporcione cualquier comentario sobre nuestros servicios o indique qué nos gustaría mejorar.
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

3. REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
04	RONC	Ronc -4	18/10/2018	Semana 43	GTC	[redacted]			Platea	S3	-	Estructura	Excavación	Suciedad	Limpiar la zona, retirar plásticos, antes del vaciado	Levantado	18/10/2018	
05	RONC	Ronc -5	19/10/2018	Semana 43	GTC				1	s1	Vestibulo previo	Estructura	Encofrado	Armado incorrecto	retirar el encofrado para ducto en el	Levantado	19/10/2018	
08	RONC	Ronc -8	25/10/2018	Semana 44	GTC				2	S4	Muro de ascensor	Estructura	Encofrado	falla en instalación	colocar accesorios faltantes al encofrado	Levantado	25/10/2018	
09	RONC	Ronc -9	26/10/2018	Semana 44	GTC				2	S4	201	Arquitectura	Concreto postvaciado	cangrejera	resanar con mortero estructural	Levantado	26/10/2018	
11	RONC	Ronc -11	29/10/2018	Semana 45	GTC				3	S3	Muro de cocina	Estructura	Encofrado	Falla en trazo	volver a trazar	Levantado	29/10/2018	
14	RONC	Ronc -14	9/11/2018	Semana 45	GTC				5	S1	Dormitorio 1	Arquitectura	Concreto postvaciado	cangrejera	resanar con mortero estructural	Levantado	12/11/2018	
15	RONC	Ronc -15	9/11/2018	Semana 45	GTC				5	S1	Sala	Arquitectura	Concreto postvaciado	Obstrucción	picar y retirar la zona obstruida	Levantado	10/11/2018	
17	RONC	Ronc -17	13/11/2018	Semana 46	GTC				5	S4	Pasadizo	Arquitectura	Concreto postvaciado	Desplome	Amolar y resanar	Levantado	15/11/2018	
18	RONC	Ronc -18	13/11/2018	Semana 46	GTC				5	S4	Dormitorio 1	Arquitectura	Concreto postvaciado	Obstrucción	picar y retirar la zona obstruida	Levantado	14/11/2018	
21	RONC	Ronc -21	20/11/2018	Semana 47	GTC				6	S3	Pasadizo	Estructura	Entubado PEALPE	Roto	Cambiar la tubería	Levantado	24/11/2018	
22	RONC	Ronc -22	21/11/2018	Semana 47	GTC				6	S3	Dormitorio 1	Estructura	Acero de refuerzo	Falta de separadores	Colocar separadores	Levantado	21/11/2018	
25	RONC	Ronc -25	27/11/2018	Semana 48	GTC				7	S4	Dormitorio 1	Estructura	Acero de refuerzo	Doblado	Ccambiar o empalmar	Levantado	26/12/2018	
26	RONC	Ronc -26	27/11/2018	Semana 48	GTC				7	S4	Pasadizo	Estructura	Acero de refuerzo	Mal aseguramiento	Colocar separadores	Levantado	26/12/2018	
28	RONC	Ronc -28	5/12/2018	Semana 49	GTC				9	S3	Dormitorio 1	Estructura	Entubado PVC SAP	Mal aseguramiento	Cuadrar el ternopor antes de asegurar	Levantado	26/12/2018	
29	RONC	Ronc -29	5/12/2018	Semana 49	GTC				9	S3	Dormitorio 1	Estructura	Entubado PEALPE	mal recorrido	modificar el recorrido de las tuberias	Levantado	26/12/2018	
32	RONC	Ronc -32	12/12/2018	Semana 50	GTC				10	S4	Cocina	Estructura	Encofrado	Mal aseguramiento	Colocar todas las corbatas	Levantado	26/12/2018	
33	RONC	Ronc -33	12/12/2018	Semana 50	GTC				10	S4	Sala	Estructura	Encofrado	Apuntalamiento inadecuado	asegurar los puntales	Levantado	26/12/2018	
34	RONC	Ronc -34	13/12/2018	Semana 50	GTC				11	S1	Cocina - Sala	Estructura	Entubado PVC SAP	Falla de prueba	Verificar alguna fuga en el recorrido de agua	Levantado	26/12/2018	
35	RONC	Ronc -35	14/12/2018	Semana 50	GTC				11	S2	Dormitorio 1	Estructura	Entubado PVC SAP	mal recorrido	modificar el recorrido de las tuberias	Levantado	26/12/2018	
36	RONC	Ronc -36	14/12/2018	Semana 50	GTC				11	S2	Pasadizo	Estructura	Acero de refuerzo	Dimensionamiento incorrecto	Colocar acero de dimensionamiento adecuado	Levantado	26/12/2018	
37	RONC	Ronc -37	14/12/2018	Semana 50	GTC				11	S2	Dormitorio 2	Estructura	Acero de refuerzo	Armado incorrecto	Colocar todas las varillas de acero necesaria	Levantado	26/12/2018	
43	RONC	Ronc -43	18/12/2018	Semana 51	GTC				12	S1	Sala	Estructura	Acero de refuerzo	Mal aseguramiento	Atortolar el alambre de manera adecuada	Levantado	18/12/2018	
44	RONC	Ronc -44	18/12/2018	Semana 51	GTC				12	S1	Dormitorio 1	Estructura	Entubado PVC SAP	Mal aseguramiento	Cuadrar el ternopor antes de asegurar	Levantado	18/12/2018	
45	RONC	Ronc -45	18/12/2018	Semana 51	GTC				11	S2	Baño 2	Estructura	Encofrado	Despostillamiento	Resanar la zona afectada	Levantado	26/12/2018	
50	RONC	Ronc -50	20/12/2018	Semana 51	GTC				12	S3	Dormitorio 1	Estructura	Acero de refuerzo	Sin recubrimiento	Colocar rondanas	Levantado	20/12/2018	
51	RONC	Ronc -51	20/12/2018	Semana 51	GTC				12	S3	Cocina	Estructura	Entubado PVC SAP	Falla en prueba	Verificar alguna fuga en el recorrido de agua	Levantado	20/12/2018	
52	RONC	Ronc -52	20/12/2018	Semana 51	GTC				12	S3	Dormitorio 1	Estructura	Acero de refuerzo	Falta separadores	Colocar separadores	Levantado	20/12/2018	
62	RONC	Ronc -62	26/12/2018	Semana 52	GTC				2	S4	Sala	Arquitectura	Concreto postvaciado	Fisura	Colocar Sika f11	Levantado	26/12/2018	
63	RONC	Ronc -63	26/12/2018	Semana 52	GTC				2	S3	Cocina	Arquitectura	Entubado PVC SAP	Falla en prueba	Sellar la conexión codo - tubería	Levantado	26/12/2018	
68	RONC	Ronc -68	27/12/2018	Semana 52	GTC				4	S1	Ducto	Arquitectura	Entubado PVC SAP	Roto	Cambiar el Codo roto	Levantado	28/12/2018	
69	RONC	Ronc -69	29/12/2018	Semana 52	GTC				14	S1	Dormitorio 2	Estructura	Acero de refuerzo	Falla en procedimento	Atortolar el alambre de manera adecuada	Levantado	29/12/2018	
104	RONC	Ronc -104	1/02/2019	Semana 05	GTC				2	202	_	Estructura	Concreto premezclado	contraflecha en piso	picar y amolar el piso	Levantado	8/02/2019	
105	RONC	Ronc -105	1/02/2019	Semana 05	GTC				2 AL 5	Todos	_	Acabados	Enchape	Drywall picado	dejar de picar muro de drywall	Levantado	8/02/2019	
106	RONC	Ronc -106	5/02/2019	Semana 06	GTC				21 duplex complemento	S1 Y S4	Azotea	Arquitectura	Topografía	Mala interpretacion de plano	Rectificar el trazado y remodular el encofrado de muro	Levantado	5/02/2019	
107	RONC	Ronc -107	6/02/2019	Semana 06	GTC				12	1201	Baño 2	Acabados	Sello cortafuego	Instalacion incompleta	Terminar de colocar el sello en la junta	Levantado	6/02/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
108	RONC	Ronc -108	7/02/2019	Semana 06	GTC	[redacted]			2	Sector 2 y 4 201 - 205	Cocina	Acabados	Puertas y/o marcos	``Pinto`` entre pared y marco de puerta	Reubicar y poner a raz de muro	Levantado	8/02/2019	[redacted]
109	RONC	Ronc -109	8/02/2019	Semana 06	GTC				19	_	Vestibulo previo	Arquitectura	Solaqueo	Cangrejera en muro	Aplicar mortero de contraccion compensada	Levantado	8/02/2019	
672	PROTOCOLO	PROT -1	12/02/2019	Semana 7	GTC				1	S1 - 105 - 106	Sala	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar area de trabajo	Levantado	12/012/2019	
673	PROTOCOLO	PROT -2	12/02/2019	Semana 7	GTC				1	S1 - 105 - 106	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	12/012/2019	
674	PROTOCOLO	PROT -3	12/02/2019	Semana 7	GTC				1	S1 - 105 - 106	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	12/012/2019	
116	RONC	Ronc -116	13/02/2019	Semana 07	GTC				20	S3 - 2008	Pasadizo	Arquitectura	Entubado PVC SAP	Obstrucción	Cambiar seccion taponada y resanar	Levantado	1/03/2019	
117	RONC	Ronc -117	13/02/2019	Semana 07	GTC				21 duplex complemento	S1 - 2103	Azotea	Arquitectura	Concreto postvaciado	desplome	Picar, solaquear y dar aplomado según trazo de derrame, en muro de parapeto.	Levantado	21/02/2019	
118	RONC	Ronc -118	13/02/2019	Semana 07	GTC				21 duplex complemento	S2 - 2105	Azotea	Arquitectura	Concreto postvaciado	Mal acabado	Cimbrar, picar y solaquear para borde indicado de losa.	Levantado	21/02/2019	
675	PROTOCOLO	PROT -4	13/02/2019	Semana 7	GTC				1	S2 - 104 - 103	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar area de trabajo	Levantado	13/012/2019	
676	PROTOCOLO	PROT -5	13/02/2019	Semana 7	GTC				1	S2 - 104 - 103	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	13/012/2019	
677	PROTOCOLO	PROT -6	13/02/2019	Semana 7	GTC				1	S2 - 104 - 103	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	13/012/2019	
678	PROTOCOLO	PROT -7	13/02/2019	Semana 7	GTC				1	S2 - 104 - 103	Sala - Enchufe	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Dimensión incorrecta	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	13/012/2019	
679	PROTOCOLO	PROT -8	14/02/2019	Semana 7	GTC				1	S3 - 101 - 102	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	14/02/2019	
680	PROTOCOLO	PROT -9	14/02/2019	Semana 7	GTC				1	S3 - 101 - 102	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	14/02/2019	
681	PROTOCOLO	PROT -10	14/02/2019	Semana 7	GTC				1	S3 - 101 - 102	Losa	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	14/02/2019	
682	PROTOCOLO	PROT -11	14/02/2019	Semana 7	GTC				1	S3 - 101 - 102	Sala - Enchufe	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Dimensión incorrecta	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	14/02/2019	
683	PROTOCOLO	PROT -12	15/02/2019	Semana 7	GTC				1	S4 - 107 - 108	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	15/012/2019	
684	PROTOCOLO	PROT -13	16/02/2019	Semana 7	GTC				2	S1 - 206- 205	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	16/02/2019	
685	PROTOCOLO	PROT -14	16/02/2019	Semana 7	GTC				2	S1 - 206- 205	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	16/02/2019	
686	PROTOCOLO	PROT -15	16/02/2019	Semana 7	GTC				2	S1 - 206- 205	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	16/02/2019	
687	PROTOCOLO	PROT -16	16/02/2019	Semana 7	GTC				2	S1 - 206- 205	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	16/02/2019	
688	PROTOCOLO	PROT -17	18/02/2019	Semana 8	GTC				2	S2- 203- 204	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	18/02/2019	
689	PROTOCOLO	PROT -18	18/02/2019	Semana 8	GTC				2	S2- 203- 204	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	18/02/2019	
690	PROTOCOLO	PROT -19	18/02/2019	Semana 8	GTC				2	S2- 203- 204	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	18/02/2019	
691	PROTOCOLO	PROT -20	19/02/2019	Semana 8	GTC				2	S3 - 201 - 202	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	19/02/2019	
692	PROTOCOLO	PROT -21	19/02/2019	Semana 8	GTC				2	S3 - 201 - 202	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	19/02/2019	
693	PROTOCOLO	PROT -22	19/02/2019	Semana 8	GTC				2	S3 - 201 - 202	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	19/02/2019	
694	PROTOCOLO	PROT -23	19/02/2019	Semana 8	GTC				2	S3 - 201 - 202	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	19/02/2019	
121	RONC	Ronc -121	20/02/2019	Semana 08	GTC				3	S1	_	Estructura	Acero de refuerzo	Recubrimiento faltante	Colocar rondanas y dados de concreto; colocar alambres.	Levantado	21/02/2019	
695	PROTOCOLO	PROT -24	20/02/2019	Semana 8	GTC				2	S4 - 207- 208	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	20/02/2019	
696	PROTOCOLO	PROT -25	20/02/2019	Semana 8	GTC				2	S4 - 207- 208	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	20/02/2019	
697	PROTOCOLO	PROT -26	20/02/2019	Semana 8	GTC				2	S4 - 207- 208	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	20/02/2019	
122	RONC	Ronc -122	21/02/2019	Semana 08	GTC				3	S1	Parapeto	Estructura	Concreto premezclado	Falla en procedimiento	vaciar concreto en parapeto	Levantado	2/03/2019	
698	PROTOCOLO	PROT -27	21/02/2019	Semana 8	GTC				3	S1 - 306 - 305	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	21/02/2019	
699	PROTOCOLO	PROT -28	21/02/2019	Semana 8	GTC				3	S1 - 306 - 305	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	21/02/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
700	PROTOCOLO	PROT -29	21/02/2019	Semana 8	GTC	[redacted]			3	S1 - 306 - 305	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	21/02/2019	[redacted]
701	PROTOCOLO	PROT -30	21/02/2019	Semana 8	GTC				3	S1 - 306 - 305	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	21/02/2019	
702	PROTOCOLO	PROT -31	22/02/2019	Semana 8	GTC				3	S2 - 304 - 303	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	22/02/2019	
703	PROTOCOLO	PROT -32	22/02/2019	Semana 8	GTC				3	S2 - 304 - 303	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	22/02/2019	
704	PROTOCOLO	PROT -33	22/02/2019	Semana 8	GTC				3	S2 - 304 - 303	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	22/02/2019	
705	PROTOCOLO	PROT -34	22/02/2019	Semana 8	GTC				3	S2 - 304 - 303	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	22/02/2019	
706	PROTOCOLO	PROT -35	23/02/2019	Semana 8	GTC				3	S3 - 301 - 302	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	23/02/2019	
707	PROTOCOLO	PROT -36	23/02/2019	Semana 8	GTC				3	S3 - 301 - 302	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	23/02/2019	
708	PROTOCOLO	PROT -37	23/02/2019	Semana 8	GTC				3	S3 - 301 - 302	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	23/02/2019	
709	PROTOCOLO	PROT -38	25/02/2019	Semana 9	GTC				3	S4 - 307 - 308	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	25/02/2019	
710	PROTOCOLO	PROT -39	25/02/2019	Semana 9	GTC				3	S4 - 307 - 308	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	25/02/2019	
711	PROTOCOLO	PROT -40	25/02/2019	Semana 9	GTC				3	S4 - 307 - 308	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	25/02/2019	
712	PROTOCOLO	PROT -41	26/02/2019	Semana 9	GTC				3	S1 - 406 - 405	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	26/02/2019	
713	PROTOCOLO	PROT -42	26/02/2019	Semana 9	GTC				3	S1 - 406 - 405	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	26/02/2019	
714	PROTOCOLO	PROT -43	26/02/2019	Semana 9	GTC				3	S1 - 406 - 405	Losa	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	26/02/2019	
715	PROTOCOLO	PROT -44	26/02/2019	Semana 9	GTC				3	S1 - 406 - 405	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	26/02/2019	
716	PROTOCOLO	PROT -45	26/02/2019	Semana 9	GTC				3	S1 - 406 - 405	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	26/02/2019	
717	PROTOCOLO	PROT -46	27/02/2019	Semana 9	GTC				4	S2 - 404 - 403	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	27/02/2019	
718	PROTOCOLO	PROT -47	27/02/2019	Semana 9	GTC				4	S2 - 404 - 403	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	27/02/2019	
719	PROTOCOLO	PROT -48	27/02/2019	Semana 9	GTC				4	S2 - 404 - 403	Losa	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	27/02/2019	
720	PROTOCOLO	PROT -49	27/02/2019	Semana 9	GTC				4	S2 - 404 - 403	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	27/02/2019	
128	RONC	Ronc -128	28/02/2019	Semana 09	GTC				21 duplex complemento	2004	-	Arquitectura	Concreto postvaciado	cangrejera	resanar con mortero estructural	Levantado	8/03/2019	
129	RONC	Ronc -129	28/02/2019	Semana 09	GTC				5	S2 - 506	Cocina	Acabados	Enchape	Cajoneo	cambiar pieza cajoneada	Levantado	8/03/2019	
721	PROTOCOLO	PROT -50	28/02/2019	Semana 9	GTC				4	S3 - 402 - 401	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	28/02/2019	
722	PROTOCOLO	PROT -51	28/02/2019	Semana 9	GTC				4	S3 - 402 - 401	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	28/02/2019	
723	PROTOCOLO	PROT -52	28/02/2019	Semana 9	GTC				4	S3 - 402 - 401	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	28/02/2019	
724	PROTOCOLO	PROT -53	28/02/2019	Semana 9	GTC				4	S3 - 402 - 401	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	28/02/2019	
725	PROTOCOLO	PROT -54	28/02/2019	Semana 9	GTC				4	S3 - 402 - 401	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	28/02/2019	
726	PROTOCOLO	PROT -55	1/03/2019	Semana 9	GTC				4	S4 - 407 - 408	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	1/03/2019	
727	PROTOCOLO	PROT -56	1/03/2019	Semana 9	GTC				4	S4 - 407 - 408	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	1/03/2019	
728	PROTOCOLO	PROT -57	1/03/2019	Semana 9	GTC				4	S4 - 407 - 408	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	1/03/2019	
729	PROTOCOLO	PROT -58	1/03/2019	Semana 9	GTC				4	S4 - 407 - 408	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	1/03/2019	
730	PROTOCOLO	PROT -59	2/03/2019	Semana 9	GTC				5	S1 - 506 - 505	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	2/03/2019	
731	PROTOCOLO	PROT -60	2/03/2019	Semana 9	GTC				5	S1 - 506 - 505	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	2/03/2019	
732	PROTOCOLO	PROT -61	2/03/2019	Semana 9	GTC				5	S1 - 506 - 505	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	2/03/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
733	PROTOCOLO	PROT -62	2/03/2019	Semana 9	GTC	[redacted]			5	S1 - 506 - 505	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	2/03/2019	[redacted]
135	RONC	Ronc -135	4/03/2019	Semana 10	GTC				6	S4	Losa	Acabados	Escarchado	Falta de homogeneidad	corregir escarchado	Levantado	5/03/2019	
734	PROTOCOLO	PROT -63	4/03/2019	Semana 10	GTC				5	S2 - 504 - 503	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	4/03/2019	
735	PROTOCOLO	PROT -64	4/03/2019	Semana 10	GTC				5	S2 - 504 - 503	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	4/03/2019	
736	PROTOCOLO	PROT -65	4/03/2019	Semana 10	GTC				5	S2 - 504 - 503	Losa	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	4/03/2019	
737	PROTOCOLO	PROT -66	4/03/2019	Semana 10	GTC				5	S2 - 504 - 503	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	4/03/2019	
738	PROTOCOLO	PROT -67	4/03/2019	Semana 10	GTC				5	S2 - 504 - 503	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	4/03/2019	
739	PROTOCOLO	PROT -68	5/03/2019	Semana 10	GTC				5	S3 - 501 - 502	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	5/03/2019	
740	PROTOCOLO	PROT -69	5/03/2019	Semana 10	GTC				5	S3 - 501 - 502	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	5/03/2019	
741	PROTOCOLO	PROT -70	5/03/2019	Semana 10	GTC				5	S3 - 501 - 502	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	5/03/2019	
130	RONC	Ronc -130	6/03/2019	Semana 10	GTC				5	S4	_	Estructura	Concreto premezclado	Falla en procedimiento	Colocar concreto en zonas faltantes	Levantado	8/03/2019	
131	RONC	Ronc -131	6/03/2019	Semana 10	GTC				3	S3	_	Estructura	Entubado PEALPE	Tuberia suelta	Se cambió de tuberia de gas y se aseguró a la malla	Levantado	8/03/2019	
742	PROTOCOLO	PROT -71	6/03/2019	Semana 10	GTC				5	S4 - 507 - 508	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	6/03/2019	
743	PROTOCOLO	PROT -72	6/03/2019	Semana 10	GTC				5	S4 - 507 - 508	Losa	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	6/03/2019	
744	PROTOCOLO	PROT -73	6/03/2019	Semana 10	GTC				5	S4 - 507 - 508	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	6/03/2019	
745	PROTOCOLO	PROT -74	6/03/2019	Semana 10	GTC				5	S4 - 507 - 508	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	6/03/2019	
746	PROTOCOLO	PROT -75	7/03/2019	Semana 10	GTC				6	S1 - 606 - 605	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	7/03/2019	
747	PROTOCOLO	PROT -76	7/03/2019	Semana 10	GTC				6	S1 - 606 - 605	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	7/03/2019	
748	PROTOCOLO	PROT -77	7/03/2019	Semana 10	GTC				6	S1 - 606 - 605	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	7/03/2019	
136	RONC	Ronc -136	8/03/2019	Semana 10	GTC				6	S3	_	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera	Reparar con mortero estructural	Levantado	9/03/2019	
749	PROTOCOLO	PROT -78	8/03/2019	Semana 10	GTC				6	S2 - 604 - 603	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	8/03/2019	
750	PROTOCOLO	PROT -79	8/03/2019	Semana 10	GTC				6	S2 - 604 - 603	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	8/03/2019	
751	PROTOCOLO	PROT -80	8/03/2019	Semana 10	GTC				6	S2 - 604 - 603	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	8/03/2019	
752	PROTOCOLO	PROT -81	9/03/2019	Semana 10	GTC				6	S3 - 601 - 602	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	9/03/2019	
753	PROTOCOLO	PROT -82	9/03/2019	Semana 10	GTC				6	S3 - 601 - 602	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	9/03/2019	
754	PROTOCOLO	PROT -83	9/03/2019	Semana 10	GTC				6	S3 - 601 - 602	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	9/03/2019	
923	PROTOCOLO	PROT -252	9/03/2019	Semana 10	GTC				2	S3 - 202	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	9/03/2019	
924	PROTOCOLO	PROT -253	9/03/2019	Semana 10	GTC				2	S1 - 205	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	9/03/2019	
925	PROTOCOLO	PROT -254	9/03/2019	Semana 10	GTC				2	S4 - 208	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Cangrejeras	Picar y rellenar con mortero de alta resistencia	Levantado	9/03/2019	
926	PROTOCOLO	PROT -255	9/03/2019	Semana 10	GTC				2	S4 - 208	Puerta	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	9/03/2019	
755	PROTOCOLO	PROT -84	11/03/2019	Semana 11	GTC				6	S4 - 607 - 608	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	11/03/2019	
756	PROTOCOLO	PROT -85	11/03/2019	Semana 11	GTC				6	S4 - 607 - 608	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	11/03/2019	
141	RONC	Ronc -141	12/03/2019	Semana 11	GTC				1	S3	Cocina	Estructura	Entubado polipropileno PPR	Rotura de tuberia	Cambiar seccion afectada	Levantado	14/03/2019	
142	RONC	Ronc -142	12/03/2019	Semana 11	GTC				20	S4	Dormitorio 1	Estructura	Entubado PVC SAP	Falta resanar	Solaqueo de agujero	Levantado	14/03/2019	
143	RONC	Ronc -143	12/03/2019	Semana 11	GTC				19	S3	Baño 1	Estructura	Entubado PVC SAP	Falta resanar	Solaqueo de agujero	Levantado	20/04/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
144	RONC	Ronc -144	12/03/2019	Semana 11	GTC	[redacted]			20	S3	Escalera duplex	Arquitectura	Entubado PVC SAP	Perforacion de tuberia	Cambiar seccion afectada	Levantado	20/04/2019	
757	PROTOCOLO	PROT -86	12/03/2019	Semana 11	GTC				7	S1 - 706 - 705	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	12/03/2019	
758	PROTOCOLO	PROT -87	12/03/2019	Semana 11	GTC				7	S1 - 706 - 705	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	12/03/2019	
759	PROTOCOLO	PROT -88	12/03/2019	Semana 11	GTC				7	S1 - 706 - 705	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	12/03/2019	
760	PROTOCOLO	PROT -89	12/03/2019	Semana 11	GTC				7	S1 - 706 - 705	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	12/03/2019	
145	RONC	Ronc -145	13/03/2019	Semana 11	GTC				20	S2	Dormitorio 1	Arquitectura	INDECI	Sello cortafuego incompleto	Limpieza y llenado de zona afectada	Levantado	20/04/2019	
761	PROTOCOLO	PROT -90	13/03/2019	Semana 11	GTC				7	S2 - 704 - 703	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	13/03/2019	
762	PROTOCOLO	PROT -91	13/03/2019	Semana 11	GTC				7	S2 - 704 - 703	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	13/03/2019	
763	PROTOCOLO	PROT -92	13/03/2019	Semana 11	GTC				7	S2 - 704 - 703	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	13/03/2019	
147	RONC	Ronc -147	14/03/2019	Semana 11	GTC				7	S3	Sala - Comedor	Estructura	Encofrado	Apuntalamiento inadecuado	Colocar apuntalamiento	Levantado	20/04/2019	
764	PROTOCOLO	PROT -93	14/03/2019	Semana 11	GTC				7	S3 - 701 - 702	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	14/03/2019	
765	PROTOCOLO	PROT -94	14/03/2019	Semana 11	GTC				7	S3 - 701 - 702	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	14/03/2019	
766	PROTOCOLO	PROT -95	14/03/2019	Semana 11	GTC				7	S3 - 701 - 702	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	14/03/2019	
148	RONC	Ronc -148	15/03/2019	Semana 11	GTC				7	S4	Baño 2	Estructura	Encofrado	Abultamiento en muro por falta de accesorio de sujecion	Pica, dejar a nivel de cara del muro, rellenar y solaquear	Levantado	20/04/2019	
149	RONC	Ronc -149	15/03/2019	Semana 11	GTC				7	S4	Dormitorio 1	Estructura	Acero de refuerzo	Minimo recubrimiento - Ausencia de recubrimiento	Rellenar y solaquear con mortero de contraccion compensada	Levantado	20/04/2019	
767	PROTOCOLO	PROT -96	15/03/2019	Semana 11	GTC				7	S4 - 707 - 708	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	15/03/2019	
768	PROTOCOLO	PROT -97	15/03/2019	Semana 11	GTC				7	S4 - 707 - 708	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	15/03/2019	
927	PROTOCOLO	PROT -256	15/03/2019	Semana 11	GTC				3	S3 - 301	Puerta	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	15/03/2019	
928	PROTOCOLO	PROT -257	15/03/2019	Semana 11	GTC				3	S2 - 304	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	15/03/2019	
769	PROTOCOLO	PROT -98	16/03/2019	Semana 11	GTC				8	S1 - 806 - 805	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	16/03/2019	
770	PROTOCOLO	PROT -99	16/03/2019	Semana 11	GTC				8	S1 - 806 - 805	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	16/03/2019	
929	PROTOCOLO	PROT -258	16/03/2019	Semana 12	GTC				3	S4 - 307	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	16/03/2019	
1007	PROTOCOLO	PROT -336	16/03/2019	Semana 11	GTC				2	S2 - 203	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	
1008	PROTOCOLO	PROT -337	16/03/2019	Semana 11	GTC				2	S1 - 205	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Discontinuidad	Perfilar bruña para dar acabado	Levantado	26/10/2019	
1009	PROTOCOLO	PROT -338	16/03/2019	Semana 11	GTC				2	S4 - 208	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
150	RONC	Ronc -150	18/03/2019	Semana 12	GTC				7	S3	cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro debajo de tablero electrico	Rellenar y solaquear con mortero de contraccion compensada	Levantado	20/04/2019	
771	PROTOCOLO	PROT -100	18/03/2019	Semana 12	GTC				8	S2 - 804 - 803	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	18/03/2019	
772	PROTOCOLO	PROT -101	18/03/2019	Semana 12	GTC				8	S2 - 804 - 803	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	18/03/2019	
773	PROTOCOLO	PROT -102	18/03/2019	Semana 12	GTC				8	S2 - 804 - 803	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	18/03/2019	
930	PROTOCOLO	PROT -259	18/03/2019	Semana 12	GTC				4	S3 - 401	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	18/03/2019	
931	PROTOCOLO	PROT -260	18/03/2019	Semana 12	GTC				4	S3 - 402	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	18/03/2019	
774	PROTOCOLO	PROT -103	19/03/2019	Semana 12	GTC				8	S3 - 801 - 802	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	19/03/2019	
775	PROTOCOLO	PROT -104	19/03/2019	Semana 12	GTC				8	S3 - 801 - 802	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	19/03/2019	
776	PROTOCOLO	PROT -105	19/03/2019	Semana 12	GTC				8	S3 - 801 - 802	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	19/03/2019	
1010	PROTOCOLO	PROT -339	19/03/2019	Semana 12	GTC				3	S2- 303	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
157	RONC	Ronc -157	20/03/2019	Semana 12	GTC	[redacted]			9	S3	Pasadizo	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en parte inferior del muro	Rellenar y solaquear con mortero de contraccion compensada	Levantado	20/04/2019	[redacted]
777	PROTOCOLO	PROT -106	20/03/2019	Semana 12	GTC				8	S4 - 807 - 808	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	20/03/2019	
778	PROTOCOLO	PROT -107	20/03/2019	Semana 12	GTC				8	S4 - 807 - 808	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	20/03/2019	
779	PROTOCOLO	PROT -108	20/03/2019	Semana 12	GTC				8	S4 - 807 - 808	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	20/03/2019	
932	PROTOCOLO	PROT -261	20/03/2019	Semana 12	GTC				4	S1 - 405	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	20/03/2019	
933	PROTOCOLO	PROT -262	20/03/2019	Semana 12	GTC				4	S4 - 407	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	20/03/2019	
158	RONC	Ronc -158	21/03/2019	Semana 12	GTC				9	S2	Baño 1	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en parte inferior del muro	Rellenar y solaquear con mortero de contraccion compensada	Levantado	20/04/2019	
161	RONC	Ronc -161	21/03/2019	Semana 12	GTC				8	_	Vestibulo previo	Arquitectura	Concreto postvaciado	Cangrejera	Rellenar y solaquear	Levantado	20/04/2019	
780	PROTOCOLO	PROT -109	21/03/2019	Semana 12	GTC				9	S1 - 906 - 905	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	21/03/2019	
781	PROTOCOLO	PROT -110	21/03/2019	Semana 12	GTC				9	S1 - 906 - 905	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	21/03/2019	
782	PROTOCOLO	PROT -111	22/03/2019	Semana 12	GTC				9	S2 - 904 - 903	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	22/03/2019	
783	PROTOCOLO	PROT -112	22/03/2019	Semana 12	GTC				9	S2 - 904 - 903	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	22/03/2019	
784	PROTOCOLO	PROT -113	22/03/2019	Semana 12	GTC				9	S2 - 904 - 903	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	22/03/2019	
785	PROTOCOLO	PROT -114	23/03/2019	Semana 12	GTC				9	S3 - 901 - 902	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	23/03/2019	
786	PROTOCOLO	PROT -115	23/03/2019	Semana 12	GTC				9	S3 - 901 - 902	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	23/03/2019	
787	PROTOCOLO	PROT -116	23/03/2019	Semana 12	GTC				9	S3 - 901 - 902	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	23/03/2019	
1011	PROTOCOLO	PROT -340	23/03/2019	Semana 12	GTC				3	S1 - 306	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	
788	PROTOCOLO	PROT -117	25/03/2019	Semana 13	GTC				9	S4 - 907- 908	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	25/03/2019	
789	PROTOCOLO	PROT -118	25/03/2019	Semana 13	GTC				9	S4 - 907- 908	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	25/03/2019	
790	PROTOCOLO	PROT -119	25/03/2019	Semana 13	GTC				9	S4 - 907- 908	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	25/03/2019	
791	PROTOCOLO	PROT -120	25/03/2019	Semana 13	GTC				9	S4 - 907- 908	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	25/03/2019	
164	RONC	Ronc -164	26/03/2019	Semana 13	GTC				12	S4	Dormitorio 2	Acabados	Reparacion de fisura	Escarchado manchado por el sellador para fisura	Despues de limpiar el area afectada se debe aplicar escarchado nuevamente	Levantado	4/04/2019	
165	RONC	Ronc -165	26/03/2019	Semana 13	GTC				19	S3	Cocina	Acabados	Drywall	Angulo esquinero exterior levantado	Cambiar seccion afectada	Levantado	2/04/2019	
792	PROTOCOLO	PROT -121	26/03/2019	Semana 13	GTC				10	S1 - 1006- 1005	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	26/03/2019	
793	PROTOCOLO	PROT -122	26/03/2019	Semana 13	GTC				10	S1 - 1006- 1005	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	26/03/2019	
794	PROTOCOLO	PROT -123	26/03/2019	Semana 13	GTC				10	S1 - 1006- 1005	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	26/03/2019	
1012	PROTOCOLO	PROT -341	26/03/2019	Semana 13	GTC				4	S3 - 402	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	
1013	PROTOCOLO	PROT -342	26/03/2019	Semana 13	GTC				4	S1 - 405	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	
168	RONC	Ronc -168	27/03/2019	Semana 13	GTC				2	Montante electrico	Pasadizo	Equipamiento	Equipamiento eléctrico	Empalme de cableado desde tablero de servicios generales a tablero de distribucion	Cambiar cableado electrico incompleto	Levantado	13/04/2019	
169	RONC	Ronc -169	27/03/2019	Semana 13	GTC				8	S4	Pasadizo	Acabados	INDECI	Sello cortafuego perforado	Aplicar mas material en la zona observada	Levantado	27/03/2019	
170	RONC	Ronc -170	27/03/2019	Semana 13	GTC				2	_	Vestibulo previo	Acabados	INDECI	Sello cortafuego - Instalacion no autorizada por O.T	Retirar el material despues de secar por una semana y colocar el requerido	Levantado	9/04/2019	
171	RONC	Ronc -171	27/03/2019	Semana 13	GTC				2	Montante electrico	Pasadizo	Equipamiento	Equipamiento eléctrico	Encauchetado de cableado electrico deguatado por rozamiento	Cambiar cableado electrico observado	Levantado	15/04/2019	
795	PROTOCOLO	PROT -124	27/03/2019	Semana 13	GTC				10	S2 - 1004- 1003	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	27/03/2019	
796	PROTOCOLO	PROT -125	27/03/2019	Semana 13	GTC				10	S2 - 1004- 1003	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	27/03/2019	
797	PROTOCOLO	PROT -126	27/03/2019	Semana 13	GTC				10	S2 - 1004- 1003	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	27/03/2019	
934	PROTOCOLO	PROT -263	27/03/2019	Semana 13	GTC				5	S2 - 503	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	27/03/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
798	PROTOCOLO	PROT -127	28/03/2019	Semana 13	GTC	[redacted]			10	S3 - 1002- 1001	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	28/03/2019	
799	PROTOCOLO	PROT -128	28/03/2019	Semana 13	GTC				10	S3 - 1002- 1001	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	28/03/2019	
800	PROTOCOLO	PROT -129	28/03/2019	Semana 13	GTC				10	S3 - 1002- 1001	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	28/03/2019	
1014	PROTOCOLO	PROT -343	28/03/2019	Semana 13	GTC				4	S4 - 408	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	
801	PROTOCOLO	PROT -130	29/03/2019	Semana 13	GTC				10	S4 - 1007- 1008	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	29/03/2019	
802	PROTOCOLO	PROT -131	29/03/2019	Semana 13	GTC				10	S4 - 1007- 1008	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	29/03/2019	
803	PROTOCOLO	PROT -132	29/03/2019	Semana 13	GTC				10	S4 - 1007- 1008	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	29/03/2019	
804	PROTOCOLO	PROT -133	29/03/2019	Semana 13	GTC				10	S4 - 1007- 1008	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	29/03/2019	
805	PROTOCOLO	PROT -134	30/03/2019	Semana 13	GTC				11	S1 - 1106 - 1105	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	30/03/2019	
806	PROTOCOLO	PROT -135	30/03/2019	Semana 13	GTC				11	S1 - 1106 - 1105	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	30/03/2019	
807	PROTOCOLO	PROT -136	30/03/2019	Semana 13	GTC				11	S1 - 1106 - 1105	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	30/03/2019	
935	PROTOCOLO	PROT -264	30/03/2019	Semana 13	GTC				5	S4 - 505	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	30/03/2019	
808	PROTOCOLO	PROT -137	1/04/2019	Semana 14	GTC				11	S2 - 1104 - 1103	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	1/04/2019	
809	PROTOCOLO	PROT -138	1/04/2019	Semana 14	GTC				11	S2 - 1104 - 1103	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	1/04/2019	
810	PROTOCOLO	PROT -139	1/04/2019	Semana 14	GTC				11	S2 - 1104 - 1103	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	1/04/2019	
811	PROTOCOLO	PROT -140	1/04/2019	Semana 14	GTC				11	S2 - 1104 - 1103	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	1/04/2019	
1015	PROTOCOLO	PROT -344	1/04/2019	Semana 14	GTC				5	S3 - 502	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Discontinuidad	Perfilar bruña para dar acabado	Levantado	26/10/2019	
1016	PROTOCOLO	PROT -345	1/04/2019	Semana 14	GTC				5	S1 - 505	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	
1017	PROTOCOLO	PROT -346	1/04/2019	Semana 14	GTC				6	S4 - 508	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Discontinuidad	Perfilar bruña para dar acabado	Levantado	26/10/2019	
174	RONC	Ronc -174	2/04/2019	Semana 14	GTC				_	Ingreso a torre	_	Arquitectura	Tabiqueria	Mal almacenamiento de material	Reubicacion	Levantado	10/04/2019	
175	RONC	Ronc -175	3/04/2019	Semana 14	GTC				11	S3 - 1107	Pasadizo	Estructura	Encofrado	Minimo recubrimiento - Ausencia de recubrimiento	Resanar y solaquear	Levantado	17/04/2019	
176	RONC	Ronc -176	3/04/2019	Semana 14	GTC				11	S3 - 1108	Pasadizo	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro compartido con alcoba principal	Resanar y solaquear	Levantado	26/04/2019	
177	RONC	Ronc -177	3/04/2019	Semana 14	GTC				11	S3 - 1107	Dormitorio 1	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro	Resanar y solaquear	Levantado	5/03/2019	
178	RONC	Ronc -178	3/04/2019	Semana 14	GTC				11	S4 - 1102	Baño 2	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro	Resanar y solaquear	Levantado	16/04/2019	
179	RONC	Ronc -179	3/04/2019	Semana 14	GTC				9	S4 - 902	Dormitorio 1	Estructura	Concreto postvaciado	Tuberia PVC SAP perforada durante la etapa de solaqueo	Reparar la tuberia, resanar y solaquear	Levantado	9/04/2019	
180	RONC	Ronc -180	3/04/2019	Semana 14	GTC				11	S2	Cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Burbujas en muro	Resanar y solaquear	Levantado	8/04/2019	
181	RONC	Ronc -181	3/04/2019	Semana 14	GTC				11	S3 - 1108	Cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro	Resanar y solaquear	Levantado	8/04/2019	
182	RONC	Ronc -182	3/04/2019	Semana 14	GTC				11	S2	Cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro divisorio de departamentos	Resanar y solaquear	Levantado	18/04/2019	
812	PROTOCOLO	PROT -141	3/04/2019	Semana 14	GTC				11	S3 - 1101 - 1102	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	3/04/2019	
813	PROTOCOLO	PROT -142	3/04/2019	Semana 14	GTC				11	S3 - 1101 - 1102	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	3/04/2019	
814	PROTOCOLO	PROT -143	3/04/2019	Semana 14	GTC				11	S3 - 1101 - 1102	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	3/04/2019	
936	PROTOCOLO	PROT -265	3/04/2019	Semana 14	GTC				6	S3 - 601	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	3/04/2019	
937	PROTOCOLO	PROT -266	3/04/2019	Semana 14	GTC				6	S2 - 604	Puerta	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	3/04/2019	
938	PROTOCOLO	PROT -267	3/04/2019	Semana 14	GTC				6	S4 - 607	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	3/04/2019	
183	RONC	Ronc -183	4/04/2019	Semana 14	GTC				11	S4 - 1102	Sala - Comedor	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro divisorio de baño y sala	Resanar y solaquear	Levantado	16/04/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
815	PROTOCOLO	PROT -144	4/04/2019	Semana 14	GTC	[redacted]			11	S4 - 1107 - 1108	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	4/04/2019	[redacted]
816	PROTOCOLO	PROT -145	4/04/2019	Semana 14	GTC				11	S4 - 1107 - 1108	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	4/04/2019	
817	PROTOCOLO	PROT -146	4/04/2019	Semana 14	GTC				11	S4 - 1107 - 1108	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	4/04/2019	
818	PROTOCOLO	PROT -147	5/04/2019	Semana 14	GTC				12	S1 - 1206 - 1206	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	4/04/2019	
819	PROTOCOLO	PROT -148	5/04/2019	Semana 14	GTC				12	S1 - 1206 - 1206	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	5/04/2019	
820	PROTOCOLO	PROT -149	5/04/2019	Semana 14	GTC				12	S1 - 1206 - 1206	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	5/04/2019	
821	PROTOCOLO	PROT -150	5/04/2019	Semana 14	GTC				12	S2 - 1206 - 1206	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	5/04/2019	
939	PROTOCOLO	PROT -268	5/04/2019	Semana 14	GTC				7	S3 - 701	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	5/04/2019	
940	PROTOCOLO	PROT -269	5/04/2019	Semana 14	GTC				7	S2 - 704	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	5/04/2019	
822	PROTOCOLO	PROT -151	6/04/2019	Semana 14	GTC				12	S2 - 1204 - 1203	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	6/04/2019	
823	PROTOCOLO	PROT -152	6/04/2019	Semana 14	GTC				12	S2 - 1204 - 1203	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	6/04/2019	
824	PROTOCOLO	PROT -153	6/04/2019	Semana 14	GTC				12	S2 - 1204 - 1203	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	6/04/2019	
1018	PROTOCOLO	PROT -347	6/04/2019	Semana 14	GTC				6	S3 - 602	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	
186	RONC	Ronc -186	8/04/2019	Semana 15	GTC				21 duplex complemento	S4 - 2101	Azotea	Acabados	Concreto postvaciado	Parapeto fisurado	Demolicion de seccion observada	Levantado	24/04/2019	
825	PROTOCOLO	PROT -154	8/04/2019	Semana 15	GTC				12	S3 - 1201 - 1202	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	8/04/2019	
826	PROTOCOLO	PROT -155	8/04/2019	Semana 15	GTC				12	S3 - 1201 - 1202	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	8/04/2019	
827	PROTOCOLO	PROT -156	8/04/2019	Semana 15	GTC				12	S3 - 1201 - 1202	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	8/04/2019	
187	RONC	Ronc -187	9/04/2019	Semana 15	GTC				12	S2 - 1206	Sala - Comedor	Estructura	Concreto postvaciado	Presencia de burbujas en el muro compartido	Resanar y solaquear	Levantado	12/04/2019	
188	RONC	Ronc -188	9/04/2019	Semana 15	GTC				12	S2 - 1205	Cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Presencia de burbujas en el muro	Resanar y solaquear	Levantado	12/04/2019	
189	RONC	Ronc -189	9/04/2019	Semana 15	GTC				10	S4 - 1001	Cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Protuberancia en vaciado de derrame de ingreso	Demoler sobresalido, resanar y solaquear	Levantado	11/04/2019	
828	PROTOCOLO	PROT -157	9/04/2019	Semana 15	GTC				12	S4 - 1207 - 1208	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	9/04/2019	
829	PROTOCOLO	PROT -158	9/04/2019	Semana 15	GTC				12	S4 - 1207 - 1208	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	9/04/2019	
830	PROTOCOLO	PROT -159	9/04/2019	Semana 15	GTC				12	S4 - 1207 - 1208	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	9/04/2019	
831	PROTOCOLO	PROT -160	9/04/2019	Semana 15	GTC				12	S4 - 1207 - 1208	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	9/04/2019	
832	PROTOCOLO	PROT -161	10/04/2019	Semana 15	GTC				13	S1 - 1306 - 1305	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	10/04/2019	
833	PROTOCOLO	PROT -162	10/04/2019	Semana 15	GTC				13	S1 - 1306 - 1305	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	10/04/2019	
834	PROTOCOLO	PROT -163	10/04/2019	Semana 15	GTC				13	S1 - 1306 - 1305	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	10/04/2019	
835	PROTOCOLO	PROT -164	10/04/2019	Semana 15	GTC				13	S1 - 1306 - 1305	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	10/04/2019	
941	PROTOCOLO	PROT -270	10/04/2019	Semana 15	GTC				8	S2 - 803	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	10/04/2019	
942	PROTOCOLO	PROT -271	10/04/2019	Semana 15	GTC				8	S1 - 806	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	10/04/2019	
1074	PROTOCOLO	PROT -403	10/04/2019	Semana 15	GTC				2	S2 - 204	Baño 2	Arquitectura	Enchape	Quiñe	retirar ceramico quiñado e istalar uno nuevo, dar acabado	Levantado	10/04/2019	
836	PROTOCOLO	PROT -165	11/04/2019	Semana 15	GTC				13	S2 - 1303 - 1304	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	11/04/2019	
837	PROTOCOLO	PROT -166	11/04/2019	Semana 15	GTC				13	S2 - 1303 - 1304	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	11/04/2019	
838	PROTOCOLO	PROT -167	11/04/2019	Semana 15	GTC				13	S2 - 1303 - 1304	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	11/04/2019	
839	PROTOCOLO	PROT -168	12/04/2019	Semana 15	GTC				13	S3 - 1301 - 1302	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	12/04/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA: [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
840	PROTOCOLO	PROT -169	12/04/2019	Semana 15	GTC	[redacted]			13	S3 - 1301 - 1302	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	12/04/2019	[redacted]
841	PROTOCOLO	PROT -170	12/04/2019	Semana 15	GTC				13	S3 - 1301 - 1302	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	12/04/2019	
842	PROTOCOLO	PROT -171	12/04/2019	Semana 15	GTC				13	S3 - 1301 - 1302	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	12/04/2019	
843	PROTOCOLO	PROT -172	13/04/2019	Semana 15	GTC				13	S4 - 1307 - 1308	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	13/04/2019	
844	PROTOCOLO	PROT -173	13/04/2019	Semana 15	GTC				13	S4 - 1307 - 1308	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	13/04/2019	
845	PROTOCOLO	PROT -174	13/04/2019	Semana 15	GTC				13	S4 - 1307 - 1308	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	13/04/2019	
846	PROTOCOLO	PROT -175	15/04/2019	Semana 16	GTC				14	S1 - 1406 - 1405	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	15/04/2019	
847	PROTOCOLO	PROT -176	15/04/2019	Semana 16	GTC				14	S1 - 1406 - 1405	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	15/04/2019	
848	PROTOCOLO	PROT -177	15/04/2019	Semana 16	GTC				14	S1 - 1406 - 1405	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	15/04/2019	
943	PROTOCOLO	PROT -272	15/04/2019	Semana 16	GTC				9	S1 - 901	Puerta	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	15/04/2019	
944	PROTOCOLO	PROT -273	15/04/2019	Semana 16	GTC				9	S2- 903	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	15/04/2019	
945	PROTOCOLO	PROT -274	15/04/2019	Semana 16	GTC				9	S1- 905	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	15/04/2019	
1075	PROTOCOLO	PROT -404	15/04/2019	Semana 16	GTC				3	S3 - 302	Baño 2	Arquitectura	Enchape	Fisura	Retirar ceramico roto e instalar uno nuevo	Levantado	15/04/2019	
199	RONC	Ronc -199	16/04/2019	Semana 16	GTC				14	S3 - 1407	Mampara en sala y ventana en cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Mal vaciado de alfeizares	Encofrar y vaciar secciones faltantes para lograr el derrame	Levantado	22/04/2019	
849	PROTOCOLO	PROT -178	16/04/2019	Semana 16	GTC				14	S2 - 1404 - 1403	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	16/04/2019	
850	PROTOCOLO	PROT -179	16/04/2019	Semana 16	GTC				14	S2 - 1404 - 1403	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	16/04/2019	
946	PROTOCOLO	PROT -275	16/04/2019	Semana 16	GTC				9	S4- 907	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	16/04/2019	
851	PROTOCOLO	PROT -180	17/04/2019	Semana 16	GTC				14	S3 - 1401 - 1402	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	17/04/2019	
852	PROTOCOLO	PROT -181	17/04/2019	Semana 16	GTC				14	S3 - 1401 - 1402	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	17/04/2019	
947	PROTOCOLO	PROT -276	17/04/2019	Semana 16	GTC				10	S2 - 1003	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	16/04/2019	
202	RONC	Ronc -202	18/04/2019	Semana 16	GTC				14	S4 - 1401	Dormitorio 1	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en parte inferior del muro cerca a la ventana	Resanar y solaquear	Levantado	29/04/2019	
203	RONC	Ronc -203	18/04/2019	Semana 16	GTC				14	S4 - 1401	Muro divisorio entre sala y baño de visita	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en parte inferior esquinera del muro	Resanar y solaquear	Levantado	29/04/2019	
204	RONC	Ronc -204	18/04/2019	Semana 16	GTC				14	S4 - 1401	Muro de cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Presencia de burbujas	Resanar y solaquear	Levantado	29/04/2019	
205	RONC	Ronc -205	18/04/2019	Semana 16	GTC				14	S4 - 1402	Dormitorio 2	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en vertice de alfeizar y derrame vertical	Resanar y solaquear	Levantado	29/04/2019	
206	RONC	Ronc -206	18/04/2019	Semana 16	GTC				14	S1 - 1403	Dormitorio 2	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro	Resanar y solaquear	Levantado	29/04/2019	
853	PROTOCOLO	PROT -182	18/04/2019	Semana 16	GTC				14	S4 - 1407 - 1408	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	18/04/2019	
854	PROTOCOLO	PROT -183	18/04/2019	Semana 16	GTC				14	S4 - 1407 - 1408	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	18/04/2019	
855	PROTOCOLO	PROT -184	18/04/2019	Semana 16	GTC				14	S4 - 1407 - 1408	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	18/04/2019	
207	RONC	Ronc -207	22/04/2019	Semana 17	GTC				2	S1 - 203	Pasadizo	Acabados	Entubado PVC SAP	Perforacion de tuberia PEALPE	Picar alrededor de la tuberia PEALPE y cambiar la seccion afectada. Realizar la prueba de hermeticidad de previo de gas	Levantado	26/04/2019	
856	PROTOCOLO	PROT -185	22/04/2019	Semana 17	GTC				15	S1 - 1506 - 1505	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	22/04/2019	
857	PROTOCOLO	PROT -186	22/04/2019	Semana 17	GTC				15	S1 - 1506 - 1505	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	22/04/2019	
208	RONC	Ronc -208	23/04/2019	Semana 17	GTC				6	S1 - 604	Baño 2	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en poyo para desagüe	Resanar y solaquear	Levantado	29/04/2019	
209	RONC	Ronc -209	23/04/2019	Semana 17	GTC				15	S2 - 1506	Dormitorio 1	Estructura	Concreto postvaciado	Presencia de burbujas en paredes	Resanar y solaquear	Levantado	30/04/2019	
211	RONC	Ronc -211	23/04/2019	Semana 17	GTC				15	S2 - 1506	Dormitorio 2	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro de ventana	Resanar y solaquear	Levantado	30/04/2019	
212	RONC	Ronc -212	23/04/2019	Semana 17	GTC				20	S3 - 2008	Escalera duplex	Acabados	Baranda Metálica	Escarchado manchado cerca a la transicion hacia la escalera	Corregir el escarchado en el area afectada	Levantado	29/06/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
858	PROTOCOLO	PROT -187	23/04/2019	Semana 17	GTC	[redacted]			15	S2 - 1504 - 1503	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	23/04/2019	
859	PROTOCOLO	PROT -188	23/04/2019	Semana 17	GTC				15	S2 - 1504 - 1503	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	23/04/2019	
860	PROTOCOLO	PROT -189	23/04/2019	Semana 17	GTC				15	S2 - 1504 - 1503	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	23/04/2019	
861	PROTOCOLO	PROT -190	23/04/2019	Semana 17	GTC				15	S2 - 1504 - 1503	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	23/04/2019	
948	PROTOCOLO	PROT -277	23/04/2019	Semana 16	GTC				10	S1 - 1005	Puerta	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	23/04/2019	
949	PROTOCOLO	PROT -278	23/04/2019	Semana 16	GTC				10	S4 - 1007	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	23/04/2019	
1019	PROTOCOLO	PROT -348	23/04/2019	Semana 17	GTC				6	S1 - 606	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	
214	RONC	Ronc -214	24/04/2019	Semana 17	GTC				15	S3 - 1508	Ingreso a cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro	Resanar y solaquear	Levantado	25/04/2019	
215	RONC	Ronc -215	24/04/2019	Semana 17	GTC				15	S3 - 1507	Sala	Estructura	Concreto postvaciado	Presencia de burbujas	Resanar y solaquear	Levantado	27/04/2019	
862	PROTOCOLO	PROT -191	24/04/2019	Semana 17	GTC				15	S3 - 1501 - 1502	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	24/04/2019	
863	PROTOCOLO	PROT -192	24/04/2019	Semana 17	GTC				15	S3 - 1501 - 1502	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	24/04/2019	
219	RONC	Ronc -219	25/04/2019	Semana 17	GTC				15	Sector 4	-	Estructura	Concreto premezclado	Concreto con 4" de asentamiento menor a +/- 1.5"	Devolucion de la unidad mezcladora	Levantado	25/04/2019	
864	PROTOCOLO	PROT -193	25/04/2019	Semana 17	GTC				15	S4- 1507 - 1508	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	25/04/2019	
865	PROTOCOLO	PROT -194	25/04/2019	Semana 17	GTC				15	S4- 1507 - 1508	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	25/04/2019	
866	PROTOCOLO	PROT -195	25/04/2019	Semana 17	GTC				15	S4- 1507 - 1508	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	25/04/2019	
1020	PROTOCOLO	PROT -349	25/04/2019	Semana 17	GTC				7	S2 - 704	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1021	PROTOCOLO	PROT -350	25/04/2019	Semana 17	GTC				7	S4 - 707	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	
867	PROTOCOLO	PROT -196	26/04/2019	Semana 17	GTC				16	S1- 1606 - 1605	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	26/04/2019	
868	PROTOCOLO	PROT -197	27/04/2019	Semana 17	GTC				16	S2- 1604 - 1603	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	27/04/2019	
869	PROTOCOLO	PROT -198	27/04/2019	Semana 17	GTC				16	S2- 1604 - 1603	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	27/04/2019	
870	PROTOCOLO	PROT -199	27/04/2019	Semana 17	GTC				16	S2- 1604 - 1603	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	27/04/2019	
950	PROTOCOLO	PROT -279	27/04/2019	Semana 17	GTC				11	S3 - 1101	Puerta	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	27/04/2019	
951	PROTOCOLO	PROT -280	27/04/2019	Semana 17	GTC				11	S2 - 1103	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	27/04/2019	
952	PROTOCOLO	PROT -281	27/04/2019	Semana 17	GTC				11	S4 - 1108	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	27/04/2019	
223	RONC	Ronc -223	29/04/2019	Semana 18	GTC				16	S2 - 1606	Dormitorio 2	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro	Resanar y solaquear	Levantado	6/05/2019	
871	PROTOCOLO	PROT -200	29/04/2019	Semana 18	GTC				16	S3- 1601 - 1602	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	29/04/2019	
872	PROTOCOLO	PROT -201	29/04/2019	Semana 18	GTC				16	S3- 1601 - 1602	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	29/04/2019	
873	PROTOCOLO	PROT -202	29/04/2019	Semana 18	GTC				16	S3- 1601 - 1602	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	29/04/2019	
1022	PROTOCOLO	PROT -351	29/04/2019	Semana 18	GTC				8	S3 - 801	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano de puerta para alinear	Levantado	26/10/2019	
1023	PROTOCOLO	PROT -352	29/04/2019	Semana 18	GTC				8	S1 - 806	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear y alinear muro	Levantado	26/10/2019	
874	PROTOCOLO	PROT -203	30/04/2019	Semana 18	GTC				16	S4- 1607 - 1608	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	30/04/2019	
875	PROTOCOLO	PROT -204	30/04/2019	Semana 18	GTC				16	S4- 1607 - 1608	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	30/04/2019	
225	RONC	Ronc -225	2/05/2019	Semana 18	GTC				17	S1 - 1703	Sala	Estructura	Concreto postvaciado	Mal llenado de alfeizar de ventana	Encofrar y vaciar lo faltante para lograr el derrame	Levantado	6/05/2019	
226	RONC	Ronc -226	2/05/2019	Semana 18	GTC				17	S2 - 1705	Cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro	Resanar y solaquear	Levantado	7/05/2019	
876	PROTOCOLO	PROT -205	2/05/2019	Semana 18	GTC				17	S1- 1706 - 1705	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	2/05/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
877	PROTOCOLO	PROT -206	2/05/2019	Semana 18	GTC	[redacted]			17	S1- 1706 - 1705	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	2/05/2019	
227	RONC	Ronc -227	3/05/2019	Semana 18	GTC				16	S2 Y S3	Montante gas y agua	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro	Resanar y solaquear	Levantado	6/05/2019	
878	PROTOCOLO	PROT -207	3/05/2019	Semana 18	GTC				17	S2- 1704 - 1703	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	3/05/2019	
953	PROTOCOLO	PROT -282	3/05/2019	Semana 18	GTC				12	S3 - 1202	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	3/05/2019	
954	PROTOCOLO	PROT -283	3/05/2019	Semana 18	GTC				12	S2 - 1204	Puerta	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	3/05/2019	
1024	PROTOCOLO	PROT -353	3/05/2019	Semana 18	GTC				9	S2 - 904	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	
230	RONC	Ronc -230	6/05/2019	Semana 19	GTC				Cimentacion	_	Area de bombas	Estructura	Acero de refuerzo	No hay recubrimiento entre el acero de refuerzo y la excavacion que contendran al concreto vaciado	Colocar separadores de concreto para garantizar el recubrimiento	Levantado	6/05/2019	
880	PROTOCOLO	PROT -209	6/05/2019	Semana 19	GTC				17	S3- 1701 - 1702	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	6/05/2019	
881	PROTOCOLO	PROT -210	6/05/2019	Semana 19	GTC				17	S3- 1701 - 1702	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	6/05/2019	
231	RONC	Ronc -231	7/05/2019	Semana 19	GTC				17	S4 - 1701	Dormitorio 2	Arquitectura	Concreto postvaciado	Presencia de burbujas	Resanar y solaquear	Levantado	8/05/2019	
232	RONC	Ronc -232	7/05/2019	Semana 19	GTC				18	S4 - 1802	Baño 2	Arquitectura	Concreto postvaciado	Cangrejera	Colocar puente de adherencia, resanar y solaquear	Levantado	8/05/2019	
882	PROTOCOLO	PROT -211	7/05/2019	Semana 19	GTC				17	S4- 1707 - 1708	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	7/05/2019	
883	PROTOCOLO	PROT -212	7/05/2019	Semana 19	GTC				17	S4- 1707 - 1708	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	7/05/2019	
884	PROTOCOLO	PROT -213	7/05/2019	Semana 19	GTC				17	S4- 1707 - 1708	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	7/05/2019	
1076	PROTOCOLO	PROT -405	7/05/2019	Semana 19	GTC				6	S4 - 607	Baño 2	Arquitectura	Enchape	Material defectuoso	Cambiar ceramico con tono inadecuado	Levantado	7/05/2019	
885	PROTOCOLO	PROT -214	8/05/2019	Semana 19	GTC				18	S1- 1806 - 1705	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	8/05/2019	
886	PROTOCOLO	PROT -215	8/05/2019	Semana 19	GTC				18	S1- 1806 - 1705	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	8/05/2019	
233	RONC	Ronc -233	9/05/2019	Semana 19	GTC				17	S4 - 1701	Losa	Acabados	Escarchado	Ondulaciones	Rasquetear las ondulaciones, rellenar y volver a escarchar	Levantado	13/05/2019	
234	RONC	Ronc -234	9/05/2019	Semana 19	GTC				18	S1 - 1803	Sala	Arquitectura	Concreto postvaciado	Mal llenado de alfeizar de ventana	Encofrar y vaciar lo faltante para lograr el derrame	Levantado	10/05/2019	
887	PROTOCOLO	PROT -216	9/05/2019	Semana 19	GTC				18	S2- 1804 - 1703	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	9/05/2019	
888	PROTOCOLO	PROT -217	9/05/2019	Semana 19	GTC				18	S2- 1804 - 1703	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Cangrejeras	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	9/05/2019	
889	PROTOCOLO	PROT -218	9/05/2019	Semana 19	GTC				18	S2- 1804 - 1703	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	9/05/2019	
890	PROTOCOLO	PROT -219	9/05/2019	Semana 19	GTC				18	S2- 1804 - 1703	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	9/05/2019	
955	PROTOCOLO	PROT -284	9/05/2019	Semana 19	GTC				13	S3 - 1301	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	9/05/2019	
956	PROTOCOLO	PROT -285	9/05/2019	Semana 19	GTC				13	S2 - 1303	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	9/05/2019	
957	PROTOCOLO	PROT -286	9/05/2019	Semana 19	GTC				13	S4 - 1307	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	9/05/2019	
891	PROTOCOLO	PROT -220	10/05/2019	Semana 19	GTC				18	S3- 1802 - 1701	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	10/05/2019	
892	PROTOCOLO	PROT -221	10/05/2019	Semana 19	GTC				18	S3- 1802 - 1701	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	10/05/2019	
893	PROTOCOLO	PROT -222	11/05/2019	Semana 19	GTC				18	S4- 1807 - 1808	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	11/05/2019	
894	PROTOCOLO	PROT -223	11/05/2019	Semana 19	GTC				18	S4- 1807 - 1808	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	11/05/2019	
895	PROTOCOLO	PROT -224	11/05/2019	Semana 19	GTC				18	S4- 1807 - 1808	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	11/05/2019	
235	RONC	Ronc -235	13/05/2019	Semana 20	GTC				10	S2 - 1006	Ingreso al departamento	Arquitectura	Entubado de polipropileno	Tubería PEALPE gas perforada	Cambiar sección afectada y revisar hermeticidad en prueba postvaciado	Levantado	18/05/2019	
236	RONC	Ronc -236	13/05/2019	Semana 20	GTC				19	S1 - 1904	Cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro	Resanar y solaquear	Levantado	17/05/2019	
237	RONC	Ronc -237	13/05/2019	Semana 20	GTC				14	S4 - 1401	Pasadizo	Equipamiento	IIEE - C.A.C.I	Caja octogonal metalica en la losa sin perforación para sujecion de D.H	Hacer perforación para sujetar el dispositivo	Levantado	17/05/2019	
896	PROTOCOLO	PROT -225	13/05/2019	Semana 20	GTC				19	S1- 1906 - 1905	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	14/05/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
897	PROTOCOLO	PROT -226	13/05/2019	Semana 20	GTC	[redacted]			19	S1- 1906 - 1905	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	14/05/2019	
898	PROTOCOLO	PROT -227	13/05/2019	Semana 20	GTC				19	S1- 1906 - 1905	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	14/05/2019	
238	RONC	Ronc -238	14/05/2019	Semana 20	GTC				11	S4 - 1102	Dormitorio 1	Arquitectura	Solaqueo y derrame	No se resanó el área afectada durante la partida	Resanar y solaquear	Levantado	17/05/2019	
958	PROTOCOLO	PROT -287	14/05/2019	Semana 20	GTC				14	S1 - 1406	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	14/05/2019	
959	PROTOCOLO	PROT -288	14/05/2019	Semana 20	GTC				14	S4 - 1407	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	14/05/2019	
960	PROTOCOLO	PROT -289	14/05/2019	Semana 20	GTC				14	S4 - 1407	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	14/05/2019	
961	PROTOCOLO	PROT -290	14/05/2019	Semana 20	GTC				14	S4 - 1408	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	14/05/2019	
962	PROTOCOLO	PROT -291	14/05/2019	Semana 20	GTC				14	S4 - 1408	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	14/05/2019	
1025	PROTOCOLO	PROT -354	14/05/2019	Semana 20	GTC				10	S3 - 1001	Sala	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear y alinear muro	Levantado	26/10/2019	
1026	PROTOCOLO	PROT -355	14/05/2019	Semana 20	GTC				10	S4 - 1008	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Perfilar bruña para dar acabado	Levantado	26/10/2019	
1080	PROTOCOLO	PROT -409	14/05/2019	Semana 20	GTC				7	S1 - 706	Baño 2	Arquitectura	Enchape	Falla en instalación	Aplicar pegamento en todo el ceramico	Levantado	18/05/2019	
239	RONC	Ronc -239	15/05/2019	Semana 20	GTC				19	S3 - 1908	Sala - Cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Segregación	Resanar y solaquear	Levantado	15/05/2019	
240	RONC	Ronc -240	15/05/2019	Semana 20	GTC				19	S2 - 1906	Cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Cangrejera en muro	Resanar y solaquear	Levantado	15/05/2019	
241	RONC	Ronc -241	15/05/2019	Semana 20	GTC				7	S1 - 704	Ingreso al departamento	Arquitectura	Concreto postvaciado	Tubería PEALPE gas perforada	Cambiar sección afectada y reviisar hermeticidad en prueba postvaciado	Levantado	18/05/2019	
899	PROTOCOLO	PROT -228	15/05/2019	Semana 20	GTC				19	S2- 1904 - 1903	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	15/05/2019	
900	PROTOCOLO	PROT -229	15/05/2019	Semana 20	GTC				19	S3- 1904 - 1902	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	15/05/2019	
963	PROTOCOLO	PROT -292	15/05/2019	Semana 20	GTC				15	S3 - 1502	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	15/05/2019	
964	PROTOCOLO	PROT -293	15/05/2019	Semana 20	GTC				15	S2 - 1503	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	15/05/2019	
965	PROTOCOLO	PROT -294	15/05/2019	Semana 20	GTC				15	S2 - 1504	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	15/05/2019	
966	PROTOCOLO	PROT -295	15/05/2019	Semana 20	GTC				15	S1 - 1505	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	15/05/2019	
1027	PROTOCOLO	PROT -356	15/05/2019	Semana 20	GTC				11	S3 - 1101	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1028	PROTOCOLO	PROT -357	15/05/2019	Semana 20	GTC				11	S3 - 1101	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Dimensión incorrecta	dar medida a vano	Levantado	26/10/2019	
1029	PROTOCOLO	PROT -358	15/05/2019	Semana 20	GTC				11	S3 - 1102	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1030	PROTOCOLO	PROT -359	15/05/2019	Semana 20	GTC				11	S2 - 1103	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1031	PROTOCOLO	PROT -360	15/05/2019	Semana 20	GTC				11	S2 - 1104	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1032	PROTOCOLO	PROT -361	15/05/2019	Semana 20	GTC				11	S1 - 1106	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1033	PROTOCOLO	PROT -362	15/05/2019	Semana 20	GTC				11	S4 - 1107	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1034	PROTOCOLO	PROT -363	15/05/2019	Semana 20	GTC				11	S4 - 1108	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1035	PROTOCOLO	PROT -364	15/05/2019	Semana 20	GTC				11	S4 - 1108	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1036	PROTOCOLO	PROT -365	15/05/2019	Semana 20	GTC				11	S3 - 11101	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1077	PROTOCOLO	PROT -406	15/05/2019	Semana 20	GTC				7	S3 - 701	Baño 2	Arquitectura	Enchape	Material defectuoso	Cambiar ceramico con tono inadecuado	Levantado	16/05/2019	
1078	PROTOCOLO	PROT -407	15/05/2019	Semana 20	GTC				7	S3 - 702	Cocina	Arquitectura	Enchape	Desplome	etirar Piezas desplomadas y volver a instalar nuevas aplomad	Levantado	16/05/2019	
1079	PROTOCOLO	PROT -408	15/05/2019	Semana 20	GTC				7	S2 - 703	Cocina	Arquitectura	Enchape	Quiñe	retirar ceramico quiñado e istalar uno nuevo, dar acabado	Levantado	16/05/2019	
242	RONC	Ronc -242	16/05/2019	Semana 20	GTC				19	S4 - 1902	Cocina	Estructura	Concreto postvaciado	Mal llenado de alfeizar de ventana	Encofrar y vaciar lo faltante para lograr el derrame	Levantado	17/05/2019	
901	PROTOCOLO	PROT -230	16/05/2019	Semana 20	GTC				19	S3- 1907 - 1908	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	16/05/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
967	PROTOCOLO	PROT -296	16/05/2019	Semana 20	GTC	[redacted]			15	S1 - 1506	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	16/05/2019	[redacted]
1037	PROTOCOLO	PROT -366	16/05/2019	Semana 20	GTC				12	S3 - 1202	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1038	PROTOCOLO	PROT -367	16/05/2019	Semana 20	GTC				12	S2 - 1204	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1039	PROTOCOLO	PROT -368	16/05/2019	Semana 20	GTC				12	S1 - 1205	Baño 1 - Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1040	PROTOCOLO	PROT -369	16/05/2019	Semana 20	GTC				12	S1 - 1206	Baño 1 - Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1041	PROTOCOLO	PROT -370	16/05/2019	Semana 20	GTC				12	S4 - 1208	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1042	PROTOCOLO	PROT -371	16/05/2019	Semana 20	GTC				12	S4 - 1208	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
902	PROTOCOLO	PROT -231	17/05/2019	Semana 20	GTC				20	S1- 2006 - 2005	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	17/05/2019	
968	PROTOCOLO	PROT -297	17/05/2019	Semana 20	GTC				15	S4 - 1507	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	17/05/2019	
969	PROTOCOLO	PROT -298	17/05/2019	Semana 20	GTC				15	S4 - 1507	Techo	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	17/05/2019	
245	RONC	Ronc -245	20/05/2019	Semana 21	GTC				1	Vestíbulo previo	Ingreso	Equipamiento	Sistema alarma contra incendio	Punto para estacion manual de emergencia sin destapar	Descubrir punto	Levantado	23/05/2019	
246	RONC	Ronc -246	20/05/2019	Semana 21	GTC				2	S3 - 208	Sala	Acabados	Papel mural	Mal empalme en unión de papel	Mejorar empalmes de papel	Levantado	22/05/2019	
247	RONC	Ronc -247	20/05/2019	Semana 21	GTC				5	S1 - 504	Baño 1	Acabados	Enchape	Mala instalaciòn de fragua (fisuras)	Corregir instalación de fragua. Usar dosificación adecuada	Levantado	23/05/2019	
903	PROTOCOLO	PROT -232	20/05/2019	Semana 21	GTC				20	S2- 2004 - 2003	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	20/05/2019	
249	RONC	Ronc -249	21/05/2019	Semana 21	GTC				15	Vestíbulo previo	Escalera de emergencia	Arquitectura	Acabados	Sello cortafuego	Sello perforado por punzonqamiento	Levantado	23/05/2019	
904	PROTOCOLO	PROT -233	21/05/2019	Semana 21	GTC				20	S3- 2001 - 2002	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar area de trabajo	Levantado	21/05/2019	
905	PROTOCOLO	PROT -234	21/05/2019	Semana 21	GTC				20	S3- 2001 - 2002	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	21/05/2019	
906	PROTOCOLO	PROT -235	21/05/2019	Semana 21	GTC				20	S3- 2001 - 2002	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	21/05/2019	
907	PROTOCOLO	PROT -236	22/05/2019	Semana 21	GTC				20	S4- 2007 - 2008	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	22/05/2019	
970	PROTOCOLO	PROT -299	22/05/2019	Semana 21	GTC				16	S3 - 1601	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	20/06/2019	
1081	PROTOCOLO	PROT -410	22/05/2019	Semana 21	GTC				7	S4 - 708	Cocina	Arquitectura	Enchape	Quiñe	retirar ceramico quiñado e istalar uno nuevo, dar acabado	Levantado	20/06/2019	
908	PROTOCOLO	PROT -237	23/05/2019	Semana 21	GTC				21	S1 - S4	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	22/05/2019	
909	PROTOCOLO	PROT -238	23/05/2019	Semana 21	GTC				21	S1 - S4	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	22/05/2019	
910	PROTOCOLO	PROT -239	24/05/2019	Semana 21	GTC				21	S2 - S3	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	24/05/2019	
911	PROTOCOLO	PROT -240	24/05/2019	Semana 21	GTC				21	S2 - S3	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar . Limpiar, rellenar con tarrajeo y solaquear	Levantado	24/05/2019	
1043	PROTOCOLO	PROT -372	24/05/2019	Semana 21	GTC				13	S3 - 1302	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1044	PROTOCOLO	PROT -373	24/05/2019	Semana 21	GTC				13	S1 - 1305	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Alinear derrame de puerta	Levantado	26/10/2019	
1045	PROTOCOLO	PROT -374	24/05/2019	Semana 21	GTC				13	S1 - 1305	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar continuidad a bruña	Levantado	26/10/2019	
1046	PROTOCOLO	PROT -375	24/05/2019	Semana 21	GTC				13	S4 - 1307	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1047	PROTOCOLO	PROT -376	25/05/2019	Semana 21	GTC				14	S3 - 1401	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1048	PROTOCOLO	PROT -377	25/05/2019	Semana 21	GTC				14	S2 - 1403	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1049	PROTOCOLO	PROT -378	25/05/2019	Semana 21	GTC				14	S1 - 1407	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Alinear derrame de puerta	Levantado	26/10/2019	
1050	PROTOCOLO	PROT -379	25/05/2019	Semana 21	GTC				14	S1 - 1407	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	
257	RONC	Ronc -257	27/05/2019	Semana 22	GTC				9	S1 - 903	Cocina	Arquitectura	Entubado PEALPE	Llave de paso de gas esta rota por golpe	Cambio de accesorio	Levantado	28/05/2019	
258	RONC	Ronc -258	27/05/2019	Semana 22	GTC				2	S4 - 201	Baño 2	Arquitectura	Entubado PVC SAP	Tuberia IIEE perforada por tarugo de inodoro	Colocar parche para sellar tubería	Levantado	29/05/2019	
259	RONC	Ronc -259	27/05/2019	Semana 22	GTC				19	S3 - 1908	Sala	Arquitectura	Concreto postvaciado	Burbujas en placa	Resanar con mortero	Levantado	27/05/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
260	RONC	Ronc -260	27/05/2019	Semana 22	GTC	[redacted]			19	S1 - 1903	Dormitorio 1	Arquitectura	Concreto postvaciado	Segregación	Resanar y solaquear	Levantado	27/05/2019	
977	PROTOCOLO	PROT -306	28/05/2019	Semana 22	GTC				17	S3 - 1701	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	28/06/2019	
978	PROTOCOLO	PROT -307	28/05/2019	Semana 22	GTC				17	S1 - 1705	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	28/06/2019	
979	PROTOCOLO	PROT -308	28/05/2019	Semana 22	GTC				17	S1 - 1706	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	28/06/2019	
980	PROTOCOLO	PROT -309	28/05/2019	Semana 22	GTC				17	S1 - 1706	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	28/06/2019	
981	PROTOCOLO	PROT -310	28/05/2019	Semana 22	GTC				17	S1 - 1706	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	28/06/2019	
982	PROTOCOLO	PROT -311	28/05/2019	Semana 22	GTC				17	S1 - 1708	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	28/06/2019	
983	PROTOCOLO	PROT -312	28/05/2019	Semana 22	GTC				17	S1 - 1708	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	28/06/2019	
1051	PROTOCOLO	PROT -380	28/05/2019	Semana 22	GTC				15	S3 - 1501	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1052	PROTOCOLO	PROT -381	28/05/2019	Semana 22	GTC				15	S2 - 1503	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1053	PROTOCOLO	PROT -382	28/05/2019	Semana 22	GTC				15	S2 - 1504	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1054	PROTOCOLO	PROT -383	28/05/2019	Semana 22	GTC				15	S1 - 1505	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1055	PROTOCOLO	PROT -384	28/05/2019	Semana 22	GTC				15	S1 - 1506	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1056	PROTOCOLO	PROT -385	28/05/2019	Semana 22	GTC				15	S4 - 1507	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1057	PROTOCOLO	PROT -386	28/05/2019	Semana 22	GTC				15	S4 - 1508	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
971	PROTOCOLO	PROT -300	29/05/2019	Semana 22	GTC				16	S3 - 1602	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	28/06/2019	
972	PROTOCOLO	PROT -301	29/05/2019	Semana 22	GTC				16	S3 - 1602	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	28/06/2019	
973	PROTOCOLO	PROT -302	29/05/2019	Semana 22	GTC				16	S3 - 1602	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	28/06/2019	
974	PROTOCOLO	PROT -303	29/05/2019	Semana 22	GTC				16	S2 - 1603	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	28/06/2019	
975	PROTOCOLO	PROT -304	29/05/2019	Semana 22	GTC				16	S2 - 1604	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	28/06/2019	
976	PROTOCOLO	PROT -305	29/05/2019	Semana 22	GTC				16	S1 - 1606	Puerta	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	28/06/2019	
267	RONC	Ronc -267	5/06/2019	Semana 23	GTC				20	S1 - 2001, 2002	Escalera duplex	Estructura	Acero de refuerzo	Mal espaciamiento de acero	Corregir espaciamiento según plano	Levantado	6/06/2019	
268	RONC	Ronc -268	5/06/2019	Semana 23	GTC				12 , 13	S1, S2, S3 Y S4	Baño 1	Arquitectura	Concreto postvaciado	Poyos en baños sin anclaje	Volver a vaciar poyos con su respectivo anclaje	Levantado	10/06/2019	
269	RONC	Ronc -269	5/06/2019	Semana 23	GTC				20	S3 - 2007	Sala	Arquitectura	Concreto postvaciado	Sobrecarga en losa por almacenamiento de material	Mover material o dividir peso en diferentes areas	Levantado	6/06/2019	
270	RONC	Ronc -270	5/06/2019	Semana 23	GTC				3	S2 - 305	Cocina	Acabados	Pintura Interior	Presencia de gotas y mal lijado en acbado pintura	Lijar correctamente zonas afectadas	Levantado	7/06/2019	
280	RONC	Ronc -280	10/06/2019	Semana 24	GTC				2 y 3	S1 y S2	Ingreso Dpto	Acabados	Puertas y/o Marcos	Mal corte de hoja de puerta	Corregir medidas y mejorar corte Cambiar puertas mal cortadas	Levantado	15/06/2019	
281	RONC	Ronc -281	10/06/2019	Semana 24	GTC				2,3,4,5	-	Pasadizo AC	Arquitectura	Concreto postvaciado	Mala dosificación de mezcla para vaciado de pasadizos	Se capacitó al personal sobre dosificación para mezcla de vaciado	Levantado	12/06/2019	
282	RONC	Ronc -282	10/06/2019	Semana 24	GTC				2 y 3	S1, S2, S3 Y S4	-	Acabados	Puertas y/o Marcos	Pintura en puerta presenta vetas	Mejorar acabado de pintura	Levantado	17/06/2019	
283	RONC	Ronc -283	12/06/2019	Semana 24	GTC				2	S2 Y S3	Sala y dormitorio 1	Acabados	Papel mural	Grumos bajo papel	Lijar grumos de empaste y pegar papel	Levantado	14/06/2019	
1082	PROTOCOLO	PROT -411	12/06/2019	Semana 24	GTC				8	S4 - 808	Baño 1	Arquitectura	Enchape	Quiñe	retirar ceramico quiñado e istalar uno nuevo, dar acabado	Levantado	12/06/2019	
984	PROTOCOLO	PROT -313	14/06/2019	Semana 24	GTC				18	S3 - 1801	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	28/06/2019	
985	PROTOCOLO	PROT -314	14/06/2019	Semana 24	GTC				18	S3 - 1801	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	28/06/2019	
986	PROTOCOLO	PROT -315	14/06/2019	Semana 24	GTC				18	S2 - 1804	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	28/06/2019	
987	PROTOCOLO	PROT -316	14/06/2019	Semana 24	GTC				18	S1 - 1806	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	28/06/2019	
1058	PROTOCOLO	PROT -387	14/06/2019	Semana 24	GTC				16	S2 - 1603	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear y alinear muro	Levantado	26/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1059	PROTOCOLO	PROT -388	14/06/2019	Semana 24	GTC	[redacted]			16	S2 - 1603	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	[redacted]
1060	PROTOCOLO	PROT -389	14/06/2019	Semana 24	GTC				16	S1 - 1605	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desalineamiento	Solaquear vano para alinear	Levantado	26/10/2019	
1061	PROTOCOLO	PROT -390	14/06/2019	Semana 24	GTC				16	S4 - 1608	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1083	PROTOCOLO	PROT -412	15/06/2019	Semana 24	GTC				12	S2 - 1203	Baño 1	Arquitectura	Enchape	Quiñe	retirar ceramico quiñado e istalar uno nuevo, dar acabado	Levantado	18/06/2019	
290	RONC	Ronc -290	17/06/2019	Semana 25	GTC				15, 16 y 17	S1, S2, S3 Y S4	Sala - dormitorios	Acabados	Pintura Interior	Mal empaste en muros	Aplicar empaste uniformemente	Levantado	19/06/2019	
291	RONC	Ronc -291	17/06/2019	Semana 25	GTC				18	S1, S2, S3 Y S4	Sala - dormitorios	Acabados	Pintura Interior	Mal blanqueado en techo y paredes	Aplicar mezcla uniformemente	Levantado	19/06/2019	
292	RONC	Ronc -292	18/06/2019	Semana 25	GTC				5	S1, S2, S3 Y S4	Sala - dormitorios	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Espaciamiento incorrecto entre tarugos para rodones	Corregir distancias según plano	Levantado	20/06/2019	
293	RONC	Ronc -293	18/06/2019	Semana 25	GTC				2	S1 - 204	Baño 1	Acabados	Pintura Interior	Pintura cuarteada por sobre empaste	Retirar zona afectada y volver a empastar correctamente	Levantado	19/06/2019	
988	PROTOCOLO	PROT -317	18/06/2019	Semana 25	GTC				19	S3 - 1901	Puerta	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	28/06/2019	
989	PROTOCOLO	PROT -318	18/06/2019	Semana 25	GTC				19	S3 - 1901	Techo	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	28/06/2019	
990	PROTOCOLO	PROT -319	18/06/2019	Semana 25	GTC				19	S3 - 1902	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	28/06/2019	
991	PROTOCOLO	PROT -320	18/06/2019	Semana 25	GTC				19	S4 - 1908	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	28/06/2019	
992	PROTOCOLO	PROT -321	18/06/2019	Semana 25	GTC				19	S4 - 1908	Techo	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	28/06/2019	
1062	PROTOCOLO	PROT -391	18/06/2019	Semana 25	GTC				17	S2 - 1704	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1063	PROTOCOLO	PROT -392	18/06/2019	Semana 25	GTC				17	S1 - 1705	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
307	RONC	Ronc -307	27/06/2019	Semana 26	GTC				-	Obras exteriores	Juego de Niños	Estructura	Acero de refuerzo	Falla en instalación	Se indicó al personal corregir la habilitación para posterior colocado en muro perimetrico	Levantado	27/06/2019	
308	RONC	Ronc -308	27/06/2019	Semana 26	GTC				20	S1 - 2004	Escalera duplex	Acabados	Baranda Metálica	Ausencia mortero	Se conversó con hueritas para cuidar trabajos ajenos y se debe colocar mortero en zona donde se instalo baranda	Levantado	27/06/2019	
309	RONC	Ronc -309	28/06/2019	Semana 26	GTC				1	Obras exteriores	Concentradores	Equipamiento	Cableados	Sin energía	Se desintaló la llave, se realizó prueba de continuidad al estar conforme se reajustó las conexiones del cabeado a la llave y se volvió a tomar medida dando 220V	Levantado	28/06/2019	
310	RONC	Ronc -310	28/06/2019	Semana 26	GTC				4	S4 - 401	Dormitorio 1	Acabados	Piso Laminado	Separación de piso laminado	Dar alerta a capataz y operario que dejar la separación para evitar problemas de dilatación	Levantado	28/06/2019	
311	RONC	Ronc -311	28/06/2019	Semana 26	GTC				20	S2 y S4 - 2001 y 2006	Baño 2	Arquitectura	Tabiquería	Falla en procedimiento	Se informará a capataz de B&r que ductos son de drywall. Deben retirar mechas de acero	Levantado	4/07/2019	
312	RONC	Ronc -312	28/06/2019	Semana 26	GTC				17	S2 - 1705	Baño 2	Arquitectura	Entubado PVC SAP	Material defectuoso	Picar poyo, cambiar tubería rota, resanar poyo.	Levantado	1/07/2019	
329	RONC	Ronc -329	4/07/2019	Semana 27	GTC				19	S3 - 1908	Ingreso Dpto	Acabados	Puertas y/o Marcos	Desalineamiento	Corregir mal corte en hoja de puerta	Levantado	6/07/2019	
330	RONC	Ronc -330	4/07/2019	Semana 27	GTC				19	S3 - 1908	Baño 2	Acabados	Puertas y/o Marcos	Fisura	Cambiar marco de puerta por fisura en marco	Levantado	6/07/2019	
331	RONC	Ronc -331	4/07/2019	Semana 27	GTC				20	S3 - 2008	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiquería	Material defectuoso	Tubería rota por anclaje de tabiquería	Levantado	4/07/2019	
332	RONC	Ronc -332	4/07/2019	Semana 27	GTC				19	S3 - 1907	Cocina	Acabados	Sello cortafuego	Falta sellado	Completar sello desprendido por caída de agua en ducto de cocina	Levantado	8/07/2019	
333	RONC	Ronc -333	4/07/2019	Semana 27	GTC				-	-	Cisterna	Estructura	Encofrado	Falla en procedimiento	Ajustar mariposas de encofrado	Levantado	4/07/2019	
334	RONC	Ronc -334	4/07/2019	Semana 27	GTC				-	-	Cisterna	Arquitectura	Concreto postvaciado	Curado inadecuado	Curar placas de cisterna	Levantado	4/07/2019	
1084	PROTOCOLO	PROT -413	5/07/2019	Semana 27	GTC				14	S1 - 1405	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1085	PROTOCOLO	PROT -414	5/07/2019	Semana 27	GTC				15	S3 - 1501	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1086	PROTOCOLO	PROT -415	5/07/2019	Semana 27	GTC				15	S3 - 1502	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1087	PROTOCOLO	PROT -416	5/07/2019	Semana 27	GTC				15	S2 - 1503	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1088	PROTOCOLO	PROT -417	5/07/2019	Semana 27	GTC				15	S2 - 1504	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1089	PROTOCOLO	PROT -418	5/07/2019	Semana 27	GTC				15	S2 - 1504	Cocina	Arquitectura	Enchape	Material defectuoso	Cambiar ceramico con tono inadecuado	Levantado	12/07/2019	
1090	PROTOCOLO	PROT -419	5/07/2019	Semana 27	GTC				15	S1 - 1505	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1091	PROTOCOLO	PROT -420	5/07/2019	Semana 27	GTC				15	S1 - 1506	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1092	PROTOCOLO	PROT -421	5/07/2019	Semana 27	GTC				15	S4 - 1507	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1093	PROTOCOLO	PROT -422	5/07/2019	Semana 27	GTC	[redacted]			15	S4 - 1508	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	[redacted]
993	PROTOCOLO	PROT -322	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S3 - 2002	muro	Arquitectura	Solaqueo	Desplome	Rellenar con mortero dar aplome y acabado	Levantado	8/07/2019	
994	PROTOCOLO	PROT -323	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S2 - 2004	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	8/07/2019	
995	PROTOCOLO	PROT -324	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S2 - 2004	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	8/07/2019	
996	PROTOCOLO	PROT -325	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S1 - 2005	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	8/07/2019	
997	PROTOCOLO	PROT -326	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S2 - 2006	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	8/07/2019	
998	PROTOCOLO	PROT -327	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S1 - 2006	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	8/07/2019	
999	PROTOCOLO	PROT -328	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S4 - 2007	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	8/07/2019	
1000	PROTOCOLO	PROT -329	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S4 - 2007	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	8/07/2019	
1001	PROTOCOLO	PROT -330	8/07/2019	Semana 28	GTC				21	S2 - 2103	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	8/07/2019	
1002	PROTOCOLO	PROT -331	8/07/2019	Semana 28	GTC				21	S2 - 2104	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	8/07/2019	
1003	PROTOCOLO	PROT -332	8/07/2019	Semana 28	GTC				21	S1 - 2105	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	8/07/2019	
1004	PROTOCOLO	PROT -333	8/07/2019	Semana 28	GTC				21	S1 - 2106	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	8/07/2019	
1005	PROTOCOLO	PROT -334	8/07/2019	Semana 28	GTC				21	S4 - 2107	Techo	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	8/07/2019	
1006	PROTOCOLO	PROT -335	8/07/2019	Semana 28	GTC				21	S4 - 2108	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	8/07/2019	
1064	PROTOCOLO	PROT -393	8/07/2019	Semana 28	GTC				19	S3 - 1901	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Mal acabado	Dar acabado uniforme	Levantado	26/10/2019	
1065	PROTOCOLO	PROT -394	8/07/2019	Semana 28	GTC				19	S3 - 1902	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1066	PROTOCOLO	PROT -395	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S3 - 2001	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1067	PROTOCOLO	PROT -396	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S2 - 2003	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1068	PROTOCOLO	PROT -397	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S2 - 2004	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1069	PROTOCOLO	PROT -398	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S1 - 2005	Dormitorio 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1070	PROTOCOLO	PROT -399	8/07/2019	Semana 28	GTC				20	S14- 2007	Baño 1	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1071	PROTOCOLO	PROT -400	8/07/2019	Semana 28	GTC				21	S1 - 2105	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1072	PROTOCOLO	PROT -401	8/07/2019	Semana 28	GTC				21	S1 - 2106	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
1073	PROTOCOLO	PROT -402	8/07/2019	Semana 28	GTC				21	S4 - 2108	Baño 2	Arquitectura	Tabiqueria	Desplome	Solaquear y dar aplome a muro	Levantado	26/10/2019	
342	RONC	Ronc -342	9/07/2019	Semana 28	GTC				-	-	Fachada 107	Arquitectura	Tabiquería	Falla en procedimiento	Cortar y perfilar bruña para que queden de la misma longitud	Levantado	9/07/2019	
344	RONC	Ronc -344	9/07/2019	Semana 28	GTC				-	-	Banca - Juego de Niños	Estructura	Acero de refuerzo	Armado incorrecto	Redistribuir acero según plano: 4 aceros @ 20 cm	Levantado	9/07/2019	
1094	PROTOCOLO	PROT -423	9/07/2019	Semana 28	GTC				16	S3 - 1601	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1095	PROTOCOLO	PROT -424	9/07/2019	Semana 28	GTC				16	S3 - 1602	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1096	PROTOCOLO	PROT -425	9/07/2019	Semana 28	GTC				16	S3 - 1602	Cocina	Arquitectura	Enchape	Falla en instalación	Aplicar pegamento en todo el ceramico	Levantado	15/07/2019	
1097	PROTOCOLO	PROT -426	9/07/2019	Semana 28	GTC				16	S2 - 1603	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1098	PROTOCOLO	PROT -427	9/07/2019	Semana 28	GTC				16	S2 - 1603	Cocina	Arquitectura	Enchape	Falla en instalación	Aplicar pegamento en todo el ceramico	Levantado	15/07/2019	
1099	PROTOCOLO	PROT -428	9/07/2019	Semana 28	GTC				16	S2 - 1604	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1100	PROTOCOLO	PROT -429	9/07/2019	Semana 28	GTC				16	S1 - 1605	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1101	PROTOCOLO	PROT -430	9/07/2019	Semana 28	GTC				16	S1 - 1606	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1102	PROTOCOLO	PROT -431	9/07/2019	Semana 28	GTC	[redacted]			16	S1 - 1606	Baño 2	Arquitectura	Enchape	Falla en instalación	Aplicar pegamento en todo el ceramico	Levantado	15/07/2019	[redacted]
1103	PROTOCOLO	PROT -432	9/07/2019	Semana 28	GTC				16	S4 - 1607	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
1104	PROTOCOLO	PROT -433	9/07/2019	Semana 28	GTC				16	S4- 1607	Baño 2	Arquitectura	Enchape	Falla en instalación	Aplicar pegamento en todo el ceramico	Levantado	15/07/2019	
1105	PROTOCOLO	PROT -434	9/07/2019	Semana 28	GTC				16	S4 - 1608	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	12/07/2019	
366	RONC	Ronc -366	12/07/2019	Semana 28	GTC				20	-	Cocina y Dormitorios	Arquitectura	Solaqueo	Despostillamiento	Conversar con personal de puertas y resanar daños	Levantado	15/07/2019	
367	RONC	Ronc -367	12/07/2019	Semana 28	GTC				1	S2 - 106	Sala	Acabados	Puertas y/o Marcos	Mal almacenamiento	Conversar con Jeldwen y analizar estado de puertas pisoteadas	Levantado	15/07/2019	
368	RONC	Ronc -368	12/07/2019	Semana 28	GTC				-	-	Obras Exteriores - Cisterna	Estructura	Encofrado	Falla en procedimiento	Encofrar zona faltante, pues se puede retirar encofrado por ductos de inspección.	Levantado	12/07/2019	
369	RONC	Ronc -369	12/07/2019	Semana 28	GTC				17	S3 - 1708	cocina	Acabados	Equipamiento sanitario	Tubería rota	Retirar enchape, picar poyo y reparar tubería	Levantado	16/07/2019	
1106	PROTOCOLO	PROT -435	12/07/2019	Semana 28	GTC				17	S2 - 1704	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	15/07/2019	
1107	PROTOCOLO	PROT -436	12/07/2019	Semana 28	GTC				17	S1 - 1705	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	15/07/2019	
370	RONC	Ronc -370	15/07/2019	Semana 29	GTC				-	-	Losa de cisterna	Estructura	Encofrado	Dimensión incorrecta	Reducir encofrado de 25 a 20 cm y colocar el acero que corresponde a una viga de 20 cm	Levantado	15/07/2019	
371	RONC	Ronc -371	15/07/2019	Semana 29	GTC				1	S4 - 101	Baño 1	Arquitectura	Entubado PVC SAP	Tubería rota	Reparación de seccion de tuberia rota.	Levantado	20/07/2019	
372	RONC	Ronc -372	15/07/2019	Semana 29	GTC				20-21	2001	Terraza	Arquitectura	Concreto postvaciado	Despostillamiento	Resanar borde de parapeto con mortero de alta resistencia	Levantado	20/07/2019	
1108	PROTOCOLO	PROT -437	15/07/2019	Semana 29	GTC				18	S3 - 1801	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	18/07/2019	
1109	PROTOCOLO	PROT -438	15/07/2019	Semana 29	GTC				18	S3 - 1802	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	18/07/2019	
1110	PROTOCOLO	PROT -439	15/07/2019	Semana 29	GTC				18	S2 - 1803	Baño 2	Arquitectura	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar emplantillado	Levantado	18/07/2019	
1111	PROTOCOLO	PROT -440	15/07/2019	Semana 29	GTC				18	S2 - 1803	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	18/07/2019	
1112	PROTOCOLO	PROT -441	15/07/2019	Semana 29	GTC				18	S2 - 1804	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	18/07/2019	
1113	PROTOCOLO	PROT -442	15/07/2019	Semana 29	GTC				18	S1 - 1805	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	18/07/2019	
1114	PROTOCOLO	PROT -443	15/07/2019	Semana 29	GTC				18	S1 - 1806	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	18/07/2019	
1115	PROTOCOLO	PROT -444	15/07/2019	Semana 29	GTC				18	S4 - 1807	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	18/07/2019	
1116	PROTOCOLO	PROT -445	15/07/2019	Semana 29	GTC				18	S4 - 1808	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	18/07/2019	
389	RONC	Ronc -389	17/07/2019	Semana 29	GTC				17	S3 - 1708	Balcones	Acabados	Baranda Metálica	Oxido	Lijar óxido y masillar para cubrir baranda.	Levantado	25/07/2019	
390	RONC	Ronc -390	17/07/2019	Semana 29	GTC				-	-	Pista Etapa 2 - OE	Estructura	Concreto Pre-mezclado	Diseño Inadecuado	Comunicarse con Unicon y corregir el diseño de concreto de 175 a 210 kg/cm2	Levantado	17/07/2019	
394	RONC	Ronc -394	18/07/2019	Semana 29	GTC				-	-	Obras exteriores - pistas	Arquitectura	Concreto postvaciado	Fisura	Reparar fisura aplicando sikadur 52	Levantado	20/07/2019	
1117	PROTOCOLO	PROT -446	19/07/2019	Semana 29	GTC				20	S4 - 2006	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	20/07/2019	
1118	PROTOCOLO	PROT -447	19/07/2019	Semana 29	GTC				20	S4 - 2007	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	20/07/2019	
396	RONC	Ronc -396	22/07/2019	Semana 30	GTC				-	-	Parque - OE	Acabados	Equipamiento eléctrico	Funcionamiento defectuoso	Luminaria quedmada, cambiar luminaria	Levantado	23/07/2019	
397	RONC	Ronc -397	22/07/2019	Semana 30	GTC				-	-	Estacionamiento - OE	Arquitectura	Solaqueo	Falta resane	Solaquear buzones de desague	Levantado	22/07/2019	
400	RONC	Ronc -400	22/07/2019	Semana 30	GTC				-	-	bras exteriores - Juego de Niñ	Arquitectura	Acabados	Sin sumidero	Picar zona donde se debe instalar sumider	Levantado	22/07/2019	
401	RONC	Ronc -401	22/07/2019	Semana 30	GTC				18	S3 - 1807	Baño 2	Acabados	Enchape	Tubería rota	Picar cerámico y cambiar tubería	Levantado	24/07/2019	
402	RONC	Ronc -402	22/07/2019	Semana 30	GTC				20	S3 - 2008	Dormitorio 1	Acabados	Sello cortafuego	Despegado	Reponer sello desprendido	Levantado	31/07/2019	
1119	PROTOCOLO	PROT -448	22/07/2019	Semana 30	GTC				21	S3 - 2101	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	25/07/2019	
1120	PROTOCOLO	PROT -449	22/07/2019	Semana 30	GTC				21	S3 - 2102	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	25/07/2019	
1121	PROTOCOLO	PROT -450	22/07/2019	Semana 30	GTC				21	S2 - 2103	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	25/07/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1122	PROTOCOLO	PROT -451	22/07/2019	Semana 30	GTC	[redacted]			21	S2 - 2104	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	25/07/2019	[redacted]
1123	PROTOCOLO	PROT -452	22/07/2019	Semana 30	GTC				21	S1 - 2105	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	25/07/2019	
1124	PROTOCOLO	PROT -453	22/07/2019	Semana 30	GTC				21	S1 - 2106	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	25/07/2019	
1125	PROTOCOLO	PROT -454	22/07/2019	Semana 30	GTC				21	S1 - 2107	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	25/07/2019	
1126	PROTOCOLO	PROT -455	22/07/2019	Semana 30	GTC				21	S1 - 2108	Varios	Arquitectura	Enchape	Sin sumidero	No se corto ceramico para instalacion de sumidero	Levantado	25/07/2019	
408	RONC	Ronc -408	23/07/2019	Semana 30	GTC				20	S1 - 2004	Terraza	Arquitectura	Solaqueo	Oxido	Resanar huecos (por andamio) con morterio para cubrir alambres de encofrado	Levantado	26/07/2019	
1889	PROTOCOLO	PROT -1218	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1701	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	16/10/2019	
1890	PROTOCOLO	PROT -1219	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1701	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1891	PROTOCOLO	PROT -1220	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1701	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	16/10/2019	
1892	PROTOCOLO	PROT -1221	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1701	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1893	PROTOCOLO	PROT -1222	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1701	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	16/10/2019	
1894	PROTOCOLO	PROT -1223	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1701	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	16/10/2019	
1895	PROTOCOLO	PROT -1224	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1702	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	16/10/2019	
1896	PROTOCOLO	PROT -1225	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1702	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1897	PROTOCOLO	PROT -1226	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1702	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1898	PROTOCOLO	PROT -1227	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1702	Baño 2	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	16/10/2019	
1899	PROTOCOLO	PROT -1228	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1702	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	16/10/2019	
1900	PROTOCOLO	PROT -1229	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1702	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	16/10/2019	
1901	PROTOCOLO	PROT -1230	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S2 - 1703	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	16/10/2019	
1902	PROTOCOLO	PROT -1231	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S2 - 1703	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1903	PROTOCOLO	PROT -1232	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S2 - 1703	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1904	PROTOCOLO	PROT -1233	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S2 - 1703	Baño 2	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	16/10/2019	
1905	PROTOCOLO	PROT -1234	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S2 - 1703	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	16/10/2019	
1906	PROTOCOLO	PROT -1235	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S2 - 1703	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	16/10/2019	
1907	PROTOCOLO	PROT -1236	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S2 - 1704	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	16/10/2019	
1908	PROTOCOLO	PROT -1237	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S2 - 1704	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1909	PROTOCOLO	PROT -1238	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S2 - 1704	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1910	PROTOCOLO	PROT -1239	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S2 - 1704	Baño 2	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	16/10/2019	
1911	PROTOCOLO	PROT -1240	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S2 - 1704	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	16/10/2019	
1912	PROTOCOLO	PROT -1241	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S2 - 1704	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	16/10/2019	
1913	PROTOCOLO	PROT -1242	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1705	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	16/10/2019	
1914	PROTOCOLO	PROT -1243	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1705	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1915	PROTOCOLO	PROT -1244	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1705	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	16/10/2019	
1916	PROTOCOLO	PROT -1245	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1705	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1917	PROTOCOLO	PROT -1246	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1705	Puertas	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	16/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1918	PROTOCOLO	PROT -1247	30/07/2019	Semana 31	GTC	[redacted]			17	S3 - 1705	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	16/10/2019	[redacted]
1919	PROTOCOLO	PROT -1248	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1705	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	16/10/2019	
1920	PROTOCOLO	PROT -1249	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1706	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	16/10/2019	
1921	PROTOCOLO	PROT -1250	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1706	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1922	PROTOCOLO	PROT -1251	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1706	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1923	PROTOCOLO	PROT -1252	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1706	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1924	PROTOCOLO	PROT -1253	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1706	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	16/10/2019	
1925	PROTOCOLO	PROT -1254	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1706	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	16/10/2019	
1926	PROTOCOLO	PROT -1255	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S3 - 1706	Baño 1	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	16/10/2019	
1927	PROTOCOLO	PROT -1256	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1707	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	16/10/2019	
1928	PROTOCOLO	PROT -1257	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1707	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1929	PROTOCOLO	PROT -1258	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1707	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1930	PROTOCOLO	PROT -1259	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1707	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	16/10/2019	
1931	PROTOCOLO	PROT -1260	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1707	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	16/10/2019	
1932	PROTOCOLO	PROT -1261	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1707	Baño 1	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	16/10/2019	
1933	PROTOCOLO	PROT -1262	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1708	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	16/10/2019	
1934	PROTOCOLO	PROT -1263	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1708	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1935	PROTOCOLO	PROT -1264	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1708	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1936	PROTOCOLO	PROT -1265	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1708	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	16/10/2019	
1937	PROTOCOLO	PROT -1266	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1708	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	16/10/2019	
1938	PROTOCOLO	PROT -1267	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1708	Muro	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	16/10/2019	
1939	PROTOCOLO	PROT -1268	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1708	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	16/10/2019	
1940	PROTOCOLO	PROT -1269	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1708	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	16/10/2019	
1941	PROTOCOLO	PROT -1270	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1708	Baño 1	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	16/10/2019	
1942	PROTOCOLO	PROT -1271	30/07/2019	Semana 31	GTC				17	S4 - 1708	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	16/10/2019	
1968	PROTOCOLO	PROT -1297	30/07/2019	Semana 34	GTC				18	S4 - 1805	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
431	RONC	Ronc -431	31/07/2019	Semana 31	GTC				-	-	Cisterna	Arquitectura	Acero de refuerzo	Acero/Alambre expuesto	Cubrir acero para evitar que este se oxide.	Levantado	3/08/2019	
434	RONC	Ronc -434	1/08/2019	Semana 31	GTC				1	S2 - 106	Cocina	Arquitectura	Solaqueo	Acero/Alambre expuesto	Retirar acero anclado y resanar hueco.	Levantado	2/08/2019	
435	RONC	Ronc -435	1/08/2019	Semana 31	GTC				17	S1 - 1704	Cocina	Arquitectura	Entubado PEALPE	Tubería rota	Cotizar con S&E para hacer la reparación de la tubería	Levantado	12/09/2019	
437	RONC	Ronc -437	1/08/2019	Semana 31	GTC				1	S4 - 102	Cocina	Acabados	Enchape	Falla en procedimiento	Se debe retirar los soportes del enchape que estan pegados a la pintura	Levantado	3/08/2019	
438	RONC	Ronc -438	1/08/2019	Semana 31	GTC				19	S1 - 1904	Sala - Cocina	Acabados	Papel Mural	Falta sellado	Falta colocar sellador antes de instalar papel	Levantado	1/08/2019	
444	RONC	Ronc -444	1/08/2019	Semana 31	GTC				21	S2 - 2106	Sala Star	Arquitectura	Acabados	Solaqueo	Resanar quiñe en techo de sala star por golpe con mampara.	Levantado	1/08/2019	
1175	PROTOCOLO	PROT -504	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 201	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1176	PROTOCOLO	PROT -505	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 201	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1177	PROTOCOLO	PROT -506	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 201	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Volver a mancillar y pintar	Levantado	1/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1178	PROTOCOLO	PROT -507	1/08/2019	Semana 31	GTC	[redacted]			2	S3 - 201	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	[redacted]
1179	PROTOCOLO	PROT -508	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 201	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1180	PROTOCOLO	PROT -509	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 201	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1181	PROTOCOLO	PROT -510	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 202	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1182	PROTOCOLO	PROT -511	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 202	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1183	PROTOCOLO	PROT -512	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 202	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Volver a mancillar y pintar	Levantado	1/10/2019	
1184	PROTOCOLO	PROT -513	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 202	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1185	PROTOCOLO	PROT -514	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 202	Piso	Acabados	Piso Laminado	Despegado	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1186	PROTOCOLO	PROT -515	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 202	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1187	PROTOCOLO	PROT -516	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 202	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	1/10/2019	
1188	PROTOCOLO	PROT -517	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S3 - 202	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1189	PROTOCOLO	PROT -518	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 203	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1190	PROTOCOLO	PROT -519	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 203	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1191	PROTOCOLO	PROT -520	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 203	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1192	PROTOCOLO	PROT -521	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 203	Piso	Acabados	Piso Laminado	Despegado	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1193	PROTOCOLO	PROT -522	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 203	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1194	PROTOCOLO	PROT -523	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 203	Cocina	Acabados	Enchape	Quiñe	Retirar ceramico e instaar otro	Levantado	1/10/2019	
1195	PROTOCOLO	PROT -524	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 203	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1196	PROTOCOLO	PROT -525	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 204	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1197	PROTOCOLO	PROT -526	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 204	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1198	PROTOCOLO	PROT -527	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 204	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1199	PROTOCOLO	PROT -528	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 204	Cocina	Acabados	Enchape	Quiñe	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1200	PROTOCOLO	PROT -529	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 204	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	1/10/2019	
1201	PROTOCOLO	PROT -530	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S2 - 204	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1202	PROTOCOLO	PROT -531	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 205	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1203	PROTOCOLO	PROT -532	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 205	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1204	PROTOCOLO	PROT -533	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 205	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Volver a mancillar y pintar	Levantado	1/10/2019	
1205	PROTOCOLO	PROT -534	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 205	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1206	PROTOCOLO	PROT -535	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 205	Piso	Acabados	Piso Laminado	Despegado	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1207	PROTOCOLO	PROT -536	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 205	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1208	PROTOCOLO	PROT -537	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 205	Cocina	Acabados	Enchape	Quiñe	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1209	PROTOCOLO	PROT -538	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 205	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	1/10/2019	
1210	PROTOCOLO	PROT -539	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 205	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1211	PROTOCOLO	PROT -540	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 206	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1212	PROTOCOLO	PROT -541	1/08/2019	Semana 31	GTC	[redacted]			2	S1 - 206	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	[redacted]
1213	PROTOCOLO	PROT -542	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 206	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1214	PROTOCOLO	PROT -543	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 206	Piso	Acabados	Piso Laminado	Despegado	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1215	PROTOCOLO	PROT -544	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 206	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1216	PROTOCOLO	PROT -545	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 206	Cocina	Acabados	Enchape	Quiñe	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1217	PROTOCOLO	PROT -546	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 206	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	1/10/2019	
1218	PROTOCOLO	PROT -547	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S1 - 206	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1219	PROTOCOLO	PROT -548	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 207	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1220	PROTOCOLO	PROT -549	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 207	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1221	PROTOCOLO	PROT -550	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 207	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1222	PROTOCOLO	PROT -551	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 207	Piso	Acabados	Piso Laminado	Despegado	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1223	PROTOCOLO	PROT -552	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 207	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1224	PROTOCOLO	PROT -553	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 207	Cocina	Acabados	Enchape	Quiñe	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1225	PROTOCOLO	PROT -554	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 207	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1226	PROTOCOLO	PROT -555	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 208	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1227	PROTOCOLO	PROT -556	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 208	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1228	PROTOCOLO	PROT -557	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 208	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Volver a mancillar y pintar	Levantado	1/10/2019	
1229	PROTOCOLO	PROT -558	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 208	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1230	PROTOCOLO	PROT -559	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 208	Piso	Acabados	Piso Laminado	Despegado	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1231	PROTOCOLO	PROT -560	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 208	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1232	PROTOCOLO	PROT -561	1/08/2019	Semana 31	GTC				2	S4 - 208	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
912	PROTOCOLO	PROT -241	2/08/2019	Semana 31	GTC				1	S3 - 101	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	5/08/2019	
913	PROTOCOLO	PROT -242	2/08/2019	Semana 31	GTC				1	S3 - 101	Muro - Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	5/08/2019	
914	PROTOCOLO	PROT -243	2/08/2019	Semana 31	GTC				1	S3 - 101	Techo	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	5/08/2019	
915	PROTOCOLO	PROT -244	2/08/2019	Semana 31	GTC				1	S3 - 102	Muro Bruña	Arquitectura	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, solquear y alinear bruña	Levantado	5/08/2019	
916	PROTOCOLO	PROT -245	2/08/2019	Semana 31	GTC				1	S3 - 102	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	5/08/2019	
917	PROTOCOLO	PROT -246	2/08/2019	Semana 31	GTC				1	S2 - 103	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	5/08/2019	
918	PROTOCOLO	PROT -247	2/08/2019	Semana 31	GTC				1	S2 - 103	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	5/08/2019	
919	PROTOCOLO	PROT -248	2/08/2019	Semana 31	GTC				1	S1 - 105	Ventana	Arquitectura	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Rellenar con mortero y dar medida según plano	Levantado	5/08/2019	
920	PROTOCOLO	PROT -249	2/08/2019	Semana 31	GTC				1	S1 - 106	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	5/08/2019	
921	PROTOCOLO	PROT -250	2/08/2019	Semana 31	GTC				1	S1 - 107	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Mal acabado	Picar, rellemar y tarrajear	Levantado	5/08/2019	
922	PROTOCOLO	PROT -251	2/08/2019	Semana 31	GTC				1	S1 - 108	Muro	Arquitectura	Solaqueo	Protuberancia	Picar, rellenar y dar acabado	Levantado	5/08/2019	
1233	PROTOCOLO	PROT -562	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S3 - 301	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	2/10/2019	
1234	PROTOCOLO	PROT -563	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S3 - 301	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	2/10/2019	
1235	PROTOCOLO	PROT -564	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S3 - 301	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	2/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1236	PROTOCOLO	PROT -565	3/08/2019	Semana 31	GTC	[redacted]			3	S3 - 301	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	2/10/2019	[redacted]
1237	PROTOCOLO	PROT -566	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S3 - 301	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	2/10/2019	
1238	PROTOCOLO	PROT -567	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S3 - 302	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	2/10/2019	
1239	PROTOCOLO	PROT -568	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S3 - 302	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	2/10/2019	
1240	PROTOCOLO	PROT -569	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S3 - 302	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	2/10/2019	
1241	PROTOCOLO	PROT -570	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S3 - 302	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	2/10/2019	
1242	PROTOCOLO	PROT -571	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S3 - 302	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	2/10/2019	
1243	PROTOCOLO	PROT -572	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S3 - 302	Cocina	Acabados	Enchape	Quiñe	Retirar mancha	Levantado	2/10/2019	
1244	PROTOCOLO	PROT -573	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S2 - 303	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1245	PROTOCOLO	PROT -574	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S2 - 303	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1246	PROTOCOLO	PROT -575	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S2 - 303	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1247	PROTOCOLO	PROT -576	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S2 - 303	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1248	PROTOCOLO	PROT -577	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S2 - 303	Cocina	Acabados	Enchape	Quiñe	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1249	PROTOCOLO	PROT -578	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S2 - 304	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1250	PROTOCOLO	PROT -579	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S2 - 304	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1251	PROTOCOLO	PROT -580	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S2 - 304	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1252	PROTOCOLO	PROT -581	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S2 - 304	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1253	PROTOCOLO	PROT -582	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S2 - 304	Baño 2	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	1/10/2019	
1254	PROTOCOLO	PROT -583	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 305	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1255	PROTOCOLO	PROT -584	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 305	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1256	PROTOCOLO	PROT -585	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 305	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1257	PROTOCOLO	PROT -586	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 305	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1258	PROTOCOLO	PROT -587	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 305	Cocina	Acabados	Enchape	Quiñe	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1259	PROTOCOLO	PROT -588	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 305	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	1/10/2019	
1260	PROTOCOLO	PROT -589	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 306	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1261	PROTOCOLO	PROT -590	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 306	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1262	PROTOCOLO	PROT -591	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 306	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	2/10/2019	
1263	PROTOCOLO	PROT -592	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 306	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1264	PROTOCOLO	PROT -593	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 306	Piso	Acabados	Piso Laminado	Despegado	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1265	PROTOCOLO	PROT -594	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 306	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1266	PROTOCOLO	PROT -595	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 306	Cocina	Acabados	Enchape	Quiñe	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1267	PROTOCOLO	PROT -596	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S1 - 306	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	1/10/2019	
1268	PROTOCOLO	PROT -597	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 307	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1269	PROTOCOLO	PROT -598	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 307	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1270	PROTOCOLO	PROT -599	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 307	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1271	PROTOCOLO	PROT -600	3/08/2019	Semana 31	GTC	[redacted]			3	S4 - 307	Piso	Acabados	Piso Laminado	Despegado	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	[redacted]
1272	PROTOCOLO	PROT -601	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 307	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1273	PROTOCOLO	PROT -602	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 307	Cocina	Acabados	Enchape	Quiñe	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1274	PROTOCOLO	PROT -603	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 307	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
1275	PROTOCOLO	PROT -604	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 308	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	1/10/2019	
1276	PROTOCOLO	PROT -605	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 308	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1277	PROTOCOLO	PROT -606	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 308	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	2/10/2019	
1278	PROTOCOLO	PROT -607	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 308	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Volver a mancillar y pintar	Levantado	1/10/2019	
1279	PROTOCOLO	PROT -608	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 308	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	1/10/2019	
1280	PROTOCOLO	PROT -609	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 308	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1281	PROTOCOLO	PROT -610	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 308	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	1/10/2019	
1282	PROTOCOLO	PROT -611	3/08/2019	Semana 31	GTC				3	S4 - 308	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	1/10/2019	
454	RONC	Ronc -454	5/08/2019	Semana 32	GTC				-	-	Estacionamiento	Obras Exteriores	Pavimentación	falta de limpieza / orden	Limpieza de las calles y mejoramiento de desnivel de ingreso vehicular livianos y pesados a la obra	Levantado	8/08/2019	
1283	PROTOCOLO	PROT -612	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 401	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	3/10/2019	
1284	PROTOCOLO	PROT -613	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 401	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1285	PROTOCOLO	PROT -614	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 401	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1286	PROTOCOLO	PROT -615	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 401	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1287	PROTOCOLO	PROT -616	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 401	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	3/10/2019	
1288	PROTOCOLO	PROT -617	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 401	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	3/10/2019	
1289	PROTOCOLO	PROT -618	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 401	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	3/10/2019	
1290	PROTOCOLO	PROT -619	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 402	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	3/10/2019	
1291	PROTOCOLO	PROT -620	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 402	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1292	PROTOCOLO	PROT -621	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 402	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1293	PROTOCOLO	PROT -622	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 402	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1294	PROTOCOLO	PROT -623	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 402	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	3/10/2019	
1295	PROTOCOLO	PROT -624	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 402	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	3/10/2019	
1296	PROTOCOLO	PROT -625	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S3 - 402	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	3/10/2019	
1297	PROTOCOLO	PROT -626	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S2 - 403	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	3/10/2019	
1298	PROTOCOLO	PROT -627	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S2 - 403	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1299	PROTOCOLO	PROT -628	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S2 - 403	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1300	PROTOCOLO	PROT -629	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S2 - 403	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1301	PROTOCOLO	PROT -630	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S2 - 403	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	3/10/2019	
1302	PROTOCOLO	PROT -631	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S2 - 403	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	3/10/2019	
1303	PROTOCOLO	PROT -632	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S2 - 404	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	3/10/2019	
1304	PROTOCOLO	PROT -633	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S2 - 404	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1305	PROTOCOLO	PROT -634	5/08/2019	Semana 32	GTC	[redacted]			4	S2 - 404	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	[redacted]
1306	PROTOCOLO	PROT -635	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S2 - 404	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1307	PROTOCOLO	PROT -636	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S2 - 404	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	3/10/2019	
1308	PROTOCOLO	PROT -637	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S2 - 404	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	3/10/2019	
1309	PROTOCOLO	PROT -638	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S2 - 404	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	3/10/2019	
1310	PROTOCOLO	PROT -639	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 405	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	3/10/2019	
1311	PROTOCOLO	PROT -640	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 405	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1312	PROTOCOLO	PROT -641	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 405	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1313	PROTOCOLO	PROT -642	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 405	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1314	PROTOCOLO	PROT -643	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 405	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	3/10/2019	
1315	PROTOCOLO	PROT -644	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 405	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	3/10/2019	
1316	PROTOCOLO	PROT -645	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 406	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	3/10/2019	
1317	PROTOCOLO	PROT -646	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 406	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1318	PROTOCOLO	PROT -647	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 406	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1319	PROTOCOLO	PROT -648	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 406	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1320	PROTOCOLO	PROT -649	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 406	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	3/10/2019	
1321	PROTOCOLO	PROT -650	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 406	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	3/10/2019	
1322	PROTOCOLO	PROT -651	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S1 - 406	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	3/10/2019	
1323	PROTOCOLO	PROT -652	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S4 - 407	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	3/10/2019	
1324	PROTOCOLO	PROT -653	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S4 - 407	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1325	PROTOCOLO	PROT -654	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S4 - 407	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	3/10/2019	
1326	PROTOCOLO	PROT -655	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S4 - 407	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	3/10/2019	
1327	PROTOCOLO	PROT -656	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S4 - 408	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	3/10/2019	
1328	PROTOCOLO	PROT -657	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S4 - 408	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1329	PROTOCOLO	PROT -658	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S4 - 408	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1330	PROTOCOLO	PROT -659	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S4 - 408	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	3/10/2019	
1331	PROTOCOLO	PROT -660	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S4 - 408	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	3/10/2019	
1332	PROTOCOLO	PROT -661	5/08/2019	Semana 32	GTC				4	S4 - 408	Baño 2	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	3/10/2019	
471	RONC	Ronc -471	7/08/2019	Semana 32	GTC				-	-	Obras Exteriores	Obras Exteriores	Pavimentación	Curado inadecuado	Se indicio al personal para que cure el concreto	Levantado	7/08/2019	
1333	PROTOCOLO	PROT -662	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 501	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	4/10/2019	
1334	PROTOCOLO	PROT -663	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 501	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1335	PROTOCOLO	PROT -664	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 501	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1336	PROTOCOLO	PROT -665	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 501	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1337	PROTOCOLO	PROT -666	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 501	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	4/10/2019	
1338	PROTOCOLO	PROT -667	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 501	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	4/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1339	PROTOCOLO	PROT -668	7/08/2019	Semana 32	GTC	[redacted]			5	S3 - 502	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	4/10/2019	[redacted]
1340	PROTOCOLO	PROT -669	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 502	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1341	PROTOCOLO	PROT -670	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 502	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1342	PROTOCOLO	PROT -671	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 502	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	4/10/2019	
1343	PROTOCOLO	PROT -672	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 502	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	4/10/2019	
1344	PROTOCOLO	PROT -673	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 503	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	4/10/2019	
1345	PROTOCOLO	PROT -674	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 503	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1346	PROTOCOLO	PROT -675	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 503	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1347	PROTOCOLO	PROT -676	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 503	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1348	PROTOCOLO	PROT -677	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 503	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	3/10/2019	
1349	PROTOCOLO	PROT -678	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 503	Baño 2	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	4/10/2019	
1350	PROTOCOLO	PROT -679	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 503	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	4/10/2019	
1351	PROTOCOLO	PROT -680	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 504	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	4/10/2019	
1352	PROTOCOLO	PROT -681	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 504	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1353	PROTOCOLO	PROT -682	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 504	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1354	PROTOCOLO	PROT -683	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 504	Baño 2	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	4/10/2019	
1355	PROTOCOLO	PROT -684	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 504	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	4/10/2019	
1356	PROTOCOLO	PROT -685	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 505	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1357	PROTOCOLO	PROT -686	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 505	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1358	PROTOCOLO	PROT -687	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 505	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	4/10/2019	
1359	PROTOCOLO	PROT -688	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S2 - 505	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	4/10/2019	
1360	PROTOCOLO	PROT -689	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 506	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	4/10/2019	
1361	PROTOCOLO	PROT -690	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 506	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1362	PROTOCOLO	PROT -691	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 506	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1363	PROTOCOLO	PROT -692	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 506	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	4/10/2019	
1364	PROTOCOLO	PROT -693	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 506	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	4/10/2019	
1365	PROTOCOLO	PROT -694	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S3 - 506	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	4/10/2019	
1366	PROTOCOLO	PROT -695	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S4 - 507	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	4/10/2019	
1367	PROTOCOLO	PROT -696	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S4 - 507	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1368	PROTOCOLO	PROT -697	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S4 - 507	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1369	PROTOCOLO	PROT -698	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S4 - 507	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	4/10/2019	
1370	PROTOCOLO	PROT -699	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S4 - 507	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	4/10/2019	
1371	PROTOCOLO	PROT -700	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S4 - 508	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1372	PROTOCOLO	PROT -701	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S4 - 508	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	4/10/2019	
1373	PROTOCOLO	PROT -702	7/08/2019	Semana 32	GTC				5	S4 - 508	Baño 2	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	4/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1374	PROTOCOLO	PROT -703	7/08/2019	Semana 32	GTC	[redacted]			5	S4 - 508	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	4/10/2019	[redacted]
1552	PROTOCOLO	PROT -881	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1001	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1553	PROTOCOLO	PROT -882	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1001	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1554	PROTOCOLO	PROT -883	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1001	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Oxidada	Retirar oxido, masillar y volver a pintar	Levantado	10/10/2019	
1555	PROTOCOLO	PROT -884	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1001	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1556	PROTOCOLO	PROT -885	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1001	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	10/10/2019	
1557	PROTOCOLO	PROT -886	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1001	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	10/10/2019	
1558	PROTOCOLO	PROT -887	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1002	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1559	PROTOCOLO	PROT -888	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1002	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1560	PROTOCOLO	PROT -889	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1002	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Oxidada	Retirar oxido, masillar y volver a pintar	Levantado	10/10/2019	
1561	PROTOCOLO	PROT -890	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1002	Puertas	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1562	PROTOCOLO	PROT -891	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1002	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	10/10/2019	
1563	PROTOCOLO	PROT -892	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1003	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1564	PROTOCOLO	PROT -893	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1003	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1565	PROTOCOLO	PROT -894	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1003	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1566	PROTOCOLO	PROT -895	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1003	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1567	PROTOCOLO	PROT -896	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1003	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	10/10/2019	
1568	PROTOCOLO	PROT -897	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1004	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1569	PROTOCOLO	PROT -898	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1004	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1570	PROTOCOLO	PROT -899	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1004	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1571	PROTOCOLO	PROT -900	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1004	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1572	PROTOCOLO	PROT -901	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S3 - 1004	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	10/10/2019	
1574	PROTOCOLO	PROT -903	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1005	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1575	PROTOCOLO	PROT -904	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1005	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1576	PROTOCOLO	PROT -905	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1005	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1577	PROTOCOLO	PROT -906	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1005	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	10/10/2019	
1578	PROTOCOLO	PROT -907	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1006	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1579	PROTOCOLO	PROT -908	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1006	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1580	PROTOCOLO	PROT -909	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1006	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1581	PROTOCOLO	PROT -910	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1006	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1582	PROTOCOLO	PROT -911	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1006	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1583	PROTOCOLO	PROT -912	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1006	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	10/10/2019	
1584	PROTOCOLO	PROT -913	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S4 - 1007	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1585	PROTOCOLO	PROT -914	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S4 - 1007	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1586	PROTOCOLO	PROT -915	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S4 - 1007	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1587	PROTOCOLO	PROT -916	7/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]			10	S4 - 1007	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	[redacted]
1588	PROTOCOLO	PROT -917	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S4 - 1007	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	10/10/2019	
1589	PROTOCOLO	PROT -918	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S4 - 1008	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1590	PROTOCOLO	PROT -919	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S4 - 1008	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1591	PROTOCOLO	PROT -920	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S4 - 1008	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1592	PROTOCOLO	PROT -921	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S4 - 1008	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	10/10/2019	
1593	PROTOCOLO	PROT -922	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S4 - 1008	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1594	PROTOCOLO	PROT -923	7/08/2019	Semana 33	GTC				10	S4 - 1008	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	10/10/2019	
1375	PROTOCOLO	PROT -704	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S3 - 601	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1376	PROTOCOLO	PROT -705	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S3 - 601	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1377	PROTOCOLO	PROT -706	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S3 - 601	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1378	PROTOCOLO	PROT -707	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S3 - 601	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	7/10/2019	
1379	PROTOCOLO	PROT -708	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S3 - 602	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	7/10/2019	
1380	PROTOCOLO	PROT -709	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S3 - 602	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1381	PROTOCOLO	PROT -710	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S3 - 602	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1382	PROTOCOLO	PROT -711	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S3 - 602	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1383	PROTOCOLO	PROT -712	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S3 - 602	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	7/10/2019	
1384	PROTOCOLO	PROT -713	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S3 - 602	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	7/10/2019	
1385	PROTOCOLO	PROT -714	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 603	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	7/10/2019	
1386	PROTOCOLO	PROT -715	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 603	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1387	PROTOCOLO	PROT -716	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 603	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1388	PROTOCOLO	PROT -717	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 603	Baño 2	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	7/10/2019	
1389	PROTOCOLO	PROT -718	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 603	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	7/10/2019	
1390	PROTOCOLO	PROT -719	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 604	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	7/10/2019	
1391	PROTOCOLO	PROT -720	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 604	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1392	PROTOCOLO	PROT -721	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 604	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1393	PROTOCOLO	PROT -722	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 604	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1394	PROTOCOLO	PROT -723	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 604	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	7/10/2019	
1395	PROTOCOLO	PROT -724	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 604	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	7/10/2019	
1396	PROTOCOLO	PROT -725	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S1 - 605	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	7/10/2019	
1397	PROTOCOLO	PROT -726	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S1 - 605	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1398	PROTOCOLO	PROT -727	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S1 - 605	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1399	PROTOCOLO	PROT -728	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S1 - 605	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1400	PROTOCOLO	PROT -729	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S1 - 605	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1401	PROTOCOLO	PROT -730	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S1 - 605	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	7/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1402	PROTOCOLO	PROT -731	8/08/2019	Semana 32	GTC	[redacted]			6	S1 - 606	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	7/10/2019	[redacted]
1403	PROTOCOLO	PROT -732	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S1 - 606	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1404	PROTOCOLO	PROT -733	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S1 - 606	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1405	PROTOCOLO	PROT -734	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S1 - 606	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1406	PROTOCOLO	PROT -735	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S1 - 606	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	7/10/2019	
1407	PROTOCOLO	PROT -736	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S1 - 606	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	7/10/2019	
1408	PROTOCOLO	PROT -737	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 607	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	7/10/2019	
1409	PROTOCOLO	PROT -738	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 607	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1410	PROTOCOLO	PROT -739	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 607	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1411	PROTOCOLO	PROT -740	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 607	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	7/10/2019	
1412	PROTOCOLO	PROT -741	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 607	Baño 2	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	7/10/2019	
1413	PROTOCOLO	PROT -742	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 608	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	7/10/2019	
1414	PROTOCOLO	PROT -743	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 608	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1415	PROTOCOLO	PROT -744	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 608	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1416	PROTOCOLO	PROT -745	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 608	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	7/10/2019	
1417	PROTOCOLO	PROT -746	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 608	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	7/10/2019	
1418	PROTOCOLO	PROT -747	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 608	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	7/10/2019	
1419	PROTOCOLO	PROT -748	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 608	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	7/10/2019	
1420	PROTOCOLO	PROT -749	8/08/2019	Semana 32	GTC				6	S2 - 608	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	7/10/2019	
1421	PROTOCOLO	PROT -750	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S3 - 701	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1422	PROTOCOLO	PROT -751	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S3 - 701	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1423	PROTOCOLO	PROT -752	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S3 - 701	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Oxidada	Retirar oxido, masillar y volver a pintar	Levantado	9/10/2019	
1424	PROTOCOLO	PROT -753	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S3 - 701	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1425	PROTOCOLO	PROT -754	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S3 - 701	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	9/10/2019	
1426	PROTOCOLO	PROT -755	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S3 - 702	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1427	PROTOCOLO	PROT -756	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S3 - 702	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1428	PROTOCOLO	PROT -757	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S3 - 702	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1429	PROTOCOLO	PROT -758	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S3 - 702	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	9/10/2019	
1430	PROTOCOLO	PROT -759	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S2 - 703	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1431	PROTOCOLO	PROT -760	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S2 - 703	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1432	PROTOCOLO	PROT -761	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S2 - 703	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1433	PROTOCOLO	PROT -762	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S2 - 703	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	9/10/2019	
1434	PROTOCOLO	PROT -763	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S2 - 704	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1435	PROTOCOLO	PROT -764	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S2 - 704	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1436	PROTOCOLO	PROT -765	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S2 - 704	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Retirar oxido, masillar y volver a pintar	Levantado	9/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1437	PROTOCOLO	PROT -766	9/08/2019	Semana 32	GTC	[redacted]			7	S2 - 704	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	9/10/2019	[redacted]
1438	PROTOCOLO	PROT -767	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S2 - 704	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	9/10/2019	
1439	PROTOCOLO	PROT -768	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S2 - 704	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	9/10/2019	
1440	PROTOCOLO	PROT -769	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S1 - 705	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1441	PROTOCOLO	PROT -770	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S1 - 705	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1442	PROTOCOLO	PROT -771	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S1 - 705	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Retirar oxido, masillar y volver a pintar	Levantado	9/10/2019	
1443	PROTOCOLO	PROT -772	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S1 - 705	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	9/10/2019	
1444	PROTOCOLO	PROT -773	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S1 - 706	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1445	PROTOCOLO	PROT -774	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S1 - 706	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1446	PROTOCOLO	PROT -775	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S1 - 706	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	9/10/2019	
1447	PROTOCOLO	PROT -776	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S4 - 707	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1448	PROTOCOLO	PROT -777	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S4 - 707	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1449	PROTOCOLO	PROT -778	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S4 - 707	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1450	PROTOCOLO	PROT -779	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S4 - 707	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	9/10/2019	
1451	PROTOCOLO	PROT -780	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S4 - 707	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	9/10/2019	
1452	PROTOCOLO	PROT -781	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S4 - 707	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	9/10/2019	
1453	PROTOCOLO	PROT -782	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S4 - 708	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1454	PROTOCOLO	PROT -783	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S4 - 708	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1455	PROTOCOLO	PROT -784	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S4 - 708	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Retirar oxido, masillar y volver a pintar	Levantado	9/10/2019	
1456	PROTOCOLO	PROT -785	9/08/2019	Semana 32	GTC				7	S4 - 708	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	9/10/2019	
1618	PROTOCOLO	PROT -947	9/08/2019	Semana 33	GTC				11	S1 - 1105	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	
1619	PROTOCOLO	PROT -948	9/08/2019	Semana 33	GTC				11	S1 - 1105	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1620	PROTOCOLO	PROT -949	9/08/2019	Semana 33	GTC				11	S1 - 1105	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1621	PROTOCOLO	PROT -950	9/08/2019	Semana 33	GTC				11	S1 - 1105	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	11/10/2019	
478	RONC	Ronc -478	12/08/2019	Semana 33	GTC				19	S3-1908	Losa	Acabados	Escarchado	Humedad/ hogos	Retirar el escarchado, limpiar la zona y volver a escarchar	Levantado	25/08/2019	
1457	PROTOCOLO	PROT -786	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S3 - 801	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1458	PROTOCOLO	PROT -787	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S3 - 801	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1459	PROTOCOLO	PROT -788	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S3 - 801	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1460	PROTOCOLO	PROT -789	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S3 - 801	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1461	PROTOCOLO	PROT -790	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S3 - 801	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	9/10/2019	
1462	PROTOCOLO	PROT -791	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S3 - 801	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	9/10/2019	
1463	PROTOCOLO	PROT -792	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S3 - 802	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1464	PROTOCOLO	PROT -793	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S3 - 802	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1465	PROTOCOLO	PROT -794	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S3 - 802	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1466	PROTOCOLO	PROT -795	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S3 - 802	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1467	PROTOCOLO	PROT -796	12/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]			8	S3 - 802	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	9/10/2019	[redacted]
1468	PROTOCOLO	PROT -797	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S2 - 803	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1469	PROTOCOLO	PROT -798	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S2 - 803	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1470	PROTOCOLO	PROT -799	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S2 - 803	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1471	PROTOCOLO	PROT -800	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S2 - 803	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1472	PROTOCOLO	PROT -801	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S2 - 803	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	9/10/2019	
1473	PROTOCOLO	PROT -802	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S2 - 803	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	9/10/2019	
1474	PROTOCOLO	PROT -803	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S2 - 804	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1475	PROTOCOLO	PROT -804	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S2 - 804	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1476	PROTOCOLO	PROT -805	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S2 - 804	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1477	PROTOCOLO	PROT -806	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S2 - 804	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1478	PROTOCOLO	PROT -807	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S2 - 804	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	9/10/2019	
1479	PROTOCOLO	PROT -808	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S2 - 804	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	9/10/2019	
1480	PROTOCOLO	PROT -809	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S1 - 805	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1481	PROTOCOLO	PROT -810	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S1 - 805	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1482	PROTOCOLO	PROT -811	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S1 - 805	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1483	PROTOCOLO	PROT -812	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S1 - 805	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1484	PROTOCOLO	PROT -813	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S1 - 805	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	9/10/2019	
1485	PROTOCOLO	PROT -814	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S1 - 805	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	9/10/2019	
1486	PROTOCOLO	PROT -815	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S1 - 806	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1487	PROTOCOLO	PROT -816	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S1 - 806	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1488	PROTOCOLO	PROT -817	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S1 - 806	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1489	PROTOCOLO	PROT -818	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S1 - 806	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1490	PROTOCOLO	PROT -819	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S1 - 806	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	9/10/2019	
1491	PROTOCOLO	PROT -820	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S1 - 806	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	9/10/2019	
1492	PROTOCOLO	PROT -821	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S4 - 807	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1493	PROTOCOLO	PROT -822	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S4 - 807	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1494	PROTOCOLO	PROT -823	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S4 - 807	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1495	PROTOCOLO	PROT -824	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S4 - 807	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1496	PROTOCOLO	PROT -825	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S4 - 807	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	9/10/2019	
1497	PROTOCOLO	PROT -826	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S4 - 808	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	9/10/2019	
1498	PROTOCOLO	PROT -827	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S4 - 808	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1499	PROTOCOLO	PROT -828	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S4 - 808	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1500	PROTOCOLO	PROT -829	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S4 - 808	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	9/10/2019	
1501	PROTOCOLO	PROT -830	12/08/2019	Semana 33	GTC				8	S4 - 808	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	9/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA: [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1502	PROTOCOLO	PROT -831	12/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]			8	S4 - 808	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	9/10/2019	[redacted]
1622	PROTOCOLO	PROT -951	12/08/2019	Semana 33	GTC				11	S1 - 1106	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	
1623	PROTOCOLO	PROT -952	12/08/2019	Semana 33	GTC				11	S1 - 1106	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1624	PROTOCOLO	PROT -953	12/08/2019	Semana 33	GTC				11	S1 - 1106	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1625	PROTOCOLO	PROT -954	12/08/2019	Semana 33	GTC				11	S1 - 1106	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	11/10/2019	
1626	PROTOCOLO	PROT -955	12/08/2019	Semana 33	GTC				11	S4 - 1107	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	
1627	PROTOCOLO	PROT -956	12/08/2019	Semana 33	GTC				11	S4 - 1107	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1628	PROTOCOLO	PROT -957	12/08/2019	Semana 33	GTC				11	S4 - 1107	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1629	PROTOCOLO	PROT -958	12/08/2019	Semana 33	GTC				11	S4 - 1107	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	11/10/2019	
1630	PROTOCOLO	PROT -959	12/08/2019	Semana 33	GTC				11	S4 - 1107	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	11/10/2019	
1715	PROTOCOLO	PROT -1044	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1401	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1716	PROTOCOLO	PROT -1045	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1401	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1717	PROTOCOLO	PROT -1046	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1401	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1718	PROTOCOLO	PROT -1047	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1401	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, limpiar masillar y pintar	Levantado	12/10/2019	
1719	PROTOCOLO	PROT -1048	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1401	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1720	PROTOCOLO	PROT -1049	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1401	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	12/10/2019	
1721	PROTOCOLO	PROT -1050	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1401	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1722	PROTOCOLO	PROT -1051	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1401	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	12/10/2019	
1723	PROTOCOLO	PROT -1052	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1401	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	12/10/2019	
1724	PROTOCOLO	PROT -1053	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1401	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	12/10/2019	
1725	PROTOCOLO	PROT -1054	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1402	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1726	PROTOCOLO	PROT -1055	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1402	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1727	PROTOCOLO	PROT -1056	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1402	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1728	PROTOCOLO	PROT -1057	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1402	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1729	PROTOCOLO	PROT -1058	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1402	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	12/10/2019	
1730	PROTOCOLO	PROT -1059	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S3 - 1402	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	12/10/2019	
1731	PROTOCOLO	PROT -1060	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1403	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1732	PROTOCOLO	PROT -1061	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1403	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1733	PROTOCOLO	PROT -1062	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1403	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1734	PROTOCOLO	PROT -1063	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1403	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1735	PROTOCOLO	PROT -1064	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1403	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	12/10/2019	
1736	PROTOCOLO	PROT -1065	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1403	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1737	PROTOCOLO	PROT -1066	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1403	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	12/10/2019	
1738	PROTOCOLO	PROT -1067	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1403	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	12/10/2019	
1739	PROTOCOLO	PROT -1068	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1404	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1740	PROTOCOLO	PROT -1069	12/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]			14	S2 - 1404	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	[redacted]
1741	PROTOCOLO	PROT -1070	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1404	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1742	PROTOCOLO	PROT -1071	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1404	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, limpiar masillar y pintar	Levantado	12/10/2019	
1743	PROTOCOLO	PROT -1072	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1404	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1744	PROTOCOLO	PROT -1073	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1404	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	12/10/2019	
1745	PROTOCOLO	PROT -1074	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1404	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	12/10/2019	
1746	PROTOCOLO	PROT -1075	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1404	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	12/10/2019	
1747	PROTOCOLO	PROT -1076	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S2 - 1404	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	12/10/2019	
1748	PROTOCOLO	PROT -1077	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1405	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1749	PROTOCOLO	PROT -1078	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1405	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1750	PROTOCOLO	PROT -1079	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1405	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, limpiar masillar y pintar	Levantado	12/10/2019	
1751	PROTOCOLO	PROT -1080	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1405	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1752	PROTOCOLO	PROT -1081	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1405	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1753	PROTOCOLO	PROT -1082	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1405	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	12/10/2019	
1754	PROTOCOLO	PROT -1083	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1405	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	12/10/2019	
1755	PROTOCOLO	PROT -1084	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1405	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	12/10/2019	
1756	PROTOCOLO	PROT -1085	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1406	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1757	PROTOCOLO	PROT -1086	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1406	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1758	PROTOCOLO	PROT -1087	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1406	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1759	PROTOCOLO	PROT -1088	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1406	Puertas	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	12/10/2019	
1760	PROTOCOLO	PROT -1089	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1406	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1761	PROTOCOLO	PROT -1090	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1406	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	12/10/2019	
1762	PROTOCOLO	PROT -1091	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S1 - 1406	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	12/10/2019	
1763	PROTOCOLO	PROT -1092	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1407	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1764	PROTOCOLO	PROT -1093	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1407	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1765	PROTOCOLO	PROT -1094	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1407	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1766	PROTOCOLO	PROT -1095	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1407	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1767	PROTOCOLO	PROT -1096	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1407	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	12/10/2019	
1768	PROTOCOLO	PROT -1097	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1407	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1769	PROTOCOLO	PROT -1098	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1407	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	12/10/2019	
1770	PROTOCOLO	PROT -1099	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1407	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	12/10/2019	
1771	PROTOCOLO	PROT -1100	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1407	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1772	PROTOCOLO	PROT -1101	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1408	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1773	PROTOCOLO	PROT -1102	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1408	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1774	PROTOCOLO	PROT -1103	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1408	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1775	PROTOCOLO	PROT -1104	12/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]			14	S4 - 1408	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	12/10/2019	[redacted]
1776	PROTOCOLO	PROT -1105	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1408	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1777	PROTOCOLO	PROT -1106	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1408	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	12/10/2019	
1778	PROTOCOLO	PROT -1107	12/08/2019	Semana 33	GTC				14	S4 - 1408	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	12/10/2019	
1503	PROTOCOLO	PROT -832	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S3 - 901	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1504	PROTOCOLO	PROT -833	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S3 - 901	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1505	PROTOCOLO	PROT -834	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S3 - 901	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1506	PROTOCOLO	PROT -835	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S3 - 901	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1507	PROTOCOLO	PROT -836	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S3 - 901	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	10/10/2019	
1508	PROTOCOLO	PROT -837	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S3 - 901	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1509	PROTOCOLO	PROT -838	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S3 - 902	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1510	PROTOCOLO	PROT -839	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S3 - 902	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1511	PROTOCOLO	PROT -840	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S3 - 902	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1512	PROTOCOLO	PROT -841	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S3 - 902	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1513	PROTOCOLO	PROT -842	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S3 - 902	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1514	PROTOCOLO	PROT -843	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S2 - 903	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1515	PROTOCOLO	PROT -844	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S2 - 903	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1516	PROTOCOLO	PROT -845	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S2 - 903	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1517	PROTOCOLO	PROT -846	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S2 - 903	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1518	PROTOCOLO	PROT -847	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S2 - 903	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	10/10/2019	
1519	PROTOCOLO	PROT -848	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S2 - 903	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1520	PROTOCOLO	PROT -849	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S2 - 904	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1521	PROTOCOLO	PROT -850	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S2 - 904	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1522	PROTOCOLO	PROT -851	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S2 - 904	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1523	PROTOCOLO	PROT -852	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S2 - 904	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1524	PROTOCOLO	PROT -853	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S2 - 904	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	10/10/2019	
1525	PROTOCOLO	PROT -854	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S2 - 904	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1526	PROTOCOLO	PROT -855	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S1 - 905	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1527	PROTOCOLO	PROT -856	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S1 - 905	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1528	PROTOCOLO	PROT -857	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S1 - 905	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1529	PROTOCOLO	PROT -858	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S1 - 905	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1530	PROTOCOLO	PROT -859	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S1 - 905	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	10/10/2019	
1531	PROTOCOLO	PROT -860	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S1 - 905	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	10/10/2019	
1532	PROTOCOLO	PROT -861	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S1 - 906	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1533	PROTOCOLO	PROT -862	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S1 - 906	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1534	PROTOCOLO	PROT -863	13/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]			9	S1 - 906	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	[redacted]
1535	PROTOCOLO	PROT -864	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S1 - 906	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1536	PROTOCOLO	PROT -865	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S1 - 906	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	10/10/2019	
1537	PROTOCOLO	PROT -866	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S1 - 906	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1538	PROTOCOLO	PROT -867	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S1 - 906	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	10/10/2019	
1539	PROTOCOLO	PROT -868	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 907	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1540	PROTOCOLO	PROT -869	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 907	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1541	PROTOCOLO	PROT -870	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 907	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1542	PROTOCOLO	PROT -871	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 907	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1543	PROTOCOLO	PROT -872	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 907	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	10/10/2019	
1544	PROTOCOLO	PROT -873	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 907	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	10/10/2019	
1545	PROTOCOLO	PROT -874	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 907	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1546	PROTOCOLO	PROT -875	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 908	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1547	PROTOCOLO	PROT -876	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 908	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1548	PROTOCOLO	PROT -877	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 908	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1549	PROTOCOLO	PROT -878	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 908	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	10/10/2019	
1550	PROTOCOLO	PROT -879	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 908	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	10/10/2019	
1551	PROTOCOLO	PROT -880	13/08/2019	Semana 33	GTC				9	S4 - 908	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	10/10/2019	
1573	PROTOCOLO	PROT -902	13/08/2019	Semana 33	GTC				10	S2 - 1005	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1595	PROTOCOLO	PROT -924	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S3 - 1101	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1596	PROTOCOLO	PROT -925	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S3 - 1101	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1597	PROTOCOLO	PROT -926	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S3 - 1101	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1598	PROTOCOLO	PROT -927	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S3 - 1101	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	11/10/2019	
1599	PROTOCOLO	PROT -928	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S3 - 1101	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	11/10/2019	
1600	PROTOCOLO	PROT -929	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S3 - 1102	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	
1601	PROTOCOLO	PROT -930	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S3 - 1102	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1602	PROTOCOLO	PROT -931	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S3 - 1102	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1603	PROTOCOLO	PROT -932	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S3 - 1102	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1604	PROTOCOLO	PROT -933	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1103	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	10/10/2019	
1605	PROTOCOLO	PROT -934	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1103	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1606	PROTOCOLO	PROT -935	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1103	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1607	PROTOCOLO	PROT -936	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1103	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1608	PROTOCOLO	PROT -937	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1103	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	11/10/2019	
1609	PROTOCOLO	PROT -938	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1103	Cocina	Acabados	Equipamiento eléctrico	Desnivel	Nivelar equipmaiento electrico	Levantado	11/10/2019	
1610	PROTOCOLO	PROT -939	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1103	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	11/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA: [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1611	PROTOCOLO	PROT -940	13/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]			11	S2 - 1104	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	[redacted]
1612	PROTOCOLO	PROT -941	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1104	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1613	PROTOCOLO	PROT -942	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1104	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1614	PROTOCOLO	PROT -943	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1104	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1615	PROTOCOLO	PROT -944	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1104	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	11/10/2019	
1616	PROTOCOLO	PROT -945	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1104	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	11/10/2019	
1617	PROTOCOLO	PROT -946	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S2 - 1104	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	11/10/2019	
1631	PROTOCOLO	PROT -960	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S4 - 1107	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	
1632	PROTOCOLO	PROT -961	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S4 - 1107	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1633	PROTOCOLO	PROT -962	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S4 - 1107	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1634	PROTOCOLO	PROT -963	13/08/2019	Semana 33	GTC				11	S4 - 1107	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	11/10/2019	
481	RONC	Ronc -481	14/08/2019	Semana 33	GTC				1	S3- 1908	Sala	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Falla en procedimiento	Resanar el muro y volver a colocar el rodon	Levantado	14/08/2019	
1635	PROTOCOLO	PROT -964	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S3 - 1201	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	
1636	PROTOCOLO	PROT -965	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S3 - 1201	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1637	PROTOCOLO	PROT -966	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S3 - 1201	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1638	PROTOCOLO	PROT -967	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S3 - 1202	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	
1639	PROTOCOLO	PROT -968	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S3 - 1202	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1640	PROTOCOLO	PROT -969	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S3 - 1202	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1641	PROTOCOLO	PROT -970	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S3 - 1202	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	11/10/2019	
1642	PROTOCOLO	PROT -971	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S2 - 1203	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	
1643	PROTOCOLO	PROT -972	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S2 - 1203	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1644	PROTOCOLO	PROT -973	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S2 - 1203	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1645	PROTOCOLO	PROT -974	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S2 - 1203	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	11/10/2019	
1646	PROTOCOLO	PROT -975	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S2 - 1203	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	11/10/2019	
1647	PROTOCOLO	PROT -976	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S2 - 1204	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	
1648	PROTOCOLO	PROT -977	14/08/2019	Semana 33	GTC				12	S2 - 1204	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
486	RONC	Ronc -486	15/08/2019	Semana 33	GTC				8 - 807	S3- 08	Fachadas	Acabados	Pintura Exterior	Mancha	Lijar y mejorar acabado	Levantado	15/08/2019	
487	RONC	Ronc -487	15/08/2019	Semana 33	GTC				-	-	Cisterna	Obras Exteriores	Ventanas y/o Mamparas	falta de limpieza / orden	Se comunico al capataz para que retire, material de excavacion de la zona peatonal	Levantado	15/08/2019	
1674	PROTOCOLO	PROT -1003	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S3 - 1301	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	13/10/2019	
1675	PROTOCOLO	PROT -1004	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S3 - 1301	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	13/10/2019	
1676	PROTOCOLO	PROT -1005	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S3 - 1301	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	13/10/2019	
1677	PROTOCOLO	PROT -1006	15/08/2019	Semana 33	GTC				12	S3 - 1301	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	11/10/2019	
1678	PROTOCOLO	PROT -1007	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S3 - 1301	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	13/10/2019	
1679	PROTOCOLO	PROT -1008	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S3 - 1302	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1680	PROTOCOLO	PROT -1009	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S3 - 1302	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1681	PROTOCOLO	PROT -1010	15/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]			13	S3 - 1302	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	[redacted]
1682	PROTOCOLO	PROT -1011	15/08/2019	Semana 33	GTC				12	S3 - 1302	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1683	PROTOCOLO	PROT -1012	15/08/2019	Semana 33	GTC				12	S3 - 1302	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	12/10/2019	
1684	PROTOCOLO	PROT -1013	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S3 - 1302	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	12/10/2019	
1685	PROTOCOLO	PROT -1014	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S2 - 1303	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1686	PROTOCOLO	PROT -1015	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S2 - 1303	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1687	PROTOCOLO	PROT -1016	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S2 - 1303	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1688	PROTOCOLO	PROT -1017	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S2 - 1303	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1689	PROTOCOLO	PROT -1018	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S2 - 1303	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	12/10/2019	
1690	PROTOCOLO	PROT -1019	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S2 - 1303	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	12/10/2019	
1691	PROTOCOLO	PROT -1020	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1304	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1692	PROTOCOLO	PROT -1021	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1304	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1693	PROTOCOLO	PROT -1022	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1304	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1694	PROTOCOLO	PROT -1023	15/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1304	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
492	RONC	Ronc -492	16/08/2019	Semana 33	GTC				-	-	Concentradores	Equipamiento	Gabinetes	Oxido	Quitar el oxido y volver a pintar	Levantado	20/08/2019	
494	RONC	Ronc -494	16/08/2019	Semana 33	GTC				-	-	Redes exteriores	Equipamiento	Sistema de Gas	Ubicación incorrecta	Se encontró tubería de agua instalada antes de instalar tubería de gas, lo cual impedía la instalacion de la misma. Por ello se tubo que cortar tubería de agua para poder instalar la de gas.	Levantado	17/08/2019	
1649	PROTOCOLO	PROT -978	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S1 - 1205	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	
1650	PROTOCOLO	PROT -979	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S1 - 1205	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1651	PROTOCOLO	PROT -980	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S1 - 1205	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1652	PROTOCOLO	PROT -981	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S1 - 1205	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1653	PROTOCOLO	PROT -982	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S1 - 1205	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	11/10/2019	
1654	PROTOCOLO	PROT -983	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S1 - 1205	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	11/10/2019	
1655	PROTOCOLO	PROT -984	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S1 - 1206	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	
1656	PROTOCOLO	PROT -985	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S1 - 1206	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1657	PROTOCOLO	PROT -986	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S1 - 1206	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1658	PROTOCOLO	PROT -987	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S1 - 1206	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1659	PROTOCOLO	PROT -988	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S1 - 1206	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	11/10/2019	
1660	PROTOCOLO	PROT -989	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S1 - 1206	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	11/10/2019	
1661	PROTOCOLO	PROT -990	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S4 - 1207	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	
1662	PROTOCOLO	PROT -991	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S4 - 1207	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1663	PROTOCOLO	PROT -992	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S4 - 1207	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1664	PROTOCOLO	PROT -993	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S4 - 1207	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	11/10/2019	
1665	PROTOCOLO	PROT -994	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S4 - 1207	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	11/10/2019	
1666	PROTOCOLO	PROT -995	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S4 - 1207	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	11/10/2019	
1667	PROTOCOLO	PROT -996	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S4 - 1208	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	11/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1668	PROTOCOLO	PROT -997	16/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]			12	S4 - 1208	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	[redacted]
1669	PROTOCOLO	PROT -998	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S4 - 1208	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1670	PROTOCOLO	PROT -999	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S4 - 1208	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	11/10/2019	
1671	PROTOCOLO	PROT -1000	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S4 - 1208	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	11/10/2019	
1672	PROTOCOLO	PROT -1001	16/08/2019	Semana 33	GTC				11	S4 - 1208	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	11/10/2019	
1673	PROTOCOLO	PROT -1002	16/08/2019	Semana 33	GTC				12	S4 - 1208	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	11/10/2019	
1695	PROTOCOLO	PROT -1024	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1305	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1696	PROTOCOLO	PROT -1025	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1305	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1697	PROTOCOLO	PROT -1026	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1305	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1698	PROTOCOLO	PROT -1027	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1305	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1699	PROTOCOLO	PROT -1028	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1305	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	12/10/2019	
1700	PROTOCOLO	PROT -1029	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1305	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	12/10/2019	
1701	PROTOCOLO	PROT -1030	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1306	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1702	PROTOCOLO	PROT -1031	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1306	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1703	PROTOCOLO	PROT -1032	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1306	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1704	PROTOCOLO	PROT -1033	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S1 - 1306	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1705	PROTOCOLO	PROT -1034	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S4 - 1307	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1706	PROTOCOLO	PROT -1035	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S4 - 1307	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1707	PROTOCOLO	PROT -1036	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S4 - 1307	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1708	PROTOCOLO	PROT -1037	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S4 - 1307	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1709	PROTOCOLO	PROT -1038	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S4 - 1307	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	12/10/2019	
1710	PROTOCOLO	PROT -1039	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S4 - 1308	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	12/10/2019	
1711	PROTOCOLO	PROT -1040	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S4 - 1308	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1712	PROTOCOLO	PROT -1041	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S4 - 1308	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	12/10/2019	
1713	PROTOCOLO	PROT -1042	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S4 - 1308	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	12/10/2019	
1714	PROTOCOLO	PROT -1043	17/08/2019	Semana 33	GTC				13	S4 - 1308	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	12/10/2019	
1779	PROTOCOLO	PROT -1108	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S3 - 1501	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	14/10/2019	
1780	PROTOCOLO	PROT -1109	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S3 - 1501	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1781	PROTOCOLO	PROT -1110	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S3 - 1501	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1782	PROTOCOLO	PROT -1111	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S3 - 1501	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1783	PROTOCOLO	PROT -1112	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S3 - 1501	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	14/10/2019	
1784	PROTOCOLO	PROT -1113	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S3 - 1501	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	14/10/2019	
1785	PROTOCOLO	PROT -1114	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S3 - 1501	Baño 2	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	14/10/2019	
1786	PROTOCOLO	PROT -1115	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S3 - 1502	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	14/10/2019	
1787	PROTOCOLO	PROT -1116	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S3 - 1502	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1788	PROTOCOLO	PROT -1117	19/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]			15	S3 - 1502	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	[redacted]
1789	PROTOCOLO	PROT -1118	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S3 - 1502	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	14/10/2019	
1790	PROTOCOLO	PROT -1119	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S3 - 1502	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1791	PROTOCOLO	PROT -1120	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S3 - 1502	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	14/10/2019	
1792	PROTOCOLO	PROT -1121	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1503	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	14/10/2019	
1793	PROTOCOLO	PROT -1122	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1503	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1794	PROTOCOLO	PROT -1123	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1503	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1795	PROTOCOLO	PROT -1124	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1503	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1796	PROTOCOLO	PROT -1125	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1503	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	14/10/2019	
1797	PROTOCOLO	PROT -1126	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1503	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	14/10/2019	
1798	PROTOCOLO	PROT -1127	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1504	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	14/10/2019	
1799	PROTOCOLO	PROT -1128	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1504	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1800	PROTOCOLO	PROT -1129	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1504	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1801	PROTOCOLO	PROT -1130	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1504	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1802	PROTOCOLO	PROT -1131	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1504	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	14/10/2019	
1803	PROTOCOLO	PROT -1132	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1504	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	14/10/2019	
1804	PROTOCOLO	PROT -1133	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1504	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	14/10/2019	
1805	PROTOCOLO	PROT -1134	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1505	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	14/10/2019	
1806	PROTOCOLO	PROT -1135	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1505	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1807	PROTOCOLO	PROT -1136	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1505	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1808	PROTOCOLO	PROT -1137	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1505	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1809	PROTOCOLO	PROT -1138	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1505	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	14/10/2019	
1810	PROTOCOLO	PROT -1139	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1505	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	14/10/2019	
1811	PROTOCOLO	PROT -1140	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1506	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	14/10/2019	
1812	PROTOCOLO	PROT -1141	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1506	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1813	PROTOCOLO	PROT -1142	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1506	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1814	PROTOCOLO	PROT -1143	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1506	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1815	PROTOCOLO	PROT -1144	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1506	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	14/10/2019	
1816	PROTOCOLO	PROT -1145	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S2 - 1506	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	14/10/2019	
1817	PROTOCOLO	PROT -1146	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S1 - 1507	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	14/10/2019	
1818	PROTOCOLO	PROT -1147	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S1 - 1507	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1819	PROTOCOLO	PROT -1148	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S1 - 1507	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1820	PROTOCOLO	PROT -1149	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S1 - 1507	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	14/10/2019	
1821	PROTOCOLO	PROT -1150	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S1 - 1508	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	14/10/2019	
1822	PROTOCOLO	PROT -1151	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S1 - 1508	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1823	PROTOCOLO	PROT -1152	19/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]			15	S1 - 1508	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1824	PROTOCOLO	PROT -1153	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S1 - 1508	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	14/10/2019	
1825	PROTOCOLO	PROT -1154	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S1 - 1508	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	14/10/2019	
1826	PROTOCOLO	PROT -1155	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S1 - 1508	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	14/10/2019	
1827	PROTOCOLO	PROT -1156	19/08/2019	Semana 34	GTC				15	S1 - 1508	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	14/10/2019	
1828	PROTOCOLO	PROT -1157	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1601	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	15/10/2019	
1829	PROTOCOLO	PROT -1158	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1601	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1830	PROTOCOLO	PROT -1159	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1601	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1831	PROTOCOLO	PROT -1160	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1601	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	15/10/2019	
1832	PROTOCOLO	PROT -1161	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1601	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1833	PROTOCOLO	PROT -1162	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1601	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	15/10/2019	
1834	PROTOCOLO	PROT -1163	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1601	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	15/10/2019	
1835	PROTOCOLO	PROT -1164	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1601	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	15/10/2019	
1836	PROTOCOLO	PROT -1165	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1601	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	15/10/2019	
1837	PROTOCOLO	PROT -1166	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1602	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	15/10/2019	
1838	PROTOCOLO	PROT -1167	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1602	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1839	PROTOCOLO	PROT -1168	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1602	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1840	PROTOCOLO	PROT -1169	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1602	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1841	PROTOCOLO	PROT -1170	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1602	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	15/10/2019	
1842	PROTOCOLO	PROT -1171	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1602	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	15/10/2019	
1843	PROTOCOLO	PROT -1172	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1602	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	15/10/2019	
1844	PROTOCOLO	PROT -1173	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S3 - 1602	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	15/10/2019	
1845	PROTOCOLO	PROT -1174	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1603	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	15/10/2019	
1846	PROTOCOLO	PROT -1175	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1603	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1847	PROTOCOLO	PROT -1176	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1603	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1848	PROTOCOLO	PROT -1177	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1603	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	15/10/2019	
1849	PROTOCOLO	PROT -1178	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1603	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	15/10/2019	
1850	PROTOCOLO	PROT -1179	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1603	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	15/10/2019	
1851	PROTOCOLO	PROT -1180	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1603	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	15/10/2019	
1852	PROTOCOLO	PROT -1181	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1604	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	15/10/2019	
1853	PROTOCOLO	PROT -1182	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1604	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1854	PROTOCOLO	PROT -1183	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1604	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1855	PROTOCOLO	PROT -1184	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1604	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	15/10/2019	
1856	PROTOCOLO	PROT -1185	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1604	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1857	PROTOCOLO	PROT -1186	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1604	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	15/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1858	PROTOCOLO	PROT -1187	19/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]			16	S2 - 1604	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	15/10/2019	[redacted]
1859	PROTOCOLO	PROT -1188	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S2 - 1604	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	15/10/2019	
1860	PROTOCOLO	PROT -1189	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1605	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	15/10/2019	
1861	PROTOCOLO	PROT -1190	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1605	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1862	PROTOCOLO	PROT -1191	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1605	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1863	PROTOCOLO	PROT -1192	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1605	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	15/10/2019	
1864	PROTOCOLO	PROT -1193	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1605	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1865	PROTOCOLO	PROT -1194	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1605	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	15/10/2019	
1866	PROTOCOLO	PROT -1195	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1605	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	15/10/2019	
1867	PROTOCOLO	PROT -1196	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1605	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	15/10/2019	
1868	PROTOCOLO	PROT -1197	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1606	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	15/10/2019	
1869	PROTOCOLO	PROT -1198	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1606	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1870	PROTOCOLO	PROT -1199	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1606	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1871	PROTOCOLO	PROT -1200	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1606	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1872	PROTOCOLO	PROT -1201	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1606	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	15/10/2019	
1873	PROTOCOLO	PROT -1202	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1606	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	15/10/2019	
1874	PROTOCOLO	PROT -1203	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S1 - 1606	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	15/10/2019	
1875	PROTOCOLO	PROT -1204	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1607	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	15/10/2019	
1876	PROTOCOLO	PROT -1205	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1607	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1877	PROTOCOLO	PROT -1206	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1607	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1878	PROTOCOLO	PROT -1207	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1607	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1879	PROTOCOLO	PROT -1208	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1607	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	15/10/2019	
1880	PROTOCOLO	PROT -1209	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1607	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	15/10/2019	
1881	PROTOCOLO	PROT -1210	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1608	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	15/10/2019	
1882	PROTOCOLO	PROT -1211	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1608	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1883	PROTOCOLO	PROT -1212	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1608	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1884	PROTOCOLO	PROT -1213	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1608	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	15/10/2019	
1885	PROTOCOLO	PROT -1214	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1608	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	15/10/2019	
1886	PROTOCOLO	PROT -1215	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1608	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	15/10/2019	
1887	PROTOCOLO	PROT -1216	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1608	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	15/10/2019	
1888	PROTOCOLO	PROT -1217	19/08/2019	Semana 34	GTC				16	S4 - 1608	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	15/10/2019	
505	RONC	Ronc -505	22/08/2019	Semana 34	GTC				21	-	Azotea	Arquitectura	Entubado PVC SAP	Falla en instalación	Se debe retirar entubado y cables electricos de ascensor,pues no es necesario instalar 2 tableros para el mismo.	Levantado	16/09/2019	
506	RONC	Ronc -506	22/08/2019	Semana 34	GTC				2 y 3	-	Pasadizo	Arquitectura	Solaqueo	Despostillamiento	Rellenar vanos de cajas de pase en pasadizos	Levantado	24/08/2019	
508	RONC	Ronc -508	22/08/2019	Semana 34	GTC				20 duplex	S4 - 2001	Terraza	Arquitectura	Concreto postvaciado	Fisura	Limpiar zona afectada y resanar	Levantado	2/09/2019	
509	RONC	Ronc -509	22/08/2019	Semana 34	GTC				3	S4 -301	Pasadizo	Arquitectura	Concreto postvaciado	Cajoneo/Soplado	resanar zona afectada	Levantado	29/08/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
510	RONC	Ronc -510	22/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]			20	S2 - 2005	Terraza	Acabados	Enchape	Falla en procedimiento	Colocar sikaflex cada 3m en ceramico	Levantado	27/08/2019	
511	RONC	Ronc -511	22/08/2019	Semana 34	GTC				20	S4 - 2001	Sala	Acabados	Papel Mural	Desalineamiento	Retirar Papel y alinear con Bruña	Levantado	26/08/2019	
1943	PROTOCOLO	PROT -1272	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S3 - 1801	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
1944	PROTOCOLO	PROT -1273	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S3 - 1801	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1945	PROTOCOLO	PROT -1274	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S3 - 1801	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	22/10/2019	
1946	PROTOCOLO	PROT -1275	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S3 - 1801	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1947	PROTOCOLO	PROT -1276	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S3 - 1801	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
1948	PROTOCOLO	PROT -1277	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S3 - 1801	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
1949	PROTOCOLO	PROT -1278	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S3 - 1802	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
1950	PROTOCOLO	PROT -1279	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S3 - 1802	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1951	PROTOCOLO	PROT -1280	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S3 - 1802	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1952	PROTOCOLO	PROT -1281	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S3 - 1802	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
1953	PROTOCOLO	PROT -1282	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S3 - 1802	Baño 1	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	22/10/2019	
1954	PROTOCOLO	PROT -1283	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S2 - 1803	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
1955	PROTOCOLO	PROT -1284	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S2 - 1803	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1956	PROTOCOLO	PROT -1285	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S2 - 1803	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1957	PROTOCOLO	PROT -1286	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S2 - 1803	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
1958	PROTOCOLO	PROT -1287	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S2 - 1803	Baño 1	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	22/10/2019	
1959	PROTOCOLO	PROT -1288	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S2 - 1804	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
1960	PROTOCOLO	PROT -1289	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S2 - 1804	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1961	PROTOCOLO	PROT -1290	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S2 - 1804	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1962	PROTOCOLO	PROT -1291	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S2 - 1804	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
1963	PROTOCOLO	PROT -1292	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S2 - 1804	Baño 1	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	22/10/2019	
1964	PROTOCOLO	PROT -1293	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S2 - 1804	Sala	Acabados	Equipamiento eléctrico	Dispositivo defectuoso	Cambiar focos de sala	Levantado	22/10/2019	
1965	PROTOCOLO	PROT -1294	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S2 - 1804	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
1966	PROTOCOLO	PROT -1295	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S4 - 1805	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
1967	PROTOCOLO	PROT -1296	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S4 - 1805	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1969	PROTOCOLO	PROT -1298	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S4 - 1805	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1970	PROTOCOLO	PROT -1299	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S4 - 1805	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
1971	PROTOCOLO	PROT -1300	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S4 - 1805	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	22/10/2019	
1972	PROTOCOLO	PROT -1301	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S4 - 1805	Baño 1	Acabados	Equipamiento sanitario	Oxido	Cambiar pieza oxidada	Levantado	22/10/2019	
1973	PROTOCOLO	PROT -1302	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S4 - 1805	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
1974	PROTOCOLO	PROT -1303	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S4 - 1806	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
1975	PROTOCOLO	PROT -1304	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S4 - 1806	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1976	PROTOCOLO	PROT -1305	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S4 - 1806	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1977	PROTOCOLO	PROT -1306	22/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]			18	S4 - 1806	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	[redacted]
1978	PROTOCOLO	PROT -1307	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S4 - 1806	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
1979	PROTOCOLO	PROT -1308	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S1 - 1807	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
1980	PROTOCOLO	PROT -1309	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S1 - 1807	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1981	PROTOCOLO	PROT -1310	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S1 - 1807	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1982	PROTOCOLO	PROT -1311	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S1 - 1807	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	22/10/2019	
1983	PROTOCOLO	PROT -1312	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S1 - 1807	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
1984	PROTOCOLO	PROT -1313	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S1 - 1807	Baño 1	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	22/10/2019	
1985	PROTOCOLO	PROT -1314	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S1 - 1807	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
1986	PROTOCOLO	PROT -1315	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S1 - 1808	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
1987	PROTOCOLO	PROT -1316	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S1 - 1808	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1988	PROTOCOLO	PROT -1317	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S1 - 1808	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1989	PROTOCOLO	PROT -1318	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S1 - 1808	Baño 1	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	22/10/2019	
1990	PROTOCOLO	PROT -1319	22/08/2019	Semana 34	GTC				18	S1 - 1808	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
1991	PROTOCOLO	PROT -1320	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1901	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
1992	PROTOCOLO	PROT -1321	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1901	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1993	PROTOCOLO	PROT -1322	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1901	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	22/10/2019	
1994	PROTOCOLO	PROT -1323	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1901	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
1995	PROTOCOLO	PROT -1324	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1901	Baño 2	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	22/10/2019	
1996	PROTOCOLO	PROT -1325	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1901	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
1997	PROTOCOLO	PROT -1326	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1901	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	22/10/2019	
1998	PROTOCOLO	PROT -1327	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1901	Baño 1	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	22/10/2019	
1999	PROTOCOLO	PROT -1328	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1901	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
2000	PROTOCOLO	PROT -1329	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1902	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
2001	PROTOCOLO	PROT -1330	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1902	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2002	PROTOCOLO	PROT -1331	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1902	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2003	PROTOCOLO	PROT -1332	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1902	Baño 2	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	22/10/2019	
2004	PROTOCOLO	PROT -1333	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1902	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
2005	PROTOCOLO	PROT -1334	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1902	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	22/10/2019	
2006	PROTOCOLO	PROT -1335	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1902	Baño 1	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	22/10/2019	
2007	PROTOCOLO	PROT -1336	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S3 - 1902	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
2008	PROTOCOLO	PROT -1337	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1903	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
2009	PROTOCOLO	PROT -1338	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1903	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2010	PROTOCOLO	PROT -1339	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1903	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2011	PROTOCOLO	PROT -1340	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1903	Baño 2	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	22/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
2012	PROTOCOLO	PROT -1341	22/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]			19	S2 - 1903	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	[redacted]
2013	PROTOCOLO	PROT -1342	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1903	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	22/10/2019	
2014	PROTOCOLO	PROT -1343	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1903	Baño 1	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	22/10/2019	
2015	PROTOCOLO	PROT -1344	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1903	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
2016	PROTOCOLO	PROT -1345	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1904	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
2017	PROTOCOLO	PROT -1346	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1904	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2018	PROTOCOLO	PROT -1347	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1904	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	22/10/2019	
2019	PROTOCOLO	PROT -1348	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1904	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2020	PROTOCOLO	PROT -1349	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1904	Baño 2	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	22/10/2019	
2021	PROTOCOLO	PROT -1350	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1904	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
2022	PROTOCOLO	PROT -1351	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1904	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	22/10/2019	
2023	PROTOCOLO	PROT -1352	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S2 - 1904	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
2024	PROTOCOLO	PROT -1353	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1905	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
2025	PROTOCOLO	PROT -1354	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1905	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2026	PROTOCOLO	PROT -1355	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1905	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2027	PROTOCOLO	PROT -1356	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1905	Baño 2	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	22/10/2019	
2028	PROTOCOLO	PROT -1357	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1905	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
2029	PROTOCOLO	PROT -1358	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1905	Baño 2	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	22/10/2019	
2030	PROTOCOLO	PROT -1359	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1905	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
2031	PROTOCOLO	PROT -1360	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1906	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
2032	PROTOCOLO	PROT -1361	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1906	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2033	PROTOCOLO	PROT -1362	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1906	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2034	PROTOCOLO	PROT -1363	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1906	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2035	PROTOCOLO	PROT -1364	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1906	Baño 2	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	22/10/2019	
2036	PROTOCOLO	PROT -1365	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1906	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
2037	PROTOCOLO	PROT -1366	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1906	Baño 2	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	22/10/2019	
2038	PROTOCOLO	PROT -1367	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S1 - 1906	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
2039	PROTOCOLO	PROT -1368	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1907	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	
2040	PROTOCOLO	PROT -1369	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1907	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2041	PROTOCOLO	PROT -1370	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1907	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2042	PROTOCOLO	PROT -1371	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1907	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2043	PROTOCOLO	PROT -1372	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1907	Baño 2	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	22/10/2019	
2044	PROTOCOLO	PROT -1373	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1907	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
2045	PROTOCOLO	PROT -1374	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1907	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
2046	PROTOCOLO	PROT -1375	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1908	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	22/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
2047	PROTOCOLO	PROT -1376	22/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]			19	S4 - 1908	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	[redacted]
2048	PROTOCOLO	PROT -1377	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1908	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	22/10/2019	
2049	PROTOCOLO	PROT -1378	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1908	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	22/10/2019	
2050	PROTOCOLO	PROT -1379	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1908	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	22/10/2019	
2051	PROTOCOLO	PROT -1380	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1908	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	22/10/2019	
2052	PROTOCOLO	PROT -1381	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1908	Baño 1	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	22/10/2019	
2053	PROTOCOLO	PROT -1382	22/08/2019	Semana 34	GTC				19	S4 - 1908	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	22/10/2019	
2054	PROTOCOLO	PROT -1383	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2001	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	28/10/2019	
2055	PROTOCOLO	PROT -1384	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2001	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2056	PROTOCOLO	PROT -1385	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2001	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2057	PROTOCOLO	PROT -1386	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2001	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	28/10/2019	
2058	PROTOCOLO	PROT -1387	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2001	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2059	PROTOCOLO	PROT -1388	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2001	Piso	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	28/10/2019	
2060	PROTOCOLO	PROT -1389	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2001	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	28/10/2019	
2061	PROTOCOLO	PROT -1390	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2001	Cocina	Acabados	Equipamiento eléctrico	Cambiar foco malogrado	Cambiar focos de sala	Levantado	28/10/2019	
2062	PROTOCOLO	PROT -1391	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2001	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	28/10/2019	
2063	PROTOCOLO	PROT -1392	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2002	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	28/10/2019	
2064	PROTOCOLO	PROT -1393	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2002	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2065	PROTOCOLO	PROT -1394	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2002	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2066	PROTOCOLO	PROT -1395	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2002	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	28/10/2019	
2067	PROTOCOLO	PROT -1396	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2002	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2068	PROTOCOLO	PROT -1397	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2002	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	28/10/2019	
2069	PROTOCOLO	PROT -1398	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S3 - 2002	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	28/10/2019	
2070	PROTOCOLO	PROT -1399	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2003	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	28/10/2019	
2071	PROTOCOLO	PROT -1400	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2003	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2072	PROTOCOLO	PROT -1401	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2003	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2073	PROTOCOLO	PROT -1402	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2003	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2074	PROTOCOLO	PROT -1403	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2003	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	28/10/2019	
2075	PROTOCOLO	PROT -1404	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2003	Cocina	Acabados	Enchape	Trabajo inconcluso	Fraguar Parte faltante	Levantado	28/10/2019	
2076	PROTOCOLO	PROT -1405	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2003	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	28/10/2019	
2077	PROTOCOLO	PROT -1406	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2004	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	28/10/2019	
2078	PROTOCOLO	PROT -1407	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2004	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2079	PROTOCOLO	PROT -1408	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2004	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2080	PROTOCOLO	PROT -1409	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2004	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	28/10/2019	
2081	PROTOCOLO	PROT -1410	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2004	Piso	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
2082	PROTOCOLO	PROT -1411	23/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]			20	S2 - 2004	Puertas	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	28/10/2019	[redacted]
2083	PROTOCOLO	PROT -1412	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2004	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	28/10/2019	
2084	PROTOCOLO	PROT -1413	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2004	Sala	Acabados	Equipamiento eléctrico	Cambiar enchufe de sala	Cambiar focos de sala	Levantado	28/10/2019	
2085	PROTOCOLO	PROT -1414	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S2 - 2004	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	28/10/2019	
2086	PROTOCOLO	PROT -1415	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2005	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	28/10/2019	
2087	PROTOCOLO	PROT -1416	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2005	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2088	PROTOCOLO	PROT -1417	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2005	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2089	PROTOCOLO	PROT -1418	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2005	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	28/10/2019	
2090	PROTOCOLO	PROT -1419	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2005	Piso	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2091	PROTOCOLO	PROT -1420	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2005	Puertas	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	28/10/2019	
2092	PROTOCOLO	PROT -1421	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2005	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Despegado	Pegar con siliciona	Levantado	28/10/2019	
2093	PROTOCOLO	PROT -1422	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2005	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	28/10/2019	
2094	PROTOCOLO	PROT -1423	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2005	Sala	Acabados	Equipamiento eléctrico	Cambiar enchufe de sala	Cambiar focos de sala	Levantado	28/10/2019	
2095	PROTOCOLO	PROT -1424	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2005	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	28/10/2019	
2096	PROTOCOLO	PROT -1425	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2006	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	28/10/2019	
2097	PROTOCOLO	PROT -1426	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2006	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2098	PROTOCOLO	PROT -1427	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2006	Losa	Acabados	Escarchado	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2099	PROTOCOLO	PROT -1428	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2006	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Limar, masillar y pintar	Levantado	28/10/2019	
2100	PROTOCOLO	PROT -1429	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2006	Piso	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	28/10/2019	
2101	PROTOCOLO	PROT -1430	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2006	Puertas	Acabados	Piso Laminado	Mancha	Limpiar	Levantado	28/10/2019	
2102	PROTOCOLO	PROT -1431	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2006	Baño 1	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	28/10/2019	
2103	PROTOCOLO	PROT -1432	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S1 - 2006	Sala	Acabados	Equipamiento eléctrico	Cambiar enchufe de sala	Cambiar focos de sala	Levantado	28/10/2019	
2104	PROTOCOLO	PROT -1433	23/08/2019	Semana 34	GTC				20	S4 - 2007	Muro	Acabados	Papel mural	Rayadura	Retirar Papel rayado e instalar nuevo	Levantado	28/10/2019	
516	RONC	Ronc -516	26/08/2019	Semana 35	GTC				20	-	Fachada lateral izquierda	Acabados	Solaqueo	Desprendimiento	Limpieza de la zona afectada y resane de la seccion afectada	Levantado	27/08/2019	
517	RONC	Ronc -517	27/08/2019	Semana 35	GTC				1	-	Fachada	Acabados	Pintura	Mancha	Resanar manchas con cal o texturador	Levantado	2/10/2019	
518	RONC	Ronc -518	27/08/2019	Semana 35	GTC				4	-	Vestibulo previo	Arquitectura	Tabiquería	Desplome	Solaquear y homogeneizar medidas	Levantado	20/09/2019	
519	RONC	Ronc -519	27/08/2019	Semana 35	GTC				7	-	Escalera de emergencia	Arquitectura	Solaqueo	Trabajo inconcluso	Extraer el material del agujero y resanar posteriormente y proceder nuevamente con el pintado.	Levantado	29/08/2019	
520	RONC	Ronc -520	27/08/2019	Semana 35	GTC				16	-	Escalera de emergencia	Arquitectura	Solaqueo	Falta resane	Retirar Dunlopillo y rellenar quiñe con mortero de alta desistencia	Levantado	28/09/2019	
521	RONC	Ronc -521	27/08/2019	Semana 35	GTC				18	-	Fachada Parapeto Ascensor	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar texturado retirar empaste	Levantado	29/08/2019	
522	RONC	Ronc -522	27/08/2019	Semana 35	GTC				1	S3 - 108	Fachada	Acabados	Baranda Metálica	Desalineamiento	Alinear Estructura (retirar parlantes y soldadura para coregir)	Levantado	2/09/2019	
523	RONC	Ronc -523	27/08/2019	Semana 35	GTC				1	-	Estacionamiento	Obras Exteriores	Pavimentación	Falta resane	Limpiar huellas y evitar pase de minicargador	Abierto		
529	RONC	Ronc -529	29/08/2019	Semana 35	GTC				12	-	Estacionamiento	Obras Exteriores	Concreto postvaciado	Fisura	Aplicar lechada y dilatar por trazado con andadora. No volver a realizar vaciados con tinas de dos o mas paños	Abierto		
537	RONC	Ronc -537	2/09/2019	Semana 36	GTC				-	-	Toten	Obras Exteriores	Encofrado	Desnivel	Picar, tarrajear y solaquear la base del Toten	Levantado	3/09/2019	
538	RONC	Ronc -538	3/09/2019	Semana 36	GTC				-	-	-	Acabados	Pintura Exterior	Falla en procedimiento	Limpieza del excedente de color blanco	Levantado	5/09/2019	
539	RONC	Ronc -539	3/09/2019	Semana 36	GTC				1	-	Area comun	Acabados	Enchape	Desnivel	Nivelar el piso con el enchape	Levantado	9/09/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO: [redacted]
VERSIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
540	RONC	Ronc -540	3/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]			6	602	Baño 1	Acabados	IISS	Filtración	Reparar la tubería	Levantado	3/09/2019	[redacted]
541	RONC	Ronc -541	3/09/2019	Semana 36	GTC				1	S2 - 105	Fachada	Acabados	Pintura Exterior	Mal acabado	Perfilar vano y dar acabado de solaqueo y cal	Levantado	7/09/2019	
542	RONC	Ronc -542	3/09/2019	Semana 36	GTC				-	-	Humedales	Obras Exteriores	Acero	Mal almacenamiento	Se comunico al capataz para que mueva aceros que estaban almacenados en contactocon el suelo.	Levantado	4/09/2019	
559	RONC	Ronc -559	11/09/2019	Semana 37	GTC				-	-	Vereda Torre 12	Obras Exteriores	Concreto postvaciado	Rebaba	Picar y limpiar rebabas de concreto	Levantado	16/09/2019	
562	RONC	Ronc -562	12/09/2019	Semana 37	GTC				-	-	Humedal	Obras Exteriores	Acero	Desalineamiento	alinear acero para muro de humedal	Levantado	14/09/2019	
563	RONC	Ronc -563	12/09/2019	Semana 37	GTC				-	-	Humedal	Obras Exteriores	Acero	Armado incorrecto	Retirar acero ondeado y colocar varillas rectas	Levantado	14/09/2019	
564	RONC	Ronc -564	12/09/2019	Semana 37	GTC				4	-	Hall de Ascensores	Arquitectura	Concreto postvaciado	Quiñe	resanar quiñe en vaciado de contrapiso en salida de ascensor	Levantado	16/09/2019	
565	RONC	Ronc -565	12/09/2019	Semana 37	GTC				-	-	Exteriores torre 12	Obras Exteriores	Entubado PVC SAP	Mal almacenamiento	Se converso con encargadp de IIEE para que retire el material y lo almacene en un lugar correcto.	Levantado	13/09/2019	
566	RONC	Ronc -566	12/09/2019	Semana 37	GTC				2	-	Hall de Ascensores	Arquitectura	Concreto postvaciado	Fisura	Reparar fisura según procedimiento	Levantado	14/09/2019	
572	RONC	Ronc -572	16/09/2019	Semana 38	GTC				-	-	Pasadizo - gabinete ACI	Acabados	Sello cortafuego	Trabajo inconcluso	Se desmontó los gabinetes y se colocará sello cortafuego	Levantado	18/09/2019	
573	RONC	Ronc -573	17/09/2019	Semana 38	GTC				1	-	Ascensores	Equipamiento	Ascensores	Quiñe	Masillar quiñe y pintar	Levantado	30/09/2019	
574	RONC	Ronc -574	17/09/2019	Semana 38	GTC				4	S2 y S3	Pasadizo	Acabados	Solaqueo	Mal acabado	Amolado de protuberancia y pintado	Levantado	3/10/2019	
575	RONC	Ronc -575	17/09/2019	Semana 38	GTC				1	-	Toten	Obras Exteriores	Concreto postvaciado	Cangrejera	Reparacion de cangrejera	Levantado	21/09/2019	
576	RONC	Ronc -576	17/09/2019	Semana 38	GTC				-	S2	Fachada	Acabados	Carpintería Metálica	Falla en instalación	Reparar despostillamiento	Levantado	3/10/2019	
578	RONC	Ronc -578	17/09/2019	Semana 38	GTC				1	105	Sala	Arquitectura	Acabados	Falta sellado	Completar Sello de ventana exterior	Levantado	18/09/2019	
579	RONC	Ronc -579	17/09/2019	Semana 38	GTC				varios	-	Gabinetes ACI	Acabados	Pintura Interior	Trabajo inconcluso	Dar acabado de Pintura	Levantado	17/09/2019	
594	RONC	Ronc -594	23/09/2019	Semana 39	GTC				12	S2 - 1205 - 1206	-	Equipamiento	Sistema de Alarma Contraincendio	Falla en instalación	Cambiar tubería dañada	Levantado	27/09/2019	
595	RONC	Ronc -595	24/09/2019	Semana 39	GTC				1	-	Gabinete concentrador	Equipamiento	Concentradores	Mancha	Retirar mancha y retocar.	Levantado	1/10/2019	
596	RONC	Ronc -596	24/09/2019	Semana 39	GTC				1	-	Fachada exterior	Acabados	Solaqueo	Fisura	Hacer continuidad a bruñas en contrazocalo	Levantado	28/09/2019	
602	RONC	Ronc -602	24/09/2019	Semana 39	GTC				6	-	Vestibulo previo	Acabados	Pintura Interior	Humedad	Limpiar hongos con lejia y dar acabado de lejia	Levantado	28/09/2019	
607	RONC	Ronc -607	1/10/2019	Semana 40	GTC				-	-	Cerco perimetrico	Obras Exteriores	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar alveolos faltantes	Levantado	5/10/2019	
608	RONC	Ronc -608	2/10/2019	Semana 40	GTC				-	-	Vestibulo previo	Acabados	Sello corta fuego	Desprendimiento	Coordinandar para que se vuelva a poner el sello	Levantado	10/10/2019	
616	RONC	Ronc -616	3/10/2019	Semana 40	GTC				2	-	-	Acabados	Equipamiento eléctrico	Dispositivo defectuoso	Revisar sensor	Levantado	9/10/2019	
620	RONC	Ronc -620	7/10/2019	Semana 41	GTC				-	-	Salidas de agua Humedal	Obras Exteriores	Entubado PVC SAP	Trabajo inconcluso	Aplanar con capa o hacer pulido en salidas de agua con un radio de 20 cm	Levantado	12/10/2019	
621	RONC	Ronc -621	7/10/2019	Semana 41	GTC				-	-	Muro perimetrico	Obras Exteriores	Concreto postvaciado	Rebaba	Retirar Rebaba	Levantado	12/10/2019	
639	RONC	Ronc -639	11/10/2019	Semana 41	GTC				3	-	Escalera de emergencia	Arquitectura	Acabados	Cajoneo	Cajoneo en acabado de escalera, se debe picar y resanar.	Levantado	15/10/2019	
640	RONC	Ronc -640	11/10/2019	Semana 41	GTC				1	-	Pasadizo	Arquitectura	Concreto postvaciado	Fisura	Reparar fisura con rpocedimiento establecido.	Levantado	22/10/2019	
642	RONC	Ronc -642	14/10/2019	Semana 42	GTC				-	-	Exterior - jardin	Estructura	Entubado PVC SAP	Documentación inexistente	Se debe hacer un plano con el detalle de proteccion de las tuberias	Levantado	19/10/2019	
643	RONC	Ronc -643	15/10/2019	Semana 42	GTC				-	-	Sardinel - humedales	Estructura	Acero	Falta recubrimiento	Se indico al personal que respete recubrimiento de 2.5 cm del acero de encofrado	Levantado	15/10/2019	
651	RONC	Ronc -651	16/10/2019	Semana 42	GTC				1	-	-	Arquitectura	Entubado PEALPE	Filtración	Reparar tuberia	Levantado	25/10/2019	
652	RONC	Ronc -652	17/10/2019	Semana 42	GTC				1	-	Veredas	Obras Exteriores	Solaqueo	Discontinuidad	Realizar bruña	Levantado	17/10/2019	
655	RONC	Ronc -655	21/10/2019	Semana 43	GTC				OE	-	Estacionamiento	Obras Exteriores	Acero	Recubrimiento faltante	Colocar separadores de concreto para garantizar el recubrimiento	Levantado	21/10/2019	
656	RONC	Ronc -656	21/10/2019	Semana 43	GTC				-	-	Humedales	Obras Exteriores	Solaqueo	Rebaba	Retiro de rebaba para mejroar el acabado de los sardineles	Levantado	26/10/2019	
665	RONC	Ronc -665	24/10/2019	Semana 43	GTC				1	-	Fachada	Acabados	Pintura	Mal acabado	Se mejorará el acabado	Levantado	26/10/2019	
666	RONC	Ronc -666	24/10/2019	Semana 43	GTC				-	-	Muro perimetrico	Obras Exteriores	Tabiquería	Falta resane	Se debe dar resane en muro	Levantado	27/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
668	RONC	Ronc -668	25/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]			20	2001	Sala	Acabados	Ventanas y/o Mamparas	Falta sellado	Colocar silicona en mampara de duplex	Levantado	26/10/2019	[redacted]
669	RONC	Ronc -669	25/10/2019	Semana 43	GTC				20	-	Azotea	Arquitectura	Ladrillo pastelero	Falla en procedimiento	Colocar ladrillos en techo.	Levantado	28/10/2019	
1127	PROTOCOLO	PROT -456	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S3 - 101	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	31/10/2019	
1128	PROTOCOLO	PROT -457	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S3 - 101	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1129	PROTOCOLO	PROT -458	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S3 - 101	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Volver a mancillar y pintar	Levantado	31/10/2019	
1130	PROTOCOLO	PROT -459	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S3 - 101	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1131	PROTOCOLO	PROT -460	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S3 - 101	Cocina	Acabados	Enchape	Quiñe	Retirar ceramico e instaar otro	Levantado	31/10/2019	
1132	PROTOCOLO	PROT -461	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S3 - 101	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1133	PROTOCOLO	PROT -462	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S3 - 102	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	31/10/2019	
1134	PROTOCOLO	PROT -463	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S3 - 102	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1135	PROTOCOLO	PROT -464	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S3 - 102	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Volver a mancillar y pintar	Levantado	31/10/2019	
1136	PROTOCOLO	PROT -465	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S3 - 102	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1137	PROTOCOLO	PROT -466	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S3 - 102	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1138	PROTOCOLO	PROT -467	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S3 - 102	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1139	PROTOCOLO	PROT -468	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S2 - 103	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	31/10/2019	
1140	PROTOCOLO	PROT -469	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S2 - 103	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1141	PROTOCOLO	PROT -470	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S2 - 103	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Volver a mancillar y pintar	Levantado	31/10/2019	
1142	PROTOCOLO	PROT -471	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S2 - 103	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1143	PROTOCOLO	PROT -472	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S2 - 103	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1144	PROTOCOLO	PROT -473	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S2 - 103	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1145	PROTOCOLO	PROT -474	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S2 - 104	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1146	PROTOCOLO	PROT -475	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S2 - 104	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Volver a mancillar y pintar	Levantado	31/10/2019	
1147	PROTOCOLO	PROT -476	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S2 - 104	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1148	PROTOCOLO	PROT -477	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S2 - 104	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1149	PROTOCOLO	PROT -478	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 105	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	31/10/2019	
1150	PROTOCOLO	PROT -479	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 105	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1151	PROTOCOLO	PROT -480	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 105	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Volver a mancillar y pintar	Levantado	31/10/2019	
1152	PROTOCOLO	PROT -481	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 105	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1153	PROTOCOLO	PROT -482	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 105	Piso	Acabados	Piso Laminado	Despegado	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1154	PROTOCOLO	PROT -483	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 105	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1155	PROTOCOLO	PROT -484	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 105	Baño 2	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	31/10/2019	
1156	PROTOCOLO	PROT -485	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 105	Techo	Acabados	Equipamiento eléctrico	Material defectuoso	Cambiar equipamineto	Levantado	31/10/2019	
1157	PROTOCOLO	PROT -486	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 106	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	31/10/2019	
1158	PROTOCOLO	PROT -487	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 106	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1159	PROTOCOLO	PROT -488	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 106	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:	[redacted]
VERSIÓN:	
FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	4/11/2019

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Etapa del Proyecto	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de Levantamiento	Fecha de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1160	PROTOCOLO	PROT -489	29/10/2019	Semana 40	GTC	[redacted]			1	S1 - 106	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	[redacted]
1161	PROTOCOLO	PROT -490	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 106	Cocina	Acabados	Muebles de cocina y /o baños	Mancha	Retirar manchas de mueble	Levantado	31/10/2019	
1162	PROTOCOLO	PROT -491	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 106	Techo	Acabados	Equipamiento eléctrico	Material defectuoso	Cambiar equipamineto	Levantado	31/10/2019	
1163	PROTOCOLO	PROT -492	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S1 - 106	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1164	PROTOCOLO	PROT -493	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S4 - 107	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	31/10/2019	
1165	PROTOCOLO	PROT -494	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S4 - 107	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1166	PROTOCOLO	PROT -495	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S4 - 107	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1167	PROTOCOLO	PROT -496	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S4 - 107	Piso	Acabados	Piso Laminado	Despegado	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1168	PROTOCOLO	PROT -497	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S4 - 107	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1169	PROTOCOLO	PROT -498	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S4 - 108	Muro	Acabados	Papel mural	Mancha	Retirar Papel manchado e instalar nuevo	Levantado	31/10/2019	
1170	PROTOCOLO	PROT -499	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S4 - 108	Muro	Acabados	Pintura	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1171	PROTOCOLO	PROT -500	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S4 - 108	Terraza	Acabados	Baranda Metálica	Quiñe	Volver a mancillar y pintar	Levantado	31/10/2019	
1172	PROTOCOLO	PROT -501	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S4 - 108	Puertas	Acabados	Puertas y/o marcos	Mancha	Limpiar y volver a pintar dar acabado	Levantado	31/10/2019	
1173	PROTOCOLO	PROT -502	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S4 - 108	Piso	Acabados	Contrazócalo y/o Rodones	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
1174	PROTOCOLO	PROT -503	29/10/2019	Semana 40	GTC				1	S4 - 108	Ventanas	Acabados	Ventanas / Mamparas	Mancha	Retirar mancha	Levantado	31/10/2019	
879	PROTOCOLO	PROT -208	.3/05/2019	Semana 18	GTC				17	S2- 1704 - 1703	Muros	Arquitectura	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	3/05/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	[redacted]
SUB-JEFE DE GTC:	[redacted]
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
01	RONC	OBS - 01	3	13/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S3	[redacted]	ESTRUCTURA	Acero	Estribos mal espaciados	Se comunico al capataz que corrija la separacion. Reducir de30 cm 25 cm	Levantado	13/08/2019	[redacted]
02	RONC	OBS - 02	1	13/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2	[redacted]	ESTRUCTURA	Acero	Falla en procedimiento	se procedera a retirar el encofrado y colocar los roldanas	Levantado	13/08/2019	[redacted]
03	RONC	OBS - 03	1	13/08/2019	Semana 33	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	1	S2	[redacted]	ESTRUCTURA	Sistema de Agua Contra Incendio	Falla en instalación	Picar la losa para sentir el collarin de la valvula, pos vaciado y desencofrado y colocar la valvula	Levantado	17/08/2019	[redacted]
04	RONC	OBS - 04	1	13/08/2019	Semana 33	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	1	S1	[redacted]	ESTRUCTURA	Encofrado	Armado incorrecto	Se coordino la señalizacion del error para su posterior correcion	Levantado	20/08/2019	[redacted]
05	RONC	OBS - 05	1	13/08/2019	Semana 33	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	1	S1	[redacted]	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Segregación	Evitar el exceso de vibrado para evitar que el concreto pierda agua	Levantado	14/08/2019	[redacted]
06	PROTOCOLO	OBS - 06	4	13/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 106 - 105	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	10/09/2019	[redacted]
07	PROTOCOLO	OBS - 07	1	13/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 106	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	10/09/2019	[redacted]
08	PROTOCOLO	OBS - 08	3	13/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 106 - 105	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	10/09/2019	[redacted]
09	PROTOCOLO	OBS - 09	3	13/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 106 - 105	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	10/09/2019	[redacted]
10	PROTOCOLO	OBS - 10	5	14/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2 - 104 - 103	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	10/09/2019	[redacted]
11	PROTOCOLO	OBS - 11	3	14/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2 - 104 - 103	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	10/09/2019	[redacted]
12	PROTOCOLO	OBS - 12	1	14/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2 - 103	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	10/09/2019	[redacted]
13	RONC	OBS - 13	1	15/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	105	[redacted]	ESTRUCTURA	Encofrado	Apuntalamiento Inadecuado	Se informo al capataz para que apuntalen correctamente las losas luego del desencofrado.	Levantado	15/08/2019	[redacted]
15	RONC	OBS - 15	1	15/08/2019	Semana 33	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	1	S3	[redacted]	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Rebaba	picado de rebaba en el encuentro de muro - piso	Levantado	19/08/2019	[redacted]
16	RONC	OBS - 16	1	15/08/2019	Semana 33	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	1	S3	[redacted]	ESTRUCTURA	Encofrado	Desalineamiento	Amolado de muro en la parte baja	Levantado	19/08/2019	[redacted]
14	RONC	OBS - 14	1	15/08/2019	Semana 33	OT	[redacted]	[redacted]	1	106	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	16/08/2019	[redacted]
17	PROTOCOLO	OBS - 17	8	15/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S3 - 101 - 102	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	10/09/2019	[redacted]
18	PROTOCOLO	OBS - 18	2	15/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S3 - 101 - 102	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	10/09/2019	[redacted]
19	PROTOCOLO	OBS - 19	6	15/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S3 - 101 - 102	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	10/09/2019	[redacted]
20	RONC	OBS - 20	1	16/08/2019	Semana 33	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	1	S1	[redacted]	ESTRUCTURA	Encofrado	Trabajo inconcluso	Retiro de corbata.	Levantado	16/08/2019	[redacted]
21	PROTOCOLO	OBS - 21	7	16/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 107 - 108	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	10/09/2019	[redacted]
22	PROTOCOLO	OBS - 22	4	16/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 107 - 108	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	10/09/2019	[redacted]
23	PROTOCOLO	OBS - 23	1	16/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 107	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	10/09/2019	[redacted]
24	PROTOCOLO	OBS - 24	8	17/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 206 - 205	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	12/09/2019	[redacted]
25	PROTOCOLO	OBS - 25	3	17/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 206 - 205	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	12/09/2019	[redacted]
26	RONC	OBS - 26	1	18/08/2019	Semana 33	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2 - 104	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falla en procedimiento	Picar y reubicar tubería	Levantado	19/08/2019	[redacted]
27	RONC	OBS - 27	1	19/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2 - 104	SALA - COMEDOR	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Falla en procedimiento	Garantizar mayor recubrimiento para tuberia, cambiar seccion afectada y rezanar	Levantado	7/09/2019	[redacted]
29	RONC	OBS - 29	1	19/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 207 -208	COCINA	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Falla en procedimiento	Se debe cortar acero y colocar caja dentro del acero. Luego se debe reforzar con acero parte de la caja.	Levantado	20/08/2019	[redacted]
28	RONC	OBS - 28	1	19/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 108	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Burbujas	Rellenar con mortero y dar acabado uniforme	Levantado	24/08/2019	[redacted]
30	PROTOCOLO	OBS - 30	3	19/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 204 - 203	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	12/09/2019	[redacted]
31	PROTOCOLO	OBS - 31	2	19/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 204 - 203	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	12/09/2019	[redacted]
32	RONC	OBS - 32	1	20/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S3	COCINA	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Documentación incorrecta	Mandar RFI para que modifiquen plano de tomacorriente. Zumbador debe empalmar circuito tomacorriente s	Levantado	21/08/2019	[redacted]
33	RONC	OBS - 33	1	20/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3 - 201	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	20/08/2019	[redacted]
34	RONC	OBS - 34	1	20/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S3 - 202	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falla en procedimiento	Limpieza y llenado de concreto en alfaizer de ventana	Levantado	20/08/2019	[redacted]
35	PROTOCOLO	OBS - 35	6	20/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3 - 201 - 202	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	12/09/2019	[redacted]
36	PROTOCOLO	OBS - 36	1	20/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3 - 201	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	12/09/2019	[redacted]
37	PROTOCOLO	OBS - 37	2	20/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 202	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	12/09/2019	[redacted]
38	RONC	OBS - 38	1	21/08/2019	Semana 34	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	1	S4	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Apuntalamiento Inadecuado	Mejorar colocación de puntales antes del vaciado	Levantado	21/08/2019	[redacted]
39	RONC	OBS - 39	1	21/08/2019	Semana 34	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	3	S2	CAJA DE ASCENSORES	ESTRUCTURA	Acero	Falla en procedimiento	Se llamo al capataz de 2A para que corrija el Zuncho	Levantado	21/08/2019	[redacted]
40	RONC	OBS - 40	1	21/08/2019	Semana 34	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	1	S4	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en instalación	Colocar la totalidad de pines y chavetas al encofrado	Levantado	21/08/2019	[redacted]
41	PROTOCOLO	OBS - 41	6	21/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 207 - 208	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	12/09/2019	[redacted]
42	PROTOCOLO	OBS - 42	1	21/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 207	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	12/09/2019	[redacted]
43	PROTOCOLO	OBS - 43	3	21/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 404	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	12/09/2019	[redacted]
45	RONC	OBS - 45	1	22/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2	-	ARQUITECTURA	Encofrado	Falla en procedimiento	Limpiar residuos de encofrado con soplador	Levantado	22/08/2019	[redacted]
46	RONC	OBS - 46	1	22/08/2019	Semana 34	OT	[redacted]	[redacted]	3	S2	SALA - COMEDOR	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Almacenaje incorrecto	Se Indico a personal no sobrecargar losas de sala con acero para evitar fisuras	Levantado	22/08/2019	[redacted]
47	RONC	OBS - 47	1	22/08/2019	Semana 34	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	3	S3	COCINA	ESTRUCTURA	Acero	Error en empalme	Se coloco refuerzo de acero en cajas de tablero metalico	Levantado	22/08/2019	[redacted]
48	RONC	OBS - 48	1	22/08/2019	Semana 34	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	4	S2	-	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Reparar tubería antes del vaciado	Levantado	22/08/2019	[redacted]
49	RONC	OBS - 49	1	22/08/2019	Semana 34	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	2	S4	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en procedimiento	No completr encofrado con remates . El remte al no estar sujeto por grapas, pineles o chavetas genera un desfase	Levantado	23/08/2019	[redacted]
50	RONC	OBS - 50	1	22/08/2019	Semana 34	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	2	S1	-	ESTRUCTURA	Entubado PEALPE	Dimensión incorrecta	Se va a proceder a picar y correr la caja en los muros. Se va a ajustar mejor los nichos	Levantado	24/08/2019	[redacted]
44	RONC	OBS - 44	1	22/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	26/08/2019	[redacted]
51	PROTOCOLO	OBS - 51	6	22/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 306 - 305	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	16/09/2019	[redacted]
52	PROTOCOLO	OBS - 52	1	22/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 306 - 305	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	16/09/2019	[redacted]
55	RONC	OBS - 55	1	23/08/2019	Semana 34	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	3	S2	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en procedimiento	Cambiar alineador por uno mas largo, que contenga todo el largo del muro	Levantado	23/08/2019	[redacted]
56	RONC	OBS - 56	1	23/08/2019	Semana 34	OT	[redacted]	[redacted]	3	S1	-	ESTRUCTURA	Acero	Falla en procedimiento	Colocar los alambres dentro de la estructura para no generar óxido	Levantado	23/08/2019	[redacted]
53	RONC	OBS - 53	2	23/08/2019	Semana 34	OT	[redacted]	[redacted]	2	204	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Acero/Alambre expuesto	Se debera cortar y quitar el alambre suelto en el muro.	Levantado	24/08/2019	[redacted]
54	RONC	OBS - 54	1	23/08/2019	Semana 34	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	2	S2	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falla en procedimiento	Retiro de las corbatas por su parte posterior, resane	Levantado	23/08/2019	[redacted]
57	PROTOCOLO	OBS - 57	6	23/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 304 - 303	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	16/09/2019	[redacted]
58	PROTOCOLO	OBS - 58	2	23/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 304	DORMITORIO 2 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	16/09/2019	[redacted]
59	PROTOCOLO	OBS - 59	1	23/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 304	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	16/09/2019	[redacted]
60	PROTOCOLO	OBS - 60	5	24/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S3 - 301 - 302	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	16/09/2019	[redacted]
61	PROTOCOLO	OBS - 61	1	24/08/2019	Semana 34	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S3 - 302	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	16/09/2019	[redacted]
62	PROTOCOLO	OBS - 62	7	26/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S4 - 407 - 408	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	16/09/2019	[redacted]
63	PROTOCOLO	OBS - 63	7	26/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S4 - 408	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falla en procedimiento	Colocar puntales según el plano	Levantado	16/09/2019	[redacted]
64	PROTOCOLO	OBS - 64	8	26/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S4 - 408	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	16/09/2019	[redacted]
65	PROTOCOLO	OBS - 65	2	26/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 307 - 308	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	16/09/2019	[redacted]
66	RONC	OBS - 66	1	27/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S3	-	ESTRUCTURA	Acero	Ubicación incorrecta	Se informo a 2A para que vuelva a colocar el separador para que la caja este pegado al encofrado	Levantado	27/08/2019	[redacted]
67	RONC	OBS - 67	1	27/08/2019	Semana 35	OT	[redacted]	[redacted]	3	S4 - 308	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Entubado PP	Tubería rota	Cambiar tubería rota ocacionada por tapa ducto	Levantado	31/08/2019	[redacted]
68	RONC	OBS - 68	1	27/08/2019	Semana 35	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	-	-	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Material defectuoso	Se realizó la solicitud de nuevas piezas	Levantado	27/08/2019	[redacted]
69	PROTOCOLO	OBS - 69	8	27/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S1 - 406 - 405	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	16/09/2019	[redacted]
70	PROTOCOLO	OBS - 70	3	27/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S1 - 406 - 405	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	16/09/2019	[redacted]
71	PROTOCOLO	OBS - 71	4	27/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S1 - 406 - 405	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	16/09/2019	[redacted]
72	RONC	OBS - 72	1	28/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	-	-	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Tiempo de espera mayor al aceptable	Se comunico a UNICON sobre los constantes retrasos	Levantado	28/08/2019	[redacted]
73	RONC	OBS - 73	1	28/08/2019	Semana 35	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	-	-	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en instalación	Se volvera a instruir al operario de encofrado que asegure correctamente las chavetas	Levantado	29/08/2019	[redacted]
74	RONC	OBS - 74	1	28/08/2019	Semana 35	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	4	S3	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en instalación	Mejorar en colocacion de alineador.	Levantado	28/08/2019	[redacted]
76	RONC	OBS - 76	1	28/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S2 - 403	-	ESTRUCTURA	Acero	Falta de recubrimiento	Colocar roldanas	Levantado	28/08/2019	[redacted]
75	RONC	OBS - 75	1	28/08/2019	Semana 35	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	3	S4	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	29/08/2019	[redacted]
77	RONC	OBS - 77	1	28/08/2019	Semana 35	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	3	Vestíbulo Previo	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Óxido	Reparar óxido	Levantado	28/08/2019	[redacted]
78	PROTOCOLO	OBS - 78	8	28/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S2 - 404 - 403	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	16/09/2019	[redacted]
79	PROTOCOLO	OBS - 79	2	28/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S2 - 404 - 403	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	16/09/2019	[redacted]
80	PROTOCOLO	OBS - 80	1	28/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S2 - 404	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	16/09/2019	[redacted]
81	PROTOCOLO	OBS - 81	1	28/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S2 - 404	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	16/09/2019	[redacted]
83	RONC	OBS - 83	1	29/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S4	-	ESTRUCTURA	Acero	Falta de limpieza	Limpiar el acero antes de vaciar	Levantado	31/08/2019	[redacted]
84	RONC	OBS - 84	1	29/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en instalación	Alinear el encofrado a la losa del sector anterior	Levantado	31/08/2019	[redacted]
82	RONC	OBS - 82	1	29/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S2 - 403	COCINA - SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Burbujas	Rellenar con mortero y dar acabado uniforme	Levantado	5/09/2019	[redacted]
85	PROTOCOLO	OBS - 85	7	29/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S3 - 401 - 402	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	16/09/2019	[redacted]
86	PROTOCOLO	OBS - 86	1	29/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S3 - 401	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	16/09/2019	[redacted]
87	PROTOCOLO	OBS - 87	1	29/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S3 - 402	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	16/09/2019	[redacted]
88	PROTOCOLO	OBS - 88	5	29/08/2019	Semana 35	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S3 - 401 - 402	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	16/09/2019	[redacted]
91	RONC	OBS - 91	1	2/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S2 - 504	TECHO	ESTRUCTURA	Acero	Falta de recubrimiento	Se enviara a un obrero para doblado del acero y se revisara el recubrimiento requerido de 2cm	Levantado	2/09/2019	[redacted]
89	RONC	OBS - 89	1	2/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 506	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	3/09/2019	[redacted]
90	RONC	OBS - 90	1	2/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 506	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta de recubrimiento	Picar alrededor, garantizar superficie de aderencia y rellenar con mortero de alta resistencia	Levantado	3/09/2019	[redacted]
92	PROTOCOLO	OBS - 92	8	2/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 506 - 505	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	19/09/2019	[redacted]
93	PROTOCOLO	OBS - 93	1	2/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 505	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	19/09/2019	[redacted]

[redacted]	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	[redacted]
SUB-JEFE DE GTC:	[redacted]
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
94	PROTOCOLO	OBS - 94	1	2/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 506	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	19/09/2019	[redacted]
95	RONC	OBS - 95	1	3/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	3	-	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Reparar pases con Planitop	Levantado	5/09/2019	[redacted]
96	PROTOCOLO	OBS - 96	8	3/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S2- 504 - 503	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	19/09/2019	[redacted]
97	PROTOCOLO	OBS - 97	2	3/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S2- 503	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	19/09/2019	[redacted]
98	PROTOCOLO	OBS - 98	1	3/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S2- 503	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falla en procedimiento	Colocar puntales según el plano	Levantado	19/09/2019	[redacted]
99	RONC	OBS - 99	1	4/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	P5 - S4	COCINA	ESTRUCTURA	Acero	Falta de recubrimiento	Se coordino con capataz 2A para que coloque roldanas en acero.para que tenga recubrimiento necesario	Levantado	4/09/2019	[redacted]
100	PROTOCOLO	OBS - 100	8	4/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S3 - 501 - 502	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	19/09/2019	[redacted]
101	PROTOCOLO	OBS - 101	1	4/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S3 - 501 - 502	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falla en procedimiento	Colocar puntales según el plano	Levantado	19/09/2019	[redacted]
102	PROTOCOLO	OBS - 102	3	4/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S3- 501	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	19/09/2019	[redacted]
103	RONC	OBS - 103	1	5/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	6	-	-	ESTRUCTURA	Acero	Dimensión incorrecta	Picar losa y grifar acero	Levantado	5/09/2019	[redacted]
104	RONC	OBS - 104	1	5/09/2019	Semana 36	OT	[redacted]	[redacted]	5	-	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Trabajo inconcluso	Retirar corbatas	Levantado	5/09/2019	[redacted]
105	RONC	OBS - 105	1	5/09/2019	Semana 36	OT	[redacted]	[redacted]	5	S2 - 503	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Trabajo inconcluso	Retirar Esquinero de muro con Tapa	Levantado	5/09/2019	[redacted]
107	RONC	OBS - 107	1	5/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en instalación	Se desarmo la seccion y se volvio a encofrar.	Levantado	5/09/2019	[redacted]
108	RONC	OBS - 108	1	5/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S2 - 604	DORMITORIO 2	ESTRUCTURA	Acero	Estribos mal espaciados	Capataz atortolo estribo a la distancia correspondiente 30 cm	Levantado	6/09/2019	[redacted]
106	RONC	OBS - 106	1	5/09/2019	Semana 36	OT	[redacted]	[redacted]	3		-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Acero/Alambre expuesto	Picar, retirar alambre y resanar	Levantado	5/09/2019	[redacted]
109	PROTOCOLO	OBS - 109	7	5/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 507 - 508	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	19/09/2019	[redacted]
110	PROTOCOLO	OBS - 110	1	5/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 507 - 508	DORMITORIO 1 - MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	19/09/2019	[redacted]
111	PROTOCOLO	OBS - 111	2	5/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 507	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	19/09/2019	[redacted]
112	PROTOCOLO	OBS - 112	2	5/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 508	DORMITORIO 2 - LOZAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	19/09/2019	[redacted]
113	RONC	OBS - 113	1	6/09/2019	Semana 36	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 505	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desnivel	Alinear caja de tablero electrico	Levantado	10/09/2019	[redacted]
114	RONC	OBS - 114	1	6/09/2019	Semana 36	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	4	S2 - 404	FACHADA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	18/09/2019	[redacted]
115	PROTOCOLO	OBS - 115	4	6/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 606 - 605	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	24/10/2019	[redacted]
116	PROTOCOLO	OBS - 116	1	6/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 605	ESTAR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	24/10/2019	[redacted]
117	PROTOCOLO	OBS - 117	1	6/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 605	ESTAR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	24/10/2019	[redacted]
118	PROTOCOLO	OBS - 118	4	7/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S2- 604 - 603	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	24/10/2019	[redacted]
119	PROTOCOLO	OBS - 119	2	7/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S2- 604	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	24/10/2019	[redacted]
120	PROTOCOLO	OBS - 120	2	7/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S2 - 603	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	24/10/2019	[redacted]
121	PROTOCOLO	OBS - 121	7	7/09/2019	Semana 36	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S2- 604 - 603	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	24/10/2019	[redacted]
122	RONC	OBS - 122	1	9/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4	DORMITORIO 1	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Falla de slump	Se tuvo que retemplar el concreto	Levantado	9/09/2019	[redacted]
123	PROTOCOLO	OBS - 123	5	9/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3 - 601 - 602	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	24/10/2019	[redacted]
124	PROTOCOLO	OBS - 124	1	9/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3 - 602	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	24/10/2019	[redacted]
125	PROTOCOLO	OBS - 125	7	9/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3- 601 - 602	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	24/10/2019	[redacted]
128	RONC	OBS - 128	1	10/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S2	SALA	ESTRUCTURA	Encofrado	Ausencia de accesorio	Se encontró pines sin chavetas en encofrado	Levantado	10/09/2019	[redacted]
126	RONC	OBS - 126	1	10/09/2019	Semana 37	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	2	S1- 206	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Despostillamiento	Limpiar y resanar con mortero de alta resistencia	Levantado	10/09/2019	[redacted]
127	RONC	OBS - 127	1	10/09/2019	Semana 37	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 207	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Rebaba	Limpiar rebaba	Levantado	10/09/2019	[redacted]
129	PROTOCOLO	OBS - 129	7	10/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S4 - 607 - 608	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	24/10/2019	[redacted]
130	PROTOCOLO	OBS - 130	1	10/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S4 - 607	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	24/10/2019	[redacted]
131	RONC	OBS - 131	1	11/09/2019	Semana 37	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	6	S3	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Desalineamiento	Cambio de alineadores de encofrado	Levantado	20/09/2019	[redacted]
132	RONC	OBS - 132	1	11/09/2019	Semana 37	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	5	S4	DUCTO DESAGUE	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Segregación	Mejorar proceso de vibrado	Levantado	12/09/2019	[redacted]
133	RONC	OBS - 133	1	11/09/2019	Semana 37	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 204	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	11/09/2019	[redacted]
134	RONC	OBS - 134	1	11/09/2019	Semana 37	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	2	-	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	11/09/2019	[redacted]
135	RONC	OBS - 135	1	11/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	11/09/2019	[redacted]
136	RONC	OBS - 136	1	11/09/2019	Semana 37	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	4	-	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	12/09/2019	[redacted]
137	PROTOCOLO	OBS - 137	6	11/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 706 - 705	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	27/10/2019	[redacted]
138	RONC	OBS - 138	1	11/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	2	-	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Solaqueo	Ausencia de protección	Colocar proteccion a derrames temrinados	Levantado	20/09/2019	[redacted]
139	RONC	OBS - 139	1	11/09/2019	Semana 37	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	4	-	ALFEIZER	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	12/09/2019	[redacted]
141	PROTOCOLO	OBS - 141	8	12/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S2 - 704 - 703	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	27/10/2019	[redacted]
142	PROTOCOLO	OBS - 142	2	12/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S2 - 704	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	27/10/2019	[redacted]
143	PROTOCOLO	OBS - 143	4	12/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S2 - 704 - 703	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	27/10/2019	[redacted]
140	RONC	OBS - 140	1	12/09/2019	Semana 37	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 107	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Solaqueo	Trabajo inconcluso	Se debe dejar solaque alineado a la placa	Levantado	13/09/2019	[redacted]
149	PROTOCOLO	OBS - 149	4	13/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S3 - 701 - 702	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	27/10/2019	[redacted]
144	RONC	OBS - 144	1	13/09/2019	Semana 37	OT	[redacted]	[redacted]	7	S4- 707	DORMITORIO 1	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Se rompio tubería por impacto de balde con tubería DACI. Se reparó la tuiberia en el mismo vaciado	Levantado	13/09/2019	[redacted]
145	RONC	OBS - 145	1	13/09/2019	Semana 37	OT	[redacted]	[redacted]	6	-	COCINA	ESTRUCTURA	Entubado PEALPE	Desnivel	Se debe cuadrar cajas de gas en cocina	Levantado	22-Set	[redacted]
146	RONC	OBS - 146	1	13/09/2019	Semana 37	OT	[redacted]	[redacted]	3	S1-305	DORMITORIO 1	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Desalineamiento	Caja de tomacorriente sobresale del muro, se debe picar y alinear a la placa	Levantado	22-Set	[redacted]
147	RONC	OBS - 147	1	13/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1	DORMITORIO 1	ESTRUCTURA	Acero	Falta de recubrimiento	Levantar el acero pegado a la losa	Levantado	13/09/2019	[redacted]
148	RONC	OBS - 148	1	13/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1	VESTÍBULO PREVIO	ESTRUCTURA	Encofrado	Ausencia de accesorio	Asegurar las piezas previo al vaciado	Levantado	13/09/2019	[redacted]
150	PROTOCOLO	OBS - 150	2	13/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S3 - 701	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	27/10/2019	[redacted]
151	PROTOCOLO	OBS - 151	2	13/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S3 - 701	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	27/10/2019	[redacted]
152	PROTOCOLO	OBS - 152	7	14/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S4 - 707 - 708	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	27/10/2019	[redacted]
153	PROTOCOLO	OBS - 153	1	14/09/2019	Semana 37	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S4 - 707	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	27/10/2019	[redacted]
154	RONC	OBS - 154	1	16/09/2019	Semana 38	OT	[redacted]	[redacted]	4	S1 - 405	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar y resanar con solaqueo	Levantado	21/09/2019	[redacted]
155	RONC	OBS - 155	1	16/09/2019	Semana 38	OT	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 705	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	21/09/2019	[redacted]
157	RONC	OBS - 157	1	16/09/2019	Semana 38	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 302	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Ondulaciones	Solaquear zonas criticas	Levantado	26/09/2019	[redacted]
156	RONC	OBS - 156	1	16/09/2019	Semana 38	OT	[redacted]	[redacted]	4	S1 - 405	DORMITORIO 3	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Se debe reparar la tuberia y resanar zona picada.	Levantado	21/09/2019	[redacted]
159	RONC	OBS - 159	1	16/09/2019	Semana 38	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 302	Sala	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Ondulaciones	Rellenar parte inferior para evitar observaciones en acabado de rodones	Levantado	16/09/2019	[redacted]
158	RONC	OBS - 158	1	16/09/2019	Semana 38	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 508	Sala	ESTRUCTURA	Encofrado	Material incorrecto	Se uso como encofrado soleras de madera, por ello se indico al capataz que se usen los encofrados metálicos.	Levantado	16/09/2019	[redacted]
160	PROTOCOLO	OBS - 160	7	16/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S1 - 805 - 806	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	26/09/2019	[redacted]
161	PROTOCOLO	OBS - 161	1	16/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S1 - 805	ESTAR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	26/09/2019	[redacted]
162	PROTOCOLO	OBS - 162	4	16/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S1 - 805 - 806	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	26/09/2019	[redacted]
163	PROTOCOLO	OBS - 163	7	16/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S1 - 805 - 806	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	26/09/2019	[redacted]
164	PROTOCOLO	OBS - 164	1	16/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S1 - 806	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	26/09/2019	[redacted]
165	RONC	OBS - 165	1	17/09/2019	Semana 38	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 306	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	23/09/2019	[redacted]
166	RONC	OBS - 166	1	17/09/2019	Semana 38	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	4	S4 - 407	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	27/09/2019	[redacted]
167	PROTOCOLO	OBS - 167	8	17/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 803 - 804	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	26/09/2019	[redacted]
168	PROTOCOLO	OBS - 168	5	17/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 803	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	26/09/2019	[redacted]
169	PROTOCOLO	OBS - 169	6	17/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 803 - 804	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	26/09/2019	[redacted]
170	PROTOCOLO	OBS - 170	2	17/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 803 - 804	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	26/09/2019	[redacted]
171	RONC	OBS - 171	1	17/09/2019	Semana 38	OT	[redacted]	[redacted]	4	-	PASADIZO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Acero/Alambre expuesto	Picar, cortar alambre y resanar	Levantado	18/09/2019	[redacted]
172	RONC	OBS - 172	1	18/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 801	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	21/09/2019	[redacted]
174	RONC	OBS - 174	1	18/09/2019	Semana 38	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 303	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	25/09/2019	[redacted]
176	PROTOCOLO	OBS - 176	4	18/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 801 - 802	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	26/09/2019	[redacted]
173	RONC	OBS - 173	1	18/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S3 - 802	SALA	ESTRUCTURA	Encofrado	Desprendimiento	Resanar desprendimiento	Levantado	21/09/2019	[redacted]
177	PROTOCOLO	OBS - 177	5	18/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 801 - 802	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	26/09/2019	[redacted]
175	RONC	OBS - 175	1	18/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	2	-	PASADIZO	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Ubicación incorrecta	Se debe coregir el registro de bateria de desague a 10 cm del muro	Levantado	21/09/2019	[redacted]
178	PROTOCOLO	OBS - 178	4	18/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 801 - 802	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	26/09/2019	[redacted]
179	PROTOCOLO	OBS - 179	1	18/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 801	LOSA - DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	26/09/2019	[redacted]
180	PROTOCOLO	OBS - 180	1	18/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 801	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	26/09/2019	[redacted]
181	RONC	OBS - 181	1	19/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 204	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Dimensión incorrecta	Corregir medidas a lo indicado en plano y dar acabado	Levantado	20/09/2019	[redacted]
185	PROTOCOLO	OBS - 185	4	19/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S4 - 807 - 808	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	26/09/2019	[redacted]
186	PROTOCOLO	OBS - 186	1	19/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S4 - 807	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	26/09/2019	[redacted]
182	RONC	OBS - 182	1	19/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1	VESTÍBULO PREVIO	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Trabajo inconcluso	No se colocó pase de tubería ACI en losa, se coloco el pase en el momento de la observación	Levantado	19/09/2019	[redacted]
183	RONC	OBS - 183	1	19/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1	LOSA	ESTRUCTURA	Acero	Diámetro incorrecto	Se comunicó al capataz para que coloque los refuerzos de 6mm cuando habian colocado de 8 mm	Levantado	19/09/2019	[redacted]
184	RONC	OBS - 184	1	19/09/2019	Semana 38	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	5	-	ESCALERA DE EMERGENCI	ESTRUCTURA	Encofrado	Armado incorrecto	Tarrajear la zona en donde la planchas se encuentra desnivelada respecto al fondo de escalera	Levantado	25/09/2019	[redacted]
187	PROTOCOLO	OBS - 187	5	19/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S4 - 807 - 808	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	26/09/2019	[redacted]
188	PROTOCOLO	OBS - 188	2	20/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 906 - 905	SALA - COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	26/09/2019	[redacted]
189	PROTOCOLO	OBS - 189	2	20/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 906 - 905	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	26/09/2019	[redacted]
190	PROTOCOLO	OBS - 190	6	20/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 906 - 905	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	26/09/2019	[redacted]
191	PROTOCOLO	OBS - 191	5	20/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 906 - 905	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	26/09/2019	[redacted]
192	PROTOCOLO	OBS - 192	8	20/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 906 - 905	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	26/09/2019	[redacted]
193	PROTOCOLO	OBS - 193	3	21/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 903 - 904	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	28/09/2019	[redacted]
194	PROTOCOLO	OBS - 194	5	21/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 903 - 904	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	28/09/2019	[redacted]
195	PROTOCOLO	OBS - 195	1	21/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 904	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	28/09/2019	[redacted]
196	PROTOCOLO	OBS - 196	7	21/09/2019	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 903 - 904	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	28/09/2019	[redacted]
197	RONC	OBS - 197	1	23/09/2019	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 903	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Burbujas	Rellenar con mortero y dar acabado uniforme	Levantado	26/09/2019	[redacted]
199	PROTOCOLO	OBS - 199	2	23/09/2019	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S3 - 902	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	5/10/2019	[redacted]
200	PROTOCOLO	OBS - 200	6	23/09/2019	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S3 - 901 - 902	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	6/10/2019	[redacted]

	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
198	RONC	OBS - 198	1	23/09/2019	Semana 39	GTC			5	-	HALL DE ASCENSORES	ESTRUCTURA	Encofrado	Almacenaje incorrecto	Colocar alineadores y puntales	Levantado	25/09/2019	
201	PROTOCOLO	OBS - 201	4	23/09/2019	Semana 39	GTC			9	S3 - 901 - 902	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	7/10/2019	
202	PROTOCOLO	OBS - 202	1	23/09/2019	Semana 39	GTC			9	S3 - 902	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	8/10/2019	
204	PROTOCOLO	OBS - 204	3	24/09/2019	Semana 39	GTC			9	S4 - 907 - 908	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	9/10/2019	
205	PROTOCOLO	OBS - 205	1	24/09/2019	Semana 39	GTC			9	S4 - 907	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	10/10/2019	
206	PROTOCOLO	OBS - 206	6	24/09/2019	Semana 39	GTC			9	S4 - 908	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	11/10/2019	
203	RONC	OBS - 203	1	24/09/2019	Semana 39	GTC			2	-	VESTÍBULO PREVIO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falla en procedimiento	Retirar acero y asegurar con epoxico	Levantado	30/09/2019	
207	RONC	OBS - 207	1	25/09/2019	Semana 39	GTC			10	S1 - 1006		ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	26/09/2019	
209	RONC	OBS - 209	1	25/09/2019	Semana 39	OT			6	S3 - 601	SALA - COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	27/09/2019	
210	RONC	OBS - 210	1	25/09/2019	Semana 39	PRODUCCIÓN			5	S2 - 504	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	2/10/2019	
211	RONC	OBS - 211	1	25/09/2019	Semana 39	PRODUCCIÓN			5	S3 - 501	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Despostillamiento	Limpiar y resanar con mortero de alta resistencia	Levantado	25/09/2019	
208	RONC	OBS - 208	1	25/09/2019	Semana 39	OT			7	-	VESTÍBULO PREVIO	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en procedimiento	Retirar corbatas	Levantado	28/09/2019	
214	RONC	OBS - 214	1	25/09/2019	Semana 39	PRODUCCIÓN			5	-	VESTIBULO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	2/10/2019	
215	RONC	OBS - 215	1	25/09/2019	Semana 39	PRODUCCIÓN			5		PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Burbujas	Rellenar con mortero y dar acabado uniforme	Levantado	2/10/2019	
216	RONC	OBS - 216	1	25/09/2019	Semana 39	PRODUCCIÓN			6	S2 - 604	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	2/10/2019	
212	RONC	OBS - 212	1	25/09/2019	Semana 39	PRODUCCIÓN			6	S2 - 604	PASADIZO	ESTRUCTURA	Encofrado	Desplome	Charla: mejorar aplome de encofrado	Levantado	2/10/2019	
213	RONC	OBS - 213	1	25/09/2019	Semana 39	PRODUCCIÓN			5	-	PASADIZO	ESTRUCTURA	Encofrado	Desalineamiento	Mejorar instalacion de encofrado	Levantado	2/10/2019	
218	PROTOCOLO	OBS - 218	8	25/09/2019	Semana 39	GTC			10	S1 - 1006 - 1005	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	7/10/2019	
219	PROTOCOLO	OBS - 219	3	25/09/2019	Semana 39	GTC			10	S1 - 1006 - 1005	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	7/10/2019	
220	PROTOCOLO	OBS - 220	1	25/09/2019	Semana 39	GTC			10	S1 - 1006	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	7/10/2019	
217	RONC	OBS - 217	1	25/09/2019	Semana 39	JEFE DE OBRA			9	-	COCINA	ESTRUCTURA	Acero	Desalineamiento	Alinear acero	Levantado	2/10/2019	
221	PROTOCOLO	OBS - 221	1	25/09/2019	Semana 39	GTC			10	S1 - 1005	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	7/10/2019	
222	PROTOCOLO	OBS - 222	1	25/09/2019	Semana 39	GTC			10	S1 - 1005	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	7/10/2019	
223	RONC	OBS - 223	1	25/09/2019	Semana 39	OT			2	-	ESCALERA DE EMERGENCI	ARQUITECTURA	Solaqueo	Obstrucción	Limpiar zona y verificar punto de luz	Levantado	28/09/2019	
224	RONC	OBS - 224	1	25/09/2019	Semana 39	PRODUCCIÓN			6	S2 - 604	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Solaqueo	Despostillamiento	Limpiar y resanar con mortero de alta resistencia	Levantado	2/10/2019	
225	PROTOCOLO	OBS - 225	4	26/09/2019	Semana 39	GTC			10	S2 - 1004- 1003	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	7/10/2019	
226	PROTOCOLO	OBS - 226	2	26/09/2019	Semana 39	GTC			10	S2 - 1004- 1003	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	7/10/2019	
227	PROTOCOLO	OBS - 227	3	26/09/2019	Semana 39	GTC			10	S2 - 1004- 1003	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	7/10/2019	
228	PROTOCOLO	OBS - 228	2	26/09/2019	Semana 39	GTC			10	S2 - 1004	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	7/10/2019	
229	PROTOCOLO	OBS - 229	1	26/09/2019	Semana 39	GTC			10	S2 - 1003	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	7/10/2019	
230	PROTOCOLO	OBS - 230	6	27/09/2019	Semana 39	GTC			10	S3 - 1001 -1002	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	7/10/2019	
231	PROTOCOLO	OBS - 231	2	27/09/2019	Semana 39	GTC			10	S3 - 1001 -1002	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	7/10/2019	
232	PROTOCOLO	OBS - 232	1	27/09/2019	Semana 39	GTC			10	S3 - 1002	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	7/10/2019	
233	PROTOCOLO	OBS - 233	2	27/09/2019	Semana 39	GTC			10	S3 - 1001	ESTAR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	7/10/2019	
234	PROTOCOLO	OBS - 234	1	27/09/2019	Semana 39	GTC			10	S3 - 1001	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	7/10/2019	
235	PROTOCOLO	OBS - 235	1	28/09/2019	Semana 39	GTC			10	S4 - 1007 -1008	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	7/10/2019	
236	PROTOCOLO	OBS - 236	2	28/09/2019	Semana 39	GTC			10	S4 - 1007 -1008	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	7/10/2019	
237	PROTOCOLO	OBS - 237	8	28/09/2019	Semana 39	GTC			10	S4 - 1007 -1008	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	7/10/2019	
238	PROTOCOLO	OBS - 238	8	28/09/2019	Semana 39	GTC			10	S4 - 1007	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Curado inadecuado	Realizar el curado de la zona afectada por 7 días	Levantado	7/10/2019	
239	PROTOCOLO	OBS - 239	1	30/09/2019	Semana 40	GTC			11	S1 - 1106 - 1105	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	30/09/2019	
240	PROTOCOLO	OBS - 240	1	30/09/2019	Semana 40	GTC			11	S1 - 1106	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	7/10/2019	
241	PROTOCOLO	OBS - 241	3	30/09/2019	Semana 40	GTC			11	S1 - 1106 - 1105	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	7/10/2019	
242	PROTOCOLO	OBS - 242	1	30/09/2019	Semana 40	GTC			11	S1 - 1106 - 1105	LOSA - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	7/10/2019	
243	PROTOCOLO	OBS - 243	6	30/09/2019	Semana 40	GTC			11	S1 - 1106 - 1105	LOSA - DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	7/10/2019	
244	PROTOCOLO	OBS - 244	4	1/10/2019	Semana 40	GTC			11	S2 - 1104 - 1103	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	7/10/2019	
245	PROTOCOLO	OBS - 245	1	1/10/2019	Semana 40	GTC			11	S2 - 1103	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	7/10/2019	
246	PROTOCOLO	OBS - 246	1	1/10/2019	Semana 40	GTC			11	S2 - 1104	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	7/10/2019	
247	PROTOCOLO	OBS - 247	5	1/10/2019	Semana 40	GTC			11	S2 - 1104 - 1103	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	7/10/2019	
250	PROTOCOLO	OBS - 250	4	1/10/2019	Semana 40	GTC			11	S3 - 1101 - 1102	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	7/10/2019	
248	RONC	OBS - 248	1	1/10/2019	Semana 40	PRODUCCIÓN			1	-		OBRAS EXTERIORES	Concreto Post-vaciado	Falla en procedimiento	Se hizo un acabado diferente a plano en vereda. Se picó 5 cm para hacer un nuevo vaciado con el acabado indicado,	Levantado	3/10/2019	
249	RONC	OBS - 249	1	1/10/2019	Semana 40	OT			12	S3 - 1201	COCINA	ESTRUCTURA	Entubado PP	Error en empalme	Se encontró una mala pega en union de tuberia de agua fria durante prueba de presion. Se cortó tuberia y se hizo una nueva pega.	Levantado	1/10/2019	
253	PROTOCOLO	OBS - 253	3	2/10/2019	Semana 40	GTC			11	S3 - 1101 - 1102	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	7/10/2019	
254	PROTOCOLO	OBS - 254	3	2/10/2019	Semana 40	GTC			11	S3 - 1101 - 1102	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	7/10/2019	
255	PROTOCOLO	OBS - 255	4	2/10/2019	Semana 40	GTC			11	S3 - 1101 - 1102	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	7/10/2019	
252	RONC	OBS - 252	1	2/10/2019	Semana 40	OT			6	-	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Rebaba	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	5/10/2019	
256	RONC	OBS - 256	1	2/10/2019	Semana 40	OT			6 y 7	-	VARIOS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	5/10/2019	
251	RONC	OBS - 251	1	2/10/2019	Semana 40	PRODUCCIÓN			2 y 3	-	PASADIZO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desplome	Solaquear muros para corregir el desplome	Levantado	3/10/2019	
257	PROTOCOLO	OBS - 257	2	3/10/2019	Semana 40	GTC			11	S4 - 1107 - 1108	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	7/10/2019	
258	PROTOCOLO	OBS - 258	3	3/10/2019	Semana 40	GTC			11	S4 - 1107 - 1108	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	7/10/2019	
259	PROTOCOLO	OBS - 259	1	3/10/2019	Semana 40	GTC			11	S4 - 1108	LOSA - PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	7/10/2019	
264	RONC	OBS - 264	1	3/10/2019	Semana 40	GTC			12	S1	-	ESTRUCTURA	Acero	Óxido	Limpiar acero antes del vaciado	Levantado	3/10/2019	
265	RONC	OBS - 265	1	3/10/2019	Semana 40	GTC			11	-	GABINETE DE AGUA Y GAS	ESTRUCTURA	Encofrado	Ondulaciones	Se conversó con capataz para que su personal tenga cuidado con las latas.	Levantado	3/10/2019	
266	RONC	OBS - 266	1	3/10/2019	Semana 40	GTC			12	S1 - 1205 - 1206	BAÑO 1	ESTRUCTURA	Entubado PP	Falta de recubrimiento	Se tuvo que grifar 1 cm el acero para que se rrespete recubrimiento de 8 cm.	Levantado	3/10/2019	
268	RONC	OBS - 268	1	3/10/2019	Semana 40	OT			7	-	PASADIZO	ESTRUCTURA	Encofrado	Trabajo inconcluso	Retirar corbata	Levantado	3/10/2019	
269	RONC	OBS - 269	1	3/10/2019	Semana 40	OT			12	S1 - 1206	BAÑO 1	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Ubicación incorrecta	Se movió tubo de desague a la ubicación que manda plano	Levantado	3/10/2019	
270	RONC	OBS - 270	1	3/10/2019	Semana 40	JEFE DE OBRA			7	S4	-	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Frencuencia Inadecuada	Se comunico a Unicon que respete la frecuencia establecida en los requerimientos diarios	Levantado	3/10/2019	
271	RONC	OBS - 271	1	3/10/2019	Semana 40	GTC			2	S3	-	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	11/10/2019	
260	RONC	OBS - 260	1	3/10/2019	Semana 40	PRODUCCIÓN			2	-	VESTÍBULO PREVIO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desnivel	Se deberá rellenar zonas desniveladas	Levantado	5/10/2019	
261	RONC	OBS - 261	1	3/10/2019	Semana 40	PRODUCCIÓN			2	-	-	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falla en procedimiento	Bruñas no cumplen con especificciones del proceso de la casa. Se corregirán profundidades de bruñas.	Levantado	4/10/2019	
262	RONC	OBS - 262	1	3/10/2019	Semana 40	PRODUCCIÓN			-	-	-	ARQUITECTURA	Tabiquería	Documentación incorrecta	Se corregirá planos	Levantado	4/10/2019	
263	RONC	OBS - 263	1	3/10/2019	Semana 40	PRODUCCIÓN			2	S3	-	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar derrame y alinear	Levantado	5/10/2019	
267	RONC	OBS - 267	1	3/10/2019	Semana 40	OT			3	-	COCINA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falla en procedimiento	Capacitar al personal sobre correcto procedimiento	Levantado	3/10/2019	
273	PROTOCOLO	OBS - 273	2	4/10/2019	Semana 40	GTC			12	S1 - 1206 - 1205	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	7/10/2019	
274	PROTOCOLO	OBS - 274	1	4/10/2019	Semana 40	GTC			12	S1 - 1205	MURO - COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	7/10/2019	
272	RONC	OBS - 272	1	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S3 - 201	DORMITORIO 1 - LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	9/10/2019	
275	PROTOCOLO	OBS - 275	24	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S1 - 206 - 205	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta resane	Encofrar y vaciar con planitop	Levantado	12/10/2019	
276	PROTOCOLO	OBS - 276	15	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S1 - 206 - 205	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	12/10/2019	
277	PROTOCOLO	OBS - 277	8	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S1 - 206 - 205	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	12/10/2019	
278	PROTOCOLO	OBS - 278	4	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S2 - 204 - 203	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	12/10/2019	
279	PROTOCOLO	OBS - 279	16	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S2 - 204 - 203	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	12/10/2019	
280	PROTOCOLO	OBS - 280	7	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S2 - 204 - 203	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	12/10/2019	
281	PROTOCOLO	OBS - 281	3	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S3 - 201 - 202	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	12/10/2019	
282	PROTOCOLO	OBS - 282	14	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S3 - 201 - 202	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	12/10/2019	
283	PROTOCOLO	OBS - 283	8	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S3 - 201 - 202	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	12/10/2019	
284	PROTOCOLO	OBS - 284	6	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S3 - 201 - 202	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	12/10/2019	
285	PROTOCOLO	OBS - 285	4	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S4 - 207 - 208	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Acero/Alambre expuesto	Picar, cortar alambre y resanar	Levantado	12/10/2019	
286	PROTOCOLO	OBS - 286	13	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S4 - 207 - 208	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	12/10/2019	
287	PROTOCOLO	OBS - 287	5	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S4 - 207 - 208	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	12/10/2019	
288	PROTOCOLO	OBS - 288	9	4/10/2019	Semana 40	GTC			2	S4 - 207 - 208	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	12/10/2019	
289	PROTOCOLO	OBS - 289	2	5/10/2019	Semana 40	GTC			12	S2 - 1204 - 1203	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	19/10/2019	
290	PROTOCOLO	OBS - 290	4	5/10/2019	Semana 40	GTC			12	S2 - 1204	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	19/10/2019	
291	PROTOCOLO	OBS - 291	1	5/10/2019	Semana 40	GTC			12	S2 - 1204	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	9/10/2019	
292	PROTOCOLO	OBS - 292	1	5/10/2019	Semana 40	GTC			12	S2 - 1204	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	17/10/2019	
295	PROTOCOLO	OBS - 295	4	7/10/2019	Semana 41	GTC			12	S3 - 1201 - 1202	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	17/10/2019	
296	PROTOCOLO	OBS - 296	1	7/10/2019	Semana 41	GTC			12	S3 - 1201	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	17/10/2019	
297	PROTOCOLO	OBS - 297	8	7/10/2019	Semana 41	GTC			12	S3 - 1201	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	9/10/2019	
298	PROTOCOLO	OBS - 298	8	7/10/2019	Semana 41	GTC			12	S3 - 1202	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	17/10/2019	
293	RONC	OBS - 293	1	7/10/2019	Semana 41	OT			-	-	BANCO DE ACERO	ESTRUCTURA	Acero	Almacenaje incorrecto	Se habio con el capatas para pulir el acero	Levantado	11/10/2019	
299	RONC	OBS - 299	1	7/10/2019	Semana 41	PRODUCCIÓN			5	-	-	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta resane	Se resanara encuentro de escalera con losa	Levantado	14/10/2019	
294	RONC	OBS - 294	1	7/10/2019	Semana 41	PRODUCCIÓN			4	S2 - 404	-	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falla en instalación	Se coordino con encargado para levantamiento de actividades	Levantado	12/10/2019	

[redacted]	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
309	RONC	OBS - 309	1	9/10/2019	Semana 41	JEFE DE OBRA	[redacted]		8	S2 - 803	SALA - MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Burbujas	Rellenar con mortero y dar acabado uniforme	Levantado	11/10/2019	[redacted]
311	PROTOCOLO	OBS - 311	5	9/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		12	S4 - 1207 - 1208	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	17/10/2019	[redacted]
312	PROTOCOLO	OBS - 312	1	9/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		12	S3 - 1207	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	17/10/2019	[redacted]
310	RONC	OBS - 310	1	9/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		13	S1	LOSA	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Ubicación incorrecta	Se colocó pase de tubería ACI a 51 cm del muro, cuando plano mandaba a una distancia de 91 cm. Se avisó al operario y dejó la tubería a los 91 cm del muro.	Levantado	9/10/2019	[redacted]
300	PROTOCOLO	OBS - 300	12	9/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		3	S1 - 306 - 305	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	12/10/2019	[redacted]
301	PROTOCOLO	OBS - 301	6	9/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		3	S1 - 306 - 305	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	12/10/2019	[redacted]
302	PROTOCOLO	OBS - 302	11	9/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		3	S2 - 304 - 303	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	12/10/2019	[redacted]
303	PROTOCOLO	OBS - 303	5	9/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		3	S2 - 304 - 303	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	12/10/2019	[redacted]
304	PROTOCOLO	OBS - 304	9	9/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		3	S3 - 301 - 302	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	12/10/2019	[redacted]
305	PROTOCOLO	OBS - 305	7	9/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		3	S3 - 301 - 302	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	12/10/2019	[redacted]
306	PROTOCOLO	OBS - 306	12	9/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		3	S4 - 307 - 308	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	12/10/2019	[redacted]
307	PROTOCOLO	OBS - 307	3	9/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		3	S4 - 307 - 308	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	12/10/2019	[redacted]
308	PROTOCOLO	OBS - 308	4	9/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		3	S4 - 308	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Trabajo inconcluso	Terminar de solaquear derrame	Levantado	12/10/2019	[redacted]
315	RONC	OBS - 315	1	10/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		13	S2	MURO DE BAÑO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	10/10/2019	[redacted]
316	PROTOCOLO	OBS - 316	6	10/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		13	S1 - 1306 - 1305	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	17/10/2019	[redacted]
317	PROTOCOLO	OBS - 317	1	10/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		13	S1 - 1306	MURO - SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	levantado	10/10/2019	[redacted]
313	RONC	OBS - 313	1	10/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		13	S2	LOSA	ESTRUCTURA	Encofrado	Falta de limpieza	Se sopleteo la superficie de losa del encofrado para retirar el polvillo y residuos de la losa previa al vaciado	Levantado	10/10/2019	[redacted]
314	RONC	OBS - 314	1	10/10/2019	Semana 41	OT	[redacted]		13	S2	MURO DE DORMITORIO PRINCIPAL	ESTRUCTURA	Encofrado	Ausencia de accesorio	Se informó al capataz para que asegure los pines con chavetas.	Levantado	10/10/2019	[redacted]
318	RONC	OBS - 318	1	11/10/2019	Semana 41	OT	[redacted]		13	S2	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Acero/Alambre expuesto	Picar, retirar alambre y resanar	Levantado	11/10/2019	[redacted]
319	RONC	OBS - 319	1	11/10/2019	Semana 41	OT	[redacted]		12	-	ESCALERA DE EMERGENCI	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	11/10/2019	[redacted]
321	PROTOCOLO	OBS - 321	7	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		13	S2 - 1304 - 1303	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	17/10/2019	[redacted]
322	PROTOCOLO	OBS - 322	1	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		13	S2 - 1303	MUROS - COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	12/10/2019	[redacted]
323	PROTOCOLO	OBS - 323	10	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S1 - 406 - 405	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta resane	Encofrar y vaciar con planitop	Levantado	19/10/2019	[redacted]
324	PROTOCOLO	OBS - 324	16	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S1 - 406 - 405	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
325	PROTOCOLO	OBS - 325	4	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S1 - 406 - 405	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
326	PROTOCOLO	OBS - 326	3	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S2 - 404 - 403	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	19/10/2019	[redacted]
327	PROTOCOLO	OBS - 327	7	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S2 - 404 - 403	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
328	PROTOCOLO	OBS - 328	3	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S2 - 404 - 403	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
329	PROTOCOLO	OBS - 329	4	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S3 - 401 - 402	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	19/10/2019	[redacted]
330	PROTOCOLO	OBS - 330	8	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S3 - 401 - 402	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
331	PROTOCOLO	OBS - 331	4	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S3 - 401 - 402	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
332	PROTOCOLO	OBS - 332	3	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S3 - 401 - 402	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	19/10/2019	[redacted]
333	PROTOCOLO	OBS - 333	5	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S4 - 407 - 408	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Acero/Alambre expuesto	Picar, cortar alambre y resanar	Levantado	19/10/2019	[redacted]
334	PROTOCOLO	OBS - 334	9	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S4 - 407 - 408	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
335	PROTOCOLO	OBS - 335	2	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S4 - 407 - 408	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
336	PROTOCOLO	OBS - 336	3	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		4	S4 - 407 - 408	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	19/10/2019	[redacted]
320	RONC	OBS - 320	1	11/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		2	S2 - 204	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Protuberancia	Amolar zona de mortero en ladrillos que presente protuberancias	Levantado	12/10/2019	[redacted]
337	PROTOCOLO	OBS - 337	2	12/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		13	S3 - 1301 - 1302	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	17/10/2019	[redacted]
338	PROTOCOLO	OBS - 338	1	12/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		13	S3 - 1201 - 1203	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	12/10/2019	[redacted]
339	PROTOCOLO	OBS - 339	3	12/10/2019	Semana 41	GTC	[redacted]		13	S3 - 1201	MUROS - COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	12/10/2019	[redacted]
340	PROTOCOLO	OBS - 340	1	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		13	S4 - 1307 -1308	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	21/10/2019	[redacted]
341	PROTOCOLO	OBS - 341	2	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		13	S4 - 1307 -1308	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	15/10/2019	[redacted]
342	PROTOCOLO	OBS - 342	5	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		13	S4 - 1307 -1308	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	29/10/2019	[redacted]
343	PROTOCOLO	OBS - 343	3	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		13	S4 - 1307	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Curado inadecuado	Realizar el curado de la zona afectada por 7 días	Levantado	29/10/2019	[redacted]
344	PROTOCOLO	OBS - 344	4	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S1 - 206 - 205	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar y solaquear puntos de instalaciones	Levantado	23/10/2019	[redacted]
345	PROTOCOLO	OBS - 345	3	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S1 - 206	VARIOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	23/10/2019	[redacted]
346	PROTOCOLO	OBS - 346	4	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S2 - 204 - 203	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar y solaquear puntos de instalaciones	Levantado	23/10/2019	[redacted]
347	PROTOCOLO	OBS - 347	1	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S2 - 203	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Mal acabado	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	23/10/2019	[redacted]
348	PROTOCOLO	OBS - 348	2	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S2 - 203	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desplome	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	23/10/2019	[redacted]
349	PROTOCOLO	OBS - 349	3	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S2 - 204	VARIOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Quiñe	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	23/10/2019	[redacted]
350	PROTOCOLO	OBS - 350	5	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S3 - 201 - 202	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar y solaquear puntos de instalaciones	Levantado	23/10/2019	[redacted]
351	PROTOCOLO	OBS - 351	4	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S3 - 201 - 202	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	23/10/2019	[redacted]
352	PROTOCOLO	OBS - 352	1	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S3 - 202	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Dimensión incorrecta	Corregir medidas a lo indicado en plano y dar acabado	Levantado	23/10/2019	[redacted]
353	PROTOCOLO	OBS - 353	5	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S4 - 207 - 208	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar y solaquear puntos de instalaciones	Levantado	23/10/2019	[redacted]
354	PROTOCOLO	OBS - 354	5	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S4 - 207	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	23/10/2019	[redacted]
355	PROTOCOLO	OBS - 355	1	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S4 - 202	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Dimensión incorrecta	Corregir medidas a lo indicado en plano y dar acabado	Levantado	23/10/2019	[redacted]
356	PROTOCOLO	OBS - 356	2	14/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		2	S4 - 202	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	23/10/2019	[redacted]
360	RONC	OBS - 360	1	15/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		13	-	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Fisura	Limpiar y reparar según procedimiento utilizando Sika 52	Levantado	22/10/2019	[redacted]
363	PROTOCOLO	OBS - 363	3	15/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S1 - 1406 - 1405	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	31/10/2019	[redacted]
364	PROTOCOLO	OBS - 364	3	15/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S1 - 1406 - 1405	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	1/11/2019	[redacted]
365	PROTOCOLO	OBS - 365	1	15/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S1 - 1406	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	29/10/2019	[redacted]
366	PROTOCOLO	OBS - 366	1	15/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S1 - 1405	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	6/11/2019	[redacted]
367	PROTOCOLO	OBS - 367	1	15/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S1 - 1405	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	6/11/2019	[redacted]
359	RONC	OBS - 359	1	15/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	-	ESCALERA DE EMERGENCI	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Se debe reparar tuberia	Levantado	22/10/2019	[redacted]
361	RONC	OBS - 361	1	15/10/2019	Semana 42	PRODUCCIÓN	[redacted]		-	-	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Diseño Inadecuado	Corregir planos para aplicar desde el piso 15 en adelante	Levantado	22/10/2019	[redacted]
357	RONC	OBS - 357	1	15/10/2019	Semana 42	PRODUCCIÓN	[redacted]		2	-	-	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falla en procedimiento	Se cortara acero y se solucionara resando	Levantado	16/10/2019	[redacted]
358	RONC	OBS - 358	1	15/10/2019	Semana 42	PRODUCCIÓN	[redacted]		2	-	-	ARQUITECTURA	Tabiquería	Óxido	Se cambiaran aceros	Levantado	16/10/2019	[redacted]
362	RONC	OBS - 362	1	15/10/2019	Semana 42	PRODUCCIÓN	[redacted]		2, 3, 4 y 5	-	-	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falla en procedimiento	Tarrajeo de muro, dejando juntas (concreto - bloquetas)	Levantado	22/10/2019	[redacted]
368	RONC	OBS - 368	1	16/10/2019	Semana 42	OT	[redacted]		13	S1 - 1305	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	29/10/2019	[redacted]
371	PROTOCOLO	OBS - 371	4	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S2 - 1404- 1403	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	6/11/2019	[redacted]
372	PROTOCOLO	OBS - 372	2	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S2 - 1404- 1403	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	6/11/2019	[redacted]
373	PROTOCOLO	OBS - 373	3	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S2 - 1404- 1403	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	6/11/2019	[redacted]
374	PROTOCOLO	OBS - 374	2	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S2 - 1404	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	29/10/2019	[redacted]
375	PROTOCOLO	OBS - 375	1	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S2 - 1403	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	6/10/2019	[redacted]
369	RONC	OBS - 369	1	16/10/2019	Semana 42	OT	[redacted]		13	-	PASADIZO	ESTRUCTURA	Encofrado	Trabajo inconcluso	Retirar encofrado	Levantado	17/10/2019	[redacted]
370	RONC	OBS - 370	1	16/10/2019	Semana 42	OT	[redacted]		13	S4 - 1307	BAÑO 1	ESTRUCTURA	Encofrado	Trabajo inconcluso	Retirar corbata	Levantado	17/10/2019	[redacted]
376	RONC	OBS - 376	1	16/10/2019	Semana 42	OT	[redacted]		12	-	-	ARQUITECTURA	Solaqueo	Acero/Alambre expuesto	Picar, cortar alambre y resanar	Levantado	19/10/2019	[redacted]
377	PROTOCOLO	OBS - 377	4	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S1 - 506 - 505	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta resane	Encofrar y vaciar con planitop	Levantado	19/10/2019	[redacted]
378	PROTOCOLO	OBS - 378	2	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S1 - 506 - 505	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
379	PROTOCOLO	OBS - 379	2	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S1 - 506 - 505	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
380	PROTOCOLO	OBS - 380	3	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S2 - 504 - 503	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	19/10/2019	[redacted]
381	PROTOCOLO	OBS - 381	4	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S2 - 504 - 503	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
382	PROTOCOLO	OBS - 382	3	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S2 - 504 - 503	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
383	PROTOCOLO	OBS - 383	2	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S3 - 501 - 502	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	19/10/2019	[redacted]
384	PROTOCOLO	OBS - 384	6	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S3 - 501 - 502	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
385	PROTOCOLO	OBS - 385	2	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S3 - 501 - 502	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
386	PROTOCOLO	OBS - 386	2	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S3 - 501 - 502	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	19/10/2019	[redacted]
387	PROTOCOLO	OBS - 387	3	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S4 - 507 - 508	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Acero/Alambre expuesto	Picar, cortar alambre y resanar	Levantado	19/10/2019	[redacted]
388	PROTOCOLO	OBS - 388	3	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S4 - 507 - 508	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
389	PROTOCOLO	OBS - 389	2	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S4 - 507 - 508	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	19/10/2019	[redacted]
390	PROTOCOLO	OBS - 390	3	16/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		5	S4 - 507 - 508	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	19/10/2019	[redacted]
391	RONC	OBS - 391	1	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S1	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falla en procedimiento	Capacitar al personal para vibrar de manera correcta	Levantado	24/10/2019	[redacted]
394	RONC	OBS - 394	1	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S2 - 1403	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	28/10/2019	[redacted]
395	RONC	OBS - 395	1	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S1 - 1405	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	29/10/2019	[redacted]
396	PROTOCOLO	OBS - 396	6	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S3 - 1401 -1402	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	6/11/2019	[redacted]
397	PROTOCOLO	OBS - 397	2	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S3 - 1401 -1402	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	6/11/2019	[redacted]
398	PROTOCOLO	OBS - 398	1	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S3 - 1402	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	6/11/2019	[redacted]
399	PROTOCOLO	OBS - 399	2	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S3 - 1401	ESTAR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	6/11/2019	[redacted]
400	PROTOCOLO	OBS - 400	1	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]		14	S3 - 1401	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	6/11/2019	[redacted]

[redacted]	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	[redacted]
SUB-JEFE DE GTC:	[redacted]
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
392	RONC	OBS - 392	1	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S2	-	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Material defectuoso	Retirar bolonerias del concreto y notificar a unicoN	Levantado	24/10/2019	[redacted]
393	RONC	OBS - 393	1	17/10/2019	Semana 42	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 506	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Se debe hacer cambio de la tubería rota que va empotrada en el poyo .	Levantado	19/10/2019	[redacted]
401	PROTOCOLO	OBS - 401	6	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 305	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar y solaquear puntos de instalaciones	Levantado	25/10/2019	[redacted]
402	PROTOCOLO	OBS - 402	6	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 306	SALA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	25/10/2019	[redacted]
403	PROTOCOLO	OBS - 403	4	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 304	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar y solaquear puntos de instalaciones	Levantado	25/10/2019	[redacted]
404	PROTOCOLO	OBS - 404	7	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2- 304	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Discontinuidad	completar bruña	Levantado	25/10/2019	[redacted]
405	PROTOCOLO	OBS - 405	5	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S3 - 301	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	25/10/2019	[redacted]
406	PROTOCOLO	OBS - 406	4	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S3- 302	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Quiñe	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	25/10/2019	[redacted]
407	PROTOCOLO	OBS - 407	5	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S3- 302	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	completar bruña	Levantado	25/10/2019	[redacted]
408	PROTOCOLO	OBS - 408	3	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 307	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Quiñe	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	25/10/2019	[redacted]
409	PROTOCOLO	OBS - 409	1	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 307	COCINA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Implementar tabieuqeria en baño	Levantado	25/10/2019	[redacted]
410	PROTOCOLO	OBS - 410	4	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 308	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar y solaquear puntos de instalaciones	Levantado	25/10/2019	[redacted]
411	PROTOCOLO	OBS - 411	1	17/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 308	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Mal acabado	Cerrar juntas	Levantado	25/10/2019	[redacted]
412	PROTOCOLO	OBS - 412	2	18/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1407 - 1408	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	6/11/2019	[redacted]
413	PROTOCOLO	OBS - 413	4	18/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1407 - 1408	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	6/11/2019	[redacted]
414	PROTOCOLO	OBS - 414	1	18/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1408	LOSA - PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	6/11/2019	[redacted]
415	PROTOCOLO	OBS - 415	1	19/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1506	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Mal almacenamiento	Ordenar area de trabajo	Levantado	29/10/2019	[redacted]
416	PROTOCOLO	OBS - 416	1	19/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1505	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	29/10/2019	[redacted]
417	PROTOCOLO	OBS - 417	5	19/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1506 - 1505	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	6/11/2019	[redacted]
418	PROTOCOLO	OBS - 418	1	19/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1505	LOSA - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	6/11/2019	[redacted]
419	PROTOCOLO	OBS - 419	6	19/10/2019	Semana 42	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1506 - 1505	LOSA - DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	6/11/2019	[redacted]
420	RONC	OBS - 420	1	21/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1401	DUCTO ELECTRICO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta de recubrimiento	Picar alrededor, garantizar superficie de aderencia y rellenar con mortero de alta resistencia	Levantado	6/11/2019	[redacted]
421	RONC	OBS - 421	1	21/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1408	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Burbujas	Rellenar con mortero y dar acabado uniforme	Levantado	6/11/2019	[redacted]
424	PROTOCOLO	OBS - 424	5	21/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S2 - 1504 - 1503	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	8/10/2019	[redacted]
425	PROTOCOLO	OBS - 425	1	21/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S2 - 1504	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	8/10/2019	[redacted]
426	PROTOCOLO	OBS - 426	1	21/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S2 - 1504	DORMITORIO 3	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	24/10/2019	[redacted]
427	PROTOCOLO	OBS - 427	3	21/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S2 - 1103	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	8/10/2019	[redacted]
428	PROTOCOLO	OBS - 428	1	21/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S2 - 1104	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	8/10/2019	[redacted]
423	RONC	OBS - 423	1	21/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S4	-	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Reparar tubería de IIEE	Levantado	23/10/2019	[redacted]
429	RONC	OBS - 429	1	21/10/2019	Semana 43	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	3	S3 - 303	-	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta resane	Resanaran tuberia de gas en muro	Levantado	25/10/2019	[redacted]
430	RONC	OBS - 430	1	21/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S4	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Alinear poyo de desague	Levantado	22/10/2019	[redacted]
422	RONC	OBS - 422	1	21/10/2019	Semana 43	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 308	-	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Resanaran muro	Levantado	25/10/2019	[redacted]
432	RONC	OBS - 432	1	22/10/2019	Semana 43	OT	[redacted]	[redacted]	11	-	ESCALERA DE EMERGENCI	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	25/10/2019	[redacted]
434	RONC	OBS - 434	1	22/10/2019	Semana 43	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	15	S2 - 1504	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Acero/Alambre expuesto	Picar, retirar alambre y resanar	Levantado	24/10/2019	[redacted]
435	PROTOCOLO	OBS - 435	5	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S3 - 1501 - 1502	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	8/10/2019	[redacted]
436	PROTOCOLO	OBS - 436	4	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S3 - 1501 - 1502	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	8/10/2019	[redacted]
437	PROTOCOLO	OBS - 437	4	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S3 - 1501 - 1502	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	24/10/2019	[redacted]
438	PROTOCOLO	OBS - 438	1	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S3 - 1502	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	24/10/2019	[redacted]
439	PROTOCOLO	OBS - 439	1	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S3 - 1501	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	8/10/2019	[redacted]
431	RONC	OBS - 431	1	22/10/2019	Semana 43	OT	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 507	COCINA	ARQUITECTURA	Acabados	Falla en instalación	Mover el punto de tomacorriente	Levantado	6/11/2019	[redacted]
433	RONC	OBS - 433	1	22/10/2019	Semana 43	OT	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 206	-	ARQUITECTURA	Empaste	Rebaba	Quitar Manchas de la zona del enchape	Levantado	23/10/2019	[redacted]
440	PROTOCOLO	OBS - 440	2	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 606 - 605	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	5/11/2019	[redacted]
441	PROTOCOLO	OBS - 441	4	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 606 - 605	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	5/11/2019	[redacted]
442	PROTOCOLO	OBS - 442	4	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S2 - 604 - 603	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	5/11/2019	[redacted]
443	PROTOCOLO	OBS - 443	3	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S2 - 604 - 603	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	5/11/2019	[redacted]
444	PROTOCOLO	OBS - 444	3	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3 - 601 - 602	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	5/11/2019	[redacted]
445	PROTOCOLO	OBS - 445	4	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3 - 601 - 602	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	5/11/2019	[redacted]
446	PROTOCOLO	OBS - 446	2	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S4 - 607 - 608	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	5/11/2019	[redacted]
447	PROTOCOLO	OBS - 447	1	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S4 - 607 - 608	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	5/11/2019	[redacted]
448	PROTOCOLO	OBS - 448	3	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S4 - 608	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Trabajo inconcluso	Terminar de solaquear derrame	Levantado	5/11/2019	[redacted]
449	PROTOCOLO	OBS - 449	2	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	6	-	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	5/11/2019	[redacted]
450	PROTOCOLO	OBS - 450	7	22/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	6	-	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	5/11/2019	[redacted]
462	PROTOCOLO	OBS - 462	5	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S4 - 1507 - 1508	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	8/10/2019	[redacted]
463	PROTOCOLO	OBS - 463	3	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S4 - 1507	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	8/10/2019	[redacted]
464	PROTOCOLO	OBS - 464	2	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S4 - 1508	LOSA - PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	24/10/2019	[redacted]
465	PROTOCOLO	OBS - 465	1	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S4 - 1507 - 1508	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	8/10/2019	[redacted]
451	PROTOCOLO	OBS - 451	4	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S1 - 406 - 405	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar y solaquear puntos de instalaciones	Levantado	30/10/2019	[redacted]
452	PROTOCOLO	OBS - 452	1	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S1 - 406	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear Bruña	Levantado	30/10/2019	[redacted]
453	PROTOCOLO	OBS - 453	5	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S2 - 404 - 403	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar y solaquear puntos de instalaciones	Levantado	30/10/2019	[redacted]
454	PROTOCOLO	OBS - 454	4	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S2 - 403	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Quiñe	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	30/10/2019	[redacted]
455	PROTOCOLO	OBS - 455	6	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S3 - 401 - 402	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar y solaquear puntos de instalaciones	Levantado	30/10/2019	[redacted]
456	PROTOCOLO	OBS - 456	1	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S3 - 402	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Mal acabado	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	30/10/2019	[redacted]
457	PROTOCOLO	OBS - 457	1	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S3 - 402	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear Bruña	Levantado	30/10/2019	[redacted]
458	PROTOCOLO	OBS - 458	5	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S4 - 407 - 408	BAÑOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar y solaquear puntos de instalaciones	Levantado	30/10/2019	[redacted]
459	PROTOCOLO	OBS - 459	1	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S4 - 407	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Discontinuidad	Rellenar y dar continuidad a bruña	Levantado	30/10/2019	[redacted]
460	PROTOCOLO	OBS - 460	2	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S4 - 408	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Protuberancia	Limar exceso de concreto tarrajear y dar aplome	Levantado	30/10/2019	[redacted]
461	PROTOCOLO	OBS - 461	2	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S4 - 407	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Quiñe	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	30/10/2019	[redacted]
466	PROTOCOLO	OBS - 466	2	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 506 - 505	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar partes picadas para instalaciones	Levantado	16/11/2019	[redacted]
467	PROTOCOLO	OBS - 467	3	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 506 - 505	VARIOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Solaqueo	Levantado	16/11/2019	[redacted]
468	PROTOCOLO	OBS - 468	4	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S2 - 504 - 503	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar partes picadas para instalaciones	Levantado	16/11/2019	[redacted]
469	PROTOCOLO	OBS - 469	1	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S2 - 504 - 503	VARIOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	16/11/2019	[redacted]
470	PROTOCOLO	OBS - 470	2	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S2 - 503	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenr y alinear	Levantado	16/11/2019	[redacted]
471	PROTOCOLO	OBS - 471	4	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S3 - 501 - 502	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar partes picadas para instalaciones	Levantado	16/11/2019	[redacted]
472	PROTOCOLO	OBS - 472	3	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S3 - 501 - 502	VARIOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	16/11/2019	[redacted]
473	PROTOCOLO	OBS - 473	1	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 507 - 508	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Trabajo inconcluso	Rellenar partes picadas para instalaciones	Levantado	16/11/2019	[redacted]
474	PROTOCOLO	OBS - 474	4	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 507 - 508	VARIOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	16/11/2019	[redacted]
475	PROTOCOLO	OBS - 475	2	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 508	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenr y alinear	Levantado	16/11/2019	[redacted]
476	PROTOCOLO	OBS - 476	3	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 508	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Dimensión incorrecta	Solaquer y dr medida adecuada	Levantado	16/11/2019	[redacted]
477	PROTOCOLO	OBS - 477	1	23/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 508	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desplome	Aplomar muro	Levantado	16/11/2019	[redacted]
480	PROTOCOLO	OBS - 480	4	24/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S1 - 1606- 1605	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	8/11/2019	[redacted]
481	PROTOCOLO	OBS - 481	2	24/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S1 - 1606- 1605	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	8/11/2019	[redacted]
482	PROTOCOLO	OBS - 482	3	24/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S1 - 1606- 1605	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	8/11/2019	[redacted]
483	PROTOCOLO	OBS - 483	2	24/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S1 - 1606- 1605	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	8/11/2019	[redacted]
484	PROTOCOLO	OBS - 484	1	24/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S1 - 1606- 1605	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	8/11/2019	[redacted]
478	RONC	OBS - 478	1	24/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	1	-	[redacted]	ARQUITECTURA	Sistema de Agua Contra Incendio	Suciedad	Se debe limpiar la llave compuerta	Levantado	28/10/2019	[redacted]
479	RONC	OBS - 479	1	24/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2	Losa	ESTRUCTURA	Acero	Falta de refuerzo	Se colocó las 2 varillas de 8mm faltantes .	Levantado	24/10/2019	[redacted]
485	PROTOCOLO	OBS - 485	5	24/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 706 - 705	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	16/11/2019	[redacted]
486	PROTOCOLO	OBS - 486	6	24/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 706 - 705	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	16/11/2019	[redacted]
487	RONC	OBS - 487	1	25/10/2019	Semana 43	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	4	S3 - 401	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	25/10/2019	[redacted]
488	PROTOCOLO	OBS - 488	6	25/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1604 -1603	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	8/11/2019	[redacted]
489	PROTOCOLO	OBS - 489	2	25/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1604 -1603	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	8/11/2019	[redacted]
490	PROTOCOLO	OBS - 490	1	25/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1603	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	8/11/2019	[redacted]
491	PROTOCOLO	OBS - 491	2	25/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1604	ESTAR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	8/11/2019	[redacted]
492	PROTOCOLO	OBS - 492	1	25/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1603	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	8/11/2019	[redacted]
493	PROTOCOLO	OBS - 493	1	25/10/2019	Semana 43	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1603	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	8/11/2019	[redacted]
494	RONC	OBS - 494	1	26/10/2019	Semana 43	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	8	S3	MONTANTE DESAGUE	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falla en procedimiento	Se indico al personal de byr que deben realizar la limpieza de tuberias de desague .	Levantado	31/10/2019	[redacted]
495	RONC	OBS - 495	1	28/10/2019	Semana 44	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S3 - 1602	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	29/10/2019	[redacted]
496	RONC	OBS - 496	1	28/10/2019	Semana 44	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1603	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Burbujas	Rellenar con mortero y dar acabado uniforme	Levantado	30/10/2019	[redacted]
497	RONC	OBS - 497	1	28/10/2019	Semana 44	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	16	S4	ALFEIZER SALA	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en procedimiento	Se indico al personal alinear el encofrado para que la bruña se alinea al encofrado.	Levantado	28/10/2019	[redacted]
498	RONC	OBS - 498	1	28/10/2019	Semana 44	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 206	LAVANDERÍA	ARQUITECTURA	Entubado PEALPE	Accesorio Roto	Se debe picar y cambiar accesorio de cobre en lavanderia y resanar zona afectada	Levantado	2/11/2019	[redacted]
501	PROTOCOLO	OBS - 501	5	29/10/2019	Semana 44	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S4 - 1707 - 1708	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	16/11/2019	[redacted]
502	PROTOCOLO	OBS - 502	1	29/10/2019	Semana 44	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S4 - 1707	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	16/11/2019	[redacted]
503	PROTOCOLO	OBS - 503	6	29/10/2019	Semana 44	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S4 - 1707 - 1708	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	16/11/2019	[redacted]
499	RONC	OBS - 499	1	29/10/2019	Semana 44	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S1	LOSA - SALA	ESTRUCTURA	Acero	Dimensión Incorrecta	Se colocó empalme para que acero tenga la longitud indicada en plano 60 cm.	Levantado	29/10/2019	[redacted]
500	RONC	OBS - 500	1	29/10/2019	Semana 44	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	16	S3	COCINA	ESTRUCTURA	Encofrado	Falta de accesorio	Aplomar planchas de encofrado, colocando el alineador faltante	Levantado	29/10/2019	[redacted]
506	PROTOCOLO	OBS - 506	7	30/10/2019	Semana 44	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S1 - 1705 - 1706	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	16/11/2019	[redacted]
507	PROTOCOLO	OBS - 507	3	30/10/2019	Semana 44	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S1 - 1705	ESTAR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	30/10/2019	[redacted]
508	PROTOCOLO	OBS - 508	4	30/10/2019	Semana 44	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S1 - 1705 - 1706	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	16/11/2019	[redacted]

	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	
NOMBRE DEL PROYECTO:			
JEFE DE OBRA:			
SUB-JEFE DE GTC:			
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**		

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
509	PROTOCOLO	OBS - 509	3	30/10/2019	Semana 44	GTC			17	S1 - 1705 - 1706	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	16/11/2019	
510	PROTOCOLO	OBS - 510	2	30/10/2019	Semana 44	GTC			17	S1 - 1706	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	16/11/2019	
504	RONC	OBS - 504	1	30/10/2019	Semana 44	GTC			15	S2	COCINA	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Obstrucción	Repara tuberia y resanar	Levantado	4/10/2019	
505	RONC	OBS - 505	1	30/10/2019	Semana 44	GTC			4	S3	DORMITORIO PRINCIPAL	ARQUITECTURA	Acabados	Suciedad	Limpiar cajas electricas	Levantado	4/10/2019	
517	PROTOCOLO	OBS - 517	2	31/10/2019	Semana 44	GTC			17	S2 - 1703 - 1704	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	31/10/2019	
511	RONC	OBS - 511	1	31/10/2019	Semana 44	OT			15	S4 - 1508	DORMITORIO PRINCIPAL	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en procedimiento	Retirar alambre N°8 en placa	Levantado	31/10/2019	
512	RONC	OBS - 512	1	31/10/2019	Semana 44	PRODUCCIÓN			2	S3 - 202	COCINA	ACABADOS	Enchape	Mancha	Se evaluará con calidad la aceptacion de las diferencia de tono en la fraeua de cerámico	Levantado	31/10/2019	
514	RONC	OBS - 514	1	31/10/2019	Semana 44	OT			15	S2 - 1503	COCINA	ARQUITECTURA	Entubado PP	Tubería rota	Reparar tubería dde agua fria dañada por picado de placa para solaqueo	Levantado	2/11/2019	
515	RONC	OBS - 515	1	31/10/2019	Semana 44	OT			2	S2 - 203	COCINA	ACABADOS	Pintura Interior	Suciedad	Limpiar exceso de empaste en caja de tomacorriente en cocina.	Levantado	31/10/2019	
516	RONC	OBS - 516	1	31/10/2019	Semana 44	JEFE DE OBRA			5	S2 - 503	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Acabados	Trabajo inconcluso	Se debe dar acabado en poyo de baño para instalar drywall en ducto	Levantado	4/10/2019	
513	RONC	OBS - 513	1	31/10/2019	Semana 44	PRODUCCIÓN			4	S1 - 406	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Se indico al personal para resanar bruñas o junta donde va sello cortafuego para resanar las imperfecciones.	Levantado	4/10/2019	
518	PROTOCOLO	OBS - 518	2	31/10/2019	Semana 44	GTC			6	S1 - 606 - 605	DORMITORIO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desnivel	Rellenar con mortero hasta alinear muro según tolerancias	Levantado	12/11/2019	
519	PROTOCOLO	OBS - 519	3	31/10/2019	Semana 44	GTC			6	S1 - 606 - 605	DORM. 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	12/11/2019	
520	PROTOCOLO	OBS - 520	2	31/10/2019	Semana 44	GTC			6	S1 - 606	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Dimensión incorrecta	Solaquear vanos hasta alinear con las escuadras	Levantado	12/11/2019	
521	PROTOCOLO	OBS - 521	3	31/10/2019	Semana 44	GTC			6	S2 - 604 - 603	ORM. 1 - DORMI. 3 - BAÑ	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desnivel	Rellenar con mortero hasta alinear muro según tolerancias	Levantado	12/11/2019	
522	PROTOCOLO	OBS - 522	4	31/10/2019	Semana 44	GTC			6	S2 - 604 - 603	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	12/11/2019	
523	PROTOCOLO	OBS - 523	3	31/10/2019	Semana 44	GTC			6	S3 - 601 - 602	DORM. 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desnivel	Rellenar con mortero hasta alinear muro según tolerancias	Levantado	12/11/2019	
524	PROTOCOLO	OBS - 524	2	31/10/2019	Semana 44	GTC			6	S3 - 601 - 602	BAÑO 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	12/11/2019	
525	PROTOCOLO	OBS - 525	2	31/10/2019	Semana 44	GTC			6	S4 - 607 - 608	DORMITORIO 1 - BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desnivel	Rellenar con mortero hasta alinear muro según tolerancias	Levantado	12/11/2019	
526	PROTOCOLO	OBS - 526	3	31/10/2019	Semana 44	GTC			6	S4 - 607 - 608	ORM. 1 - DORM. 3 - COCI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	12/11/2019	
527	PROTOCOLO	OBS - 527	1	31/10/2019	Semana 44	GTC			6	S1 - 6067	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Dimensión incorrecta	Solaquear vanos hasta alinear con las escuadras	Levantado	12/11/2019	
528	PROTOCOLO	OBS - 528	3	31/10/2019	Semana 44	GTC			7	S1 - 705	DORMITORIO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desnivel	Rellenar con mortero hasta alinear muro según tolerancias	Levantado	12/11/2019	
529	PROTOCOLO	OBS - 529	3	31/10/2019	Semana 44	GTC			7	S1 - 706 - 705	DORMITORIO 1 - SALA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	12/11/2019	
530	PROTOCOLO	OBS - 530	1	31/10/2019	Semana 44	GTC			7	S1 - 706	SALA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desplome	Solaquear vanos hasta alinear con las escuadras	Levantado	12/11/2019	
531	PROTOCOLO	OBS - 531	5	31/10/2019	Semana 44	GTC			7	S2 - 704 - 703	ORM. 1 - DORMI. 3 - BAÑ	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desnivel	Rellenar con mortero hasta alinear muro según tolerancias	Levantado	12/11/2019	
532	PROTOCOLO	OBS - 532	3	31/10/2019	Semana 44	GTC			7	S2 - 704 - 703	DORM. 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	12/11/2019	
533	PROTOCOLO	OBS - 533	1	31/10/2019	Semana 44	GTC			7	S2 - 704	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Mal acabado	Uniformizar solaqueo y dar acabado adecuado	Levantado	12/11/2019	
534	PROTOCOLO	OBS - 534	1	31/10/2019	Semana 44	GTC			7	S3 - 701	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desnivel	Rellenar con mortero hasta alinear muro según tolerancias	Levantado	12/11/2019	
535	PROTOCOLO	OBS - 535	3	31/10/2019	Semana 44	GTC			7	S3 - 701	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	12/11/2019	
536	PROTOCOLO	OBS - 536	4	31/10/2019	Semana 44	GTC			7	S4 - 707 - 708	VARIOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desnivel	Rellenar con mortero hasta alinear muro según tolerancias	Levantado	12/11/2019	
537	PROTOCOLO	OBS - 537	3	31/10/2019	Semana 44	GTC			7	S4 - 707 - 708	DORMITORIO 1 - COCINA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	12/11/2019	
538	PROTOCOLO	OBS - 538	6	2/11/2019	Semana 44	GTC			17	S3 - 1701 -1702	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	16/11/2019	
539	PROTOCOLO	OBS - 539	2	2/11/2019	Semana 44	GTC			17	S3 - 1701 -1702	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	16/11/2019	
540	PROTOCOLO	OBS - 540	2	2/11/2019	Semana 44	GTC			17	S3 - 1702	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	4/11/2019	
541	PROTOCOLO	OBS - 541	2	2/11/2019	Semana 44	GTC			17	S3 - 1701	ESTAR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	16/11/2019	
542	PROTOCOLO	OBS - 542	1	2/11/2019	Semana 44	GTC			17	S3 - 1701	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	16/11/2019	
543	PROTOCOLO	OBS - 543	13	2/11/2019	Semana 44	GTC			7	S2 - 704 - 703	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	16/11/2019	
544	PROTOCOLO	OBS - 544	12	2/11/2019	Semana 44	GTC			7	S2 - 704 - 703	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	16/11/2019	
545	PROTOCOLO	OBS - 545	11	2/11/2019	Semana 44	GTC			7	S3 - 702 - 701	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	16/11/2019	
546	PROTOCOLO	OBS - 546	10	2/11/2019	Semana 44	GTC			7	S3 - 702 - 701	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	16/11/2019	
547	PROTOCOLO	OBS - 547	9	2/11/2019	Semana 44	GTC			7	S1 - 707 - 708	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Amolado de irregularidades	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	16/11/2019	
548	PROTOCOLO	OBS - 548	9	2/11/2019	Semana 44	GTC			7	S1 - 707 - 708	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	16/11/2019	
550	PROTOCOLO	OBS - 550	7	4/11/2019	Semana 45	GTC			17	S4 - 1707 - 1708	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	20/11/2019	
551	PROTOCOLO	OBS - 551	1	4/11/2019	Semana 45	GTC			17	S4 - 1707	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	20/11/2019	
549	RONC	OBS - 549	1	4/11/2019	Semana 45	GTC			18	S1 - 1806	MURO - LOSA COCINA	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Falla de adherencia	Se procedió a pegar correctamente los tubos despegados.	Levantado	4/11/2019	
553	PROTOCOLO	OBS - 553	3	5/11/2019	Semana 45	GTC			18	S1 - 1806 - 1805	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	20/11/2019	
552	RONC	OBS - 552	1	5/11/2019	Semana 45	OT			9	S4 - 907	COCINA - TABIQUERIA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desplome	Rellenar zona para aplomar muro	Levantado	9/11/2019	
555	PROTOCOLO	OBS - 555	8	6/11/2019	Semana 45	GTC			18	S2 - 1804 - 1803	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	20/11/2019	
556	PROTOCOLO	OBS - 556	2	6/11/2019	Semana 45	GTC			18	S2 - 1804	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	20/11/2019	
557	PROTOCOLO	OBS - 557	2	6/11/2019	Semana 45	GTC			18	S2 - 1804 - 1803	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	7/11/2019	
554	RONC	OBS - 554	1	6/11/2019	Semana 45	GTC			18	S3	MONTANTE IIEE	ESTRUCTURA	Acero	Dimensión incorrecta	Se coloco empalme para que el acero llegue al encofrado	Levantado	6/11/2019	
560	RONC	OBS - 560	1	7/11/2019	Semana 45	OT			10	S1 - 1006	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Acero/Alambre expuesto	Picar, retirar alambre y resanar	Levantado	16/11/2019	
564	RONC	OBS - 564	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			18	S4 - 1802	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	20/11/2019	
565	RONC	OBS - 565	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			18	S4 - 1801	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Acero/Alambre expuesto	Picar, retirar alambre y resanar	Levantado	20/11/2019	
566	RONC	OBS - 566	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			18	S4 - 1807	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falla en procedimiento	Solaqueo de placa	Levantado	20/11/2019	
567	RONC	OBS - 567	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			18	S4 - 1808	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Burbujas	Rellenar con mortero y dar acabado uniforme	Levantado	20/11/2019	
568	RONC	OBS - 568	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			18	S4 - 1807	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	20/11/2019	
569	PROTOCOLO	OBS - 569	2	7/11/2019	Semana 45	GTC			18	S3 - 1801 - 1802	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	20/11/2019	
570	PROTOCOLO	OBS - 570	3	7/11/2019	Semana 45	GTC			18	S3 - 1801	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	8/11/2019	
571	PROTOCOLO	OBS - 571	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			18	S3 - 1801	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	20/11/2019	
558	RONC	OBS - 558	1	7/11/2019	Semana 45	PRODUCCIÓN			2	S2 - 203	BAÑO 1	ACABADOS	Sello Cortafuego	Fisura	Se resanara fisura con empaste	Levantado	9/11/2019	
559	RONC	OBS - 559	1	7/11/2019	Semana 45	PRODUCCIÓN			2	-	MONTANTES	ACABADOS	Sello Cortafuego	Trabajo inconcluso	Se comunico a encargado dandole plazo hasta el lunes	Levantado	11/11/2019	
572	RONC	OBS - 572	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			6	S4 - 607	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta resane	Encofrar y vaciar con planitop	Levantado	16/11/2019	
573	PROTOCOLO	OBS - 573	8	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S1 - 806 - 805	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	26/11/2019	
574	PROTOCOLO	OBS - 574	7	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S1 - 806 - 805	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	26/11/2019	
575	PROTOCOLO	OBS - 575	5	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S1 - 806 - 805	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	26/11/2019	
576	PROTOCOLO	OBS - 576	4	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S2 - 804 - 803	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	26/11/2019	
577	PROTOCOLO	OBS - 577	5	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S2 - 804 - 803	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	26/11/2019	
578	PROTOCOLO	OBS - 578	6	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S1 - 804 - 803	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	26/11/2019	
579	PROTOCOLO	OBS - 579	7	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S3 - 801 - 802	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	26/11/2019	
580	PROTOCOLO	OBS - 580	5	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S3 - 801 - 802	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	26/11/2019	
581	PROTOCOLO	OBS - 581	7	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S3 - 801 - 802	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	26/11/2019	
582	PROTOCOLO	OBS - 582	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S4 - 801 - 802	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Acero/Alambre expuesto	Picar, cortar alambre y resanar	Levantado	26/11/2019	
583	PROTOCOLO	OBS - 583	6	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S3 - 807 - 808	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	26/11/2019	
584	PROTOCOLO	OBS - 584	8	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S3 - 807 - 808	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	26/11/2019	
585	PROTOCOLO	OBS - 585	7	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S3 - 807 - 808	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	26/11/2019	
586	RONC	OBS - 586	1	7/11/2019	Semana 45	OT			16	-	ESCALERA DE EMERGENCI	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	20/11/2019	
561	RONC	OBS - 561	1	7/11/2019	Semana 45	OT			6	S4- 607	COCINA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Material incorrecto	Se hablo con contrata para que realizen la instalacion del tipo de ladrillo según plano	Levantado	16/11/2019	
562	RONC	OBS - 562	1	7/11/2019	Semana 45	OT			6	S1 - 606	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Material incorrecto	Resanar, , colocar ladrillos faltantes y solaquear	Levantado	16/11/2019	
563	RONC	OBS - 563	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			6		PASADIZO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falla en procedimiento	Realizar pase para tuberia ACI en tabiqueria	Levantado	16/11/2019	
587	PROTOCOLO	OBS - 587	6	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S1 - 806 - 805	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	18/11/2019	
588	PROTOCOLO	OBS - 588	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S1 - 806	DORMITORIO 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	18/11/2019	
589	PROTOCOLO	OBS - 589	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S1 - 806	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desnivel	rellenar con mortero para alinear muro según tolerancia	Levantado	18/11/2019	
590	PROTOCOLO	OBS - 590	4	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S2 - 804 - 503	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	18/11/2019	
591	PROTOCOLO	OBS - 591	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S2 - 803	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	18/11/2019	
592	PROTOCOLO	OBS - 592	5	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S3 - 801 - 802	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	18/11/2019	
593	PROTOCOLO	OBS - 593	4	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S4 - 807 - 808	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	18/11/2019	
594	PROTOCOLO	OBS - 594	2	7/11/2019	Semana 45	GTC			8	S4 - 807	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desplome	rellenar con mortero para alinear muro según tolerancia	Levantado	18/11/2019	
595	PROTOCOLO	OBS - 595	13	7/11/2019	Semana 45	GTC			9	S1 - 906 - 905	VARIOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	23/11/2019	
596	PROTOCOLO	OBS - 596	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			9	S1 - 905	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	23/11/2019	
597	PROTOCOLO	OBS - 597	3	7/11/2019	Semana 45	GTC			9	S1 - 904 -903	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	23/11/2019	
598	PROTOCOLO	OBS - 598	2	7/11/2019	Semana 45	GTC			9	S2 - 904	DORMITORTIO 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	23/11/2019	
599	PROTOCOLO	OBS - 599	4	7/11/2019	Semana 45	GTC			9	S3 - 901 - 902	VARIOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	23/11/2019	
600	PROTOCOLO	OBS - 600	2	7/11/2019	Semana 45	GTC			9	S3 - 907 - 908	VARIOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	23/11/2019	
601	PROTOCOLO	OBS - 601	3	7/11/2019	Semana 45	GTC			9	S3 - 908	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	23/11/2019	

	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
602	PROTOCOLO	OBS - 602	1	7/11/2019	Semana 45	GTC			9	S3 - 907	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desplome	rellenar con mortero para alinear muro según tolerancia	Levantado	23/11/2019	
603	PROTOCOLO	OBS - 603	2	8/11/2019	Semana 45	GTC			18	S4 - 1807 - 1808	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	20/11/2019	
604	PROTOCOLO	OBS - 604	2	8/11/2019	Semana 45	GTC			18	S4 - 1807	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	9/11/2019	
605	PROTOCOLO	OBS - 605	1	9/11/2019	Semana 45	GTC			2	S2 - 204	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Mal acabado	completar fraguado y dar acabado	Levantado	9/11/2019	
606	PROTOCOLO	OBS - 606	1	9/11/2019	Semana 45	GTC			2	S3 - 201	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Mal acabado	completar fraguado y dar acabado	Levantado	9/11/2019	
607	PROTOCOLO	OBS - 607	2	9/11/2019	Semana 45	GTC			2	S3 - 201	BAÑO 1	ACABADOS	Enchape	Material defectuoso	cambiar ceramico por uno del tono adecuado	Levantado	9/11/2019	
608	PROTOCOLO	OBS - 608	2	9/11/2019	Semana 45	GTC			2	S4 - 207	COCINA	ACABADOS	Enchape	Mal acabado	completar fraguado y dar acabado	Levantado	9/11/2019	
612	PROTOCOLO	OBS - 612	5	11/11/2019	Semana 46	GTC			19	S1 - 1905 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	25/11/2019	
613	PROTOCOLO	OBS - 613	1	11/11/2019	Semana 46	GTC			19	S1 - 1906	ESTAR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	12/11/2019	
614	PROTOCOLO	OBS - 614	3	11/11/2019	Semana 46	GTC			19	S1 - 1905 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	27/11/2019	
615	PROTOCOLO	OBS - 615	5	11/11/2019	Semana 46	GTC			19	S1 - 1905 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	27/11/2019	
616	PROTOCOLO	OBS - 616	1	11/11/2019	Semana 46	GTC			19	S1 - 1905	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	27/11/2019	
609	PROTOCOLO	OBS - 609	3	11/11/2019	Semana 46	GTC			3	S1 - 305	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Material defectuoso	cambiar ceramico por uno del tono adecuado	Levantado	14/11/2019	
610	PROTOCOLO	OBS - 610	1	11/11/2019	Semana 46	GTC			3	S2 - 304	COCINA	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambiar ceramico por uno con acabado correcto	Levantado	14/11/2019	
611	PROTOCOLO	OBS - 611	1	11/11/2019	Semana 46	GTC			3	S4 - 304	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Ravadura	Retirar ceramico dañado por uno nuevo	Levantado	14/11/2019	
617	RONC	OBS - 617	1	11/11/2019	Semana 46	PRODUCCIÓN			Platea	-	PLATEA	ESTRUCTURA	Acero	Documentación incorrecta	Se indica al capataz que debe corregir los estribos y usar los planos actualizados	Levantado	15/11/2019	
622	PROTOCOLO	OBS - 622	8	12/11/2019	Semana 46	GTC			19	S2 - 1903 - 1904	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	27/11/2019	
623	PROTOCOLO	OBS - 623	3	12/11/2019	Semana 46	GTC			19	S2 - 1903	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	27/11/2019	
624	PROTOCOLO	OBS - 624	4	12/11/2019	Semana 46	GTC			19	S2 - 1903 - 1904	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	27/11/2019	
625	PROTOCOLO	OBS - 625	3	12/11/2019	Semana 46	GTC			19	S2 - 1903 - 1904	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	13/11/2019	
618	PROTOCOLO	OBS - 618	1	12/11/2019	Semana 46	GTC			4	S2 - 404	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Quiñe	cambiar ceramico y volver a fraguar	Levantado	20/11/2019	
619	PROTOCOLO	OBS - 619	1	12/11/2019	Semana 46	GTC			4	S4 - 407	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Material defectuoso	cambiar ceramico por uno del tono adecuado	Levantado	20/11/2019	
620	PROTOCOLO	OBS - 620	1	12/11/2019	Semana 46	GTC			4	S1 - 406	COCINA	ACABADOS	Enchape	Quiñe	cambiar ceramico y volver a fraguar	Levantado	20/11/2019	
621	PROTOCOLO	OBS - 621	1	12/11/2019	Semana 46	GTC			4	S1 - 406	COCINA	ACABADOS	Enchape	Desalineamiento	Retirar zocalos desalineados y dar alineamoento, luego fragua	Levantado	18/11/2019	
626	RONC	OBS - 626	1	12/11/2019	Semana 46	GTC			2	AC	PASADIZO	ARQUITECTURA	Acabados	Material defectuoso	Se rechazo el agregado y se pidio nuevo agregado	Levantado	13/11/2019	
627	RONC	OBS - 627	1	12/11/2019	Semana 46	OT			16	AC	Escalera de Emergencia	ACABADOS	Baranda Metálica	Desalineamiento	Corregir alineamiento de baranda segun plano	Levantado	15/11/2019	
628	RONC	OBS - 628	1	12/11/2019	Semana 46	PRODUCCIÓN			19	S3 - 1902	INGRESO	ESTRUCTURA	Encofrado	Desplome	Corregir plomada de tapa de muro	Levantado	12/11/2019	
629	RONC	OBS - 629	1	12/11/2019	Semana 46	PRODUCCIÓN			3	S3 - 1901	-	ACABADOS	Pintura Interior	Discontinuidad	Dar acabado con el empaste	Levantado	13/11/2019	
630	RONC	OBS - 630	1	12/11/2019	Semana 46	JEFE DE OBRA			16	S2 - 1604 - 1603	INGRESO	ESTRUCTURA	Encofrado	Desnivel	Reparar esa zona, picando los dados que sobresalen y rellenar los aeujeros.	Levantado	15/11/2019	
631	PROTOCOLO	OBS - 631	3	12/11/2019	Semana 46	GTC			10	S1 - 1006 - 1005	VARIOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	23/11/2019	
632	PROTOCOLO	OBS - 632	4	12/11/2019	Semana 46	GTC			10	S1 - 1005	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	23/11/2019	
633	PROTOCOLO	OBS - 633	2	12/11/2019	Semana 46	GTC			10	S12 - 1004 - 1003	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	rellenar con mortero para alinear muro según tolerancia	Levantado	23/11/2019	
634	PROTOCOLO	OBS - 634	2	12/11/2019	Semana 46	GTC			10	S2 - 1004 - 1003	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	23/11/2019	
635	PROTOCOLO	OBS - 635	3	12/11/2019	Semana 46	GTC			10	S3 - 1001 - 1002	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	23/11/2019	
636	PROTOCOLO	OBS - 636	2	12/11/2019	Semana 46	GTC			10	S3 - 1001 - 1002	RMITORIO 1 - DORMITOR	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	23/11/2019	
637	PROTOCOLO	OBS - 637	3	12/11/2019	Semana 46	GTC			10	S4 - 1007 - 1008	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	23/11/2019	
638	PROTOCOLO	OBS - 638	2	12/11/2019	Semana 46	GTC			10	S4 - 1007 - 1008	BAÑO 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	rellenar con mortero para alinear muro según tolerancia	Levantado	23/11/2019	
639	PROTOCOLO	OBS - 639	2	12/11/2019	Semana 46	GTC			11	S1 - 1106 - 1105	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	27/11/2019	
640	PROTOCOLO	OBS - 640	4	12/11/2019	Semana 46	GTC			11	S1 - 1106 - 1105	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	27/11/2019	
641	PROTOCOLO	OBS - 641	2	12/11/2019	Semana 46	GTC			11	S2 - 1104 - 1103	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	27/11/2019	
642	PROTOCOLO	OBS - 642	3	12/11/2019	Semana 46	GTC			11	S2 - 1104 - 1103	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Alinear bruña para mejroar acabado	Levantado	27/11/2019	
643	PROTOCOLO	OBS - 643	1	12/11/2019	Semana 46	GTC			11	S3 - 1101 - 1102	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	27/11/2019	
644	PROTOCOLO	OBS - 644	1	12/11/2019	Semana 46	GTC			11	S3 - 1101 - 1102	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	27/11/2019	
645	PROTOCOLO	OBS - 645	2	12/11/2019	Semana 46	GTC			11	S4 - 1107 - 1108	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	27/11/2019	
646	PROTOCOLO	OBS - 646	7	13/11/2019	Semana 46	GTC			19	S3 - 1901 - 1902	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	27/11/2019	
647	PROTOCOLO	OBS - 647	2	13/11/2019	Semana 46	GTC			19	S3 - 1901 - 1902	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	27/11/2019	
648	PROTOCOLO	OBS - 648	3	13/11/2019	Semana 46	GTC			19	S3 - 1901 - 1902	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	27/11/2019	
649	PROTOCOLO	OBS - 649	1	13/11/2019	Semana 46	GTC			19	S3 - 1901	LOSA - DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	27/11/2019	
650	PROTOCOLO	OBS - 650	1	13/11/2019	Semana 46	GTC			19	S3 - 1902	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	14/11/2019	
651	RONC	OBS - 651	1	13/11/2019	Semana 46	GTC			19	S4 - 1907	Sala	ESTRUCTURA	Acero	Falta de recubrimiento	Se solicito amarrar el acero inferior a la malla para que este tenga el recubrimineto necesario	Levantado	13/11/2019	
652	RONC	OBS - 652	1	13/11/2019	Semana 46	OT			16	S4 - 1608	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Trabajo inconcluso	Retirar 2 unidades de corbatas	Levantado	12/11/2019	
653	RONC	OBS - 653	1	13/11/2019	Semana 46	GTC			Platea	S1	PLATEA - NUECLEO D 33	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Agregar 2 varillas 1/2" como indica plano	Levantado	13/11/2019	
654	RONC	OBS - 654	1	13/11/2019	Semana 46	GTC			Platea	S1	PLATEA - NUECLEO D 02	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Colocar pata por encima de tuberia	Levantado	13/11/2019	
655	RONC	OBS - 655	1	13/11/2019	Semana 46	GTC			Platea	S1	PLATEA - NUECLEO D 34	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Agregar 2 varillas al nucleo como indica el plano	Levantado	13/11/2019	
656	RONC	OBS - 656	1	13/11/2019	Semana 46	GTC			Platea	S1	PLATEA	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Armado incorrecto	Cambiar recorrido como indica plano	Levantado	13/11/2019	
657	PROTOCOLO	OBS - 657	4	13/11/2019	Semana 46	GTC			9	S1 - 906 - 905	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	27/11/2019	
658	PROTOCOLO	OBS - 658	5	13/11/2019	Semana 46	GTC			9	S1 - 906 - 905	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	27/11/2019	
659	PROTOCOLO	OBS - 659	3	13/11/2019	Semana 46	GTC			9	S1 - 906 - 905	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	27/11/2019	
660	PROTOCOLO	OBS - 660	6	13/11/2019	Semana 46	GTC			9	S2 - 904 - 903	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	27/11/2019	
661	PROTOCOLO	OBS - 661	5	13/11/2019	Semana 46	GTC			9	S2 - 904 - 903	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	27/11/2019	
662	PROTOCOLO	OBS - 662	2	13/11/2019	Semana 46	GTC			9	S2 - 903	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	27/11/2019	
663	PROTOCOLO	OBS - 663	3	13/11/2019	Semana 46	GTC			9	S3 - 902 - 901	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	27/11/2019	
664	PROTOCOLO	OBS - 664	3	13/11/2019	Semana 46	GTC			9	S3 - 902 - 901	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	27/11/2019	
665	PROTOCOLO	OBS - 665	4	13/11/2019	Semana 46	GTC			9	S3 - 902	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	27/11/2019	
666	PROTOCOLO	OBS - 666	2	13/11/2019	Semana 46	GTC			9	S4 - 907 - 908	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	27/11/2019	
667	PROTOCOLO	OBS - 667	4	13/11/2019	Semana 46	GTC			9	S4 - 907 - 908	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	27/11/2019	
668	PROTOCOLO	OBS - 668	2	13/11/2019	Semana 46	GTC			9	S3 - 902	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	27/11/2019	
669	PROTOCOLO	OBS - 669	3	14/11/2019	Semana 46	GTC			19	S4 - 1907 - 1908	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	27/11/2019	
670	PROTOCOLO	OBS - 670	1	14/11/2019	Semana 46	GTC			19	S4 - 1907	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	27/11/2019	
671	PROTOCOLO	OBS - 671	3	14/11/2019	Semana 46	GTC			19	S4 - 1907 - 1908	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	27/11/2019	
672	RONC	OBS - 672	1	14/11/2019	Semana 46	OT			Platea	S1	VIGA DE CIMENTACION	ESTRUCTURA	Acero	Suciedad	Se indico a jeff que tengan mayor cuidado a la hora de instalar las tuberias y no deien desperdicios	Levantado	13/11/2019	
673	RONC	OBS - 673	1	14/11/2019	Semana 46	PRODUCCIÓN			16	VARIOS	Baños	ARQUITECTURA	Acabados	Dimensión incorrecta	Se procedio a corregir poyos y sardineles que no cuenten con medida solicitada	Levantado	15/11/2019	
674	RONC	OBS - 674	1	14/11/2019	Semana 46	OT			14	S1 - 1606		ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Ubicación incorrecta	Picar y ubicar sumidero de acuerdo a plano	Levantado	16/11/2019	
675	RONC	OBS - 675	1	14/11/2019	Semana 46	OT			4	S4 - 407; S2 - 404	Varios	ACABADOS	Pintura Interior	Trabajo inconcluso	Completar Trabajo de blanqueado en area solicitada	Levantado	16/11/2019	
676	PROTOCOLO	OBS - 676	2	15/11/2019	Semana 46	GTC			20	S1 - 2006 - 2005	SALA - COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	16/11/2019	
677	PROTOCOLO	OBS - 677	4	15/11/2019	Semana 46	GTC			20	S1 - 2006 - 2005	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	27/11/2019	
678	PROTOCOLO	OBS - 678	1	15/11/2019	Semana 46	GTC			20	S1 - 2006 - 2005	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	27/11/2019	
679	PROTOCOLO	OBS - 679	3	15/11/2019	Semana 46	GTC			20	S1 - 2006 - 2005	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	27/11/2019	
680	PROTOCOLO	OBS - 680	2	15/11/2019	Semana 46	GTC			20	S1 - 2005	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	27/11/2019	
681	PROTOCOLO	OBS - 681	3	16/11/2019	Semana 46	GTC			20	S2 - 2003 - 2004	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	16/11/2019	
682	PROTOCOLO	OBS - 682	8	16/11/2019	Semana 46	GTC			20	S2 - 2003 - 2004	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	27/11/2019	
683	PROTOCOLO	OBS - 683	1	16/11/2019	Semana 46	GTC			20	S2 - 2003	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	27/11/2019	
684	PROTOCOLO	OBS - 684	3	16/11/2019	Semana 46	GTC			20	S2 - 2004	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	27/11/2019	
685	RONC	OBS - 685	1	18/11/2019	Semana 47	PRODUCCIÓN			17	S3 - 1701	Cocina	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	23/11/2019	
687	RONC	OBS - 687	1	18/11/2019	Semana 47	PRODUCCIÓN			17	S1 - 1702	Dormitorio 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	23/11/2019	
688	PROTOCOLO	OBS - 688	7	18/11/2019	Semana 47	GTC			20	S3 - 2001 -2002	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	29/11/2019	
689	PROTOCOLO	OBS - 689	2	18/11/2019	Semana 47	GTC			20	S3 - 2001 -2002	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	29/11/2019	
690	PROTOCOLO	OBS - 690	1	18/11/2019	Semana 47	GTC			20	S3 - 2002	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	29/11/2019	
691	PROTOCOLO	OBS - 691	1	18/11/2019	Semana 47	GTC			20	S3 - 2001	ESTAR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	29/11/2019	
692	PROTOCOLO	OBS - 692	1	18/11/2019	Semana 47	GTC			20	S3 - 2001	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	29/11/2019	
686	RONC	OBS - 686	1	18/11/2019	Semana 47	PRODUCCIÓN			16	AC	Escalera de Emergencia	ARQUITECTURA	Encofrado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	23/11/2019	
693	PROTOCOLO	OBS - 693	1	18/11/2019	Semana 47	GTC			5	S1 - 506	COCINA	ACABADOS	Enchape	Desnivel	Quitar ceramicos y dar nivel según tolerancias	Levantado	25/11/2019	
694	PROTOCOLO	OBS - 694	1	18/11/2019	Semana 47	GTC			5	S2 - 503	BAÑO 1	ACABADOS	Enchape	Desnivel	Quitar ceramicos y dar nivel según tolerancias	Levantado	25/11/2019	
695	PROTOCOLO	OBS - 695	6	18/11/2019	Semana 47	GTC			5	S3 - 501 - 502	COCINAS - BAÑOS 1	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fraguado y mejorar acabado	Levantado	25/11/2019	
696	PROTOCOLO	OBS - 696	2	18/11/2019	Semana 47	GTC			5	S3 - 502	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Quiñe	cambiar ceramico y volver a fraguar	Levantado	25/11/2019	
697	PROTOCOLO	OBS - 697	2	18/11/2019	Semana 47	GTC			5	S3 - 507	COCINA	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fraguado y mejorar acabado	Levantado	25/11/2019	
698	PROTOCOLO	OBS - 698	2	18/11/2019	Semana 47	GTC			5	S3 - 508	BAÑO 1	ACABADOS	Enchape	Material defectuoso	Cambiar ceramicos con tono adecuado	Levantado	25/11/2019	
701	PROTOCOLO	OBS - 701	2	19/11/2019	Semana 47	GTC			20	S4 - 2007 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	29/11/2019	
702	PROTOCOLO	OBS - 702	6	19/11/2019	Semana 47	GTC			20	S4 - 2007 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	29/11/2019	
703	PROTOCOLO	OBS - 703	1	19/11/2019	Semana 47	GTC			20	S4 - 2008	MURO - PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	29/11/2019	
704	PROTOCOLO	OBS - 704	1	19/11/2019	Semana 47	GTC			20	S4 - 2007 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Dimensión incorrecta	Corregir medidas a lo indicado en plano y dar acabado	Levantado	29/11/2019	
699	RONC	OBS - 699	1	19/11/2019	Semana 47	GTC			21	S2 - S3	Techo	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Se tuvo que reducir acero para que respete el recubrimiento concreto	Levantado	19/11/2019	
700	RONC	OBS - 700	1	19/11/2019	Semana 47	GTC			Platea	Platea - S3	-	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Diseño Inadecuado	Se modifico el recorrido de tuberias II.SS. Para que pasen en losa en vez de placas	Levantado	20/11/2019	
705	PROTOCOLO	OBS - 705	6	19/11/2019	Semana 47	GTC			12	S1 - 1206 - 1205	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	4/12/2019	
706	PROTOCOLO	OBS - 706	1	19/11/2019	Semana 47	GTC			12	S1 - 1206 - 1205	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar solaqueo en partes faltantes	Levantado	4/12/2019	
707	PROTOCOLO	OBS - 707	6	19/11/2019	Semana 47	GTC			12	S2 - 1204 - 1203	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	4/12/2019	

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	[redacted]
SUB-JEFE DE GTC:	[redacted]
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	18-Ene

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
708	PROTOCOLO	OBS - 708	6	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1204 - 1203	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar solaqueo en partes faltantes	Levantado	4/12/2019	[redacted]
709	PROTOCOLO	OBS - 709	3	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S3 - 1202	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	4/12/2019	[redacted]
710	PROTOCOLO	OBS - 710	1	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S3 - 1201 - 1122	BAÑO 2 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar solaqueo en partes faltantes	Levantado	4/12/2019	[redacted]
711	PROTOCOLO	OBS - 711	11	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S4 - 1207 - 1208	BAÑO 1 - BAÑO 2 -SALA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	4/12/2019	[redacted]
712	PROTOCOLO	OBS - 712	6	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S4 - 1207 - 1128	BAÑO 1 - BAÑO 2 -SALA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar solaqueo en partes faltantes	Levantado	4/12/2019	[redacted]
713	PROTOCOLO	OBS - 713	2	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1306	SALA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	6/12/2019	[redacted]
714	PROTOCOLO	OBS - 714	2	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1306 - 1305	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	6/12/2019	[redacted]
715	PROTOCOLO	OBS - 715	6	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1304 - 1303	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	6/12/2019	[redacted]
716	PROTOCOLO	OBS - 716	1	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1303	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	6/12/2019	[redacted]
717	PROTOCOLO	OBS - 717	5	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S3 - 1301 - 1302	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	6/12/2019	[redacted]
718	PROTOCOLO	OBS - 718	2	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S3 - 1302	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	6/12/2019	[redacted]
719	PROTOCOLO	OBS - 719	15	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1307 - 1308	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	6/12/2019	[redacted]
720	PROTOCOLO	OBS - 720	1	19/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1307	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	6/12/2019	[redacted]
721	RONC	OBS - 721	1	20/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S2 - S3	Techo	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falla en procedimiento	Resanar hueco con mortero de alta resistencia	Levantado	22/11/2019	[redacted]
724	RONC	OBS - 724	1	20/11/2019	Semana 47	OT	[redacted]	[redacted]	18	-	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	27/11/2019	[redacted]
728	PROTOCOLO	OBS - 728	2	20/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - S2	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	29/11/2019	[redacted]
729	PROTOCOLO	OBS - 729	2	20/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - S2	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	29/11/2019	[redacted]
730	PROTOCOLO	OBS - 730	2	20/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - S2	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	29/11/2019	[redacted]
722	RONC	OBS - 722	1	20/11/2019	Semana 47	OT	[redacted]	[redacted]	11	-	MONTANTE	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Reparar tuberia de montante	Levantado	25/11/2019	[redacted]
723	RONC	OBS - 723	1	20/11/2019	Semana 47	OT	[redacted]	[redacted]	20	-	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Desalineamiento	Picar y resanar con solaqueo	Levantado	25/11/2019	[redacted]
725	RONC	OBS - 725	1	20/11/2019	Semana 47	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 507 - 508	Varios	ACABADOS	Pintura Interior	Trabajo inconcluso	Se debe blanquear antes de empastar	Levantado	20/11/2019	[redacted]
726	RONC	OBS - 726	1	20/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	Platea	Platea - S3	-	ESTRUCTURA	Entubado PEALPE	Falla en procedimiento	Tuberias de gas con recorrido diferente al plano	Levantado	22/11/2019	[redacted]
727	RONC	OBS - 727	1	20/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	Platea	Platea - S2	-	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Cambio de tramo de tuberia dañada.	Levantado	20/11/2019	[redacted]
731	PROTOCOLO	OBS - 731	1	20/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 606	COCINA	ACABADOS	Enchape	Desnivel	Quitar ceramicos y dar nivel según tolerancias	Levantado	20/11/2019	[redacted]
732	PROTOCOLO	OBS - 732	2	20/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 603	BAÑO 1 - BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fraguado y mejorar acabado	Levantado	20/11/2019	[redacted]
733	PROTOCOLO	OBS - 733	1	20/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 607	BAÑO 1	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fraguado y mejorar acabado	Levantado	20/11/2019	[redacted]
734	PROTOCOLO	OBS - 734	1	20/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 607	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Desnivel	Quitar ceramicos y dar nivel según tolerancias	Levantado	20/11/2019	[redacted]
735	RONC	OBS - 735	1	20/11/2019	Semana 47	OT	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1305	Baño 1	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta resane	Colocar mortero de alta resistencia	Levantado	25/11/2019	[redacted]
736	RONC	OBS - 736	1	20/11/2019	Semana 47	OT	[redacted]	[redacted]	18	S4 - 1808	Sala - Comedor	ARQUITECTURA	Solaqueo	Trabajo inconcluso	Retirar Dulepillo	Levantado	25/11/2019	[redacted]
738	PROTOCOLO	OBS - 738	2	21/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S3 - S4	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	29/11/2019	[redacted]
739	PROTOCOLO	OBS - 739	3	21/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S3 - S4	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	29/11/2019	[redacted]
740	PROTOCOLO	OBS - 740	1	21/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S4	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	29/11/2019	[redacted]
737	RONC	OBS - 737	1	21/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	Platea	Platea - S3	-	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Rearmar acero de nucleo	Levantado	22/11/2019	[redacted]
741	PROTOCOLO	OBS - 741	9	21/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S1 - 1006 - 1005	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	2/12/2019	[redacted]
742	PROTOCOLO	OBS - 742	6	21/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S1 - 1006 - 1005	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	2/12/2019	[redacted]
743	PROTOCOLO	OBS - 743	9	21/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S2 - 1004 - 1003	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	2/12/2019	[redacted]
744	PROTOCOLO	OBS - 744	8	21/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S2 - 1004 - 1003	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	2/12/2019	[redacted]
745	PROTOCOLO	OBS - 745	9	21/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S3 - 1002 - 1001	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	2/12/2019	[redacted]
746	PROTOCOLO	OBS - 746	6	21/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S3 - 1002 - 1001	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	2/12/2019	[redacted]
747	PROTOCOLO	OBS - 747	9	21/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S4 - 1007 - 1008	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	2/12/2019	[redacted]
748	PROTOCOLO	OBS - 748	8	21/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S4 - 1007 - 1008	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	2/12/2019	[redacted]
749	PROTOCOLO	OBS - 749	4	22/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	Parapeto S2 - S3	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	29/11/2019	[redacted]
750	PROTOCOLO	OBS - 750	1	22/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	Parapeto S2 - S3	ESTAR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	29/11/2019	[redacted]
751	PROTOCOLO	OBS - 751	3	22/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	Parapeto S2 - S3	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	29/11/2019	[redacted]
752	PROTOCOLO	OBS - 752	1	22/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	Parapeto S2 - S3	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	29/11/2019	[redacted]
753	PROTOCOLO	OBS - 753	3	22/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	Parapeto S2 - S3	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	29/11/2019	[redacted]
754	PROTOCOLO	OBS - 754	1	22/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S2 - 703	COCINA	ACABADOS	Enchape	Material defectuoso	Cambiar ceramicos con tono adecuado	Levantado	22/11/2019	[redacted]
755	PROTOCOLO	OBS - 755	1	22/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S4 - 708	BAÑO 1	ACABADOS	Enchape	Material defectuoso	Cambiar ceramicos con tono adecuado	Levantado	22/11/2019	[redacted]
756	PROTOCOLO	OBS - 756	4	23/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	Parapeto S1 - S4	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	29/11/2019	[redacted]
757	PROTOCOLO	OBS - 757	2	23/11/2019	Semana 47	GTC	[redacted]	[redacted]	21	Parapeto S1 - S4	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	29/11/2019	[redacted]
759	RONC	OBS - 759	1	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - 2106 - 2105	TERRAZAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	30/11/2019	[redacted]
758	RONC	OBS - 758	1	25/11/2019	Semana 48	OT	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 507 - 508	BAÑOS	ACABADOS	Pintura Interior	Falla en procedimiento	Se debe blanquear antes de empastar	Levantado	25/11/2019	[redacted]
760	RONC	OBS - 760	1	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 101	COCINA	ESTRUCTURA	Acero	Falla en procedimiento	Picado de platea y Grifado de acero dentro de platea	Levantado	27/11/2019	[redacted]
761	PROTOCOLO	OBS - 761	7	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S2 - 1004 - 1003	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
762	PROTOCOLO	OBS - 762	8	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S2 - 1004 - 1003	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
763	PROTOCOLO	OBS - 763	6	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S2 - 1004 - 1003	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	9/12/2019	[redacted]
764	PROTOCOLO	OBS - 764	5	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S2 - 1004 - 1003	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Corregir medidas a lo indicado en plano y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
765	PROTOCOLO	OBS - 765	8	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S1 - 1106 - 1105	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
766	PROTOCOLO	OBS - 766	6	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S1 - 1106 - 1105	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
767	PROTOCOLO	OBS - 767	6	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S1 - 1106 - 1105	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	9/12/2019	[redacted]
768	PROTOCOLO	OBS - 768	4	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S1 - 1105	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Corregir medidas a lo indicado en plano y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
769	PROTOCOLO	OBS - 769	7	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S3 - 1101 - 1102	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
770	PROTOCOLO	OBS - 770	8	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S3 - 1101 - 1102	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
771	PROTOCOLO	OBS - 771	7	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S3 - 1101 - 1102	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	9/12/2019	[redacted]
772	PROTOCOLO	OBS - 772	2	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S3 - 1101 - 1102	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Corregir medidas a lo indicado en plano y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
773	PROTOCOLO	OBS - 773	4	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S4 - 1107 - 1108/	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
774	PROTOCOLO	OBS - 774	3	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S4 - 1107 - 1108/	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
775	PROTOCOLO	OBS - 775	5	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S4 - 1107 - 1108/	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	9/12/2019	[redacted]
776	PROTOCOLO	OBS - 776	6	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	-	Pasadizo	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
777	PROTOCOLO	OBS - 777	3	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	-	Pasadizo	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	9/12/2019	[redacted]
778	PROTOCOLO	OBS - 778	5	25/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	11	-	Pasadizo	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	9/12/2019	[redacted]
780	RONC	OBS - 780	1	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 108	DORMITORIO 1	ESTRUCTURA	Acero	Dimensión incorrecta	Se coloco bastones de 0.80 en el dormitorio principal.	Levantado	26/11/2019	[redacted]
779	RONC	OBS - 779	2	26/11/2019	Semana 48	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	1	S3 - 102	PASADIZO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta resane	Solaquear cajas de gas y dar acabado uniforme	Levantado	30/11/2019	[redacted]
781	RONC	OBS - 781	3	26/11/2019	Semana 48	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	6	S2 - 603	SALA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta resane	Se resanara losa de techo para no afectar acabados	Levantado	30/11/2019	[redacted]
782	PROTOCOLO	OBS - 782	4	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S1 - 1206 - 1205	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	10/12/2019	[redacted]
783	PROTOCOLO	OBS - 783	1	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S1 - 1206 - 1205	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	10/12/2019	[redacted]
784	PROTOCOLO	OBS - 784	2	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S1 - 1206 - 1205	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	10/12/2019	[redacted]
785	PROTOCOLO	OBS - 785	3	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1203 - 1204	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	10/12/2019	[redacted]
786	PROTOCOLO	OBS - 786	5	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1203 - 1204	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	10/12/2019	[redacted]
787	PROTOCOLO	OBS - 787	3	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1204	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	10/12/2019	[redacted]
788	PROTOCOLO	OBS - 788	4	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1201 - 1202	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	10/12/2019	[redacted]
789	PROTOCOLO	OBS - 789	3	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1201 - 1202	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	10/12/2019	[redacted]
790	PROTOCOLO	OBS - 790	5	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1202	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	10/12/2019	[redacted]
791	PROTOCOLO	OBS - 791	5	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1207- 1208	'ASADIZO - VESTIBULO PREVI	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	10/12/2019	[redacted]
792	PROTOCOLO	OBS - 792	6	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1207- 1208	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	10/12/2019	[redacted]
793	PROTOCOLO	OBS - 793	2	26/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1207	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	10/12/2019	[redacted]
797	PROTOCOLO	OBS - 797	7	27/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 108 - 107	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 52	[redacted]
798	PROTOCOLO	OBS - 798	2	27/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 108 - 107	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 52	[redacted]
799	PROTOCOLO	OBS - 799	2	27/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 108 - 107	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 52	[redacted]
794	RONC	OBS - 794	1	27/11/2019	Semana 48	OT	[redacted]	[redacted]	21	S2 - 2003	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Documentación incorrecta	Corregir el trazo y la dimension del sardinel	Levantado	30/11/2019	[redacted]
795	RONC	OBS - 795	1	27/11/2019	Semana 48	OT	[redacted]	[redacted]	1	S5	-	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Se debe picar y girar	Levantado	28/11/2019	[redacted]
796	RONC	OBS - 796	1	27/11/2019	Semana 48	OT	[redacted]	[redacted]	1	S4	VESTIBULO - PREVIO	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Se debe picar y girar	Levantado	28/11/2019	[redacted]
800	RONC	OBS - 800	1	28/11/2019	Semana 48	OT	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 101	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Ubicación incorrecta	Volver a trazar el ducto y reubicar la montante de desague	Levantado	16/12/2019	[redacted]
802	PROTOCOLO	OBS - 802	8	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2 - 105 - 104	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 52	[redacted]
803	PROTOCOLO	OBS - 803	3	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2 - 105 - 104	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 52	[redacted]
804	PROTOCOLO	OBS - 804	2	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2 - 105 - 104	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 52	[redacted]
805	PROTOCOLO	OBS - 805	1	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2 - 105	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 52	[redacted]
801	RONC	OBS - 801	1	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3	-	ESTRUCTURA	Acero	Falla en procedimiento	Colocar acero de refuerzo de 12 mm	Levantado	28/11/2019	[redacted]
806	PROTOCOLO	OBS - 806	1	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S1 - 14065	DORMI 3 - BAÑO 1 - SALA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	13/12/2019	[redacted]
807	PROTOCOLO	OBS - 807	4	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S1 - 1406 - 1405	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	13/12/2019	[redacted]
808	PROTOCOLO	OBS - 808	3	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S2- 1404	BAÑO 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	13/12/2019	[redacted]
809	PROTOCOLO	OBS - 809	2	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S2- 1404 - 1403	BAÑO 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	13/12/2019	[redacted]
810	PROTOCOLO	OBS - 810	2	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1401 - 1402	AÑO 1 - DORMI 1 - DORM	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	13/12/2019	[redacted]
811	PROTOCOLO	OBS - 811	3	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1407 - 1408	BAÑO 1 - HALL	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	13/12/2019	[redacted]
812	PROTOCOLO	OBS - 812	4	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1506	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Mal almacenamiento	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	18/12/2019	[redacted]
813	PROTOCOLO	OBS - 813	2	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1505	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	16/12/2019	[redacted]
814	PROTOCOLO	OBS - 814	1	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S3- 1502	DORMI 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	16/12/2019	[redacted]
815	PROTOCOLO	OBS - 815	4	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S4- 1507 - 1508	AÑO 2 - BAÑP 2 - COCIIN	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	16/12/2019	[redacted]
816	PROTOCOLO	OBS - 816	3	28/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S3 - 1508	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar y alinear bruña	Levantado	16/12/2019	[redacted]
817	PROTOCOLO	OBS - 817	2	29/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S3 - 102 - 103	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 52	[redacted]
818	PROTOCOLO	OBS - 818	3	29/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S3 - 102 - 103	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 52	[redacted]
819	PROTOCOLO	OBS - 819	1	29/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S3 - 103	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 52	[redacted]
822	PROTOCOLO	OBS - 822	7	30/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 101 - 106	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 52	[redacted]
823	PROTOCOLO	OBS - 823	3	30/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 101 - 106	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 52	[redacted]
820	RONC	OBS - 820	1	30/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3	-	ESTRUCTURA	Acero	Falla en procedimiento	Retirar acero y colocar manera correcta	Levantado	30/11/2019	[redacted]
821	RONC	OBS - 821	1	30/11/2019	Semana 48	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S2	-	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Diseño Inadecuado	Corregir recorrido y actualizar plano	Levantado	30/11/2019	[redacted]

[redacted]	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
826	PROTOCOLO	OBS - 826	7	2/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S5 - 109 - 110	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 52	[redacted]
827	PROTOCOLO	OBS - 827	2	2/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S5 - 109 - 110	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 52	[redacted]
828	PROTOCOLO	OBS - 828	4	2/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S5 - 109 - 110	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 52	[redacted]
824	RONC	OBS - 824	1	2/12/2019	Semana 49	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	2	S1	DORMITORIO 1	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en procedimiento	Picar, retirar alambre y resanar	Levantado	2/12/2019	[redacted]
825	PROTOCOLO	OBS - 825	1	2/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S4 - 807	BAÑO 1	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	completar fraguado y dar acabado	Levantado	2/12/2019	[redacted]
829	PROTOCOLO	OBS - 829	10	3/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 208 - 207	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 01	[redacted]
830	PROTOCOLO	OBS - 830	7	3/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 208 - 207	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 01	[redacted]
831	PROTOCOLO	OBS - 831	2	3/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 208 - 207	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 01	[redacted]
832	PROTOCOLO	OBS - 832	1	3/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 208	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	Semana 01	[redacted]
837	PROTOCOLO	OBS - 837	8	4/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 205 - 204	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 01	[redacted]
838	PROTOCOLO	OBS - 838	2	4/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 205 - 204	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 01	[redacted]
839	PROTOCOLO	OBS - 839	1	4/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 205	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 01	[redacted]
833	RONC	OBS - 833	1	4/12/2019	Semana 49	OT	[redacted]	[redacted]	20	S3 2003	ESCALERA	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Picar Alinear acero y resanar con Planitoc	Levantado	30/12/2019	[redacted]
834	RONC	OBS - 834	1	4/12/2019	Semana 49	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	2	S3	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Armado incorrecto	Colocar negativo de madera	Levantado	4/12/2019	[redacted]
835	RONC	OBS - 835	1	4/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3	DORMITORIO 1 - TECHO	ESTRUCTURA	Acero	Desalineamiento	Alinear aceros doblados	Levantado	4/12/2019	[redacted]
836	RONC	OBS - 836	1	4/12/2019	Semana 49	OT	[redacted]	[redacted]	1	S5	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Desalineamiento	Picar y resanar con solaqueo	Levantado	4/12/2019	[redacted]
853	PROTOCOLO	OBS - 853	7	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3 - 202 - 203	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 01	[redacted]
854	PROTOCOLO	OBS - 854	2	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3 - 202 - 203	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 01	[redacted]
855	PROTOCOLO	OBS - 855	2	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3 - 202 - 203	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 01	[redacted]
841	RONC	OBS - 841	1	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S4	-	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Colacion de acero faltante de 8mm	Levantado	7/12/2019	[redacted]
842	RONC	OBS - 842	1	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S4 - 303	-	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Colacion de acero faltante de 6mm	Levantado	7/12/2019	[redacted]
843	RONC	OBS - 843	1	5/12/2019	Semana 49	OT	[redacted]	[redacted]	14	S4	S2 - 1403	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Desalineamiento	Picar y correr tomacorriente coordinar con JEF	Levantado	30/12/2019	[redacted]
844	RONC	OBS - 844	1	5/12/2019	Semana 49	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	11	AC	MONTANTE	ARQUITECTURA	Acabados	Tubería rota	Reparar tubería de montante IISS	Levantado	6/12/2019	[redacted]
845	RONC	OBS - 845	1	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S4	INGRESO	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Colocar acero para la malla de loza de ingreso	Levantado	5/12/2019	[redacted]
846	RONC	OBS - 846	1	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S5	-	ESTRUCTURA	Entubado PEALPE	Armado incorrecto	Corregir recorrido deacuerdo a plano	Levantado	5/12/2019	[redacted]
847	PROTOCOLO	OBS - 847	1	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 903	COCINAS	ACABADOS	Enchape	Material defectuoso	cambiar ceramico por uno con el tono exacto	Levantado	5/12/2019	[redacted]
848	PROTOCOLO	OBS - 848	1	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S3 - 901	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar Fraguado en zona faltante	Levantado	5/12/2019	[redacted]
849	PROTOCOLO	OBS - 849	4	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S1 - 1006 - 1005	COCINAS	ACABADOS	Enchape	Mal acabado	Correegir fraguado y dar acabado correcto	Levantado	9/12/2019	[redacted]
850	PROTOCOLO	OBS - 850	1	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S1 - 1005	BAÑO 1	ACABADOS	Enchape	Desnivel	Quitar ceramicos y dar nivel según tolerancias	Levantado	9/12/2019	[redacted]
851	PROTOCOLO	OBS - 851	2	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S3 - 1002	COCINA	ACABADOS	Enchape	Mal acabado	Correegir fraguado y dar acabado correcto	Levantado	9/12/2019	[redacted]
852	PROTOCOLO	OBS - 852	2	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S4 - 1007	BAÑO 1 - BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Quiñe	cambiar ceramico y volver a fraguar	Levantado	9/12/2019	[redacted]
840	RONC	OBS - 840	1	5/12/2019	Semana 49	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 706	SALA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Mal acabado	Empastado de zona afectada	Levantado	6/12/2019	[redacted]
856	RONC	OBS - 856	4	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 903	COCINA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Óxido	Picar, retirar alambre y resanar	Levantado	7/12/2019	[redacted]
857	PROTOCOLO	OBS - 857	5	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1306 - 1305	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	11/12/2019	[redacted]
858	PROTOCOLO	OBS - 858	6	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1306 - 1305	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	11/12/2019	[redacted]
859	PROTOCOLO	OBS - 859	3	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1306 - 1305	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Meriorar acabado de bruña	Levantado	11/12/2019	[redacted]
860	PROTOCOLO	OBS - 860	5	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1305	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Mal acabado	Solaquear y rellenar hasta dar medida adecuada	Levantado	11/12/2019	[redacted]
861	PROTOCOLO	OBS - 861	2	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S2 - 1304 - 1303	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	11/12/2019	[redacted]
862	PROTOCOLO	OBS - 862	3	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S2 - 1304 - 1303	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	11/12/2019	[redacted]
863	PROTOCOLO	OBS - 863	5	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S2 - 1304 - 1303	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	11/12/2019	[redacted]
864	PROTOCOLO	OBS - 864	4	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S3 - 1301 - 1302	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	11/12/2019	[redacted]
865	PROTOCOLO	OBS - 865	5	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S3 - 1301 - 1302	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	11/12/2019	[redacted]
866	PROTOCOLO	OBS - 866	3	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S3 - 1301 - 1302	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	11/12/2019	[redacted]
867	PROTOCOLO	OBS - 867	3	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1307 - 1308	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	11/12/2019	[redacted]
868	PROTOCOLO	OBS - 868	4	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1307 - 1308	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	11/12/2019	[redacted]
869	PROTOCOLO	OBS - 869	5	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1307 - 1308	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	11/12/2019	[redacted]
870	PROTOCOLO	OBS - 870	3	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S1 - 1406 - 1405	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	18/12/2019	[redacted]
871	PROTOCOLO	OBS - 871	6	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S1 - 1406 - 1405	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	18/12/2019	[redacted]
872	PROTOCOLO	OBS - 872	2	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S1 - 1406 - 1405	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Meriorar acabado de bruña	Levantado	18/12/2019	[redacted]
873	PROTOCOLO	OBS - 873	3	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S2 - 1404 - 1403	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	18/12/2019	[redacted]
874	PROTOCOLO	OBS - 874	4	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S2 - 1404 - 1403	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	18/12/2019	[redacted]
875	PROTOCOLO	OBS - 875	5	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S2 - 1404 - 1403	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	18/12/2019	[redacted]
876	PROTOCOLO	OBS - 876	1	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1401 - 1402	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	18/12/2019	[redacted]
877	PROTOCOLO	OBS - 877	2	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1401 - 1402	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	18/12/2019	[redacted]
878	PROTOCOLO	OBS - 878	3	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1401 - 1402	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	18/12/2019	[redacted]
879	PROTOCOLO	OBS - 879	2	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1407 - 1408	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	18/12/2019	[redacted]
880	PROTOCOLO	OBS - 880	2	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1407 - 1408	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	18/12/2019	[redacted]
881	PROTOCOLO	OBS - 881	1	5/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1407 - 1408	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	18/12/2019	[redacted]
882	RONC	OBS - 882	4	5/12/2019	Semana 49	OT	[redacted]	[redacted]	17	AC	VESTIBULO DE ASCENSORES	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falla en procedimiento	Utilizar Sikaflex coordinar con capataz Celis	Levantado	30/12/2019	[redacted]
884	PROTOCOLO	OBS - 884	5	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 201 - 206	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 01	[redacted]
885	PROTOCOLO	OBS - 885	1	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 206	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 01	[redacted]
886	PROTOCOLO	OBS - 886	3	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 201	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 01	[redacted]
883	RONC	OBS - 883	3	6/12/2019	Semana 49	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	12	S4 - 1207	COCINA	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Se coordino con encargada para la limpieza de los cables.	Levantado	6/12/2019	[redacted]
887	RONC	OBS - 887	1	6/12/2019	Semana 49	OT	[redacted]	[redacted]	16	S4 - 304	-	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falla en procedimiento	Picar restos de mortero de las caja de IIEE	Levantado	21/12/2019	[redacted]
888	PROTOCOLO	OBS - 888	4	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S1 - 1606 - 1605	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	20/12/2019	[redacted]
889	PROTOCOLO	OBS - 889	3	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S1 - 1606	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	20/12/2019	[redacted]
890	PROTOCOLO	OBS - 890	1	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S1- 1605	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	20/12/2019	[redacted]
891	PROTOCOLO	OBS - 891	5	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1604 - 1603	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	20/12/2019	[redacted]
892	PROTOCOLO	OBS - 892	1	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1604	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	20/12/2019	[redacted]
893	PROTOCOLO	OBS - 893	7	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1602 - 1601	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	20/12/2019	[redacted]
894	PROTOCOLO	OBS - 894	1	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1601	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	20/12/2019	[redacted]
895	PROTOCOLO	OBS - 895	2	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S4 - 1608 - 1607	INA - BAÑO 1 - HALLA - DOR	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	20/12/2019	[redacted]
896	PROTOCOLO	OBS - 896	3	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S4 - 1608	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	20/12/2019	[redacted]
897	PROTOCOLO	OBS - 897	5	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S1 - 1706 - 1705	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	23/12/2019	[redacted]
898	PROTOCOLO	OBS - 898	3	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S1 - 1706 - 1705	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	23/12/2019	[redacted]
899	PROTOCOLO	OBS - 899	2	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S1- 1705	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	23/12/2019	[redacted]
900	PROTOCOLO	OBS - 900	1	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S2 - 1704 - 1703	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	23/12/2019	[redacted]
901	PROTOCOLO	OBS - 901	1	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S2 - 1704	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	23/12/2019	[redacted]
902	PROTOCOLO	OBS - 902	3	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S3 - 1701	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	23/12/2019	[redacted]
903	PROTOCOLO	OBS - 903	4	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S3 - 1701 - 1702	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	23/12/2019	[redacted]
904	PROTOCOLO	OBS - 904	1	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S4 - 1707 - 1708	INA - BAÑO 1 - HALLA - DOR	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en areas faltantes	Levantado	23/12/2019	[redacted]
905	PROTOCOLO	OBS - 905	1	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S4 - 1708	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	23/12/2019	[redacted]
906	PROTOCOLO	OBS - 906	1	6/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S4 - 1707	VESTÍBULO PREVIO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	23/12/2019	[redacted]
907	PROTOCOLO	OBS - 907	2	7/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S5 - 209 - 210	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 01	[redacted]
908	PROTOCOLO	OBS - 908	2	7/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S5 - 209 - 210	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 01	[redacted]
909	PROTOCOLO	OBS - 909	1	7/12/2019	Semana 49	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S5 - 209 - 210	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 01	[redacted]
916	PROTOCOLO	OBS - 916	11	9/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 308 - 307	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 02	[redacted]
917	PROTOCOLO	OBS - 917	2	9/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 308 - 307	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 02	[redacted]
918	PROTOCOLO	OBS - 918	1	9/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 308	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 02	[redacted]
919	PROTOCOLO	OBS - 919	1	9/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 307	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 02	[redacted]
910	PROTOCOLO	OBS - 910	1	9/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S1 - 1106	BAÑO 1	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	retirar ceramicos e instalar de manera correcta	Levantado	9/12/2019	[redacted]
911	PROTOCOLO	OBS - 911	1	9/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S1 - 1105	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Retirar ceramico e instalar uno sin falla	Levantado	9/12/2019	[redacted]
912	PROTOCOLO	OBS - 912	2	9/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S2 - 1103	BAÑO 1 - BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Mancha	Retirar manchas de ceramico	Levantado	9/12/2019	[redacted]
913	PROTOCOLO	OBS - 913	2	9/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S3 - 1101	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Retirar ceramico e instalar uno sin falla	Levantado	9/12/2019	[redacted]
914	PROTOCOLO	OBS - 914	3	9/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S4 - 1107 - 1108	BAÑO 1 - BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Retirar ceramico e instalar uno sin falla	Levantado	9/12/2019	[redacted]
915	PROTOCOLO	OBS - 915	1	9/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S4 - 1108	COCINA	ACABADOS	Enchape	Mancha	Retirar manchas de ceramico	Levantado	9/12/2019	[redacted]
920	RONC	OBS - 920	1	10/12/2019	Semana 50	OT	[redacted]	[redacted]	1 y 2	AC	Pasadizo	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	11/12/2019	[redacted]
923	RONC	OBS - 923	1	10/12/2019	Semana 50	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2001	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Se solaqueara parapeto	Levantado	14/12/2019	[redacted]
928	PROTOCOLO	OBS - 928	9	10/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 305 - 304	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 02	[redacted]
929	PROTOCOLO	OBS - 929	1	10/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 305	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 02	[redacted]
930	PROTOCOLO	OBS - 930	2	10/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 305	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 02	[redacted]
931	PROTOCOLO	OBS - 931	1	10/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 304	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	Semana 02	[redacted]
921	RONC	OBS - 921	1	10/12/2019	Semana 50	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2001	Dormitorio 1	ESTRUCTURA	Encofrado	Trabajo inconcluso	Se retiraran corbatas para resanar	Levantado	14/12/2019	[redacted]
922	RONC	OBS - 922	1	10/12/2019	Semana 50	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	18	S1 - 1805	Cocina	ACABADOS	Baranda Metálica	Falla en procedimiento	Se resanaran daños	Levantado	14/12/2019	[redacted]
924	RONC	OBS - 924	1	10/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S4 - 301	TABLERO ELECTRICO	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Colocacion de e acero	Levantado	10/12/2019	[redacted]
925	RONC	OBS - 925	1	10/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S4	Varios	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en instalación	Se indico a los encofradores que coloquen pires y chavetas donde faltaban	Levantado	11/12/2019	[redacted]
926	RONC	OBS - 926	1	10/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1306	Dormitorio 1	ACABADOS	Pintura Interior	Falla en procedimiento	Se indico al personal que debe cicatrizar venas en placas de dormitorio 1	Levantado	10/12/2019	[redacted]
927	RONC	OBS - 927	1	10/12/2019	Semana 50	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S5	Pasadizo	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Falla en instalación	Instalacion de tuberia	Levantado	12/12/2019	[redacted]
932	RONC	OBS - 932	1	11/12/2019	Semana 50	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	6	AC	Pasadizo	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Tubería rota	Se reemplazara tuberia	Levantado	11/12/2019	[redacted]
933	RONC	OBS - 933	1	11/12/2019	Semana 50	OT	[redacted]	[redacted]	2	S2	Pasadizo	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Despostillamiento	Limpiar y resanar con mortero de alta resistencia	Levantado	14/12/2019	[redacted]
935	RONC	OBS - 935	1	11/12/2019	Semana 50	OT	[redacted]	[redacted]	1	S2	Sala	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Fisura	Limpiar y reparar según procedimiento utilizando Sika 52	Levantado	16/12/2019	[redacted]
936	RONC	OBS - 936	1	11/12/2019	Semana 50	OT	[redacted]	[redacted]	19	S2 -1902	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Acero/Alambre expuesto	Picar, retirar alambre y resanar	Levantado	16/12/2019	[redacted]

	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	
NOMBRE DEL PROYECTO:			
JEFE DE OBRA:			
SUB-JEFE DE GTC:			
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**		

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
937	PROTOCOLO	OBS - 937	8	11/12/2019	Semana 50	GTC			3	S3 - 302 - 303	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 02	
938	PROTOCOLO	OBS - 938	2	11/12/2019	Semana 50	GTC			3	S3 - 302 - 303	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 02	
939	PROTOCOLO	OBS - 939	4	11/12/2019	Semana 50	GTC			3	S3 - 302 - 303	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 02	
934	RONC	OBS - 934	1	11/12/2019	Semana 50	PRODUCCIÓN			3 y 4	AC	-	ACABADOS	Pintura Interior	Mancha	Se limpiara manchas	Levantado	13/12/2019	
940	PROTOCOLO	OBS - 940	5	11/12/2019	Semana 50	GTC			15	S1 - 1506 - 1505	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	18/12/2019	
941	PROTOCOLO	OBS - 941	3	11/12/2019	Semana 50	GTC			15	S1 - 1506 - 1505	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	18/12/2019	
942	PROTOCOLO	OBS - 942	2	11/12/2019	Semana 50	GTC			15	S1 - 1506 - 1505	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Merjorar acabado de bruña	Levantado	18/12/2019	
943	PROTOCOLO	OBS - 943	4	11/12/2019	Semana 50	GTC			15	S2 - 1504 - 1503	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	18/12/2019	
944	PROTOCOLO	OBS - 944	2	11/12/2019	Semana 50	GTC			15	S2 - 1504 - 1503	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	18/12/2019	
945	PROTOCOLO	OBS - 945	3	11/12/2019	Semana 50	GTC			15	S2 - 1504 - 1503	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	18/12/2019	
946	PROTOCOLO	OBS - 946	4	11/12/2019	Semana 50	GTC			15	S3 - 1501 - 1502	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	18/12/2019	
947	PROTOCOLO	OBS - 947	1	11/12/2019	Semana 50	GTC			15	S3 - 1501 - 1502	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	18/12/2019	
948	PROTOCOLO	OBS - 948	2	11/12/2019	Semana 50	GTC			15	S3 - 1501 - 1502	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	18/12/2019	
949	PROTOCOLO	OBS - 949	3	11/12/2019	Semana 50	GTC			15	S4 - 1507 - 1508	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	18/12/2019	
950	PROTOCOLO	OBS - 950	3	11/12/2019	Semana 50	GTC			15	S4 - 1507 - 1508	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	18/12/2019	
951	PROTOCOLO	OBS - 951	2	11/12/2019	Semana 50	GTC			15	S4 - 1507 - 1508	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	18/12/2019	
952	RONC	OBS - 952	1	11/12/2019	Semana 50	OT			19	S3 - 1902	SALA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Mal almacenamiento	Retirar Desmonte	Levantado	27/12/2019	
953	PROTOCOLO	OBS - 953	2	11/12/2019	Semana 50	GTC			18	S1 - 1806 - 1805	DORMITORIO 1 - DORMITORIO 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	27/12/2019	
954	PROTOCOLO	OBS - 954	2	12/12/2019	Semana 50	GTC			18	S1 - 1805	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Amolar protuberancias en mortero de junta de ladrillos	Levantado	27/12/2019	
955	PROTOCOLO	OBS - 955	2	11/12/2019	Semana 50	GTC			18	S1 - 1806	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	27/12/2019	
956	PROTOCOLO	OBS - 956	4	11/12/2019	Semana 50	GTC			18	S2 - 1804 - 1803	BAÑO 1 - BAÑO 2 - HALL	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en áreas faltantes	Levantado	27/12/2019	
957	PROTOCOLO	OBS - 957	5	11/12/2019	Semana 50	GTC			18	S2 - 1804 - 1803	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	27/12/2019	
958	PROTOCOLO	OBS - 958	6	11/12/2019	Semana 50	GTC			18	S3 - 1804 - 1803	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en áreas faltantes	Levantado	27/12/2019	
959	PROTOCOLO	OBS - 959	3	11/12/2019	Semana 50	GTC			18	S3 - 1804 - 1803	BAÑO 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	27/12/2019	
960	PROTOCOLO	OBS - 960	3	11/12/2019	Semana 50	GTC			18	S4 - 1807	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en áreas faltantes	Levantado	27/12/2019	
961	PROTOCOLO	OBS - 961	6	11/12/2019	Semana 50	GTC			18	S4 - 1808	BAÑO 1 - BAÑO 2 - HALL	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Amolar protuberancias en mortero de junta de ladrillos	Levantado	27/12/2019	
962	PROTOCOLO	OBS - 962	6	11/12/2019	Semana 50	GTC			19	S1 - 1906 - 1905	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en áreas faltantes	Levantado	30/12/2019	
963	PROTOCOLO	OBS - 963	1	11/12/2019	Semana 50	GTC			19	1905	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	30/12/2019	
964	PROTOCOLO	OBS - 964	7	11/12/2019	Semana 50	GTC			19	S2 - 1904 - 1903	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en áreas faltantes	Levantado	30/12/2019	
965	PROTOCOLO	OBS - 965	2	11/12/2019	Semana 50	GTC			19	S2 - 1903	BAÑO 1 - BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	30/12/2019	
966	PROTOCOLO	OBS - 966	3	11/12/2019	Semana 50	GTC			19	S3 - 1901 - 1902	AÑO 1 - BAÑO 2 - DORMI	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en áreas faltantes	Levantado	30/12/2019	
967	PROTOCOLO	OBS - 967	1	11/12/2019	Semana 50	GTC			19	S3 - 1702	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	30/12/2019	
968	PROTOCOLO	OBS - 968	1	11/12/2019	Semana 50	GTC			19	S4 - 1907 - 1908	VARIOS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta resane	Completar y dar acabado con mortero en áreas faltantes	Levantado	30/12/2019	
969	PROTOCOLO	OBS - 969	3	11/12/2019	Semana 50	GTC			19	S4 - 1907 - 1908	BAÑO 2 - DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Amolado de irregularidades	Completar y corregir solaqueo con mortero	Levantado	30/12/2019	
973	PROTOCOLO	OBS - 973	7	12/12/2019	Semana 50	GTC			3	S4 - 301 - 306	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 02	
974	PROTOCOLO	OBS - 974	1	12/12/2019	Semana 50	GTC			3	S4 - 306	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 02	
975	PROTOCOLO	OBS - 975	2	12/12/2019	Semana 50	GTC			3	S4 - 301	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 02	
970	RONC	OBS - 970	1	12/12/2019	Semana 50	JEFE DE OBRA			13 y 14	AC	Ducto de desague	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Cambio de codos rotos antes de cerrar ducto	Levantado	16/12/2019	
971	RONC	OBS - 971	1	12/12/2019	Semana 50	PRODUCCIÓN			8	S3	-	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar Fraguado	Levantado	16/12/2019	
972	RONC	OBS - 972	1	12/12/2019	Semana 50	PRODUCCIÓN			8	S3	-	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso		Levantado	16/12/2019	
978	PROTOCOLO	OBS - 978	5	13/12/2019	Semana 50	GTC			3	S5 - 309 - 310	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 02	
979	PROTOCOLO	OBS - 979	1	13/12/2019	Semana 50	GTC			3	S5 - 309 - 310	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falla en procedimiento	Rellenar con mortero y dar alineamiento	Levantado	Semana 02	
980	PROTOCOLO	OBS - 980	1	13/12/2019	Semana 50	GTC			3	S5 - 309 - 310	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 02	
981	PROTOCOLO	OBS - 981	1	13/12/2019	Semana 50	GTC			3	S5 - 309 - 310	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	Semana 02	
976	RONC	OBS - 976	1	13/12/2019	Semana 50	GTC			2	S1 - 206	Varios	ACABADOS	Pintura Interior	Procedimiento Incorrecto	Verificar empaste	Levantado	14/12/2019	
977	RONC	OBS - 977	1	13/12/2019	Semana 50	GTC			2	S4 - 207	-	ACABADOS	Puertas y/o Marcos	Procedimiento Incorrecto	Masillar zonas de encuentro de madera	Levantado	12/12/2019	
982	PROTOCOLO	OBS - 982	4	13/12/2019	Semana 50	GTC			16	S1 - 1606 - 1605	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	23/12/2019	
983	PROTOCOLO	OBS - 983	1	13/12/2019	Semana 50	GTC			16	S1 - 1606 - 1605	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	23/12/2019	
984	PROTOCOLO	OBS - 984	3	13/12/2019	Semana 50	GTC			16	S1 - 1606 - 1605	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Merjorar acabado de bruña	Levantado	23/12/2019	
985	PROTOCOLO	OBS - 985	2	13/12/2019	Semana 50	GTC			16	S2 - 1604 - 1603	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	23/12/2019	
986	PROTOCOLO	OBS - 986	1	13/12/2019	Semana 50	GTC			16	S2 - 1604 - 1603	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	23/12/2019	
987	PROTOCOLO	OBS - 987	2	13/12/2019	Semana 50	GTC			16	S3 - 1601 - 1602	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	23/12/2019	
988	PROTOCOLO	OBS - 988	3	13/12/2019	Semana 50	GTC			16	S3 - 1601 - 1602	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	23/12/2019	
989	PROTOCOLO	OBS - 989	2	13/12/2019	Semana 50	GTC			16	S4 - 1607 - 1608	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	23/12/2019	
990	PROTOCOLO	OBS - 990	1	13/12/2019	Semana 50	GTC			16	S4 - 1607 - 1608	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	23/12/2019	
991	PROTOCOLO	OBS - 991	4	13/12/2019	Semana 50	GTC			16	S4 - 1607 - 1608	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	23/12/2019	
993	RONC	OBS - 993	1	16/12/2019	Semana 51	JEFE DE OBRA			20	AC	MURO DE SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	16/12/2019	
996	PROTOCOLO	OBS - 996	4	16/12/2019	Semana 51	GTC			4	S1 - 408 - 407	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	18/12/2019	
997	PROTOCOLO	OBS - 997	5	16/12/2019	Semana 51	GTC			4	S1 - 408 - 407	VARIOS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	18/12/2019	
992	RONC	OBS - 992	1	16/12/2019	Semana 51	PRODUCCIÓN			21	S3	AZOTEA	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en procedimiento	Se procederá a picar y dar acabado al ducto	Levantado	14/12/2019	
994	RONC	OBS - 994	1	16/12/2019	Semana 51	JEFE DE OBRA			20	AC	VANO DE SALA	ARQUITECTURA	Acero	Tubería rota	Picar fierro acero expuesto y resanar	Levantado	16/12/2019	
995	RONC	OBS - 995	1	16/12/2019	Semana 51	GTC			4	S3 - 403	COCINA	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Colocacion de refuerzo	Levantado	16/12/2019	
998	RONC	OBS - 998	2	16/12/2019	Semana 51	GTC			16	AC	PASADIZO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Material defectuoso	Se Rechazo agregado grueso y produccion solicito otra tanda material.	Levantado	18/12/2019	
999	RONC	OBS - 999	1	16/12/2019	Semana 51	GTC			12 y 14	-	FACHADA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falla en procedimiento	Se converso con el capataz de CHB para que mejore los remates de solaqueo en las ventanas	Levantado	16/12/2019	
1000	RONC	OBS - 1000	1	16/12/2019	Semana 51	GTC			20	S4 - 2007	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Dimensión incorrecta	Largo de Muro de tabiqueria menos al que manda plano se debe rellenar derrame para que la puerta cumpla con la lonaitud de 90 cm	Levantado	3/01/2020	
1001	PROTOCOLO	OBS - 1001	3	16/12/2019	Semana 51	GTC			20	S1 - 2005 - 2006	BAÑO 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	4/01/2020	
1002	PROTOCOLO	OBS - 1002	2	16/12/2019	Semana 51	GTC			20	S1 - 2005 - 2006	BAÑO 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero hasta alinear muro y losa	Levantado	4/01/2020	
1003	PROTOCOLO	OBS - 1003	4	16/12/2019	Semana 51	GTC			20	S2 - 2003 - 2004	BAÑO 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	4/01/2020	
1004	PROTOCOLO	OBS - 1004	4	16/12/2019	Semana 51	GTC			20	S2 - 2003 - 2004	BAÑO 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero hasta alinear muro y losa	Levantado	4/01/2020	
1005	PROTOCOLO	OBS - 1005	8	16/12/2019	Semana 51	GTC			20	S3 - 2001 - 2002	BAÑO 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	4/01/2020	
1006	PROTOCOLO	OBS - 1006	4	16/12/2019	Semana 51	GTC			20	S3 - 2001 - 2002	BAÑO 1 - DORM. 3	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Rellenar con mortero hasta alinear muro y losa	Levantado	4/01/2020	
1007	PROTOCOLO	OBS - 1007	2	16/12/2019	Semana 51	GTC			20	S4 - 2007 - 2008	BAÑO 1 - DORMITORIO 3 - COCINA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	4/01/2020	
1008	RONC	OBS - 1008	1	16/12/2019	Semana 51	GTC			19		BAÑO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Rebaba	Limpiar Rebabas en tuberias	Levantado	10/01/2020	
1010	PROTOCOLO	OBS - 1010	5	17/12/2019	Semana 51	GTC			4	S2 - 405 - 404	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	21/12/2019	
1011	PROTOCOLO	OBS - 1011	1	17/12/2019	Semana 51	GTC			4	S2 - 404	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	21/12/2019	
1012	PROTOCOLO	OBS - 1012	1	17/12/2019	Semana 51	GTC			4	S2 - 405	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	21/12/2019	
1009	RONC	OBS - 1009	1	17/12/2019	Semana 51	GTC			5	S2	-	ESTRUCTURA	Acero	Mal almacenamiento	Ordenar y almacenar correctamente acero	Levantado	16/12/2019	
1014	RONC	OBS - 1014	1	18/12/2019	Semana 51	OT			3	S2 - 304	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Fisura	Limpiar y reparar según procedimiento utilizando Sika 52	Levantado	19/12/2019	
1015	PROTOCOLO	OBS - 1015	4	18/12/2019	Semana 51	GTC			4	S3 - 402 - 403	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	21/12/2019	
1016	PROTOCOLO	OBS - 1016	2	18/12/2019	Semana 51	GTC			4	S3 - 402 - 403	SALA - DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	21/12/2019	
1017	PROTOCOLO	OBS - 1017	1	18/12/2019	Semana 51	GTC			4	S3 - 403	COMEDOR - LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	21/12/2019	
1013	RONC	OBS - 1013	1	18/12/2019	Semana 51	OT			7	S2 - 704	COCINA	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Se coordino con capatas para terminar de fraguar el contrazocalo	Levantado	18/12/2019	
1018	PROTOCOLO	OBS - 1018	6	19/12/2019	Semana 51	GTC			4	S4 - 406 - 401	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	21/12/2019	
1019	PROTOCOLO	OBS - 1019	1	19/12/2019	Semana 51	GTC			4	S4 - 406 - 401	SALA - LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	21/12/2019	
1020	PROTOCOLO	OBS - 1020	1	19/12/2019	Semana 51	GTC			4	S4 - 406	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	21/12/2019	
1021	PROTOCOLO	OBS - 1021	1	19/12/2019	Semana 51	GTC			4	S4 - 401	COMEDOR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	21/12/2019	
1022	RONC	OBS - 1022	1	19/12/2019	Semana 51	OT			5	S5	PASADIZO	ESTRUCTURA	Acero	Desalineamiento	Grifar el acero de manera que este alineado	Levantado	19/12/2019	
1023	RONC	OBS - 1023	1	19/12/2019	Semana 51	OT			5	S5	PASADIZO	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Desalineamiento	Regularizar en plano	Levantado	21/12/2019	
1024	RONC	OBS - 1024	1	19/12/2019	Semana 51	PRODUCCIÓN			9 y 10	AC	ESCALERA	EQUIPAMIENTO	Sistema de Agua Contra Incendio	Dimensión incorrecta	Se Resanaran hucos con dimensiones inadecuadas se comunico a contratista	Levantado	21/12/2019	
1025	RONC	OBS - 1025	1	19/12/2019	Semana 51	GTC						ESTRUCTURA	Acero	Mal almacenamiento	Colocar plastico de acero	Levantado	19/12/2019	
1026	RONC	OBS - 1026	1	19/12/2019	Semana 51	PRODUCCIÓN			8	S1 - 608	DORMITORIO 1	ACABADOS	Pintura Interior	Mancha	Se resanaran derrame de yano	Levantado	21/12/2019	
1027	PROTOCOLO	OBS - 1027	1	19/12/2019	Semana 51	GTC			13	S2 - 1303	COCINA	ACABADOS	Enchape	Mancha	Retirar manchas de enchapa	Levantado	20/12/2019	
1028	PROTOCOLO	OBS - 1028	1	19/12/2019	Semana 51	GTC			13	S2 - 1303	COCINA	ACABADOS	Enchape	Mal Acabado	Corregir acabado dde fragua	Levantado	20/12/2019	
1029	PROTOCOLO	OBS - 1029	1	19/12/2019	Semana 51	GTC			13	S2 - 1303	COCINA	ACABADOS	Enchape	Desnivel	Se debe retirar pieza desniveladas e instalar una pieza nueva para deiar el zocalo alineado	Levantado	20/12/2019	
1030	PROTOCOLO	OBS - 1030	1	19/12/2019	Semana 51	GTC			13	S3 - 1304	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Desnivel	Se debe retirar pieza desniveladas e instalar una pieza nueva para deiar el enchape alineado en ducha	Levantado	20/12/2019	
1031	PROTOCOLO	OBS - 1031	1	19/12/2019	Semana 51	GTC			13	S3 - 1301	LAVANDERÍA	ACABADOS	Enchape	Trabajo Inconcluso	Colocar fragua en zona faltante	Levantado	20/12/2019	
1032	PROTOCOLO	OBS - 1032	1	19/12/2019	Semana 51	GTC			13	S3 - 1302	LAVANDERÍA	ACABADOS	Enchape	Mancha	Retirar manchas de enchapa	Levantado	20/12/2019	
1033	PROTOCOLO	OBS - 1033	1	19/12/2019	Semana 51	GTC			13	S4 - 1307	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambiar pieza quiñada	Levantado	20/12/2019	
1034	PROTOCOLO	OBS - 1034	2	19/12/2019	Semana 51	GTC			17	S1 - 1705 - 1706	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	26/12/2019	
1035	PROTOCOLO	OBS - 1035	3	19/12/2019	Semana 51	GTC			17	S1 - 1705 - 1706	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	26/12/2019	
1036	PROTOCOLO	OBS - 1036	3	19/12/2019	Semana 51	GTC			17	S1 - 1705 - 1706	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	26/12/2019	
1037	PROTOCOLO	OBS - 1037	6	19/12/2019	Semana 51	GTC			17	S2 - 1703 - 1704	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	26/12/2019	
1038	PROTOCOLO	OBS - 1038	5	19/12/2019	Semana 51	GTC			17	S2 - 1703 - 1704	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	26/12/2019	
1039	PROTOCOLO	OBS - 1039	4	19/12/2019	Semana 51	GTC			17	S2 - 1703 - 1704	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	26/12/2019	
1040	PROTOCOLO	OBS - 1040	5	19/12/2019	Semana 51	GTC			17	S3 - 1701 - 1702	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	26/12/2019	
1041	PROTOCOLO	OBS - 1041	6	19/12/2019	Semana 51	GTC			17	S3 - 1701 - 1702	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	26/12/2019	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1042	PROTOCOLO	OBS - 1042	8	19/12/2019	Semana 51	GTC	[redacted]		17	S3 - 1701 - 1702	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	26/12/2019	[redacted]
1043	PROTOCOLO	OBS - 1043	5	19/12/2019	Semana 51	GTC	[redacted]		17	S4 - 1707 - 1708	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Picar, Rellenar con mortero y dar acabado	Levantado	26/12/2019	[redacted]
1044	PROTOCOLO	OBS - 1044	4	19/12/2019	Semana 51	GTC	[redacted]		17	S4 - 1707 - 1708	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	26/12/2019	[redacted]
1045	PROTOCOLO	OBS - 1045	5	19/12/2019	Semana 51	GTC	[redacted]		17	S4 - 1707 - 1708	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	26/12/2019	[redacted]
1046	PROTOCOLO	OBS - 1046	6	20/12/2019	Semana 51	GTC	[redacted]		4	S5 - 410 - 409	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	21/12/2019	[redacted]
1047	PROTOCOLO	OBS - 1047	2	20/12/2019	Semana 51	GTC	[redacted]		4	S5 - 410 - 409	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	21/12/2019	[redacted]
1048	PROTOCOLO	OBS - 1048	2	20/12/2019	Semana 51	GTC	[redacted]		4	S5 - 410 - 409	BAÑO 2 - SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	21/12/2019	[redacted]
1049	PROTOCOLO	OBS - 1049	5	21/12/2019	Semana 51	GTC	[redacted]		5	S1 - 508 - 507	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	23/12/2019	[redacted]
1050	PROTOCOLO	OBS - 1050	1	21/12/2019	Semana 51	GTC	[redacted]		5	S1 - 508	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	23/12/2019	[redacted]
1051	PROTOCOLO	OBS - 1051	2	21/12/2019	Semana 51	GTC	[redacted]		5	S1 - 508 - 507	BAÑO - DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	23/12/2019	[redacted]
1054	PROTOCOLO	OBS - 1054	6	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S1 - 508	LOSA - DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	25/12/2019	[redacted]
1055	PROTOCOLO	OBS - 1055	5	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S2 - 505 - 504	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	25/12/2019	[redacted]
1056	PROTOCOLO	OBS - 1056	12	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S3 - 505	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	23/12/2019	[redacted]
1057	PROTOCOLO	OBS - 1057	2	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S2 - 505 - 504	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	25/12/2019	[redacted]
1052	RONC	OBS - 1052	1	23/12/2019	Semana 52	PRODUCCIÓN	[redacted]		4	S4	-	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Burbujas	Cambiar de vibrador (Operario rotar)	Levantado	23/12/2019	[redacted]
1053	RONC	OBS - 1053	1	23/12/2019	Semana 52	PRODUCCIÓN	[redacted]		3	S2	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Apuntalamiento inadecuado	Retiro de puntales y colocacion de llave puntal	Levantado	23/12/2019	[redacted]
1058	PROTOCOLO	OBS - 1058	6	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		18	S1 - 1805 - 1806	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losas y muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1059	PROTOCOLO	OBS - 1059	5	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		18	S1 - 1805 - 1806	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1060	PROTOCOLO	OBS - 1060	2	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		18	S1 - 1806	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1061	PROTOCOLO	OBS - 1061	3	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		18	S2 - 1803 - 1804	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losas y muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1062	PROTOCOLO	OBS - 1062	4	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		18	S2 - 1803 - 1804	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1063	PROTOCOLO	OBS - 1063	2	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		18	S2 - 1804	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1064	PROTOCOLO	OBS - 1064	3	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		18	S3 - 1801 - 1802	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losas y muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1065	PROTOCOLO	OBS - 1065	3	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		18	S3 - 1801 - 1802	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1066	PROTOCOLO	OBS - 1066	4	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		18	S4 - 1807 - 1808	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losas y muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1067	PROTOCOLO	OBS - 1067	5	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		18	S4 - 1807 - 1808	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1068	PROTOCOLO	OBS - 1068	2	23/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		18	S4 - 1807	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1069	RONC	OBS - 1069	3	23/12/2019	Semana 52	OT	[redacted]		20	VARIOS	BAÑOS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Ausencia mortero	Se debe resanar el error con planitop antes de tapar el hueco con mortero. Ademas, se debe retirar alambre restante.	Levantado	28/12/2019	[redacted]
1072	PROTOCOLO	OBS - 1072	5	26/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S3 - 502	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	28/12/2019	[redacted]
1073	PROTOCOLO	OBS - 1073	14	26/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S3 - 502 - 503	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	28/12/2019	[redacted]
1074	PROTOCOLO	OBS - 1074	5	26/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S3 - 502 - 503	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	28/12/2019	[redacted]
1070	RONC	OBS - 1070	1	26/12/2019	Semana 52	PRODUCCIÓN	[redacted]		19	VARIOS	BAÑOS	ARQUITECTURA	Entubado PP	Ausencia de procedimiento	Se picara zona para realizar prueba de montantes	Levantado	26/12/2019	[redacted]
1071	RONC	OBS - 1071	1	26/12/2019	Semana 52	PRODUCCIÓN	[redacted]		3	VARIOS	PUERTAS	ACABADOS	Puertas y/o Marcos	Falla en procedimiento	Retirar puertas y Realizar corte para instalacion de chapa metalica	Levantado	28/12/2019	[redacted]
1085	PROTOCOLO	OBS - 1085	7	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S4 - 501 - 506	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	28/12/2019	[redacted]
1086	PROTOCOLO	OBS - 1086	2	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S4 - 501 - 506	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	28/12/2019	[redacted]
1087	PROTOCOLO	OBS - 1087	4	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S4 - 501	ESTAR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	28/12/2019	[redacted]
1088	PROTOCOLO	OBS - 1088	5	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S4 - 506	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	28/12/2019	[redacted]
1075	RONC	OBS - 1075	1	27/12/2019	Semana 52	OT	[redacted]		15 y 16	VARIOS	DORMITORIOS 1	ACABADOS	Sello Cortafuego	Sello desprendido	Resanar y dar uniformidad a huecos en el sello	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1076	RONC	OBS - 1076	1	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		1	S1 - 107	LAVANDERÍA	ESTRUCTURA	Acero	Ubicación incorrecta	Cortar acero y dar el recubrimiento necesario	Levantado	28/12/2019	[redacted]
1077	RONC	OBS - 1077	1	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S2	BAÑO 1	ESTRUCTURA	Entubado PEALPE	Ubicación incorrecta	Corregir tuberia de PP Vertical	Levantado	27/12/2019	[redacted]
1078	RONC	OBS - 1078	1	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S1	SALA	ESTRUCTURA	Acero	Armado incorrecto	Alinear acero y amarrar a aceros vertical	Levantado	27/12/2019	[redacted]
1079	RONC	OBS - 1079	1	27/12/2019	Semana 52	OT	[redacted]		4	S4 - 406	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Dimensión incorrecta	Picar. Alinear tuberia y resanar	Levantado	30/12/2019	[redacted]
1080	RONC	OBS - 1080	1	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S5	TECHO	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Se cambio tuberiua rota durante vaciado	Levantado	27/12/2019	[redacted]
1081	RONC	OBS - 1081	1	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S5	TECHO	ESTRUCTURA	Acero	Falta de recubrimiento	Se indico al personal que doble el acero debia tener una altura de 8 cm no de 10 cm. Se levanto en el momento	Levantado	27/12/2019	[redacted]
1082	RONC	OBS - 1082	1	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		6	S5 - 610	SALA	ESTRUCTURA	Entubado PEALPE	Armado incorrecto	Reubicar tuberia	Levantado	27/12/2019	[redacted]
1083	RONC	OBS - 1083	1	27/12/2019	Semana 52	OT	[redacted]		3	S4 - 301	-	ESTRUCTURA	Acero	Ubicación incorrecta	Cortar acero y tdar el recubrimiento necesario	Levantado	27/12/2019	[redacted]
1084	RONC	OBS - 1084	1	27/12/2019	Semana 52	JEFE DE OBRA	[redacted]		5	S5	TECHO	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Material defectuoso	Se informo a UNICON sobre problema para evitar estos inconvenientes	Levantado	27/08/2019	[redacted]
1089	PROTOCOLO	OBS - 1089	1	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		19	S1 - 1905 - 1906	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losa sy muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1090	PROTOCOLO	OBS - 1090	2	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		19	S1 - 1905 - 1906	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1091	PROTOCOLO	OBS - 1091	1	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		19	S1 - 1905 - 1906	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero de contracción plástica compensada	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1092	PROTOCOLO	OBS - 1092	1	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		19	S2 - 1903 - 1904	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losa sy muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1093	PROTOCOLO	OBS - 1093	4	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		19	S2 - 1903 - 1904	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1094	PROTOCOLO	OBS - 1094	2	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		19	S2 - 1903 - 1904	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero de contracción plástica compensada	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1095	PROTOCOLO	OBS - 1095	3	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		19	S3 - 1901 - 1902	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losa sy muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1096	PROTOCOLO	OBS - 1096	5	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		19	S3 - 1901 - 1902	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1097	PROTOCOLO	OBS - 1097	2	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		19	S3 - 1901 - 1902	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero de contracción plástica compensada	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1098	PROTOCOLO	OBS - 1098	3	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		19	S4 - 1907 - 1908	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losa sy muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1099	PROTOCOLO	OBS - 1099	2	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		19	S4 - 1907 - 1908	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1100	PROTOCOLO	OBS - 1100	1	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		19	S4 - 1907 - 1908	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero de contracción plástica compensada	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1101	PROTOCOLO	OBS - 1101	4	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		21	S1 - 2105 - 2106	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	13/01/2020	[redacted]
1102	PROTOCOLO	OBS - 1102	5	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		21	S2 - 2103 - 2104	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	13/01/2020	[redacted]
1103	PROTOCOLO	OBS - 1103	2	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		21	S2 - 2103 - 2104	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	13/01/2020	[redacted]
1104	PROTOCOLO	OBS - 1104	3	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		21	S3 - 2101	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	13/01/2020	[redacted]
1105	PROTOCOLO	OBS - 1105	4	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		21	S3 - 2101 - 2102	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	13/01/2020	[redacted]
1106	PROTOCOLO	OBS - 1106	2	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		21	S4 - 2107 - 2108	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	13/01/2020	[redacted]
1107	PROTOCOLO	OBS - 1107	4	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		21	S4 - 2107	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	13/01/2020	[redacted]
1108	RONC	OBS - 1108	1	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		20	S3 - 2002 - S4 -2007	-	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Se debe Picar, resanar y alinear bruña del 1° y 2° piso.	Levantado	25/01/2020	[redacted]
1109	PROTOCOLO	OBS - 1109	1	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		1	S3 - 101 - 102	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1110	PROTOCOLO	OBS - 1110	4	27/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		1	S4 - 107 - 108	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1111	PROTOCOLO	OBS - 1111	8	28/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S5 - 509 - 0510	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	28/12/2019	[redacted]
1112	PROTOCOLO	OBS - 1112	4	28/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S5 - 509 - 0510	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	28/12/2019	[redacted]
1113	PROTOCOLO	OBS - 1113	6	28/12/2019	Semana 52	GTC	[redacted]		5	S5 - 509 - 0510	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	30/12/2019	[redacted]
1114	RONC	OBS - 1114	1	30/12/2019	Semana 01	PRODUCCIÓN	[redacted]		7 y 8	-	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Curado inadecuado	Realizar el curado de la zona afectada por 7 días	Levantado	30/12/2019	[redacted]
1116	PROTOCOLO	OBS - 1116	11	30/12/2019	Semana 01	GTC	[redacted]		6	S1 - 608 - 607	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1117	PROTOCOLO	OBS - 1117	3	30/12/2019	Semana 01	GTC	[redacted]		6	S1 - 608 - 607	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1118	PROTOCOLO	OBS - 1118	2	30/12/2019	Semana 01	GTC	[redacted]		6	S1 - 608 - 607	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	30/12/2019	[redacted]
1115	RONC	OBS - 1115	1	30/12/2019	Semana 01	PRODUCCIÓN	[redacted]		3	S1 - 305	-	ACABADOS	Piso Laminado	Falla en instalación	Se mejorara el corte de encuentro entre ambientes de piso laminado	Levantado	30/12/2019	[redacted]
1119	PROTOCOLO	OBS - 1119	1	31/12/2019	Semana 01	GTC	[redacted]		6	S2 - 605 - 604	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 08	[redacted]
1120	PROTOCOLO	OBS - 1120	1	31/12/2019	Semana 01	GTC	[redacted]		6	S2 - 605 - 604	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1121	PROTOCOLO	OBS - 1121	12	31/12/2019	Semana 01	GTC	[redacted]		6	S2- 605	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1122	PROTOCOLO	OBS - 1122	2	31/12/2019	Semana 01	GTC	[redacted]		6	S2 - 604	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 08	[redacted]
1123	RONC	OBS - 1123	1	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		17	S4 - 1707	COCINA	ACABADOS	Drywall	Desalineamiento	e debe volver a instalar las planchas Drywal en ducto de cocin	Levantado	4/01/2020	[redacted]
1124	RONC	OBS - 1124	1	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		6	S1 - 605	SALA	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Cambio de tuberia (tramo) dañada	Levantado	2/01/2020	[redacted]
1125	RONC	OBS - 1125	1	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		6	S1 - 605	SALA	ESTRUCTURA	Acero	Desalineamiento	Alinear acero de muros en cocinas	Levantado	2/01/2020	[redacted]
1126	PROTOCOLO	OBS - 1126	12	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		20	S1 - 2005 - 2006	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losa sy muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1127	PROTOCOLO	OBS - 1127	9	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		20	S1 - 2005 - 2006	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1128	PROTOCOLO	OBS - 1128	11	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		20	S1 - 2005 - 2006	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1129	PROTOCOLO	OBS - 1129	10	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		20	S2 - 2003 - 2004	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losa sy muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1130	PROTOCOLO	OBS - 1130	7	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		20	S2 - 2003 - 2004	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1131	PROTOCOLO	OBS - 1131	3	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		20	S2 - 2003 - 2004	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1132	PROTOCOLO	OBS - 1132	6	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		20	S3 - 2001 - 2002	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losa sy muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1133	PROTOCOLO	OBS - 1133	11	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		20	S3 - 2001 - 2002	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1134	PROTOCOLO	OBS - 1134	7	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		20	S3 - 2001 - 2002	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1135	PROTOCOLO	OBS - 1135	8	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		20	S4 - 2007 - 2008	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losa sy muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1136	PROTOCOLO	OBS - 1136	7	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		20	S4 - 2007 - 2008	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1137	PROTOCOLO	OBS - 1137	5	2/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]		20	S4 - 2008	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1142	RONC	OBS - 1142	1	3/01/2020	Semana 01	OT	[redacted]		5	S4 - 501	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Rebaba	Limpiar rebaba	Levantado	4/01/2020	[redacted]

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1146	PROTOCOLO	OBS - 1146	11	3/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3 - 602 - 603	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1147	PROTOCOLO	OBS - 1147	3	3/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3 - 602 - 603	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1148	PROTOCOLO	OBS - 1148	13	3/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3 - 602 - 603	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1149	PROTOCOLO	OBS - 1149	1	3/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3 - 602	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	3/01/2020	[redacted]
1150	PROTOCOLO	OBS - 1150	1	3/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3 - 603	LOSA - DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 08	[redacted]
1143	RONC	OBS - 1143	1	3/01/2020	Semana 01	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	10	S1 - 1005	MURO	ACABADOS	Pintura Interior	Falta resane	Terminar de resanar muro para completar empaste	Levantado	4/01/2020	[redacted]
1144	RONC	OBS - 1144	1	3/01/2020	Semana 01	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	2	-	COCINA	ACABADOS	Pintura Interior	Pintura Veteada	Retirar accesorio sanitario volver a pintar y colocar accesorio	Levantado	11/01/2020	[redacted]
1145	RONC	OBS - 1145	1	3/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2	-	ACABADOS	Pintura Interior	Mal acabado	Verificar las zonas donde el empaste no cubra la superficie y empastar de nuevo	Levantado	2/01/2020	[redacted]
1138	RONC	OBS - 1138	1	3/01/2020	Semana 01	OT	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 204	COCINA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	4/01/2020	[redacted]
1139	RONC	OBS - 1139	1	3/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1	-	ARQUITECTURA	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Losa con espesor de 8 cm, cunado deberia ser de 11.5 cm para respetar el ancho del sello.	Levantado	2/01/2020	[redacted]
1140	RONC	OBS - 1140	1	3/01/2020	Semana 01	OT	[redacted]	[redacted]	4	-	ESCALERA DE EMERGENCI	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Amolar y emparejar area	Levantado	6/01/2020	[redacted]
1141	RONC	OBS - 1141	12	3/01/2020	Semana 01	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	9	S1	-	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falla en procedimiento	Primero pintar las barandas para luego amolar	Levantado	2/01/2020	[redacted]
1151	RONC	OBS - 1151	1	3/01/2020	Semana 01	OT	[redacted]	[redacted]	4 y 5	-	BAÑOS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Trabajo inconcluso	Retirar corbatas	Levantado	4/01/2020	[redacted]
1152	PROTOCOLO	OBS - 1152	11	4/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S4 - 606 - 601	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1153	PROTOCOLO	OBS - 1153	2	4/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S4 - 606 - 601	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1154	PROTOCOLO	OBS - 1154	2	4/01/2020	Semana 01	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S4 - 606 - 601	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	4/01/2020	[redacted]
1159	PROTOCOLO	OBS - 1159	14	6/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S5 - 609 - 610	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1160	PROTOCOLO	OBS - 1160	3	6/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S5 - 609 - 610	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1155	RONC	OBS - 1155	1	6/01/2020	Semana 02	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	13	S3	FACHADA	ACABADOS	Pintura Exterior	Segregación	Apliar procedimiento y rehacer el trabajo	Levantado	6/01/2020	[redacted]
1156	RONC	OBS - 1156	1	6/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	21	-	TERRAZA	ARQUITECTURA	Acabados	Documentación incorrecta	Se comunico al area BIM para que coloque poyo de 10 x10 cm para evitar que agua ingrese al piso laminado.	Levantado	6/01/2020	[redacted]
1157	RONC	OBS - 1157	1	6/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S2 - 1703	COCINA	ACABADOS	Enchape	Falla en procedimiento	Se debe abrir un poco mas el corte para tomacorriente para que placa entre sin dificultad.	Levantado	9/01/2020	[redacted]
1158	RONC	OBS - 1158	1	6/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S3	GABINETE IIEE	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Reparar zona afectada	Levantado	9/01/2020	[redacted]
1164	PROTOCOLO	OBS - 1164	15	7/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 708 - 707	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1165	PROTOCOLO	OBS - 1165	2	7/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 708	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1166	PROTOCOLO	OBS - 1166	3	7/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 708 - 707	MUROS - LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1167	PROTOCOLO	OBS - 1167	1	7/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 708	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 08	[redacted]
1168	PROTOCOLO	OBS - 1168	1	7/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 707	MUROS - PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	11/01/2020	[redacted]
1161	RONC	OBS - 1161	1	7/01/2020	Semana 02	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	11	-	-	ARQUITECTURA	Acabados	Falta resane	Se amolara chinchon y se instalara papel en zona afectada	Levantado	11/01/2020	[redacted]
1162	RONC	OBS - 1162	1	7/01/2020	Semana 02	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	7	-	SALA	ACABADOS	Papel Mural	Protuberancia	Se Resano muro	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1163	RONC	OBS - 1163	1	7/01/2020	Semana 02	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	21	-	AZOTEA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Fisura	Realizar sellado de fisuras antes de colocar pastelero	Levantado	16/01/2020	[redacted]
1176	PROTOCOLO	OBS - 1176	12	8/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S2 - 705 - 704	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1177	PROTOCOLO	OBS - 1177	3	8/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S2 - 705 - 704	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1178	PROTOCOLO	OBS - 1178	2	8/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S2 - 705 - 704	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1171	RONC	OBS - 1171	1	8/01/2020	Semana 02	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004	-	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Falla en instalación	Reparar la estructura picada para la instalacion de caja octogonal.	Levantado	11/01/2020	[redacted]
1172	RONC	OBS - 1172	1	8/01/2020	Semana 02	OT	[redacted]	[redacted]	2	-	BALCON	ACABADOS	Baranda Metálica	Documentación incorrecta	Actualizar el plano mencionado	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1173	RONC	OBS - 1173	1	8/01/2020	Semana 02	OT	[redacted]	[redacted]	18	AC	ESCALERA DE EMERGENCI.	ESTRUCTURA	Encofrado	Acero/Alambre expuesto	Resanar con Planitop	Levantado	9/01/2020	[redacted]
1174	RONC	OBS - 1174	1	8/01/2020	Semana 02	OT	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1603	LAVANDERÍA	ACABADOS	Drywall	Desprendimiento	Se debe volver a masillar la cara dañada	Levantado	10/01/2020	[redacted]
1175	RONC	OBS - 1175	1	8/01/2020	Semana 02	OT	[redacted]	[redacted]	7	S3 - 703	DORMITORIO 2	ESTRUCTURA	Acero	Trabajo inconcluso	Se doblara acero para permitir cerrar encofrado	Levantado	8/01/2020	[redacted]
1169	RONC	OBS - 1169	1	8/01/2020	Semana 02	OT	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 204	INGRESO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Despostillamiento	Limpiar y resanar con mortero de alta resistencia	Levantado	9/01/2020	[redacted]
1170	RONC	OBS - 1170	1	8/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	-	FACHADA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falla en procedimiento	Picar y crear Bruña en fachada	Levantado	10/01/2020	[redacted]
1179	RONC	OBS - 1179	1	8/01/2020	Semana 02	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	20	AC	ESCALERA DE EMERGENCI	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta resane	Resanar con mortero de alta resistencia	Levantado	11/01/2020	[redacted]
1198	RONC	OBS - 1198	1	8/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	20	VARIOS	ESCALERA DUPLEX	ARQUITECTURA	Solaqueo	Trabajo inconcluso	Se debe hacer resane correspondiente antes que hagan acabado de pintura	Levantado	18/01/2020	[redacted]
1199	PROTOCOLO	OBS - 1199	7	8/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2105 - 2106	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losa sy muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1200	PROTOCOLO	OBS - 1200	6	8/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2105 - 2106	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1201	PROTOCOLO	OBS - 1201	4	8/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2105 - 2106	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1202	PROTOCOLO	OBS - 1202	6	8/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2103 - 2104	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losa sy muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1203	PROTOCOLO	OBS - 1203	5	8/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2103 - 2104	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1204	PROTOCOLO	OBS - 1204	5	8/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2103 - 2104	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1182	RONC	OBS - 1182	1	9/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 501	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	11/01/2020	[redacted]
1183	PROTOCOLO	OBS - 1183	12	9/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S3 - 702 - 703	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1184	PROTOCOLO	OBS - 1184	3	9/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S3 - 702 - 703	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1185	PROTOCOLO	OBS - 1185	1	9/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S3 - 702	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	11/01/2020	[redacted]
1181	RONC	OBS - 1181	1	9/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 508	COCINA	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Desnivel	picar, retirar y volver a instalar dando nivel a caja	Levantado	11/01/2020	[redacted]
1180	RONC	OBS - 1180	1	9/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 507	ESTAR	ARQUITECTURA	Solaqueo	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	11/01/2020	[redacted]
1186	PROTOCOLO	OBS - 1186	15	10/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S4 - 701 - 706	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1187	PROTOCOLO	OBS - 1187	2	10/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S4 - 701 - 706	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1188	PROTOCOLO	OBS - 1188	3	10/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S4 - 702 - 703	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1189	PROTOCOLO	OBS - 1189	2	10/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S4 - 702 - 703	MURO - LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	11/01/2020	[redacted]
1190	PROTOCOLO	OBS - 1190	14	11/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S5 - 709 - 710	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1191	PROTOCOLO	OBS - 1191	2	11/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S5 - 709 - 710	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1192	PROTOCOLO	OBS - 1192	2	11/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S5 - 709	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1193	PROTOCOLO	OBS - 1193	1	11/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S5 - 710	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	11/01/2020	[redacted]
1194	PROTOCOLO	OBS - 1194	1	11/01/2020	Semana 02	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S5 - 710	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	11/01/2020	[redacted]
1195	RONC	OBS - 1195	1	13/01/2020	Semana 03	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	8	S1	ESCALERA DE EMERGENCI	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	14/01/2020	[redacted]
1196	RONC	OBS - 1196	1	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	21	-	TERRAZA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	18/01/2020	[redacted]
1212	PROTOCOLO	OBS - 1212	14	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S1 - 808 - 807	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1213	PROTOCOLO	OBS - 1213	2	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S1 - 808 - 807	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1214	PROTOCOLO	OBS - 1214	1	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S1 - 808	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 08	[redacted]
1215	PROTOCOLO	OBS - 1215	1	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S1 - 807	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	13/01/2020	[redacted]
1197	RONC	OBS - 1197	1	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S2 - 2104	TERRAZA	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Ubicación incorrecta	Se debe mover 0.2 cm punto de luz para que bruña sea continua	Levantado	18/01/2020	[redacted]
1205	PROTOCOLO	OBS - 1205	8	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2101 - 2102	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losa sy muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1206	PROTOCOLO	OBS - 1206	4	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2101 - 2102	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1207	PROTOCOLO	OBS - 1207	7	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2101 - 2102	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1208	PROTOCOLO	OBS - 1208	6	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2107 - 2108	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Irregularidad en muros	Amolar protuberancias en losa sy muros por defectos de lata de encofrado.	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1209	PROTOCOLO	OBS - 1209	7	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2107 - 2108	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1210	PROTOCOLO	OBS - 1210	4	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2107	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1211	RONC	OBS - 1211	1	13/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	21	-	PARAPETOS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Documentación inexistente	El area BIM hizo plano con detalle de ubicación de bruñas en parapetos para controlar fisuras	Levantado	13/01/2020	[redacted]
1218	RONC	OBS - 1218	1	14/01/2020	Semana 03	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1505	BALCON	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Fisura	Limpiar y reparar según procedimiento utilizando Sika 52	Levantado	18/01/2020	[redacted]
1219	PROTOCOLO	OBS - 1219	12	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 805 - 804	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1220	PROTOCOLO	OBS - 1220	1	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 805	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1221	PROTOCOLO	OBS - 1221	1	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 804	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	16/01/2020	[redacted]
1222	PROTOCOLO	OBS - 1222	12	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 805	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 08	[redacted]
1216	RONC	OBS - 1216	1	14/01/2020	Semana 03	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	8	S3	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Armado incorrecto	Asegurar pines o cambiar elementos de aseguramiento (pines - chavetas - corbatas)	Levantado	14/01/2020	[redacted]
1217	RONC	OBS - 1217	1	14/01/2020	Semana 03	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	20	-	ESCALERA DUPLEX	ARQUITECTURA	Acabados	Trabajo inconcluso	Se cortara y se realizará derrame en losa	Levantado	18/01/2020	[redacted]
1223	PROTOCOLO	OBS - 1223	1	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2005	BALCON	ACABADOS	Baranda Metálica	Mal acabado	Se masilló, lijó y dio acabado de pintura	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1224	PROTOCOLO	OBS - 1224	1	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1505	BALCON	ACABADOS	Baranda Metálica	Mal acabado	Se masilló, lijó y dio acabado de pintura	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1225	PROTOCOLO	OBS - 1225	1	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S1 - 1405	BALCON	ACABADOS	Baranda Metálica	Mal acabado	Se masilló, lijó y dio acabado de pintura	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1226	PROTOCOLO	OBS - 1226	1	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S1 - 1105	BALCON	ACABADOS	Baranda Metálica	Mal acabado	Se masilló, lijó y dio acabado de pintura	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1227	PROTOCOLO	OBS - 1227	1	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S1 - 1005	BALCON	ACABADOS	Baranda Metálica	Mal acabado	Se masilló, lijó y dio acabado de pintura	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1228	PROTOCOLO	OBS - 1228	1	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 705	BALCON	ACABADOS	Baranda Metálica	Mal acabado	Se masilló, lijó y dio acabado de pintura	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1229	PROTOCOLO	OBS - 1229	1	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 605	BALCON	ACABADOS	Baranda Metálica	Mal acabado	Se masilló, lijó y dio acabado de pintura	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1230	RONC	OBS - 1230	1	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S1 - 1605	TERRAZA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Despostillamiento	Limpiar y resanar con mortero de alta resistencia	Levantado	14/01/2020	[redacted]
1231	RONC	OBS - 1231	1	14/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2006	ESCALERA DUPLEX	ARQUITECTURA	Solaqueo	Curado inadecuado	Colocar Agua a la escalera Vaciada	Levantado	14/01/2020	[redacted]
1236	PROTOCOLO	OBS - 1236	11	15/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 802 - 803	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1237	PROTOCOLO	OBS - 1237	2	15/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 802 - 803	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1238	PROTOCOLO	OBS - 1238	2	15/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 802 - 803	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1233	RONC	OBS - 1233	1	15/01/2020	Semana 03	OT	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2003	BAÑO	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Procedera a rellenar con mezcla la zona señalada	Levantado	15/01/2020	[redacted]
1235	RONC	OBS - 1235	1	15/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 608	LAVANDERÍA	ESTRUCTURA	Acero	Acero/Alambre expuesto	Picar, corte de acero y solaquear	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1232	RONC	OBS - 1232	1	15/01/2020	Semana 03	OT	[redacted]	[redacted]	3	-	ESCALERA DE EMERGENCI	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Rellenar Protuberancia y empastar	Levantado	16/01/2020	[redacted]

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	[redacted]
SUB-JEFE DE GTC:	[redacted]
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	18-Ene

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1234	RONC	OBS - 1234	1	15/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 107	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falla en instalación	Retirar y volver a colocar ojo chino con Pegamento Epoxico	Levantado	17/01/2020	[redacted]
1241	PROTOCOLO	OBS - 1241	11	16/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S4 - 801 - 806	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1242	PROTOCOLO	OBS - 1242	3	16/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S4 - 801 - 806	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1243	PROTOCOLO	OBS - 1243	1	16/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S4 - 801 - 806	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Burbujas	Rellenar con mortero y dar acabado uniforme	Levantado	Semana 08	[redacted]
1239	RONC	OBS - 1239	1	16/01/2020	Semana 03	OT	[redacted]	[redacted]	4 y 5	-	Varios	ACABADOS	Contrazócalo y/o Rodones	Falla en instalación	Pegar zonas con sillicona sin dejar espacio entre la pared y rodones	Levantado	18/01/2020	[redacted]
1240	RONC	OBS - 1240	1	16/01/2020	Semana 03	OT	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1908	Baño Principal	ARQUITECTURA	Acabados	Mal acabado	Resanar hueco en acabado de poyo y fraguar en zona afectada	Levantado	18/01/2020	[redacted]
1244	RONC	OBS - 1244	1	17/01/2020	Semana 03	OT	[redacted]	[redacted]	5	S1	-	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	18/01/2020	[redacted]
1246	PROTOCOLO	OBS - 1246	2	17/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S5 - 809 - 810	MURO - LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 08	[redacted]
1247	PROTOCOLO	OBS - 1247	12	17/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S5 - 809 - 810	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1248	PROTOCOLO	OBS - 1248	3	17/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S5 - 709 - 710	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 08	[redacted]
1245	RONC	OBS - 1245	1	17/01/2020	Semana 03	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 905	SALA	ACABADOS	Puertas y/o Marcos	Fisura	Resanar zona fisurada en hoja de puerta con pegamento y masilla.	Levantado	18/01/2020	[redacted]
1249	PROTOCOLO	OBS - 1249	1	17/01/2020	Semana 03	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S3 - 1702	COCINA	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Retirar piezas con falla de fábrica e instalar piezas nuevas.	Levantado	20/01/2020	[redacted]
1254	PROTOCOLO	OBS - 1254	13	20/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 908 - 907	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1255	PROTOCOLO	OBS - 1255	3	20/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 908 - 907	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1256	PROTOCOLO	OBS - 1256	4	20/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 908 - 907	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1257	PROTOCOLO	OBS - 1257	1	20/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 907	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	20/01/2020	[redacted]
1258	PROTOCOLO	OBS - 1258	16	20/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 905 - 904	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1259	PROTOCOLO	OBS - 1259	3	20/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 905 - 904	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1260	PROTOCOLO	OBS - 1260	1	20/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 905	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1261	PROTOCOLO	OBS - 1261	4	20/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 905 - 904	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 08	[redacted]
1250	RONC	OBS - 1250	1	20/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2003	ESCALERA	ACABADOS	Baranda Metálica	Falla en instalación	Se debe ajustar pernos para fijar gradas	Levantado	25/01/2020	[redacted]
1251	RONC	OBS - 1251	1	20/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	20	_	TERRAZAS	ARQUITECTURA	Acabados	Trabajo inconcluso	Se debe hacer derrame en las cajas para que contrazocalo de enchape no quede vacio	Levantado	25/01/2020	[redacted]
1252	RONC	OBS - 1252	1	20/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 905	SALA	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Tubería rota	Cambio de tramo de tuberia PVC	Levantado	20/01/2020	[redacted]
1253	RONC	OBS - 1253	1	20/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2002	TERRAZA	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Ubicación incorrecta	Se pico y se movio punto de sumidero	Levantado	21/01/2020	[redacted]
1263	PROTOCOLO	OBS - 1263	15	21/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S3 - 902 - 903	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1264	PROTOCOLO	OBS - 1264	4	21/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S3 - 902 - 903	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1265	PROTOCOLO	OBS - 1265	3	21/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S3 - 902 - 903	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	21/01/2020	[redacted]
1262	RONC	OBS - 1262	1	21/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 208	-	ACABADOS	Contrazócalo y/o Rodones	Falla en instalación	Cortar Rodones para que la puerta se pueda cerrar	Levantado	21/01/2020	[redacted]
1266	RONC	OBS - 1266	1	21/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S3 - S4	TERRAZA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Despostillamiento	Limpiar y resanar con mortero de alta resistencia	Levantado	21/01/2020	[redacted]
1269	PROTOCOLO	OBS - 1269	11	22/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S4 - 901 - 906	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1270	PROTOCOLO	OBS - 1270	2	22/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S4 - 901 - 906	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1271	PROTOCOLO	OBS - 1271	3	22/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S4 - 901 - 906	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	22/01/2020	[redacted]
1267	RONC	OBS - 1267	1	22/01/2020	Semana 04	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	6	S2 - 604	-	ACABADOS	Pintura Interior	Falla en procedimiento	Se verificara correcto proceso de pintura	Levantado	22/06/2020	[redacted]
1268	RONC	OBS - 1268	1	22/01/2020	Semana 04	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	-	-	CISTERNA - ESCALERA	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Segregación	Aplicar procedimiento para reparacion de cangrejeras y segregaciones (BC.PET42.N06)	Levantado	23/06/2020	[redacted]
1275	RONC	OBS - 1275	1	23/01/2020	Semana 04	OT	[redacted]	[redacted]	7	AC	DUCTO 2	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Despostillamiento	Limpiar y resanar con mortero de alta resistencia	Levantado	Semana 07	[redacted]
1279	PROTOCOLO	OBS - 1279	13	23/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S5 - 909 - 910	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1280	PROTOCOLO	OBS - 1280	3	23/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S5 - 909 - 910	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1281	PROTOCOLO	OBS - 1281	5	23/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S5 - 909 - 910	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1282	PROTOCOLO	OBS - 1282	11	23/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S2 - 1005 - 1004	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1283	PROTOCOLO	OBS - 1283	1	23/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S2 - 1005	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1288	PROTOCOLO	OBS - 1288	7	23/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S2 - 1004	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1272	RONC	OBS - 1272	1	23/01/2020	Semana 04	OT	[redacted]	[redacted]	19	S1 - 1905	BAÑO	ACABADOS	Enchape	Mancha	Se coordino con capataz de pintura para que personal limpie su sector al terminar ACT	Levantado	23/01/2020	[redacted]
1273	RONC	OBS - 1273	1	23/01/2020	Semana 04	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	21	S3- 2101	TERRAZA	ACABADOS	Enchape	Dimensión incorrecta	Se tarrajeara parapeto	Levantado	25/01/2020	[redacted]
1274	RONC	OBS - 1274	1	23/01/2020	Semana 04	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1306	BAÑO	ACABADOS	Equipamiento sanitario	Falla en instalación	Se comunico a capataz para su modificacion	Levantado	25/01/2020	[redacted]
1276	RONC	OBS - 1276	1	23/01/2020	Semana 04	OT	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 208	COCINA	ACABADOS	Enchape	Fisura	Saca el ceramico y volver a instalar	levantado	25/01/2020	[redacted]
1277	RONC	OBS - 1277	1	23/01/2020	Semana 04	OT	[redacted]	[redacted]	6	S3 - 601	-	ACABADOS	Puertas y/o Marcos	Despostillamiento	Colocar masilla plastica en marco	Levantado	25/01/2020	[redacted]
1278	RONC	OBS - 1278	1	23/01/2020	Semana 04	OT	[redacted]	[redacted]	5	S3 - 501	COCINA	ACABADOS	Baranda Metálica	Quiñe	Retocar soporte metalico	Levantado	24/06/2020	[redacted]
1284	PROTOCOLO	OBS - 1284	1	23/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S2 - 1804	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Retirar piezas con falla de fábrica e instalar piezas nuevas.	Levantado	23/01/2020	[redacted]
1285	PROTOCOLO	OBS - 1285	1	23/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S4 - 1807	COCINA	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fragua y dar acabado.	Levantado	23/01/2020	[redacted]
1286	PROTOCOLO	OBS - 1286	1	23/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S4 - 1808	BAÑO 2	ACABADOS	Enchape	Mal acabado	Retirar fragua y volver a fraguar dando acabado optimo.	Levantado	23/01/2020	[redacted]
1287	PROTOCOLO	OBS - 1287	1	23/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S4 - 1808	BAÑO 1	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Retirar piezas con falla de fábrica e instalar piezas nuevas.	Levantado	23/01/2020	[redacted]
1289	RONC	OBS - 1289	1	24/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 908	DORMITORIO 3	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	24/01/2020	[redacted]
1291	PROTOCOLO	OBS - 1291	12	24/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S1 - 1007 - 1008	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1292	PROTOCOLO	OBS - 1292	2	24/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S1 - 1007 - 1008	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1293	PROTOCOLO	OBS - 1293	1	24/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S1 - 1007 - 1008	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 08	[redacted]
1294	PROTOCOLO	OBS - 1294	2	24/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S1 - 1007 - 1008	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 08	[redacted]
1295	PROTOCOLO	OBS - 1295	2	24/01/2020	Semana 04	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S1 - 1007 - 1008	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	24/01/2020	[redacted]
1290	RONC	OBS - 1290	1	24/01/2020	Semana 04	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	-	-	BANCO DE ACERO	ESTRUCTURA	Acero	Almacenaje incorrecto	cubrir acero de manera adecuada forrando con plastico para evitar oxido	Levantado	24/01/2020	[redacted]
1296	PROTOCOLO	OBS - 1296	6	27/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S3 - 1002 - 1003	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1297	PROTOCOLO	OBS - 1297	2	27/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S3 - 1002 - 1003	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1298	PROTOCOLO	OBS - 1298	5	27/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S3 - 1002 - 1003	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 05	[redacted]
1299	PROTOCOLO	OBS - 1299	1	27/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S3 - 1002 - 1003	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 05	[redacted]
1301	PROTOCOLO	OBS - 1301	7	28/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S4 - 901 - 906	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 05	[redacted]
1302	PROTOCOLO	OBS - 1302	3	28/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S4 - 901 - 906	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 05	[redacted]
1303	PROTOCOLO	OBS - 1303	1	28/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S4 - 906	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 05	[redacted]
1304	PROTOCOLO	OBS - 1304	2	28/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S4 - 901	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 05	[redacted]
1300	RONC	OBS - 1300	1	28/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	20	-	TERRAZAS	ACABADOS	Enchape	Falla en instalación	Retirar fragua en juntas de dilatacion y colocar Sikaflex	Levantado	Semana 05	[redacted]
1305	RONC	OBS - 1305	1	28/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004	TERRAZA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Trabajo inconcluso	Se debe picar encuentro solaguar y hacer la bruña	Levantado	Semana 05	[redacted]
1306	RONC	OBS - 1306	1	29/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S4 - 301	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Acero/Alambre expuesto	Picar, retirar alambre y resanar	Levantado	Semana 05	[redacted]
1308	PROTOCOLO	OBS - 1308	5	29/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S5 - 1009 - 1010	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 05	[redacted]
1309	PROTOCOLO	OBS - 1309	4	29/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S5 - 1009 - 1010	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 05	[redacted]
1310	PROTOCOLO	OBS - 1310	3	29/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S5 - 1009 - 1010	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 05	[redacted]
1311	PROTOCOLO	OBS - 1311	2	29/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S5 - 1009 - 1010	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 05	[redacted]
1307	RONC	OBS - 1307	1	29/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	2	-	MONTANTES	ARQUITECTURA	Entubado PVC SAL	Falla en instalación	Retirar alambres con cables de las tuberas ya instaladas	Levantado	Semana 05	[redacted]
1319	RONC	OBS - 1319	1	30/01/2020	Semana 05	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	5	S2 - 501	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 05	[redacted]
1320	PROTOCOLO	OBS - 1320	8	30/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S1 - 1108 - 1107	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 05	[redacted]
1321	PROTOCOLO	OBS - 1321	6	30/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S1 - 1108 - 1107	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 05	[redacted]
1322	PROTOCOLO	OBS - 1322	1	30/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S1 - 1108 - 1107	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 05	[redacted]
1313	RONC	OBS - 1313	1	30/01/2020	Semana 05	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	15	S1- 1505	TERRAZA	ACABADOS	Enchape	Desnivel	Se cortara ceramico	Levantado	Semana 05	[redacted]
1314	RONC	OBS - 1314	1	30/01/2020	Semana 05	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 905	DORMITORIO 1	ACABADOS	Piso Laminado	Falla en instalación	Tapar juntas retirar y pegar	Levantado	Semana 05	[redacted]
1315	RONC	OBS - 1315	1	30/01/2020	Semana 05	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	11	S2	-	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Falla en procedimiento	Cambiar operario de vibrado	Levantado	Semana 05	[redacted]
1316	RONC	OBS - 1316	1	30/01/2020	Semana 05	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	-	-	PISCINA	OBRAS EXTERIORES	Excavación	Documentación incorrecta	Actualizar y buscar la aprobacion del especialista y/o cliente	Levantado	Semana 05	[redacted]
1317	RONC	OBS - 1317	1	30/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S3	PASADIZO	ARQUITECTURA	Entubado PEALPE	Falla en instalación	Picado de losa y reubicacion de tberia	Levantado	Semana 05	[redacted]
1312	RONC	OBS - 1312	1	30/01/2020	Semana 05	OT	[redacted]	[redacted]	5	S3 - 2002 - S4 - 2007	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Solaqueo	Dimensión incorrecta	Agrandar poyo base para que drywall calce sobre el poyo	Levantado	Semana 05	[redacted]
1323	RONC	OBS - 1323	1	30/01/2020	Semana 05	OT	[redacted]	[redacted]	18	AC	MONTANTE	ARQUITECTURA	Solaqueo	Acero/Alambre expuesto	Picar, cortar alambre y resanar	Levantado	Semana 05	[redacted]
1324	RONC	OBS - 1324	1	30/01/2020	Semana 05	OT	[redacted]	[redacted]	20	AC	-	ARQUITECTURA	Solaqueo	Acero/Alambre expuesto	Picar, cortar alambre y resanar	Levantado	Semana 05	[redacted]
1325	RONC	OBS - 1325	1	30/01/2020	Semana 05	OT	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004	PARAPETO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Óxido	Remover acero y resanar	Levantado	Semana 05	[redacted]
1326	RONC	OBS - 1326	1	30/01/2020	Semana 05	OT	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2002	PARAPETO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Óxido	Remover acero y resanar	Levantado	Semana 05	[redacted]
1318	RONC	OBS - 1318	1	30/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2	DORMITORIO 2	ARQUITECTURA	Tabiquería	Ubicación incorrecta	Retiro de Acero y ojo chino	Levantado	Semana 05	[redacted]
1327	PROTOCOLO	OBS - 1327	4	31/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S2 - 1105 - 1104	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 05	[redacted]
1328	PROTOCOLO	OBS - 1328	3	31/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S2 - 1105 - 1104	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 05	[redacted]
1329	PROTOCOLO	OBS - 1329	2	31/01/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S2 - 1105 - 1104	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 05	[redacted]
1330	PROTOCOLO	OBS - 1330	5	1/02/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S3 - 1102 - 1103	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 05	[redacted]
1331	PROTOCOLO	OBS - 1331	3	1/02/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S3 - 1102 - 1103	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 05	[redacted]
1332	PROTOCOLO	OBS - 1332	7	1/02/2020	Semana 05	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S3 - 1102 - 1103	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 05	[redacted]
1340	PROTOCOLO	OBS - 1340	4	3/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S4 - 1101 - 1106	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 06	[redacted]
1341	PROTOCOLO	OBS - 1341	2	3/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S4 - 1101 - 1106	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 06	[redacted]
1342	PROTOCOLO	OBS - 1342	2	3/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S4 - 1101 - 1106	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 06	[redacted]
1343	PROTOCOLO	OBS - 1343	2	3/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S4 - 1101 - 1106	MURO - LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 06	[redacted]
1333	RONC	OBS - 1333	1	3/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S5 - 1110	DORMITORIO 2	ESTRUCTURA	Entubado PVC - SAP	Ubicación incorrecta	Reubicacion de caja	Levantado	Semana 06	[redacted]
1334	PROTOCOLO	OBS - 1334	1	3/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2002	COCINA	ACABADOS	Enchape	Mancha	Retirar piezas con falla de fábrica e instalar piezas nuevas.	Levantado	Semana 07	[redacted]

[redacted]	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1335	PROTOCOLO	OBS - 1335	1	3/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2002	COCINA	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Retirar piezas con falla de fábrica e instalar piezas nuevas.	Levantado	Semana 07	[redacted]
1336	PROTOCOLO	OBS - 1336	1	3/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2003	COCINA	ACABADOS	Enchape	Mancha	Retirar piezas con falla de fábrica e instalar piezas nuevas.	Levantado	Semana 07	[redacted]
1337	PROTOCOLO	OBS - 1337	1	3/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2003	BAÑO 1	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Retirar ceramico cojoneados y volver a instalar correctamente.	Levantado	Semana 07	[redacted]
1338	PROTOCOLO	OBS - 1338	1	3/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004	COCINA	ACABADOS	Enchape	Mancha	Retirar piezas con falla de fábrica e instalar piezas nuevas.	Levantado	Semana 07	[redacted]
1339	PROTOCOLO	OBS - 1339	1	3/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004	BAÑO 1	ACABADOS	Enchape	Rayadura	Retirar Ceramico e instalar uno sin falla de fabrica	Levantado	Semana 07	[redacted]
1345	PROTOCOLO	OBS - 1345	3	4/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S5 - 1109 - 1110	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 06	[redacted]
1346	PROTOCOLO	OBS - 1346	2	4/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S5 - 1109 - 1110	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 06	[redacted]
1347	PROTOCOLO	OBS - 1347	2	4/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S5 - 1109	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 06	[redacted]
1348	PROTOCOLO	OBS - 1348	4	4/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S5 - 1110	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 06	[redacted]
1349	PROTOCOLO	OBS - 1349	5	4/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S5 - 1110	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 06	[redacted]
1344	RONC	OBS - 1344	1	4/02/2020	Semana 06	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	-	-	PISCINA	OBRAS EXTERIORES	Excavación	Ubicación incorrecta	Se pidio actualizacion de planos y se procedio a excavar en nueva ubicacon (Sumideros)	Levantado	Semana 06	[redacted]
1351	RONC	OBS - 1351	1	5/02/2020	Semana 06	OT	[redacted]	[redacted]	21	-	MANTENIMIENTO DE EQUI	ARQUITECTURA	Baranda Metálica	Trabajo inconcluso	Se coordino con hucesac para hacer la instalacion de columna	Levantado	Semana 06	[redacted]
1350	RONC	OBS - 1350	1	5/02/2020	Semana 06	OT	[redacted]	[redacted]	7	S3 -702	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar y alinear caja de tablero electrico	Levantado	Semana 06	[redacted]
1353	PROTOCOLO	OBS - 1353	6	5/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S1 - 1208 - 1207	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 06	[redacted]
1354	PROTOCOLO	OBS - 1354	4	5/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S1 - 1208 - 1207	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 06	[redacted]
1355	PROTOCOLO	OBS - 1355	3	5/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S1 - 1208 - 1207	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 06	[redacted]
1356	PROTOCOLO	OBS - 1356	5	5/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S1 - 1207	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 06	[redacted]
1357	RONC	OBS - 1357	1	5/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2101	TERRAZA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Acero/Alambre expuesto	Picar, cortar alambre y resanar	Levantado	Semana 06	[redacted]
1358	RONC	OBS - 1358	1	5/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2006	DUPLEX	ARQUITECTURA	Solaqueo	Trabajo inconcluso	Picar amolar y hacer bruñas	Levantado	Semana 06	[redacted]
1352	RONC	OBS - 1352	1	5/02/2020	Semana 06	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 206	TECHO	ACABADOS	Escarchado	Quiñe	Se revisara Proceso de instalacion de luminarias, para no rayar los techos	Levantado	Semana 06	[redacted]
1360	RONC	OBS - 1360	1	6/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 606	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar placa, aliner caja electrica y resanar	Levantado	Semana 06	[redacted]
1361	RONC	OBS - 1361	1	6/02/2020	Semana 06	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 604	LAVANDERÍA - VANO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 06	[redacted]
1364	RONC	OBS - 1364	1	6/02/2020	Semana 06	OT	[redacted]	[redacted]	7	S2 - 705	VANO DE INGRESO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 06	[redacted]
1365	PROTOCOLO	OBS - 1365	6	6/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1205 - 1204	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 06	[redacted]
1366	PROTOCOLO	OBS - 1366	3	6/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1205 - 1204	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 06	[redacted]
1367	PROTOCOLO	OBS - 1367	6	6/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1205	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 06	[redacted]
1368	PROTOCOLO	OBS - 1368	4	6/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1205 - 1204	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 06	[redacted]
1359	RONC	OBS - 1359	1	6/02/2020	Semana 06	OT	[redacted]	[redacted]	4	S5 - 409	COCINA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Suciedad	Hacer la limpieza de la caja electrica	Levantado	Semana 06	[redacted]
1369	RONC	OBS - 1369	1	6/02/2020	Semana 06	OT	[redacted]	[redacted]	18	AC	-	ARQUITECTURA	Solaqueo	Trabajo inconcluso	Colocar Bruña	Levantado	Semana 06	[redacted]
1362	RONC	OBS - 1362	1	6/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	-	-	VESTUARIOS	OBRAS EXTERIORES	Entubado PVC SAL	Ubicación incorrecta	Corregir deacuerdo a plano	Levantado	Semana 06	[redacted]
1363	RONC	OBS - 1363	1	6/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	-	-	VESTUARIOS	OBRAS EXTERIORES	Concreto Post-vaciado	Diseño Inadecuado	Picar losa y mover puntos, luego vaciar concreto en esa zona	Levantado	Semana 06	[redacted]
1370	PROTOCOLO	OBS - 1370	3	7/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S3 - 1202 - 1203	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 06	[redacted]
1371	PROTOCOLO	OBS - 1371	2	7/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S3 - 1202 - 1203	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 06	[redacted]
1372	PROTOCOLO	OBS - 1372	3	7/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S3 - 1202 - 1203	LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Levantado	Semana 06	[redacted]
1373	PROTOCOLO	OBS - 1373	6	8/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S4 - 1201 - 1206	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 06	[redacted]
1374	PROTOCOLO	OBS - 1374	2	8/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S4 - 1201 - 1206	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 06	[redacted]
1375	PROTOCOLO	OBS - 1375	2	8/02/2020	Semana 06	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S4 - 1201 - 1206	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 06	[redacted]
1376	RONC	OBS - 1376	1	10/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S5	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 07	[redacted]
1379	RONC	OBS - 1379	1	10/02/2020	Semana 07	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	13	S1	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falla en procedimiento	Capacitar al personal para vibrar de manera correcta	Levantado	Semana 07	[redacted]
1380	PROTOCOLO	OBS - 1380	3	10/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S5 - 1209 - 1210	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Levantado	Semana 07	[redacted]
1381	PROTOCOLO	OBS - 1381	2	10/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S5 - 1209 - 1210	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 07	[redacted]
1382	PROTOCOLO	OBS - 1382	2	10/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S5 - 1209 - 1210	LOSAS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 07	[redacted]
1377	RONC	OBS - 1377	1	10/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1308	COCINA	ESTRUCTURA	Entubado PP	Falla en instalación	Se acomodo malla y se dio mejor ubicación a la tuberia, ya que estaba arqueada por falta de espacio con ello quedo a una altura de 8 cm	Levantado	Semana 07	[redacted]
1378	RONC	OBS - 1378	1	10/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	8 y 9	S2 - 804 -809	´PUERTA DE INGRESO	ACABADOS	Puertas y/o Marcos	Fisura	Se debe colocar masilla para resanar fisura y dar acabado pintura	Levantado	Semana 07	[redacted]
1383	PROTOCOLO	OBS - 1383	8	11/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1308 - 1307	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 07	[redacted]
1384	PROTOCOLO	OBS - 1384	9	11/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1308 - 1307	RRAME DE VENTANA - MUF	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 07	[redacted]
1385	PROTOCOLO	OBS - 1385	1	11/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1308	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Abierto	Semana 07	[redacted]
1386	PROTOCOLO	OBS - 1386	1	11/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1308	TECHO - INGRESO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Abierto	Semana 07	[redacted]
1387	PROTOCOLO	OBS - 1387	1	11/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1308	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Acero/Alambre expuesto	Picar, retirar alambre y resanar	Levantado	Semana 07	[redacted]
1392	PROTOCOLO	OBS - 1392	8	12/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S2 - 1304 - 1305	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Abierto	Semana 07	[redacted]
1393	PROTOCOLO	OBS - 1393	8	12/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S2 - 1304 - 1305	DERRAME DE VENTANA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 07	[redacted]
1394	PROTOCOLO	OBS - 1394	3	12/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S2 - 1304 - 1305	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Abierto	Semana 07	[redacted]
1395	PROTOCOLO	OBS - 1395	1	12/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S2 - 1305	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Abierto	Semana 07	[redacted]
1396	PROTOCOLO	OBS - 1396	1	12/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S2 - 1304	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 07	[redacted]
1388	RONC	OBS - 1388	1	12/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 206	COCINA	ARQUITECTURA	Entubado PEALPE	Desalineamiento	Picar, alinear caja y resanar con mortero	Levantado	Semana 07	[redacted]
1389	RONC	OBS - 1389	1	12/02/2020	Semana 07	OT	[redacted]	[redacted]	8	AC	SCALERAS DE EMERGENC	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Trabajo inconcluso	Resanar	Levantado	Semana 07	[redacted]
1390	RONC	OBS - 1390	1	12/02/2020	Semana 07	OT	[redacted]	[redacted]	2	S3 - 201	LAVANDERIA	ACABADOS	Equipamiento sanitario	Falla en instalación	Se giro y dejo alineado caño de lavanderia	Levantado	Semana 07	[redacted]
1391	RONC	OBS - 1391	1	12/02/2020	Semana 07	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	-	-	PISCINA - LOSA	ESTRUCTURA	Concreto Pre-mezclado	Falla en procedimiento	Se realizo la actividad para volver a inducir al personal de concreto al ver el mal proceso de vibrado	Levantado	Semana 07	[redacted]
1402	RONC	OBS - 1402	1	13/02/2020	Semana 07	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	8	S1	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 07	[redacted]
1403	PROTOCOLO	OBS - 1403	6	13/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S3 - 1302 - 1303	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Abierto	Semana 07	[redacted]
1404	PROTOCOLO	OBS - 1404	2	13/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S3 - 1302 - 1303	DERRAM V - MUROS - TECH(	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 07	[redacted]
1405	PROTOCOLO	OBS - 1405	5	13/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S3 - 1302 - 1303	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Abierto	Semana 07	[redacted]
1406	PROTOCOLO	OBS - 1406	2	13/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S3 - 1302	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Burbujas	Rellenar con mortero y dar acabado uniforme	Abierto	Semana 07	[redacted]
1407	PROTOCOLO	OBS - 1407	1	13/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S3 - 1303	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Acero/Alambre expuesto	Picar, retirar alambre y resanar	Abierto	Semana 07	[redacted]
1397	RONC	OBS - 1397	1	13/02/2020	Semana 07	OT	[redacted]	[redacted]	3	S4 - 307	DORMITORIO	ACABADOS	Puertas y/o Marcos	Fisura	colocar masilla para resanar fisura y dar acabado pintura	Levantado	Semana 07	[redacted]
1398	RONC	OBS - 1398	1	13/02/2020	Semana 07	OT	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1407	DORMITORIO 1	ACABADOS	Puertas y/o Marcos	Quiñe	colocar masilla y dar acabado pintura	Levantado	Semana 07	[redacted]
1400	RONC	OBS - 1400	1	13/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	20	AC	-	ACABADOS	Enchape	Fisura	Reparar Ceramico	Levantado	Semana 07	[redacted]
1401	RONC	OBS - 1401	1	13/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Falla en instalación	Apuntalar losa y colocar correctamente la llave y el puntal	Levantado	Semana 07	[redacted]
1399	RONC	OBS - 1399	1	13/02/2020	Semana 07	OT	[redacted]	[redacted]	7	AC	VESTIBULO PREVIO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falla en instalación	Colocar ojo Chino	Levantado	Semana 07	[redacted]
1408	PROTOCOLO	OBS - 1408	1	14/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1301 - 1306	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 07	[redacted]
1409	PROTOCOLO	OBS - 1409	7	14/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1301 - 1306	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desplome	Picar, aplomar y dar acabado al derrame	Abierto	Semana 07	[redacted]
1410	PROTOCOLO	OBS - 1410	5	14/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1301 - 1306	DERRAM V - MUROS -	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 07	[redacted]
1411	PROTOCOLO	OBS - 1411	2	14/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1301 - 1306	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Abierto	Semana 07	[redacted]
1412	PROTOCOLO	OBS - 1412	1	14/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1301	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Abierto	Semana 07	[redacted]
1413	PROTOCOLO	OBS - 1413	2	14/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1306	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Acero/Alambre expuesto	Picar, retirar alambre y resanar	Abierto	Semana 07	[redacted]
1414	PROTOCOLO	OBS - 1414	6	15/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S5 - 1309 - 1310	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 07	[redacted]
1415	PROTOCOLO	OBS - 1415	4	15/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S5 - 1309 - 1310	DERRAM V - MUROS -	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 07	[redacted]
1416	PROTOCOLO	OBS - 1416	4	15/02/2020	Semana 07	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S5 - 1309 - 1310	MUROS - LOSA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Abierto	Semana 07	[redacted]
1438	RONC	OBS - 1438	1	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	1	AC	ESCALERA - DUPLEX	ARQUITECTURA	Baranda Metálica	Documentación incorrecta	Se modifico plano	Levantado	Semana 08	[redacted]
1439	RONC	OBS - 1439	1	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S5 - 1410	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	Semana 08	[redacted]
1441	PROTOCOLO	OBS - 1441	10	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S1 - 1408 - 1407	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 08	[redacted]
1442	PROTOCOLO	OBS - 1442	4	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S1 - 1408 - 1407	RRAME DE VENTANA - MUF	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 08	[redacted]
1417	PROTOCOLO	OBS - 1417	9	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S3 - 101 - 102	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1418	PROTOCOLO	OBS - 1418	6	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2 - 103 - 104	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1419	PROTOCOLO	OBS - 1419	3	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 105 - 106	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1420	PROTOCOLO	OBS - 1420	13	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 107 - 108	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1421	PROTOCOLO	OBS - 1421	2	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 207 - 208	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 08	[redacted]
1422	PROTOCOLO	OBS - 1422	4	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 207 - 208	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1423	PROTOCOLO	OBS - 1423	1	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 207 - 208	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	rebaba	Retirar rebaba con espatula	Levantado	Semana 08	[redacted]
1424	PROTOCOLO	OBS - 1424	2	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3 - 202 - 203	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 08	[redacted]
1425	PROTOCOLO	OBS - 1425	1	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 201 - 206	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1426	PROTOCOLO	OBS - 1426	1	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 201 - 206	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 08	[redacted]
1427	PROTOCOLO	OBS - 1427	1	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 201 - 206	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Trabajo inconcluso	Retirar corbata	Levantado	Semana 08	[redacted]
1428	PROTOCOLO	OBS - 1428	3	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S5 - 209 - 210	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1429	PROTOCOLO	OBS - 1429	2	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S5 - 209 - 210	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 08	[redacted]
1437	RONC	OBS - 1437	1	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	1	AC	CONCENTRADOR	ACABADOS	Equipamiento eléctrico	Falla en procedimiento	Se hara cambio de cables	Levantado	Semana 08	[redacted]
1440	RONC	OBS - 1440	1	17/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3	SALA	ESTRUCTURA	Encofrado	Ausencia de accesorio	Colocar cuñas en los encuentros del encofrado	Levantado	Semana 08	[redacted]
1443	RONC	OBS - 1443	1	18/02/2020	Semana 08	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	8	802	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Despostillamiento	Limpiar y resanar con mortero de alta resistencia	Levantado	Semana 08	[redacted]
1445	PROTOCOLO	OBS - 1445	11	18/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S2 - 1404 - 1405	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 08	[redacted]

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1446	PROTOCOLO	OBS - 1446	6	18/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S2 - 1404 - 1405	RRAME DE VENTANA - MUF	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 08	[redacted]
1447	PROTOCOLO	OBS - 1447	6	18/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S2 - 1504 - 1505	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Burbujas	Rellenar con mortero y dar acabado uniforme	Abierto	Semana 08	[redacted]
1444	RONC	OBS - 1444	1	18/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4	DORMITORIO 1	ESTRUCTURA	Acero	Dimensión incorrecta	Colocar el empalme con la medida indicada en plano	Levantado	Semana 08	[redacted]
1449	PROTOCOLO	OBS - 1449	1	19/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1402	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 08	[redacted]
1450	PROTOCOLO	OBS - 1450	9	19/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1402 - 1403	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 08	[redacted]
1451	PROTOCOLO	OBS - 1451	6	19/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1402 - 1403	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 08	[redacted]
1452	PROTOCOLO	OBS - 1452	4	19/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1403	RRAME DE VENTANA - MUF	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Abierto	Semana 08	[redacted]
1453	PROTOCOLO	OBS - 1453	2	19/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1402 - 1403	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Abierto	Semana 08	[redacted]
1454	PROTOCOLO	OBS - 1454	4	19/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1403	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Burbujas	Rellenar con mortero y dar acabado uniforme	Abierto	Semana 08	[redacted]
1448	RONC	OBS - 1448	1	19/02/2020	Semana 08	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 705	DORMITORIO 1	ACABADOS	Papel Mural	Falla en instalación	Se procedio con el pegado de papel en el dormitorio 1	Levantado	Semana 08	[redacted]
1457	RONC	OBS - 1457	1	20/02/2020	Semana 08	OT	[redacted]	[redacted]	12	AC	ESCALERA DE EMERGENCI	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 08	[redacted]
1458	PROTOCOLO	OBS - 1458	8	20/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1401 - 1406	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 08	[redacted]
1459	PROTOCOLO	OBS - 1459	4	20/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1401 - 1406	RRAME DE VENTANA - MUF	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 08	[redacted]
1460	PROTOCOLO	OBS - 1460	2	20/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1406	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Abierto	Semana 08	[redacted]
1461	PROTOCOLO	OBS - 1461	1	20/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1406	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Abierto	Semana 08	[redacted]
1455	RONC	OBS - 1455	1	20/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S1 - 1207	SALA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	Semana 08	[redacted]
1456	RONC	OBS - 1456	1	20/02/2020	Semana 08	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	-	-	VESTIDORES	OBRAS EXTERIORES	Entubado PVC - SAP	Documentación incorrecta	Se corrigio recorrido y puntos de salida	Levantado	Semana 08	[redacted]
1462	PROTOCOLO	OBS - 1462	2	20/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3 - 202 - 203	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1463	PROTOCOLO	OBS - 1463	1	20/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S5 - 209 - 210	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 08	[redacted]
1464	PROTOCOLO	OBS - 1464	1	20/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S5 - 209 - 210	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1468	PROTOCOLO	OBS - 1468	6	21/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S5 - 1409 - 1410	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 08	[redacted]
1469	PROTOCOLO	OBS - 1469	2	21/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S5 - 1410	ERRAME DE VENTANA - MU	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 08	[redacted]
1465	RONC	OBS - 1465	1	21/02/2020	Semana 08	OT	[redacted]	[redacted]	4	AC	PASADIZO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Quiñe	Picar, resanar y empastar	Levantado	Semana 08	[redacted]
1466	RONC	OBS - 1466	1	21/02/2020	Semana 08	OT	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 802	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre	Picar, alinear caja y resanar	Levantado	Semana 08	[redacted]
1467	RONC	OBS - 1467	1	21/02/2020	Semana 08	OT	[redacted]	[redacted]	6	AC	PASADIZO	ACABADOS	Pintura Interior	Daño en material	Solicitar retiro del clavo en pared	Levantado	Semana 08	[redacted]
1470	PROTOCOLO	OBS - 1470	1	21/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 307 - 308	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1471	PROTOCOLO	OBS - 1471	3	21/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 304 - 305	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1472	PROTOCOLO	OBS - 1472	1	21/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S3 - 302 - 303	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1473	PROTOCOLO	OBS - 1473	3	21/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S4 - 301 - 306	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1474	PROTOCOLO	OBS - 1474	4	21/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S5 - 309 - 310	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 08	[redacted]
1475	PROTOCOLO	OBS - 1475	7	22/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1507 - 1508	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 08	[redacted]
1476	PROTOCOLO	OBS - 1476	4	22/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1508	RRAME DE VENTANA - MUF	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 08	[redacted]
1477	PROTOCOLO	OBS - 1477	2	22/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1508	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Abierto	Semana 08	[redacted]
1478	PROTOCOLO	OBS - 1478	1	22/02/2020	Semana 08	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S1 - 1507	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Abierto	Semana 08	[redacted]
1488	PROTOCOLO	OBS - 1488	6	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S2 - 1504 - 1505	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 09	[redacted]
1489	PROTOCOLO	OBS - 1489	4	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S2 - 1504 - 1505	DERRAME DE VENTANA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 09	[redacted]
1490	PROTOCOLO	OBS - 1490	7	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S2 - 1504 - 1505	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 09	[redacted]
1491	PROTOCOLO	OBS - 1491	2	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S2 - 1504	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Hundimiento	Picar, limpiar y rellenar con mortero	Abierto	Semana 09	[redacted]
1492	PROTOCOLO	OBS - 1492	5	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1608 - 1607	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 09	[redacted]
1493	PROTOCOLO	OBS - 1493	4	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1608 - 1607	DERRAME DE VENTANA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Abierto	Semana 09	[redacted]
1494	PROTOCOLO	OBS - 1494	3	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1608 - 1607	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 09	[redacted]
1495	PROTOCOLO	OBS - 1495	8	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 - 1608 - 1607	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 09	[redacted]
1430	PROTOCOLO	OBS - 1430	2	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 307 - 308	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1431	PROTOCOLO	OBS - 1431	3	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S1 - 307 - 308	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 09	[redacted]
1432	PROTOCOLO	OBS - 1432	2	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S3 - 302 - 303	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1433	PROTOCOLO	OBS - 1433	4	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S3 - 302 - 303	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 09	[redacted]
1434	PROTOCOLO	OBS - 1434	5	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S4 - 301 - 306	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1435	PROTOCOLO	OBS - 1435	4	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S4 - 301 - 306	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 09	[redacted]
1436	PROTOCOLO	OBS - 1436	2	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S5 - 309 - 310	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 09	[redacted]
1479	PROTOCOLO	OBS - 1479	1	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S2 - 404	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 09	[redacted]
1480	PROTOCOLO	OBS - 1480	11	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S2 - 404	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1481	PROTOCOLO	OBS - 1481	2	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S3 - 402 - 403	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 09	[redacted]
1482	PROTOCOLO	OBS - 1482	7	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S3 - 402 - 403	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1483	PROTOCOLO	OBS - 1483	1	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S3 - 403	LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 09	[redacted]
1484	PROTOCOLO	OBS - 1484	3	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S4 - 401	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1485	PROTOCOLO	OBS - 1485	5	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S5 - 410	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 09	[redacted]
1486	RONC	OBS - 1486	1	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 201 - S3 - 202	COCINA	ACABADOS	Enchape	Falla en procedimiento	Se tendra que llenar zonas interiores con pegame para que toda la pieza tenga pegamento	Levantado	Semana 09	[redacted]
1487	RONC	OBS - 1487	1	24/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S3 - 303	SALA	ARQUITECTURA	Entubado PEALPE	Falta recubrimiento	Picar losa y dar recubrimiento de 2 cm en tuberi de gas	Levantado	Semana 09	[redacted]
1496	RONC	OBS - 1496	1	25/02/2020	Semana 09	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	-	AC	MONTANTES	ACABADOS	Pintura Interior	Mal acabado	Se mando a quitar la pintura para dejar libre a tuberia de ACI, para poder clocar el sello corta fuego	Levantado	Semana 09	[redacted]
1502	RONC	OBS - 1502	1	26/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S1 - 1107	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar muro, alinear tomacorriente y dar acabado	Levantado	Semana 09	[redacted]
1503	RONC	OBS - 1503	1	26/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	11	AC	MONTANTE	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 09	[redacted]
1505	PROTOCOLO	OBS - 1505	6	26/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S3 - 1502 - 1503	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 09	[redacted]
1506	PROTOCOLO	OBS - 1506	4	26/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S3 - 1502 - 1503	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 09	[redacted]
1507	PROTOCOLO	OBS - 1507	4	26/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S3 - 1503	DERRAME DE VENTANA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 09	[redacted]
1497	RONC	OBS - 1497	1	26/02/2020	Semana 09	OT	[redacted]	[redacted]	3	AC	MONTANTE IIEE	ARQUITECTURA	Solaqueo	Quiñe	Resanar quiñe con mortero de alta resistencia	Levantado	Semana 09	[redacted]
1498	RONC	OBS - 1498	1	26/02/2020	Semana 09	OT	[redacted]	[redacted]	9	S5 - 909	-	ARQUITECTURA	Solaqueo	Despostillamiento	Limpiar y resanar con mortero de alta resistencia	Levantado	Semana 09	[redacted]
1499	RONC	OBS - 1499	1	26/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	11	S4 - 1106	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Solaqueo	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 09	[redacted]
1500	RONC	OBS - 1500	1	26/02/2020	Semana 09	OT	[redacted]	[redacted]	11	S1 - 1108	DUCTO DE IIEE	ARQUITECTURA	Solaqueo	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 09	[redacted]
1501	RONC	OBS - 1501	1	26/02/2020	Semana 09	OT	[redacted]	[redacted]	14	S4 - 1401	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Solaqueo	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 09	[redacted]
1504	RONC	OBS - 1504	1	26/02/2020	Semana 09	OT	[redacted]	[redacted]	1	FACHADA	COCINA	ACABADOS	Pintura Exterior	Rayadura	Volver a pintar dicha zona	Levantado	Semana 09	[redacted]
1510	RONC	OBS - 1510	1	27/02/2020	Semana 09	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	14	S4-1406	SALA - TECHO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Abierto	Semana 09	[redacted]
1511	PROTOCOLO	OBS - 1511	7	27/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S4 - 1501 - 1506	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 09	[redacted]
1512	PROTOCOLO	OBS - 1512	4	27/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S4 - 1501 - 1506	DERRAME DE VENTANA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 09	[redacted]
1513	PROTOCOLO	OBS - 1513	2	27/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S4 - 1506	MURO - DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Abierto	Semana 09	[redacted]
1514	PROTOCOLO	OBS - 1514	4	27/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S4 - 1506	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 09	[redacted]
1508	RONC	OBS - 1508	1	27/02/2020	Semana 09	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	-	-	CISTERNA	OBRAS EXTERIORES	Concreto Post-vaciado	Documentación incorrecta	Se procedio con la consulta al especialista para comprobar la no afectacion a la estructura	Levantado	Semana 09	[redacted]
1509	RONC	OBS - 1509	1	27/02/2020	Semana 09	OT	[redacted]	[redacted]	-	-	CAJA DE VALVULA ACI	OBRAS EXTERIORES	Concreto Post-vaciado	Dimensión incorrecta	Realizar un vaciado de 3 cm	Levantado	Semana 09	[redacted]
1516	PROTOCOLO	OBS - 1516	5	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S5 - 1509 - 1510	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Abierto	Semana 09	[redacted]
1517	PROTOCOLO	OBS - 1517	5	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S5 - 1509 - 1510	ERRAME VENTANA - MUR	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Abierto	Semana 09	[redacted]
1518	PROTOCOLO	OBS - 1518	7	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S5 - 1509 - 1510	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 09	[redacted]
1515	RONC	OBS - 1515	1	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	-	-	COLUMNA DE VESTUARI	OBRAS EXTERIORES	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 09	[redacted]
1519	PROTOCOLO	OBS - 1519	1	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S1 - 407	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1520	PROTOCOLO	OBS - 1520	2	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S2 - 405 - 404	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1521	PROTOCOLO	OBS - 1521	1	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S3 - 402	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1522	PROTOCOLO	OBS - 1522	3	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S4 - 401 - 406	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1523	PROTOCOLO	OBS - 1523	1	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S5 - 409	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1524	PROTOCOLO	OBS - 1524	2	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 507	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1525	PROTOCOLO	OBS - 1525	1	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S2 - 504	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1526	PROTOCOLO	OBS - 1526	2	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S3 - 503 - 502	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1527	PROTOCOLO	OBS - 1527	1	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S3 - 502	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Quiñe	Humedecer, solaquear y dar acabado	Levantado	Semana 09	[redacted]
1528	PROTOCOLO	OBS - 1528	1	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 506	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Quiñe	Humedecer, solaquear y dar acabado	Levantado	Semana 09	[redacted]
1529	PROTOCOLO	OBS - 1529	2	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S5 - 509	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 09	[redacted]
1530	PROTOCOLO	OBS - 1530	1	28/02/2020	Semana 09	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S5 - 509	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Quiñe	Humedecer, solaquear y dar acabado	Levantado	Semana 09	[redacted]
1537	RONC	OBS - 1537	1	2/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	-	-	PISCINA - MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Curado inadecuado	Realizar el curado de la zona afectada por 7 días	Levantado	Semana 10	[redacted]
1538	PROTOCOLO	OBS - 1538	6	2/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 -1605 - 1604	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 10	[redacted]
1539	PROTOCOLO	OBS - 1539	2	2/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 -1605 - 1604	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 10	[redacted]
1540	PROTOCOLO	OBS - 1540	7	2/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S2 -1605 - 1604	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 10	[redacted]
1536	RONC	OBS - 1536	1	2/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	-	-	MONTANTE DE DESAGUE	ARQUITECTURA	Entubado PVC - SAP	Falta Proteccion	Se indico al personal que al retirar tapaductos los desperdicios atrapados ahí deben botarlo en el mismo piso y luego barrerlo. No botarlo por el ducto.	Levantado	Semana 10	[redacted]
1548	PROTOCOLO	OBS - 1548	8	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S3 -1602 - 1603	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 10	[redacted]
1549	PROTOCOLO	OBS - 1549	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S3 -1602 - 1603	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1550	PROTOCOLO	OBS - 1550	3	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S3 -1602 - 1603	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 10	[redacted]
1551	PROTOCOLO	OBS - 1551	4	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S3 -1602 - 1603	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 10	[redacted]
1541	PROTOCOLO	OBS - 1541	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 201	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Mal acabado	Uniformizar acabado en sello	Levantado	Semana 10	[redacted]
1542	PROTOCOLO	OBS - 1542	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 207	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 10	[redacted]
1531	PROTOCOLO	OBS - 1531	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 608	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]

[redacted]	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	[redacted]
SUB-JEFE DE GTC:	[redacted]
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1532	PROTOCOLO	OBS - 1532	1	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S2 - 604	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1533	PROTOCOLO	OBS - 1533	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3 - 603 - 602	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1534	PROTOCOLO	OBS - 1534	1	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S4 - 601 - 606	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1535	PROTOCOLO	OBS - 1535	3	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S5 - 610	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1543	PROTOCOLO	OBS - 1543	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S4 - 601 - 606	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1544	PROTOCOLO	OBS - 1544	3	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3 - 602 - 603	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1545	PROTOCOLO	OBS - 1545	1	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S2 - 604 - 605	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1546	PROTOCOLO	OBS - 1546	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 607 - 608	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1547	PROTOCOLO	OBS - 1547	4	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S5 - 609 - 610	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1636	PROTOCOLO	OBS - 1636	1	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S4 - 701 - 706	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en buña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 10	[redacted]
1637	PROTOCOLO	OBS - 1637	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S4 - 701 - 706	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 10	[redacted]
1638	PROTOCOLO	OBS - 1638	1	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S3 - 702 - 703	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 10	[redacted]
1639	PROTOCOLO	OBS - 1639	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S2 - 704 - 705	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 10	[redacted]
1640	PROTOCOLO	OBS - 1640	3	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 707 - 708	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 10	[redacted]
1641	PROTOCOLO	OBS - 1641	1	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S5 - 709 - 710	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Se procedio a corregir el alineamiento entre acabados en pintura	Levantado	Semana 10	[redacted]
1642	PROTOCOLO	OBS - 1642	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S5 - 709 - 710	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 10	[redacted]
1644	PROTOCOLO	OBS - 1644	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 707 - 708	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 10	[redacted]
1645	PROTOCOLO	OBS - 1645	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S2- 704 - 705	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 10	[redacted]
1646	PROTOCOLO	OBS - 1646	3	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S3 - 702 - 703	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 10	[redacted]
1647	PROTOCOLO	OBS - 1647	1	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S4 - 701 - 706	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 10	[redacted]
1648	PROTOCOLO	OBS - 1648	1	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S4 - 701 - 706	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	mal acabado	Resanar mal acabado de bruña	Levantado	Semana 10	[redacted]
1649	PROTOCOLO	OBS - 1649	2	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S5 - 709 - 710	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 10	[redacted]
1650	PROTOCOLO	OBS - 1650	1	3/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S5 - 709 - 710	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 10	[redacted]
1559	RONC	OBS - 1559	1	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S2 - 1404	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, nivelar caja, resanar	Levantado	Semana 10	[redacted]
1560	RONC	OBS - 1560	1	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1306	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, nivelar caja, resanar	Levantado	Semana 10	[redacted]
1561	RONC	OBS - 1561	1	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S1 - 1408	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Almacenaje incorrecto	Ordenar área de trabajo y distribuir materiales en el dpto	Levantado	Semana 10	[redacted]
1562	RONC	OBS - 1562	1	4/03/2020	Semana 10	OT	[redacted]	[redacted]	13	-	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Despostillamiento	Limpiar y resanar con mortero de alta resistencia	Levantado	Semana 10	[redacted]
1564	RONC	OBS - 1564	1	4/03/2020	Semana 10	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	7	AC	MURO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Segregación	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 10	[redacted]
1565	RONC	OBS - 1565	1	4/03/2020	Semana 10	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	12	S5 - 1209	DORMITORIO 1	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Rebaba	Limpiar rebaba	Levantado	Semana 10	[redacted]
1567	PROTOCOLO	OBS - 1567	4	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S4 -1601 - 1606	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 10	[redacted]
1568	PROTOCOLO	OBS - 1568	9	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S4 -1601 - 1606	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 10	[redacted]
1569	PROTOCOLO	OBS - 1569	3	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S4 -1601 - 1606	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 10	[redacted]
1552	PROTOCOLO	OBS - 1552	1	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 508	MURO	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 10	[redacted]
1553	PROTOCOLO	OBS - 1553	8	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S2 - 504 - 505	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1554	PROTOCOLO	OBS - 1554	7	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S2 - 504 - 505	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 10	[redacted]
1555	PROTOCOLO	OBS - 1555	2	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S3 - 502 - 503	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1556	PROTOCOLO	OBS - 1556	1	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 501 - 506	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 10	[redacted]
1557	PROTOCOLO	OBS - 1557	2	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S4 - 501 - 506	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1597	PROTOCOLO	OBS - 1597	4	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 607 - 608	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1598	PROTOCOLO	OBS - 1598	1	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S1 - 607 - 608	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 10	[redacted]
1599	PROTOCOLO	OBS - 1599	3	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S2- 604 - 605	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1600	PROTOCOLO	OBS - 1600	2	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S3- 602 - 603	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1601	PROTOCOLO	OBS - 1601	1	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S4 - 601 - 606	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	mal acabado	Resanar mal acabado de bruña	Levantado	Semana 10	[redacted]
1602	PROTOCOLO	OBS - 1602	3	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S4 - 601 - 606	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1603	PROTOCOLO	OBS - 1603	2	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S5 - 609 - 610	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 10	[redacted]
1604	PROTOCOLO	OBS - 1604	8	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S5 - 609 - 610	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1558	RONC	OBS - 1558	1	4/03/2020	Semana 10	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 207	MURO	ACABADOS	Pintura Interior	Desalineamiento	Se procedio a corregir el alineamiento entre acabados en pintura	Levantado	Semana 10	[redacted]
1563	RONC	OBS - 1563	1	4/03/2020	Semana 10	OT	[redacted]	[redacted]	-	-	RED GENERAL DE ACI	OBRAS EXTERIORES	Sistema de Agua Contra Incendio	Desalineamiento	Descubrir tuberia y alinear el recorrido	Levantado	Semana 10	[redacted]
1566	PROTOCOLO	OBS - 1566	3	4/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 508	COCINA	ARQUITECTURA	Acabados	Piso Laminado	Se tiene que rellenar el piso de cemento semi pulido	Levantado	Semana 10	[redacted]
1572	PROTOCOLO	OBS - 1572	5	5/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S5 -1609 - 1610	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 10	[redacted]
1573	PROTOCOLO	OBS - 1573	7	5/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S5 -1609 - 1610	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 10	[redacted]
1574	PROTOCOLO	OBS - 1574	2	5/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	16	S5 -1609 - 1610	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1570	PROTOCOLO	OBS - 1570	2	5/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 305	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 10	[redacted]
1571	RONC	OBS - 1571	1	5/03/2020	Semana 10	OT	[redacted]	[redacted]	3	AC - 15 - 20	ESCALERA DE EMERGENCI	ACABADOS	Baranda Metálica	Trabajo inconcluso	Pintar parte inferior faltante	Levantado	Semana 10	[redacted]
1575	PROTOCOLO	OBS - 1575	4	6/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S1 -1607 - 1608	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 10	[redacted]
1576	PROTOCOLO	OBS - 1576	6	6/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S1 -1607 - 1608	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 10	[redacted]
1577	PROTOCOLO	OBS - 1577	2	6/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S1 -1707 - 1708	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 10	[redacted]
1580	RONC	OBS - 1580	1	6/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1	PASADIZO	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 10	[redacted]
1578	RONC	OBS - 1578	1	6/03/2020	Semana 10	OT	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1307	SALA	ACABADOS	Papel Mural	Protuberancia	Retirar papel, retirar rebaba de empaste y volver a colocar papel	Levantado	Semana 10	[redacted]
1579	RONC	OBS - 1579	1	6/03/2020	Semana 10	OT	[redacted]	[redacted]	15	S4 - 1508	SALA	ACABADOS	Papel Mural	Protuberancia	Retirar papel, retirar rebaba de empaste y volver a colocar papel	Levantado	Semana 10	[redacted]
1582	PROTOCOLO	OBS - 1582	5	7/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S2 -1705 - 1704	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 10	[redacted]
1583	PROTOCOLO	OBS - 1583	3	7/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S2 -1705 - 1704	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 10	[redacted]
1584	PROTOCOLO	OBS - 1584	3	7/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S2 -1705 - 1704	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 10	[redacted]
1585	PROTOCOLO	OBS - 1585	1	7/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S2 -1705 - 1704	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 10	[redacted]
1586	PROTOCOLO	OBS - 1586	3	7/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S2 -1705 - 1704	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 10	[redacted]
1581	RONC	OBS - 1581	1	7/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S3	SALA	ESTRUCTURA	Accesorio Eléctrico	Caja en mal estado	Cambiar caja eléctrica	Levantado	Semana 10	[redacted]
1587	PROTOCOLO	OBS - 1587	1	7/03/2020	Semana 10	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S4 - 406	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 10	[redacted]
1590	PROTOCOLO	OBS - 1590	5	9/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S3 -1702 - 1703	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 11	[redacted]
1591	PROTOCOLO	OBS - 1591	3	9/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S3 -1702 - 1703	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 11	[redacted]
1592	PROTOCOLO	OBS - 1592	3	9/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S3 -1702 - 1703	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 11	[redacted]
1593	PROTOCOLO	OBS - 1593	1	9/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S3 -1702 - 1703	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 11	[redacted]
1594	PROTOCOLO	OBS - 1594	3	9/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S3 -1702 - 1703	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	falta resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 11	[redacted]
1588	PROTOCOLO	OBS - 1588	1	9/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S3 - 502	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 11	[redacted]
1589	PROTOCOLO	OBS - 1589	1	9/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	5	S1 - 508	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Mal acabado	Uniformizar acabado en sello	Levantado	Semana 11	[redacted]
1595	RONC	OBS - 1595	1	9/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	-	-	EXTERIORES	ACABADOS	Enchape	Mal almacenamiento	Se coordino con Produccion para mover el enchape a su alamacen	Levantado	Semana 11	[redacted]
1606	PROTOCOLO	OBS - 1606	4	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S4 -1701 - 1706	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 11	[redacted]
1607	PROTOCOLO	OBS - 1607	6	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S4 -1701 - 1706	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 11	[redacted]
1608	PROTOCOLO	OBS - 1608	3	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S4 -1701 - 1706	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 11	[redacted]
1609	PROTOCOLO	OBS - 1609	2	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S4 -1701 - 1706	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 11	[redacted]
1596	RONC	OBS - 1596	1	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4	AREA COMUN	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falla en procedimiento	Realizar Juntas en sector 4	Levantado	Semana 11	[redacted]
1605	RONC	OBS - 1605	1	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	-	-	EXTERIOR - FRONTAL	OBRAS EXTERIORES	Entubado PP	Desnivel	Corregir pendiente que tiene la tuberia	Levantado	Semana 11	[redacted]
1610	RONC	OBS - 1610	1	10/03/2020	Semana 11	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	1 al 20	-	BAÑos	EQUIPAMIENTO	Sistema de Ventilación	Falla en Instalacion	Se reinstalo el extractor en los baños	Levantado	Semana 11	[redacted]
1611	PROTOCOLO	OBS - 1611	2	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 201	MURO	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Colocar mas pegamento en zona inferior de zócalos	Levantado	Semana 11	[redacted]
1612	PROTOCOLO	OBS - 1612	1	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S4 - 201	MURO	ACABADOS	Enchape	trabajo inconcluso	Colocar fragua en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1613	PROTOCOLO	OBS - 1613	4	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3 - 202	MURO	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Colocar mas pegamento en zona inferior de zócalos	Levantado	Semana 11	[redacted]
1614	PROTOCOLO	OBS - 1614	1	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S3 - 203	MURO	ACABADOS	Enchape	trabajo inconcluso	Colocar fragua en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1615	PROTOCOLO	OBS - 1615	1	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 204	MURO	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambio de pieza dañada	Levantado	Semana 11	[redacted]
1616	PROTOCOLO	OBS - 1616	1	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S2 - 205	MURO	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Colocar mas pegamento en zona inferior de zócalos	Levantado	Semana 11	[redacted]
1617	PROTOCOLO	OBS - 1617	1	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S1 - 208	MURO	ACABADOS	Enchape	trabajo inconcluso	Colocar fragua en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1618	PROTOCOLO	OBS - 1618	2	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S5 - 209	MURO	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Colocar mas pegamento en zona inferior de zócalos	Levantado	Semana 11	[redacted]
1619	PROTOCOLO	OBS - 1619	2	10/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	2	S5 - 210	MURO	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Colocar mas pegamento en zona inferior de zócalos	Levantado	Semana 11	[redacted]
1628	PROTOCOLO	OBS - 1628	4	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S5 -1709 - 1710	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 11	[redacted]
1629	PROTOCOLO	OBS - 1629	6	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S5 -1709 - 1710	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 11	[redacted]
1630	PROTOCOLO	OBS - 1630	2	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S5 -1709 - 1710	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 11	[redacted]
1631	PROTOCOLO	OBS - 1631	4	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S5 -1709 - 1710	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 11	[redacted]
1620	RONC	OBS - 1620	1	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S5 - 709	BAÑO 2	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desplome	Se tuvo que picar poyo para que tenga el espesor de 14 cm y puedan enchapar	Levantado	Semana 11	[redacted]
1621	PROTOCOLO	OBS - 1621	8	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 707 - 708	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 11	[redacted]
1622	PROTOCOLO	OBS - 1622	2	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S1 - 707 - 708	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 11	[redacted]
1623	PROTOCOLO	OBS - 1623	2	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S2 - 704 - 705	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 11	[redacted]
1624	PROTOCOLO	OBS - 1624	1	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S2 - 704 - 705	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 11	[redacted]
1625	PROTOCOLO	OBS - 1625	4	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S3 - 702 - 703	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 11	[redacted]
1626	PROTOCOLO	OBS - 1626	2	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S4 - 701 - 706	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 11	[redacted]
1627	PROTOCOLO	OBS - 1627	2	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	7	S5 - 709 - 710	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 11	[redacted]
1632	RONC	OBS - 1632	1	11/03/2020	Semana 11	OT	[redacted]	[redacted]	-	-	CISTERNA	EQUIPAMIENTO	Sistema de Agua Contra Incendio	Falla en instalación	Ejecutar deacuerdo al plan	Levantado	Semana 11	[redacted]

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	[redacted]
SUB-JEFE DE GTC:	[redacted]
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	18-Ene

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1633	RONC	OBS - 1633	1	11/03/2020	Semana 11	OT	[redacted]	[redacted]	1	S1 - 105	VENTANA	ACABADOS	Ventanas y/o Mamparas	Despostillamiento	Resanar con mortero de alta resistencia y dae blanqueado	Levantado	Semana 11	[redacted]
1634	RONC	OBS - 1634	1	11/03/2020	Semana 11	OT	[redacted]	[redacted]	18	S1	-	ESTRUCTURA	Encofrado	Armado incorrecto	Se debe colocar dulopillo en parte inferior de encofrado en muro	Levantado	Semana 11	[redacted]
1635	RONC	OBS - 1635	1	11/03/2020	Semana 11	OT	[redacted]	[redacted]	4	S1 - 406	COCINA	ACABADOS	Enchape	Falla en procedimiento	Colocar pegamento en la pieza de zocalo	Levantado	Semana 11	[redacted]
1643	RONC	OBS - 1643	1	11/03/2020	Semana 11	JEFE DE OBRA	[redacted]	[redacted]	1	S5 - 109	BAÑO 1	ARQUITECTURA	Entubado PVC SAL	Falta resane	Reparacion de tuberia de desague (Antes de resane de techo)	Levantado	Semana 11	[redacted]
1651	PROTOCOLO	OBS - 1651	1	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S3 - 303	MURO	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambio de pieza dañada	Levantado	Semana 11	[redacted]
1652	PROTOCOLO	OBS - 1652	1	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	3	S2 - 304	MURO	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambio de pieza dañada	Levantado	Semana 11	[redacted]
1653	PROTOCOLO	OBS - 1653	1	11/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	6	S5 - 609	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 11	[redacted]
1665	RONC	OBS - 1665	1	12/03/2020	Semana 11	OT	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2001	SALA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 11	[redacted]
1666	RONC	OBS - 1666	1	12/03/2020	Semana 11	OT	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1204	COCINA	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 11	[redacted]
1668	PROTOCOLO	OBS - 1668	2	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S1 - 1807 - 1808	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 11	[redacted]
1669	PROTOCOLO	OBS - 1669	8	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S1 - 1807 - 1808	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 11	[redacted]
1670	PROTOCOLO	OBS - 1670	2	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S1 - 1807 - 1808	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 11	[redacted]
1671	PROTOCOLO	OBS - 1671	1	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S1 - 1807 - 1808	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 11	[redacted]
1654	PROTOCOLO	OBS - 1654	12	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 804 - 805	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Abierto	Semana 11	[redacted]
1655	PROTOCOLO	OBS - 1655	1	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 804 - 805	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Abierto	Semana 11	[redacted]
1656	PROTOCOLO	OBS - 1656	1	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 804 - 805	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	mal acabado	Resanar mal acabado de bruña	Abierto	Semana 11	[redacted]
1657	PROTOCOLO	OBS - 1657	10	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 802 - 803	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Abierto	Semana 11	[redacted]
1658	PROTOCOLO	OBS - 1658	2	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 802 - 803	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	protuberancia	Amolar protuberancia	Abierto	Semana 11	[redacted]
1659	PROTOCOLO	OBS - 1659	3	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 802 - 803	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	mal acabado	Resanar mal acabado de bruña	Abierto	Semana 11	[redacted]
1660	PROTOCOLO	OBS - 1660	2	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S4 - 801 - 806	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 11	[redacted]
1661	PROTOCOLO	OBS - 1661	1	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S1 - 807- 808	MURO Y LOSA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 11	[redacted]
1680	RONC	OBS - 1680	)1581:DD10:D1	12/03/2020	Semana 11	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2001	SALA	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta resane	Se resanara piso	Levantado	Semana 11	[redacted]
1662	RONC	OBS - 1662	1	12/03/2020	Semana 11	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	1	-	-	EQUIPAMIENTO	Sistema de Agua Contra Incendio	Desalineamiento	Se pico platea para alinear la tuberia, limpiar y resanar con concreto aplicando un aditivio SIKA 32	Levantado	Semana 11	[redacted]
1663	RONC	OBS - 1663	1	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	-	-	FRENTE	OBRAS EXTERIORES	Sistema de Gas	Documentacion Incorrecta	Anulacion de caja de desague	Levantado	Semana 11	[redacted]
1664	RONC	OBS - 1664	1	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S2	COCINA	ESTRUCTURA	Entubado PP	Tuberia Rota	Reparacion de tuberia	Levantado	Semana 11	[redacted]
1667	RONC	OBS - 1667	1	12/03/2020	Semana 11	PRODUCCIÓN	[redacted]	[redacted]	12	S2 - 1204	COCINA	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Se reemplazara pieza quiñada	Levantado	Semana 11	[redacted]
1672	PROTOCOLO	OBS - 1672	3	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S1 - 807 - 808	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1673	PROTOCOLO	OBS - 1673	4	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 804 - 805	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1674	PROTOCOLO	OBS - 1674	2	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S2 - 804 - 805	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 11	[redacted]
1675	PROTOCOLO	OBS - 1675	7	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 802 - 803	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1676	PROTOCOLO	OBS - 1676	1	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S3 - 802 - 803	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	protuberancia	Amolar protuberancia	Levantado	Semana 11	[redacted]
1677	PROTOCOLO	OBS - 1677	5	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S4 - 801 - 806	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1678	PROTOCOLO	OBS - 1678	4	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	8	S5 - 809 - 810	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1679	PROTOCOLO	OBS - 1679	3	12/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S1 - 907 - 908	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1687	PROTOCOLO	OBS - 1687	4	13/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S2 - 1804 - 1805	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 11	[redacted]
1688	PROTOCOLO	OBS - 1688	5	13/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S2 - 1804 - 1805	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 11	[redacted]
1686	PROTOCOLO	OBS - 1686	1	13/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	4	S4 - 401	MURO	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Colocar mas pegamento en zona inferior de zócalos	Levantado	Semana 11	[redacted]
1681	PROTOCOLO	OBS - 1681	5	13/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S2 - 904 - 905	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1682	PROTOCOLO	OBS - 1682	4	13/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S3 - 902 - 903	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1683	PROTOCOLO	OBS - 1683	2	13/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S3 - 902 - 903	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	mal acabado	Resanar mal acabado de bruña	Levantado	Semana 11	[redacted]
1684	PROTOCOLO	OBS - 1684	7	13/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S4 - 901 - 906	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1685	PROTOCOLO	OBS - 1685	5	13/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	9	S5 - 909 - 910	MURO	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Aplicar morterno en zonas faltantes	Levantado	Semana 11	[redacted]
1689	PROTOCOLO	OBS - 1689	6	14/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S3 - 1802 - 1803	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 11	[redacted]
1690	PROTOCOLO	OBS - 1690	7	14/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S3 - 1802 - 1803	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 11	[redacted]
1691	PROTOCOLO	OBS - 1691	1	14/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S3 - 1802 - 1803	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 11	[redacted]
1692	PROTOCOLO	OBS - 1692	3	14/03/2020	Semana 11	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S3 - 1802 - 1803	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 11	[redacted]
1693	PROTOCOLO	OBS - 1693	3	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	201	Cocina - Baño visita	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1694	PROTOCOLO	OBS - 1694	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	201	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Fisura	Cambio de pieza dañada	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1695	PROTOCOLO	OBS - 1695	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	201	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Mal corte	Retirar papel con mal corte y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1696	PROTOCOLO	OBS - 1696	2	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	202	Cocina	ACABADOS	Pintura	Veteada	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1697	PROTOCOLO	OBS - 1697	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	202	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1698	PROTOCOLO	OBS - 1698	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	202	Baño Principal	ACABADOS	Aparato Sanitario	No funciona	Cambio de boya rota	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1699	PROTOCOLO	OBS - 1699	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	203	Cocina	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1700	PROTOCOLO	OBS - 1700	2	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	203	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1701	PROTOCOLO	OBS - 1701	2	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	203	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1702	PROTOCOLO	OBS - 1702	3	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	203	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1703	PROTOCOLO	OBS - 1703	2	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	204	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1704	PROTOCOLO	OBS - 1704	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	204	Estar	ACABADOS	Equipamiento Eléctrico	No funciona	Cambio de luminaria que no enciende	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1705	PROTOCOLO	OBS - 1705	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	205	Balcón	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1706	PROTOCOLO	OBS - 1706	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	205	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1707	PROTOCOLO	OBS - 1707	2	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	205	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1708	PROTOCOLO	OBS - 1708	3	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	206	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1709	PROTOCOLO	OBS - 1709	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	206	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1710	PROTOCOLO	OBS - 1710	2	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	206	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1711	PROTOCOLO	OBS - 1711	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	207	Sala	ACABADOS	Piso laminado	Quiñe	Masillar y dar acabado de pintura en zona afectada	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1712	PROTOCOLO	OBS - 1712	3	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	207	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1713	PROTOCOLO	OBS - 1713	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	207	Baño Principal	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1714	PROTOCOLO	OBS - 1714	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	208	Cocina	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Masillar y dar acabado de pintura en zona afectada	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1715	PROTOCOLO	OBS - 1715	3	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	208	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1716	PROTOCOLO	OBS - 1716	1	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	208	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1717	PROTOCOLO	OBS - 1717	2	30/06/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	2	208	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1834	PROTOCOLO	OBS - 1834	9	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S4 - 1801 - 1806	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 28	[redacted]
1835	PROTOCOLO	OBS - 1835	7	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S4 - 1801 - 1806	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 28	[redacted]
1836	PROTOCOLO	OBS - 1836	3	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S4 - 1801 - 1806	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 28	[redacted]
1837	PROTOCOLO	OBS - 1837	4	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S4 - 1801 - 1806	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 28	[redacted]
1859	PROTOCOLO	OBS - 1859	3	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S5 - 1809 - 1810	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 28	[redacted]
1860	PROTOCOLO	OBS - 1860	8	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S5 - 1809 - 1810	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 28	[redacted]
1861	PROTOCOLO	OBS - 1861	2	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S5 - 1809 - 1810	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 28	[redacted]
1862	PROTOCOLO	OBS - 1862	1	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S5 - 1809 - 1810	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 28	[redacted]
1863	PROTOCOLO	OBS - 1863	4	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S1 - 1907 - 1908	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 29	[redacted]
1864	PROTOCOLO	OBS - 1864	5	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S1 - 1907 - 1908	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 29	[redacted]
1865	PROTOCOLO	OBS - 1865	4	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S1 - 1907 - 1908	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 29	[redacted]
1882	PROTOCOLO	OBS - 1882	4	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S2 - 1904 - 1905	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 29	[redacted]
1883	PROTOCOLO	OBS - 1883	4	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S2 - 1904 - 1905	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 29	[redacted]
1884	PROTOCOLO	OBS - 1884	3	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S2 - 1904 - 1905	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 29	[redacted]
1885	PROTOCOLO	OBS - 1885	2	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S2 - 1904 - 1905	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 29	[redacted]
1718	PROTOCOLO	OBS - 1718	1	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	301	Balcón	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1719	PROTOCOLO	OBS - 1719	2	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	301	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1720	PROTOCOLO	OBS - 1720	2	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	301	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1721	PROTOCOLO	OBS - 1721	3	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	302	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1722	PROTOCOLO	OBS - 1722	1	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	302	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1723	PROTOCOLO	OBS - 1723	2	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	303	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1724	PROTOCOLO	OBS - 1724	1	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	303	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1725	PROTOCOLO	OBS - 1725	3	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	303	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1726	PROTOCOLO	OBS - 1726	2	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	303	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1727	PROTOCOLO	OBS - 1727	1	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	304	Cocina	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1728	PROTOCOLO	OBS - 1728	3	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	304	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1729	PROTOCOLO	OBS - 1729	2	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	304	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1730	PROTOCOLO	OBS - 1730	2	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	304	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1731	PROTOCOLO	OBS - 1731	2	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	305	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1732	PROTOCOLO	OBS - 1732	1	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	305	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1733	PROTOCOLO	OBS - 1733	3	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	306	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1734	PROTOCOLO	OBS - 1734	1	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	306	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1735	PROTOCOLO	OBS - 1735	1	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	306	Dorm Principal	ACABADOS	Equipamiento Eléctrico	Roto	Cambiar placa de tomacorriente	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1736	PROTOCOLO	OBS - 1736	1	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	307	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1737	PROTOCOLO	OBS - 1737	2	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	307	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1738	PROTOCOLO	OBS - 1738	2	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	308	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 27	[redacted]

[redacted]	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	[redacted]
SUB-JEFE DE GTC:	[redacted]
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1739	PROTOCOLO	OBS - 1739	1	1/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	3	308	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1740	PROTOCOLO	OBS - 1740	3	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	401	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1741	PROTOCOLO	OBS - 1741	1	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	401	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1742	PROTOCOLO	OBS - 1742	2	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	401	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1743	PROTOCOLO	OBS - 1743	3	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	401	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1744	PROTOCOLO	OBS - 1744	1	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	402	Cocina	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Masillar y dar acabado de pintura en zona afectada	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1745	PROTOCOLO	OBS - 1745	3	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	402	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1746	PROTOCOLO	OBS - 1746	1	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	402	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1747	PROTOCOLO	OBS - 1747	1	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	403	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
1748	PROTOCOLO	OBS - 1748	1	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	403	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
1749	PROTOCOLO	OBS - 1749	1	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	403	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1750	PROTOCOLO	OBS - 1750	1	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	404	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1751	PROTOCOLO	OBS - 1751	2	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	404	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1752	PROTOCOLO	OBS - 1752	1	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	405	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1753	PROTOCOLO	OBS - 1753	2	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	405	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1754	PROTOCOLO	OBS - 1754	2	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	405	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1755	PROTOCOLO	OBS - 1755	2	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	406	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1756	PROTOCOLO	OBS - 1756	2	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	406	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1757	PROTOCOLO	OBS - 1757	1	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	406	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1758	PROTOCOLO	OBS - 1758	3	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	407	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1759	PROTOCOLO	OBS - 1759	1	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	407	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1760	PROTOCOLO	OBS - 1760	2	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	407	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1761	PROTOCOLO	OBS - 1761	1	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	407	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1762	PROTOCOLO	OBS - 1762	3	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	408	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
1763	PROTOCOLO	OBS - 1763	2	2/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	4	408	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1764	PROTOCOLO	OBS - 1764	3	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	501	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1765	PROTOCOLO	OBS - 1765	1	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	501	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1766	PROTOCOLO	OBS - 1766	2	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	502	Cocina	ACABADOS	Pintura	Veteada	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1767	PROTOCOLO	OBS - 1767	2	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	502	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1768	PROTOCOLO	OBS - 1768	1	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	502	Baño Visita	ACABADOS	Aparato Sanitario	Mal siliconeado	Volver a siliconear lavadero	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1769	PROTOCOLO	OBS - 1769	3	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	502	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1770	PROTOCOLO	OBS - 1770	3	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	503	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1771	PROTOCOLO	OBS - 1771	3	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	503	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1772	PROTOCOLO	OBS - 1772	1	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	504	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1773	PROTOCOLO	OBS - 1773	1	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	504	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1774	PROTOCOLO	OBS - 1774	1	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	504	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1775	PROTOCOLO	OBS - 1775	1	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	505	Cocina	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1776	PROTOCOLO	OBS - 1776	3	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	505	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1777	PROTOCOLO	OBS - 1777	2	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	505	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1778	PROTOCOLO	OBS - 1778	1	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	506	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1779	PROTOCOLO	OBS - 1779	1	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	506	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1780	PROTOCOLO	OBS - 1780	1	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	506	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1781	PROTOCOLO	OBS - 1781	2	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	507	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1782	PROTOCOLO	OBS - 1782	1	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	507	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1783	PROTOCOLO	OBS - 1783	2	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	507	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1784	PROTOCOLO	OBS - 1784	3	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	508	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1785	PROTOCOLO	OBS - 1785	1	3/07/2020	SEMANA 27	GTC	[redacted]	[redacted]	5	508	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1786	PROTOCOLO	OBS - 1786	1	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	601	Balcón	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1787	PROTOCOLO	OBS - 1787	1	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	601	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1788	PROTOCOLO	OBS - 1788	3	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	602	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1789	PROTOCOLO	OBS - 1789	1	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	602	Baño Principal	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1790	PROTOCOLO	OBS - 1790	2	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	603	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1791	PROTOCOLO	OBS - 1791	4	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	603	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1792	PROTOCOLO	OBS - 1792	3	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	604	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1793	PROTOCOLO	OBS - 1793	1	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	604	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1794	PROTOCOLO	OBS - 1794	2	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	605	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1795	PROTOCOLO	OBS - 1795	2	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	605	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1796	PROTOCOLO	OBS - 1796	2	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	605	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1797	PROTOCOLO	OBS - 1797	4	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	606	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1798	PROTOCOLO	OBS - 1798	1	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	606	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1799	PROTOCOLO	OBS - 1799	2	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	607	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1800	PROTOCOLO	OBS - 1800	1	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	607	Cocina	ACABADOS	Equipamiento Eléctrico	Falta rotular	Colocar rotulo a tablero general del departamento	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1801	PROTOCOLO	OBS - 1801	2	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	6	608	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 27	[redacted]
1802	PROTOCOLO	OBS - 1802	2	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	701	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1803	PROTOCOLO	OBS - 1803	4	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	701	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1804	PROTOCOLO	OBS - 1804	1	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	702	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1805	PROTOCOLO	OBS - 1805	2	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	702	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1806	PROTOCOLO	OBS - 1806	3	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	703	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1807	PROTOCOLO	OBS - 1807	2	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	703	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1808	PROTOCOLO	OBS - 1808	5	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	704	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1809	PROTOCOLO	OBS - 1809	2	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	704	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1810	PROTOCOLO	OBS - 1810	2	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	705	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1811	PROTOCOLO	OBS - 1811	1	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	705	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1812	PROTOCOLO	OBS - 1812	3	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	706	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1813	PROTOCOLO	OBS - 1813	1	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	706	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1814	PROTOCOLO	OBS - 1814	1	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	707	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1815	PROTOCOLO	OBS - 1815	4	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	707	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1816	PROTOCOLO	OBS - 1816	1	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	708	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1817	PROTOCOLO	OBS - 1817	2	6/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	7	708	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1818	PROTOCOLO	OBS - 1818	3	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	801	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1819	PROTOCOLO	OBS - 1819	1	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	801	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1820	PROTOCOLO	OBS - 1820	1	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	802	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1821	PROTOCOLO	OBS - 1821	2	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	802	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1822	PROTOCOLO	OBS - 1822	2	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	803	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1823	PROTOCOLO	OBS - 1823	1	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	803	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1824	PROTOCOLO	OBS - 1824	3	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	804	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1825	PROTOCOLO	OBS - 1825	1	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	804	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1826	PROTOCOLO	OBS - 1826	1	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	805	Balcón	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1827	PROTOCOLO	OBS - 1827	1	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	805	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1828	PROTOCOLO	OBS - 1828	2	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	806	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1829	PROTOCOLO	OBS - 1829	3	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	806	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1830	PROTOCOLO	OBS - 1830	4	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	807	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1831	PROTOCOLO	OBS - 1831	1	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	807	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1832	PROTOCOLO	OBS - 1832	2	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	808	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1833	PROTOCOLO	OBS - 1833	3	7/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	8	808	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1838	PROTOCOLO	OBS - 1838	1	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	901	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1839	PROTOCOLO	OBS - 1839	1	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	901	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1840	PROTOCOLO	OBS - 1840	2	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	901	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1841	PROTOCOLO	OBS - 1841	1	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	902	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1842	PROTOCOLO	OBS - 1842	2	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	902	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1843	PROTOCOLO	OBS - 1843	1	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	903	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1844	PROTOCOLO	OBS - 1844	1	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	903	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1845	PROTOCOLO	OBS - 1845	2	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	903	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1846	PROTOCOLO	OBS - 1846	2	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	904	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1847	PROTOCOLO	OBS - 1847	1	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	904	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1848	PROTOCOLO	OBS - 1848	2	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	904	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1849	PROTOCOLO	OBS - 1849	2	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	905	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1850	PROTOCOLO	OBS - 1850	1	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	905	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1851	PROTOCOLO	OBS - 1851	2	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	905	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1852	PROTOCOLO	OBS - 1852	2	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	906	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1853	PROTOCOLO	OBS - 1853	1	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	906	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1854	PROTOCOLO	OBS - 1854	1	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	906	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1855	PROTOCOLO	OBS - 1855	2	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	907	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1856	PROTOCOLO	OBS - 1856	1	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	907	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1857	PROTOCOLO	OBS - 1857	1	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	908	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1858	PROTOCOLO	OBS - 1858	1	10/07/2020	SEMANA 28	GTC	[redacted]	[redacted]	9	908	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 28	[redacted]
1886	PROTOCOLO	OBS - 1886	7	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S3 - 1902 - 1903	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 29	[redacted]
1887	PROTOCOLO	OBS - 1887	6	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S3 - 1902 - 1903	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 29	[redacted]

[redacted]	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1888	PROTOCOLO	OBS - 1888	2	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S3 - 1902 - 1903	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 29	[redacted]
1889	PROTOCOLO	OBS - 1889	2	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S3 - 1902 - 1903	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 29	[redacted]
1905	PROTOCOLO	OBS - 1905	4	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1901 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 29	[redacted]
1906	PROTOCOLO	OBS - 1906	5	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1901 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 29	[redacted]
1907	PROTOCOLO	OBS - 1907	2	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1901 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 29	[redacted]
1908	PROTOCOLO	OBS - 1908	2	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1901 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 29	[redacted]
1909	PROTOCOLO	OBS - 1909	6	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S5 - 1909 - 1910	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 29	[redacted]
1910	PROTOCOLO	OBS - 1910	6	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S5 - 1909 - 1910	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 29	[redacted]
1911	PROTOCOLO	OBS - 1911	2	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S5 - 1909 - 1910	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 29	[redacted]
1927	PROTOCOLO	OBS - 1927	4	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2007 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 29	[redacted]
1928	PROTOCOLO	OBS - 1928	5	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2007 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 29	[redacted]
1929	PROTOCOLO	OBS - 1929	2	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2007 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 29	[redacted]
1930	PROTOCOLO	OBS - 1930	3	11/07/2020	Semana 28	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2007 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 29	[redacted]
1866	PROTOCOLO	OBS - 1866	4	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1001	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1867	PROTOCOLO	OBS - 1867	1	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1001	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1868	PROTOCOLO	OBS - 1868	2	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1002	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1869	PROTOCOLO	OBS - 1869	1	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1002	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1870	PROTOCOLO	OBS - 1870	3	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1002	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1871	PROTOCOLO	OBS - 1871	3	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1003	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1872	PROTOCOLO	OBS - 1872	1	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1003	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1873	PROTOCOLO	OBS - 1873	1	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1004	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1874	PROTOCOLO	OBS - 1874	2	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1004	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1875	PROTOCOLO	OBS - 1875	1	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1005	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1876	PROTOCOLO	OBS - 1876	2	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1005	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1877	PROTOCOLO	OBS - 1877	2	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1006	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1878	PROTOCOLO	OBS - 1878	1	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1006	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1879	PROTOCOLO	OBS - 1879	3	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1007	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1880	PROTOCOLO	OBS - 1880	1	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1008	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1881	PROTOCOLO	OBS - 1881	1	13/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	10	1008	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1890	PROTOCOLO	OBS - 1890	1	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1101	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1891	PROTOCOLO	OBS - 1891	4	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1101	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1892	PROTOCOLO	OBS - 1892	2	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1102	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1893	PROTOCOLO	OBS - 1893	3	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1102	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1894	PROTOCOLO	OBS - 1894	1	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1103	Sala	ACABADOS	Ventanas y Manparas	No funciona	Cambiar caracol roto	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1895	PROTOCOLO	OBS - 1895	1	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1103	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1896	PROTOCOLO	OBS - 1896	2	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1104	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1897	PROTOCOLO	OBS - 1897	2	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1104	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1898	PROTOCOLO	OBS - 1898	2	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1105	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1899	PROTOCOLO	OBS - 1899	2	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1106	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1900	PROTOCOLO	OBS - 1900	1	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1106	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1901	PROTOCOLO	OBS - 1901	1	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1107	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1902	PROTOCOLO	OBS - 1902	3	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1107	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1903	PROTOCOLO	OBS - 1903	2	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1108	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1904	PROTOCOLO	OBS - 1904	1	15/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	11	1108	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1912	PROTOCOLO	OBS - 1912	4	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1201	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1913	PROTOCOLO	OBS - 1913	1	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1201	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1914	PROTOCOLO	OBS - 1914	2	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1202	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1915	PROTOCOLO	OBS - 1915	3	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1202	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1916	PROTOCOLO	OBS - 1916	1	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1203	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1917	PROTOCOLO	OBS - 1917	2	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1203	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1918	PROTOCOLO	OBS - 1918	3	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1204	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1919	PROTOCOLO	OBS - 1919	1	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1204	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1920	PROTOCOLO	OBS - 1920	1	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1205	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1921	PROTOCOLO	OBS - 1921	3	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1205	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1922	PROTOCOLO	OBS - 1922	2	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1206	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1923	PROTOCOLO	OBS - 1923	1	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1206	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1924	PROTOCOLO	OBS - 1924	2	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1207	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1925	PROTOCOLO	OBS - 1925	2	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1207	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1926	PROTOCOLO	OBS - 1926	3	17/07/2020	SEMANA 29	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1208	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 29	[redacted]
1931	PROTOCOLO	OBS - 1931	4	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004 - 2005	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 30	[redacted]
1932	PROTOCOLO	OBS - 1932	7	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004 - 2005	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 30	[redacted]
1933	PROTOCOLO	OBS - 1933	2	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004 - 2005	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 30	[redacted]
1934	PROTOCOLO	OBS - 1934	1	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004 - 2005	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 30	[redacted]
1949	PROTOCOLO	OBS - 1949	3	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2002 - 2003	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 30	[redacted]
1950	PROTOCOLO	OBS - 1950	8	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2002 - 2003	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 30	[redacted]
1951	PROTOCOLO	OBS - 1951	2	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2002 - 2003	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 30	[redacted]
1952	PROTOCOLO	OBS - 1952	3	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2001 - 2006	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 30	[redacted]
1953	PROTOCOLO	OBS - 1953	8	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2001 - 2006	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 30	[redacted]
1954	PROTOCOLO	OBS - 1954	3	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2001 - 2006	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 30	[redacted]
1955	PROTOCOLO	OBS - 1955	1	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2001 - 2006	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 30	[redacted]
1956	PROTOCOLO	OBS - 1956	2	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2001 - 2006	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 30	[redacted]
1972	PROTOCOLO	OBS - 1972	3	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S5 - 2009 - 2010	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 30	[redacted]
1973	PROTOCOLO	OBS - 1973	5	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S5 - 2009 - 2010	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 30	[redacted]
1974	PROTOCOLO	OBS - 1974	4	18/07/2020	Semana 29	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S5 - 2009 - 2010	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 30	[redacted]
1989	PROTOCOLO	OBS - 1989	4	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S2 - S3 - S4	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 31	[redacted]
1990	PROTOCOLO	OBS - 1990	5	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S2 - S3 - S4	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 31	[redacted]
1991	PROTOCOLO	OBS - 1991	3	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S2 - S3 - S4	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 31	[redacted]
1992	PROTOCOLO	OBS - 1992	2	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S2 - S3 - S4	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 31	[redacted]
1993	PROTOCOLO	OBS - 1993	5	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - S5	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Trabajo inconcluso	Desencofrar la estructura al 100%	Levantado	Semana 31	[redacted]
1994	PROTOCOLO	OBS - 1994	2	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - S5	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 31	[redacted]
1995	PROTOCOLO	OBS - 1995	3	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - S5	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Cangrejera	Picar, limpiar y rellenar con mortero de alta resistencia Planitop	Levantado	Semana 31	[redacted]
1996	PROTOCOLO	OBS - 1996	1	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - S5	MUROS	ARQUITECTURA	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 31	[redacted]
1935	PROTOCOLO	OBS - 1935	3	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1301	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1936	PROTOCOLO	OBS - 1936	2	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1301	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1937	PROTOCOLO	OBS - 1937	4	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1302	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1938	PROTOCOLO	OBS - 1938	1	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1302	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1939	PROTOCOLO	OBS - 1939	3	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1303	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1940	PROTOCOLO	OBS - 1940	1	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1304	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1941	PROTOCOLO	OBS - 1941	3	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1304	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1942	PROTOCOLO	OBS - 1942	1	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1305	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1943	PROTOCOLO	OBS - 1943	1	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1306	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1944	PROTOCOLO	OBS - 1944	2	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1306	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1945	PROTOCOLO	OBS - 1945	1	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1307	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1946	PROTOCOLO	OBS - 1946	2	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1307	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1947	PROTOCOLO	OBS - 1947	1	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1308	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1948	PROTOCOLO	OBS - 1948	1	20/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1308	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1957	PROTOCOLO	OBS - 1957	3	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1401	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1958	PROTOCOLO	OBS - 1958	1	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1402	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1959	PROTOCOLO	OBS - 1959	2	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1402	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1960	PROTOCOLO	OBS - 1960	1	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1403	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1961	PROTOCOLO	OBS - 1961	2	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1403	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1962	PROTOCOLO	OBS - 1962	2	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1404	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1963	PROTOCOLO	OBS - 1963	1	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1404	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1964	PROTOCOLO	OBS - 1964	4	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1405	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1965	PROTOCOLO	OBS - 1965	2	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1405	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1966	PROTOCOLO	OBS - 1966	1	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1406	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1967	PROTOCOLO	OBS - 1967	1	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1406	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1968	PROTOCOLO	OBS - 1968	2	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1407	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1969	PROTOCOLO	OBS - 1969	1	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1407	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 30	[redacted]

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
1970	PROTOCOLO	OBS - 1970	1	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		14	1408	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1971	PROTOCOLO	OBS - 1971	3	22/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		14	1408	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1975	PROTOCOLO	OBS - 1975	1	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1501	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1976	PROTOCOLO	OBS - 1976	1	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1501	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1977	PROTOCOLO	OBS - 1977	3	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1502	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1978	PROTOCOLO	OBS - 1978	1	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1502	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1979	PROTOCOLO	OBS - 1979	1	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1503	Cocina	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1980	PROTOCOLO	OBS - 1980	1	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1503	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1981	PROTOCOLO	OBS - 1981	3	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1504	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1982	PROTOCOLO	OBS - 1982	1	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1504	Baño Principal	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1983	PROTOCOLO	OBS - 1983	1	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1505	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1984	PROTOCOLO	OBS - 1984	3	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1505	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1985	PROTOCOLO	OBS - 1985	4	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1506	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1986	PROTOCOLO	OBS - 1986	1	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1506	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1987	PROTOCOLO	OBS - 1987	3	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1507	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
1988	PROTOCOLO	OBS - 1988	2	24/07/2020	SEMANA 30	GTC	[redacted]		15	1508	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 30	[redacted]
2007	PROTOCOLO	OBS - 2007	1	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		9	S4 - 901 - 906	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 33	[redacted]
2008	PROTOCOLO	OBS - 2008	1	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		9	S3 - 902 - 903	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 33	[redacted]
2009	PROTOCOLO	OBS - 2009	2	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		9	S3 - 902 - 903	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 33	[redacted]
2010	PROTOCOLO	OBS - 2010	1	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		9	S2 - 904 - 905	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 33	[redacted]
2011	PROTOCOLO	OBS - 2011	2	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		9	S2 - 904 - 905	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 33	[redacted]
2012	PROTOCOLO	OBS - 2012	1	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		9	S1 - 907 - 908	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 33	[redacted]
2013	PROTOCOLO	OBS - 2013	2	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		9	S1 - 907 - 908	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 33	[redacted]
2014	PROTOCOLO	OBS - 2014	8	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		9	S1 - 907 - 908	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 33	[redacted]
2015	PROTOCOLO	OBS - 2015	1	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		9	S5 - 909 - 910	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 33	[redacted]
2016	PROTOCOLO	OBS - 2016	3	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		9	S5 - 909 - 910	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 33	[redacted]
1997	PROTOCOLO	OBS - 1997	2	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		16	1601	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
1998	PROTOCOLO	OBS - 1998	1	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		16	1602	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
1999	PROTOCOLO	OBS - 1999	2	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		16	1603	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2000	PROTOCOLO	OBS - 2000	1	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		16	1604	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2001	PROTOCOLO	OBS - 2001	1	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		16	1605	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2002	PROTOCOLO	OBS - 2002	1	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		16	1605	Balcón	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2003	PROTOCOLO	OBS - 2003	1	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		16	1606	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2004	PROTOCOLO	OBS - 2004	2	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		16	1606	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2005	PROTOCOLO	OBS - 2005	1	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		16	1607	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2006	PROTOCOLO	OBS - 2006	2	27/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		16	1608	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2017	PROTOCOLO	OBS - 2017	2	29/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		17	1701	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2018	PROTOCOLO	OBS - 2018	2	29/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		17	1702	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2019	PROTOCOLO	OBS - 2019	2	29/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		17	1703	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2020	PROTOCOLO	OBS - 2020	1	29/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		17	1704	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2021	PROTOCOLO	OBS - 2021	1	29/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		17	1705	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2022	PROTOCOLO	OBS - 2022	1	29/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		17	1705	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2023	PROTOCOLO	OBS - 2023	1	29/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		17	1706	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2024	PROTOCOLO	OBS - 2024	2	29/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		17	1706	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2025	PROTOCOLO	OBS - 2025	1	29/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		17	1707	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2026	PROTOCOLO	OBS - 2026	1	29/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		17	1708	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2027	PROTOCOLO	OBS - 2027	1	31/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		18	1801	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2028	PROTOCOLO	OBS - 2028	2	31/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		18	1802	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2029	PROTOCOLO	OBS - 2029	1	31/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		18	1803	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2030	PROTOCOLO	OBS - 2030	1	31/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		18	1804	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2031	PROTOCOLO	OBS - 2031	2	31/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		18	1805	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2032	PROTOCOLO	OBS - 2032	1	31/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		18	1806	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2033	PROTOCOLO	OBS - 2033	1	31/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		18	1807	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2034	PROTOCOLO	OBS - 2034	3	31/07/2020	SEMANA 31	GTC	[redacted]		18	1808	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 31	[redacted]
2043	PROTOCOLO	OBS - 2043	1	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		10	S4 - 1001 - 1006	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 34	[redacted]
2044	PROTOCOLO	OBS - 2044	4	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		10	S4 - 1001 - 1006	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 34	[redacted]
2045	PROTOCOLO	OBS - 2045	1	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		10	S3 - 1002 - 1003	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 34	[redacted]
2046	PROTOCOLO	OBS - 2046	1	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		10	S3 - 1002 - 1003	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 34	[redacted]
2047	PROTOCOLO	OBS - 2047	9	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		10	S3 - 1002 - 1003	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 34	[redacted]
2048	PROTOCOLO	OBS - 2048	2	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		10	S2 - 1004 - 1005	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 34	[redacted]
2049	PROTOCOLO	OBS - 2049	7	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		10	S2 - 1004 - 1005	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 34	[redacted]
2050	PROTOCOLO	OBS - 2050	3	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		10	S1 - 1007 - 1008	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 34	[redacted]
2051	PROTOCOLO	OBS - 2051	1	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		10	S5 - 1009 1010	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 34	[redacted]
2052	PROTOCOLO	OBS - 2052	3	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		10	S5 - 1009 1010	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 34	[redacted]
2035	PROTOCOLO	OBS - 2035	1	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		19	1901	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2036	PROTOCOLO	OBS - 2036	2	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		19	1902	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2037	PROTOCOLO	OBS - 2037	1	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		19	1903	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2038	PROTOCOLO	OBS - 2038	1	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		19	1904	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2039	PROTOCOLO	OBS - 2039	3	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		19	1905	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2040	PROTOCOLO	OBS - 2040	2	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		19	1906	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2041	PROTOCOLO	OBS - 2041	1	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		19	1907	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2042	PROTOCOLO	OBS - 2042	2	3/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		19	1908	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2053	PROTOCOLO	OBS - 2053	1	5/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		20	2001	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Fisura	Cambio de pieza dañada	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2054	PROTOCOLO	OBS - 2054	2	5/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		20	2002	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Mal corte	Retirar papel con mal corte y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2055	PROTOCOLO	OBS - 2055	1	5/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		20	2003	Cocina	ACABADOS	Pintura	Veteada	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2056	PROTOCOLO	OBS - 2056	1	5/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		20	2004	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2057	PROTOCOLO	OBS - 2057	1	5/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		20	2005	Baño Principal	ACABADOS	Aparato Sanitario	No funciona	Cambio de boya rota	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2058	PROTOCOLO	OBS - 2058	1	5/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		20	2006	Cocina	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2059	PROTOCOLO	OBS - 2059	3	5/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		20	2007	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2060	PROTOCOLO	OBS - 2060	1	5/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		20	2008	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2061	PROTOCOLO	OBS - 2061	2	7/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		1	101	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2062	PROTOCOLO	OBS - 2062	1	7/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		1	102	Baño Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2063	PROTOCOLO	OBS - 2063	2	7/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		1	103	Cocina / Dorm P	ACABADOS	Ventanas y Manparas	Mal siliconeada	Volver a dar limpieza a siliconear marcos de ventanas	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2064	PROTOCOLO	OBS - 2064	1	7/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		1	104	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2065	PROTOCOLO	OBS - 2065	1	7/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		1	104	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2066	PROTOCOLO	OBS - 2066	2	7/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		1	105	Dorm 2	ACABADOS	Barandas Metalicas	Quiñe	Masillar y dar acabado	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2067	PROTOCOLO	OBS - 2067	1	7/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		1	106	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2068	PROTOCOLO	OBS - 2068	2	7/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		1	107	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2069	PROTOCOLO	OBS - 2069	1	7/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		1	107	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2070	PROTOCOLO	OBS - 2070	1	7/08/2020	SEMANA 32	GTC	[redacted]		1	108	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2075	PROTOCOLO	OBS - 2075	1	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		11	S4 - 1101 - 1106	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 35	[redacted]
2076	PROTOCOLO	OBS - 2076	5	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		11	S4 - 1101 - 1106	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 35	[redacted]
2077	PROTOCOLO	OBS - 2077	2	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		11	S3 - 1102 - 1103	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 35	[redacted]
2078	PROTOCOLO	OBS - 2078	3	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		11	S3 - 1102 - 1103	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 35	[redacted]
2079	PROTOCOLO	OBS - 2079	1	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		11	S2 - 1105 - 1104	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 35	[redacted]
2080	PROTOCOLO	OBS - 2080	1	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		11	S2 - 1105 - 1104	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 35	[redacted]
2081	PROTOCOLO	OBS - 2081	9	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		11	S2 - 1105 - 1104	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 35	[redacted]
2082	PROTOCOLO	OBS - 2082	2	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		11	S1 - 1107 - 1108	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 35	[redacted]
2083	PROTOCOLO	OBS - 2083	4	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		11	S1 - 1107 - 1108	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 35	[redacted]
2074	PROTOCOLO	OBS - 2074	1	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		5	S2 - 502	MUROS	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambio de pieza dañada	Levantado	Semana 34	[redacted]
2071	PROTOCOLO	OBS - 2071	1	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		10	S4 - 1001 - 1006	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 33	[redacted]
2072	PROTOCOLO	OBS - 2072	2	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		10	S3 - 1002 - 1003	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 33	[redacted]
2073	PROTOCOLO	OBS - 2073	2	10/08/2020	Semana 33	GTC	[redacted]		10	S5 - 1009 - 1010	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 33	[redacted]
2084	PROTOCOLO	OBS - 2084	1	17/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		6	S5 - 609	MUROS	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Volver a fraguar	Levantado	Semana 35	[redacted]
2085	PROTOCOLO	OBS - 2085	1	17/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		9	S2 - 904	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	[redacted]
2086	PROTOCOLO	OBS - 2086	1	17/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		9	S5 - 910	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	[redacted]
2091	PROTOCOLO	OBS - 2091	1	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		12	S4 - 1201 - 1206	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 36	[redacted]
2092	PROTOCOLO	OBS - 2092	3	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		12	S4 - 1201 - 1206	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	[redacted]
2093	PROTOCOLO	OBS - 2093	1	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		12	S3 - 1202 - 1203	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 36	[redacted]
2094	PROTOCOLO	OBS - 2094	2	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		12	S3 - 1202 - 1203	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 36	[redacted]
2095	PROTOCOLO	OBS - 2095	8	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		12	S3 - 1202 - 1203	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	[redacted]
2096	PROTOCOLO	OBS - 2096	4	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		12	S2 - 1204 - 1205	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	[redacted]
2097	PROTOCOLO	OBS - 2097	1	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		12	S1 - 1207 - 1208	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 36	[redacted]
2098	PROTOCOLO	OBS - 2098	2	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		12	S1 - 1207 - 1208	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	[redacted]
2099	PROTOCOLO	OBS - 2099	1	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		12	S5 - 1209 - 1210	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 36	[redacted]
2087	PROTOCOLO	OBS - 2087	1	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		6	S2 - 602	MUROS	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambio de pieza dañada	Levantado	Semana 36	[redacted]
2088	PROTOCOLO	OBS - 2088	1	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		6	S4 - 606	MUROS	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Volver a fraguar	Levantado	Semana 35	[redacted]
2089	PROTOCOLO	OBS - 2089	1	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		6	S5 - 609	MUROS	ACABADOS	Enchape	Falla de fábrica	Cambiar pieza con falla	Levantado	Semana 35	[redacted]
2090	PROTOCOLO	OBS - 2090	1	19/08/2020	Semana 34	GTC	[redacted]		10	S2 - 1005	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Mal acabado	Uniformizar acabado en sello	Levantado	Semana 34	[redacted]

	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	
NOMBRE DEL PROYECTO:			
JEFE DE OBRA:			
SUB-JEFE DE GTC:			
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**		

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
2100	PROTOCOLO	OBS - 2100	1	21/08/2020	Semana 34	GTC			11	S2 - 1104	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	
2101	PROTOCOLO	OBS - 2101	1	21/08/2020	Semana 34	GTC			11	S2 - 1106	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	
2102	PROTOCOLO	OBS - 2102	1	24/08/2020	Semana 34	GTC			12	S3 - 1203	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	
2103	PROTOCOLO	OBS - 2103	3	24/08/2020	Semana 35	GTC			11	S3 - 1102 - 1103	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 35	
2104	PROTOCOLO	OBS - 2104	2	24/08/2020	Semana 35	GTC			11	S2 - 1104 - 1105	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 35	
2105	PROTOCOLO	OBS - 2105	2	24/08/2020	Semana 35	GTC			11	S5 - 1109 - 1110	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 35	
2106	PROTOCOLO	OBS - 2106	1	25/08/2020	Semana 35	GTC			7	S2 - 705	MUROS	ACABADOS	Enchape	Falla de fábrica	Cambiar pieza con falla	Levantado	Semana 36	
2107	PROTOCOLO	OBS - 2107	1	27/08/2020	Semana 35	GTC			13	S4 - 1301	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 35	
2108	PROTOCOLO	OBS - 2108	1	28/08/2020	Semana 35	GTC			13	S4 - 1301 - 1306	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 36	
2109	PROTOCOLO	OBS - 2109	3	28/08/2020	Semana 35	GTC			13	S4 - 1301 - 1306	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 36	
2110	PROTOCOLO	OBS - 2110	8	28/08/2020	Semana 35	GTC			13	S4 - 1301 - 1306	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	
2111	PROTOCOLO	OBS - 2111	1	28/08/2020	Semana 35	GTC			13	S3 - 1302 - 1303	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 36	
2112	PROTOCOLO	OBS - 2112	3	28/08/2020	Semana 35	GTC			13	S3 - 1302 - 1303	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	
2113	PROTOCOLO	OBS - 2113	2	28/08/2020	Semana 35	GTC			13	S1 - 1307 - 1308	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 36	
2114	PROTOCOLO	OBS - 2114	10	28/08/2020	Semana 35	GTC			13	S1 - 1307 - 1308	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	
2115	PROTOCOLO	OBS - 2115	2	28/08/2020	Semana 35	GTC			13	S5 - 1309 - 1310	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 36	
2116	PROTOCOLO	OBS - 2116	1	28/08/2020	Semana 35	GTC			13	S5 - 1309 - 1310	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 36	
2117	PROTOCOLO	OBS - 2117	5	28/08/2020	Semana 35	GTC			13	S5 - 1309 - 1310	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	
2118	PROTOCOLO	OBS - 2118	2	29/08/2020	Semana 35	GTC			14	S4 - 1401	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Mal acabado	Uniformizar acabado en sello	Levantado	Semana 34	
2119	PROTOCOLO	OBS - 2119	1	29/08/2020	Semana 35	GTC			14	S1 - 1408	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	
2120	PROTOCOLO	OBS - 2120	1	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S4 - 1401 - 1406	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 37	
2121	PROTOCOLO	OBS - 2121	2	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S4 - 1401 - 1406	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2122	PROTOCOLO	OBS - 2122	4	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S4 - 1401 - 1406	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2123	PROTOCOLO	OBS - 2123	1	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S3 - 1402 - 1403	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 37	
2124	PROTOCOLO	OBS - 2124	2	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S3 - 1402 - 1403	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre de vanos	Rellenar vanos hasta llegar a la medida solicitada según plano	Levantado	Semana 37	
2125	PROTOCOLO	OBS - 2125	2	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S3 - 1402 - 1403	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2126	PROTOCOLO	OBS - 2126	2	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S3 - 1402 - 1403	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2127	PROTOCOLO	OBS - 2127	1	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S2 - 1404 - 1405	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 37	
2128	PROTOCOLO	OBS - 2128	2	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S2 - 1404 - 1405	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre en derrame	tellenar derrame hasta llegar a la medida solicitada según plan	Levantado	Semana 37	
2129	PROTOCOLO	OBS - 2129	1	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S2 - 1404 - 1405	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre de vanos	Rellenar vanos hasta llegar a la medida solicitada según plano	Levantado	Semana 37	
2130	PROTOCOLO	OBS - 2130	4	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S2 - 1404 - 1405	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2131	PROTOCOLO	OBS - 2131	1	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S1 - 1407 - 1408	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 37	
2132	PROTOCOLO	OBS - 2132	1	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S1 - 1407 - 1408	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2133	PROTOCOLO	OBS - 2133	3	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S1 - 1407 - 1408	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2134	PROTOCOLO	OBS - 2134	2	31/08/2020	Semana 36	GTC			14	S5 - 1409- 1410	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2140	PROTOCOLO	OBS - 2140	1	1/09/2020	Semana 36	GTC			8	S4 - 801	MUROS	ACABADOS	Enchape	Falla de fábrica	Cambiar pieza con falla	Levantado	Semana 36	
2141	PROTOCOLO	OBS - 2141	3	1/09/2020	Semana 36	GTC			8	S3 - 802 - 803	MUROS	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambio de pieza dañada	Levantado	Semana 36	
2142	PROTOCOLO	OBS - 2142	1	1/09/2020	Semana 36	GTC			8	S2 - 804	MUROS	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fragua faltante	Levantado	Semana 36	
2143	PROTOCOLO	OBS - 2143	1	1/09/2020	Semana 36	GTC			8	S2 - 805	MUROS	ACABADOS	Enchape	Falla de fábrica	Cambiar pieza con falla	Levantado	Semana 36	
2144	PROTOCOLO	OBS - 2144	2	1/09/2020	Semana 36	GTC			8	S1 - 807	MUROS	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fragua faltante	Levantado	Semana 36	
2145	PROTOCOLO	OBS - 2145	2	1/09/2020	Semana 36	GTC			8	S5 - 810	MUROS	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Volver a fraguar	Levantado	Semana 36	
2135	PROTOCOLO	OBS - 2135	1	1/09/2020	Semana 36	GTC			12	S4 - 1201 - 1206	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	
2136	PROTOCOLO	OBS - 2136	2	1/09/2020	Semana 36	GTC			12	S3 - 1204 - 1205	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	
2137	PROTOCOLO	OBS - 2137	1	1/09/2020	Semana 36	GTC			12	S1 - 1207 - 1208	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 36	
2138	PROTOCOLO	OBS - 2138	1	1/09/2020	Semana 36	GTC			12	S1 - 1207 - 1208	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	
2139	PROTOCOLO	OBS - 2139	1	1/09/2020	Semana 36	GTC			12	S5 - 1209 - 1210	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	
2146	PROTOCOLO	OBS - 2146	2	2/09/2020	Semana 36	GTC			15	S1 - 1507	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	
2147	PROTOCOLO	OBS - 2147	1	3/09/2020	Semana 36	GTC			13	S4 - 1301 - 1306	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 36	
2148	PROTOCOLO	OBS - 2148	1	3/09/2020	Semana 36	GTC			13	S2 - 1304 - 1305	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	
2149	PROTOCOLO	OBS - 2149	1	3/09/2020	Semana 36	GTC			13	S1 - 1307 -1308	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 36	
2150	PROTOCOLO	OBS - 2150	1	3/09/2020	Semana 36	GTC			13	S1 - 1307 -1308	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	
2151	PROTOCOLO	OBS - 2151	1	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S4 - 1501 - 1506	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 37	
2152	PROTOCOLO	OBS - 2152	1	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S4 - 1501 - 1506	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre de vanos	Rellenar vanos hasta llegar a la medida solicitada según plano	Levantado	Semana 37	
2153	PROTOCOLO	OBS - 2153	1	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S4 - 1501 - 1506	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2154	PROTOCOLO	OBS - 2154	6	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S4 - 1501 - 1506	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2155	PROTOCOLO	OBS - 2155	1	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S3 - 1502 - 1503	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 37	
2156	PROTOCOLO	OBS - 2156	4	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S3 - 1502 - 1503	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2157	PROTOCOLO	OBS - 2157	1	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S2 - 1505 1504	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 37	
2158	PROTOCOLO	OBS - 2158	2	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S2 - 1505 1504	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre de vanos	Rellenar vanos hasta llegar a la medida solicitada según plano	Levantado	Semana 37	
2159	PROTOCOLO	OBS - 2159	1	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S2 - 1505 1504	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2160	PROTOCOLO	OBS - 2160	2	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S2 - 1505 1504	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2161	PROTOCOLO	OBS - 2161	3	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S1 - 1 507 - 1508	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2162	PROTOCOLO	OBS - 2162	1	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S5 - 1509 - 1510	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 37	
2163	PROTOCOLO	OBS - 2163	1	4/09/2020	Semana 36	GTC			15	S5 - 1509 - 1510	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2166	PROTOCOLO	OBS - 2166	1	5/09/2020	Semana 36	GTC			9	S5 - 910	MUROS	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Volver a fraguar	Levantado	Semana 36	
2167	PROTOCOLO	OBS - 2167	1	5/09/2020	Semana 36	GTC			16	S3 - 1602	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	
2168	PROTOCOLO	OBS - 2168	2	5/09/2020	Semana 36	GTC			16	S2 - 1605	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	
2164	PROTOCOLO	OBS - 2164	1	5/09/2020	Semana 36	GTC			14	S2 - 1404 - 1405	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 36	
2165	PROTOCOLO	OBS - 2165	3	5/09/2020	Semana 36	GTC			14	S2 - 1404 - 1405	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 36	
2169	PROTOCOLO	OBS - 2169	1	7/09/2020	Semana 37	GTC			10	S2 - 1005	MUROS	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Cambio de pieza cajoneada	Levantado	Semana 38	
2170	PROTOCOLO	OBS - 2170	1	7/09/2020	Semana 37	GTC			10	S1 - 1007	MUROS	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambio de pieza dañada	Levantado	Semana 36	
2171	PROTOCOLO	OBS - 2171	2	7/09/2020	Semana 37	GTC			10	S1 - 1007	MUROS	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fragua faltante	Levantado	Semana 36	
2172	PROTOCOLO	OBS - 2172	1	8/09/2020	Semana 37	GTC			17	S1 - 1707	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	
2173	PROTOCOLO	OBS - 2173	1	8/09/2020	Semana 37	GTC			15	S4 - 1501 - 1506	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en derrame	Rellenar vanos hasta llegar a la medida solicitada según plano	Levantado	Semana 37	
2174	PROTOCOLO	OBS - 2174	2	8/09/2020	Semana 37	GTC			15	S4 - 1501 - 1506	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2175	PROTOCOLO	OBS - 2175	1	8/09/2020	Semana 37	GTC			15	S3 - 1502 - 1503	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2176	PROTOCOLO	OBS - 2176	1	8/09/2020	Semana 37	GTC			15	S3 - 1502 - 1503	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2177	PROTOCOLO	OBS - 2177	1	8/09/2020	Semana 37	GTC			15	S2 - 1504 -1505	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2178	PROTOCOLO	OBS - 2178	2	8/09/2020	Semana 37	GTC			15	S2 - 1504 -1505	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2179	PROTOCOLO	OBS - 2179	2	8/09/2020	Semana 37	GTC			15	S1 - 1507 - 1508	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2180	PROTOCOLO	OBS - 2180	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S4 - 1601 - 1606	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre en derrame	tellenar derrame hasta llegar a la medida solicitada según plan	Levantado	Semana 38	
2181	PROTOCOLO	OBS - 2181	2	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S4 - 1601 - 1606	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 38	
2182	PROTOCOLO	OBS - 2182	8	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S4 - 1601 - 1606	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	
2183	PROTOCOLO	OBS - 2183	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S3 - 1602 - 1603	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 38	
2184	PROTOCOLO	OBS - 2184	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S3 - 1602 - 1603	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 38	
2185	PROTOCOLO	OBS - 2185	4	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S3 - 1602 - 1603	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	
2186	PROTOCOLO	OBS - 2186	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S1 - 1607 - 1608	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre de vanos	Rellenar vanos hasta llegar a la medida solicitada según plano	Levantado	Semana 38	
2187	PROTOCOLO	OBS - 2187	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S1 - 1607 - 1608	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 38	
2188	PROTOCOLO	OBS - 2188	2	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S5- 1609 - 1610	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 38	
2189	PROTOCOLO	OBS - 2189	5	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S5- 1609 - 1610	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	
2199	PROTOCOLO	OBS - 2199	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			17	S4 - 1701 - 1706	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 39	
2200	PROTOCOLO	OBS - 2200	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			17	S4 - 1701 - 1706	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 39	
2201	PROTOCOLO	OBS - 2201	4	10/09/2020	Semana 37	GTC			17	S4 - 1701 - 1706	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 39	
2202	PROTOCOLO	OBS - 2202	3	10/09/2020	Semana 37	GTC			17	S3 - 1702 - 1703	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 39	
2203	PROTOCOLO	OBS - 2203	2	10/09/2020	Semana 37	GTC			17	S3 - 1702 - 1703	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 39	
2204	PROTOCOLO	OBS - 2204	7	10/09/2020	Semana 37	GTC			17	S3 - 1702 - 1703	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 39	
2205	PROTOCOLO	OBS - 2205	2	10/09/2020	Semana 37	GTC			17	S5 - 1709 - 1710	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 39	
2206	PROTOCOLO	OBS - 2206	2	10/09/2020	Semana 37	GTC			17	S5 - 1709 - 1710	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 39	
2190	PROTOCOLO	OBS - 2190	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			18	S3 - 1802	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	
2191	PROTOCOLO	OBS - 2191	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			18	S3 - 1803	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Mal acabado	Uniformizar acabado en sello	Levantado	Semana 34	
2192	PROTOCOLO	OBS - 2192	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S1 - 1601 - 1606	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2193	PROTOCOLO	OBS - 2193	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S1 - 1601 - 1606	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Descuadre en derrame	tellenar derrame hasta llegar a la medida solicitada según plan	Levantado	Semana 37	
2194	PROTOCOLO	OBS - 2194	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S1 - 1601 - 1606	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2195	PROTOCOLO	OBS - 2195	2	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S1 - 1601 - 1606	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2196	PROTOCOLO	OBS - 2196	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S2 - 1604 - 1605	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2197	PROTOCOLO	OBS - 2197	1	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S2 - 1604 - 1605	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2198	PROTOCOLO	OBS - 2198	2	10/09/2020	Semana 37	GTC			16	S5 - 1609 - 1610	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2207	PROTOCOLO	OBS - 2207	1	11/09/2020	Semana 37	GTC			11	S3 - 1102	MUROS	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambio de pieza dañada	Levantado	Semana 37	
2208	PROTOCOLO	OBS - 2208	1	11/09/2020	Semana 37	GTC			11	S3 - 1102	MUROS	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Volver a fraguar	Levantado	Semana 37	
2209	PROTOCOLO	OBS - 2209	1	11/09/2020	Semana 37	GTC			11	S4 - 1106	MUROS	ACABADOS	Enchape	Falla de fábrica	Cambiar pieza con falla	Levantado	Semana 37	
2210	PROTOCOLO	OBS - 2210	1	12/09/2020	Semana 37	GTC			19	S4 - 1901	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Mal acabado	Uniformizar acabado en sello	Levantado	Semana 34	
2211	PROTOCOLO	OBS - 2211	1	12/09/2020	Semana 37	GTC			19	S3 - 1902	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	
2212	PROTOCOLO	OBS - 2212	1	12/09/2020	Semana 37	GTC			17	S4 - 1701 - 1706	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2213	PROTOCOLO	OBS - 2213	2	12/09/2020	Semana 37	GTC			17	S4 - 1701 - 1706	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2214	PROTOCOLO	OBS - 2214	2	12/09/2020	Semana 37	GTC			17	S3 - 1702 - 1703	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2215	PROTOCOLO	OBS - 2215	1	12/09/2020	Semana 37	GTC			17	S2 - 1704 - 1705	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	
2216	PROTOCOLO	OBS - 2216	1	12/09/2020	Semana 37	GTC			17	S2 - 1704 - 1705	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2217	PROTOCOLO	OBS - 2217	2	12/09/2020	Semana 37	GTC			17	S1 - 1707 - 1708	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 37	
2224	PROTOCOLO	OBS - 2224	2	14/09/2020	Semana 38	GTC			20	S2 - 2005	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	

[redacted]	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
2225	PROTOCOLO	OBS - 2225	1	14/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Mal acabado	Uniformizar acabado en sello	Levantado	Semana 34	[redacted]
2226	PROTOCOLO	OBS - 2226	1	14/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Sello Crotafuego	Limpieza en sello	Limpiar zona afectada y aplicar sello	Levantado	Semana 34	[redacted]
2218	PROTOCOLO	OBS - 2218	1	14/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S4 - 1801 - 1806	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 38	[redacted]
2219	PROTOCOLO	OBS - 2219	1	14/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S4 - 1801 - 1806	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2220	PROTOCOLO	OBS - 2220	2	14/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S3 - 1802 - 1803	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2221	PROTOCOLO	OBS - 2221	3	14/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S2 - 1804 - 1805	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2222	PROTOCOLO	OBS - 2222	2	14/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S5 - 1809 - 1810	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 38	[redacted]
2223	PROTOCOLO	OBS - 2223	2	14/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S5 - 1809 - 1810	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2227	PROTOCOLO	OBS - 2227	1	15/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S4 - 1206	MUROS	ACABADOS	Enchape	Mancha	Cambiod e ceramico	Levantado	Semana 38	[redacted]
2228	PROTOCOLO	OBS - 2228	1	15/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S4 - 1207	MUROS	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Volver a fraguar	Levantado	Semana 38	[redacted]
2229	PROTOCOLO	OBS - 2229	1	15/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S1 - 1208	MUROS	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fragua faltante	Levantado	Semana 38	[redacted]
2230	PROTOCOLO	OBS - 2230	2	16/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1901 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 38	[redacted]
2231	PROTOCOLO	OBS - 2231	1	16/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1901 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	[redacted]
2232	PROTOCOLO	OBS - 2232	5	16/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1901 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2233	PROTOCOLO	OBS - 2233	1	16/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S3 - 1902 - 1903	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 38	[redacted]
2234	PROTOCOLO	OBS - 2234	1	16/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S3 - 1902 - 1903	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	[redacted]
2235	PROTOCOLO	OBS - 2235	2	16/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S3 - 1902 - 1903	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2236	PROTOCOLO	OBS - 2236	1	16/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S2 - 1904 - 1905	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	[redacted]
2237	PROTOCOLO	OBS - 2237	5	16/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S2 - 1904 - 1905	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2238	PROTOCOLO	OBS - 2238	1	16/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S5 - 1909 - 1910	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 37	[redacted]
2239	PROTOCOLO	OBS - 2239	1	16/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S5 - 1909 - 1910	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2240	PROTOCOLO	OBS - 2240	1	17/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S2 - 1304	MUROS	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Cambio de pieza cajoneada	Levantado	Semana 38	[redacted]
2241	PROTOCOLO	OBS - 2241	1	17/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S2 - 1304	MUROS	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambio de pieza dañada	Levantado	Semana 38	[redacted]
2242	PROTOCOLO	OBS - 2242	1	17/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1306	MUROS	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Cambio de pieza cajoneada	Levantado	Semana 38	[redacted]
2243	PROTOCOLO	OBS - 2243	1	17/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S4 - 1306	MUROS	ACABADOS	Enchape	falla en procedimiento	Colocar pieza faltante	Levantado	Semana 38	[redacted]
2244	PROTOCOLO	OBS - 2244	1	17/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	13	S1 - 1307	MUROS	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Cambio de pieza cajoneada	Levantado	Semana 38	[redacted]
2251	PROTOCOLO	OBS - 2251	1	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2002 - 2003	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 38	[redacted]
2252	PROTOCOLO	OBS - 2252	1	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2007 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 38	[redacted]
2253	PROTOCOLO	OBS - 2253	1	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1901 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 40	[redacted]
2254	PROTOCOLO	OBS - 2254	2	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1901 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2255	PROTOCOLO	OBS - 2255	3	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1901 - 1906	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2256	PROTOCOLO	OBS - 2256	1	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S3 - 1902 - 1903	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 40	[redacted]
2257	PROTOCOLO	OBS - 2257	3	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S3 - 1902 - 1903	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2258	PROTOCOLO	OBS - 2258	6	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S3 - 1902 - 1903	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2259	PROTOCOLO	OBS - 2259	1	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S1 - 1907 - 1908	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 40	[redacted]
2260	PROTOCOLO	OBS - 2260	1	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S1 - 1907 - 1908	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre en derrame	Rellenar derrame hasta llegar a la medida solicitada según plan	Levantado	Semana 40	[redacted]
2261	PROTOCOLO	OBS - 2261	5	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S1 - 1907 - 1908	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2262	PROTOCOLO	OBS - 2262	1	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S5 - 1909 - 1910	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 40	[redacted]
2263	PROTOCOLO	OBS - 2263	1	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S5 - 1909 - 1910	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre de vanos	Rellenar vanos hasta llegar a la medida solicitada según plano	Levantado	Semana 40	[redacted]
2264	PROTOCOLO	OBS - 2264	1	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S5 - 1909 - 1910	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2265	PROTOCOLO	OBS - 2265	3	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S5 - 1909 - 1910	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2245	PROTOCOLO	OBS - 2245	1	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2001 - 2006	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 38	[redacted]
2246	PROTOCOLO	OBS - 2246	2	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2001 - 2006	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2247	PROTOCOLO	OBS - 2247	3	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2002 - 2003	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2248	PROTOCOLO	OBS - 2248	1	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004 -2005	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2249	PROTOCOLO	OBS - 2249	2	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2007 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2250	PROTOCOLO	OBS - 2250	2	19/09/2020	Semana 38	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S5 - 2009 -2010	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 38	[redacted]
2266	PROTOCOLO	OBS - 2266	2	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S4 - 1801 - 1806	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2267	PROTOCOLO	OBS - 2267	4	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S4 - 1801 - 1806	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2268	PROTOCOLO	OBS - 2268	1	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S3 - 1802 - 1803	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 40	[redacted]
2269	PROTOCOLO	OBS - 2269	1	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S3 - 1802 - 1803	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre de vanos	Rellenar vanos hasta llegar a la medida solicitada según plano	Levantado	Semana 40	[redacted]
2270	PROTOCOLO	OBS - 2270	1	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S3 - 1802 - 1803	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2271	PROTOCOLO	OBS - 2271	4	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S3 - 1802 - 1803	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2272	PROTOCOLO	OBS - 2272	1	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S2 - 1804 - 1805	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 40	[redacted]
2273	PROTOCOLO	OBS - 2273	1	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S2 - 1804 - 1805	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2274	PROTOCOLO	OBS - 2274	5	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S2 - 1804 - 1805	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2275	PROTOCOLO	OBS - 2275	1	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S1 - 1807 - 1807	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre de vanos	Rellenar vanos hasta llegar a la medida solicitada según plano	Levantado	Semana 40	[redacted]
2276	PROTOCOLO	OBS - 2276	2	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S1 - 1807 - 1807	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2277	PROTOCOLO	OBS - 2277	6	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S1 - 1807 - 1807	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2278	PROTOCOLO	OBS - 2278	1	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S5 - 1809 - 1810	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 40	[redacted]
2279	PROTOCOLO	OBS - 2279	4	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	18	S5 - 1809 - 1810	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2280	PROTOCOLO	OBS - 2280	1	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1403	MUROS	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambio de pieza dañada	Levantado	Semana 39	[redacted]
2281	PROTOCOLO	OBS - 2281	1	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S1 - 1407	MUROS	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fragua faltante	Levantado	Semana 39	[redacted]
2282		OBS - 2282	1	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S1 - 1408	MUROS	ACABADOS	Enchape	Rayon	Limpieza de ceramico	Levantado	Semana 39	[redacted]
2283		OBS - 2283	2	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S1 - 1408	MUROS	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fragua faltante	Levantado	Semana 39	[redacted]
2284	PROTOCOLO	OBS - 2284	3	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S3 - 2102 - 2103	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 39	[redacted]
2285	PROTOCOLO	OBS - 2285	2	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - 2107 - 2108	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 39	[redacted]
2286	PROTOCOLO	OBS - 2286	1	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - 2107 - 2108	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 39	[redacted]
2287	PROTOCOLO	OBS - 2287	4	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - 2107 - 2108	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 39	[redacted]
2288	PROTOCOLO	OBS - 2288	1	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S5 - 2109 - 2110	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 39	[redacted]
2289	PROTOCOLO	OBS - 2289	3	23/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S5 - 2109 - 2110	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 39	[redacted]
2292	PROTOCOLO	OBS - 2292	1	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2001 - 2006	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre en derrame	Rellenar derrame hasta llegar a la medida solicitada según plan	Levantado	Semana 40	[redacted]
2293	PROTOCOLO	OBS - 2293	2	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2001 - 2006	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2294	PROTOCOLO	OBS - 2294	3	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S4 - 2001 - 2006	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2295	PROTOCOLO	OBS - 2295	1	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2002 - 2003	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 40	[redacted]
2296	PROTOCOLO	OBS - 2296	1	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2002 - 2003	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2297	PROTOCOLO	OBS - 2297	4	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S3 - 2002 - 2003	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2298	PROTOCOLO	OBS - 2298	3	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004 - 2005	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 40	[redacted]
2299	PROTOCOLO	OBS - 2299	1	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004 - 2005	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Descuadre de vanos	Rellenar vanos hasta llegar a la medida solicitada según plano	Levantado	Semana 40	[redacted]
2300	PROTOCOLO	OBS - 2300	1	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004 - 2005	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2301	PROTOCOLO	OBS - 2301	4	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S2 - 2004 - 2005	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2302	PROTOCOLO	OBS - 2302	1	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2007 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2303	PROTOCOLO	OBS - 2303	3	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S1 - 2007 - 2008	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2304	PROTOCOLO	OBS - 2304	1	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S5 - 2009 - 2010	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2305	PROTOCOLO	OBS - 2305	2	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	20	S5 - 2009 - 2010	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2290	PROTOCOLO	OBS - 2290	1	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S4 - 1501	MUROS	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Cambio de pieza cajoneada	Levantado	Semana 39	[redacted]
2291	PROTOCOLO	OBS - 2291	1	25/09/2020	Semana 39	GTC	[redacted]	[redacted]	15	S3 - 15202	MUROS	ACABADOS	Enchape	Falla de fábrica	Cambio de pieza con falla	Levantado	Semana 39	[redacted]
2306	PROTOCOLO	OBS - 2306	3	28/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 101 - 106	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2307	PROTOCOLO	OBS - 2307	4	28/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 101 - 106	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 40	[redacted]
2308	PROTOCOLO	OBS - 2308	1	28/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S3 - 102 - 103	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2309	PROTOCOLO	OBS - 2309	3	28/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S3 - 102 - 103	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 40	[redacted]
2310	PROTOCOLO	OBS - 2310	1	28/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2 - 104 - 105	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2311	PROTOCOLO	OBS - 2311	2	28/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S2 - 104 - 105	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 40	[redacted]
2312	PROTOCOLO	OBS - 2312	1	28/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S5- 109 - 110	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2313	PROTOCOLO	OBS - 2313	1	28/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S5- 109 - 110	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 40	[redacted]
2314	PROTOCOLO	OBS - 2314	3	28/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S5- 109 - 110	MUROS	ARQUITECTURA	Tabiquería	falta resane	Picar, limpiar rellenar con mortero y solaquear	Levantado	Semana 40	[redacted]
2315	PROTOCOLO	OBS - 2315	3	29/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	14	S3 - 1402	BALCON	ACABADOS	Carpintería Metálica	Quiñe	Masillar, lijar y volver a dar acabado de pintura	Levantado	Semana 40	[redacted]
2316	PROTOCOLO	OBS - 2316	1	29/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S3 - 1202	BALCON	ACABADOS	Carpintería Metálica	Trabajo inconcluso	Dar retoque de masillado y pintado en zonas faltantes	Levantado	Semana 40	[redacted]
2317	PROTOCOLO	OBS - 2317	2	29/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	12	S3 - 1202	BALCON	ACABADOS	Carpintería Metálica	Quiñe	Masillar, lijar y volver a dar acabado de pintura	Levantado	Semana 40	[redacted]
2318	PROTOCOLO	OBS - 2318	1	29/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S3 - 12020	BALCON	ACABADOS	Carpintería Metálica	Trabajo inconcluso	Dar retoque de masillado y pintado en zonas faltantes	Levantado	Semana 40	[redacted]
2319	PROTOCOLO	OBS - 2319	1	29/09/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	10	S3 - 12020	BALCON	ACABADOS	Carpintería Metálica	Quiñe	Masillar, lijar y volver a dar acabado de pintura	Levantado	Semana 40	[redacted]
2320	PROTOCOLO	OBS - 2320	1	1/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	17	S1 - 1708	MUROS	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Cambio de pieza cajoneada	Levantado	Semana 40	[redacted]
2321	PROTOCOLO	OBS - 2321	2	2/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S4 - 2101 - 2106	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 41	[redacted]
2322	PROTOCOLO	OBS - 2322	1	2/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S4 - 2101 - 2106	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 41	[redacted]
2323	PROTOCOLO	OBS - 2323	3	2/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S4 - 2101 - 2106	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 41	[redacted]
2324	PROTOCOLO	OBS - 2324	3	2/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S3 - 2102 - 2103	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 41	[redacted]
2325	PROTOCOLO	OBS - 2325	9	2/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S3 - 2102 - 2103	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 41	[redacted]
2326	PROTOCOLO	OBS - 2326	1	2/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S2 -2104 -2105	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 41	[redacted]
2327	PROTOCOLO	OBS - 2327	8	2/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S2 -2104 -2105	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 41	[redacted]
2328	PROTOCOLO	OBS - 2328	1	2/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - 2107 - 2108	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 41	[redacted]
2329	PROTOCOLO	OBS - 2329	3	2/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S1 - 2107 - 2108	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 41	[redacted]
2330	PROTOCOLO	OBS - 2330	1	2/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S5 - 2109 - 2110	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 41	[redacted]
2331	PROTOCOLO	OBS - 2331	4	2/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	21	S5 - 2109 - 2110	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 41	[redacted]
2332	PROTOCOLO	OBS - 2332	1	3/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1901	MUROS	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Cambio de pieza cajoneada	Levantado	Semana 40	[redacted]
2333	PROTOCOLO	OBS - 2333	1	3/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S4 - 1901	MUROS	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fragua faltante	Levantado	Semana 40	[redacted]
2334	PROTOCOLO	OBS - 2334	1	3/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S3 - 1902	MUROS	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Cambio de pieza cajoneada	Levantado	Semana 40	[redacted]
2335	PROTOCOLO	OBS - 2335	1	3/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S2 - 1904	MUROS	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Cambio de pieza cajoneada	Levantado	Semana 40	[redacted]
2336	PROTOCOLO	OBS - 2336	1	3/10/2020	Semana 40	GTC	[redacted]	[redacted]	19	S2 - 1905	MUROS	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fragua faltante	Levantado	Semana 40	[redacted]
2341	PROTOCOLO	OBS - 2341	1	5/10/2020	Semana 41	GTC	[redacted]	[redacted]	1	S4 - 101 - 106	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en burña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 43	[redacted]

	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:	
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
2342	PROTOCOLO	OBS - 2342	3	5/10/2020	Semana 41	GTC			1	S4 - 101 - 106	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 43	
2343	PROTOCOLO	OBS - 2343	1	5/10/2020	Semana 41	GTC			1	S3 - 102 - 103	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 43	
2344	PROTOCOLO	OBS - 2344	2	5/10/2020	Semana 41	GTC			1	S3 - 102 - 103	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 43	
2345	PROTOCOLO	OBS - 2345	2	5/10/2020	Semana 41	GTC			1	S2 - 104 - 105	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 43	
2346	PROTOCOLO	OBS - 2346	1	5/10/2020	Semana 41	GTC			1	S2 - 104 - 105	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en buña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 43	
2347	PROTOCOLO	OBS - 2347	4	5/10/2020	Semana 41	GTC			1	S2 - 104 - 105	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 43	
2348	PROTOCOLO	OBS - 2348	1	5/10/2020	Semana 41	GTC			1	S1 - 107 - 108	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 43	
2349	PROTOCOLO	OBS - 2349	2	5/10/2020	Semana 41	GTC			1	S1 - 107 - 108	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Desalineamiento en buña	Picar, rellenar, alinear y dar acabado	Levantado	Semana 43	
2350	PROTOCOLO	OBS - 2350	6	5/10/2020	Semana 41	GTC			1	S1 - 107 - 108	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 43	
2351	PROTOCOLO	OBS - 2351	2	5/10/2020	Semana 41	GTC			1	S5 - 109 - 110	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Protuberancia	Picar, limpiar rellenar con mortero, alinear y solaquear	Levantado	Semana 43	
2352	PROTOCOLO	OBS - 2352	3	5/10/2020	Semana 41	GTC			1	S5 - 109 - 110	MUROS	ARQUITECTURA	Solaqueo	Falta Resane	Limpiar la zona observada y aplicar mortero	Levantado	Semana 43	
2337	PROTOCOLO	OBS - 2337	2	5/10/2020	Semana 41	GTC			20	S4 - 2001 - 2006	MUROS	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Cambio de pieza cajoneada	Levantado	Semana 40	
2338	PROTOCOLO	OBS - 2338	1	5/10/2020	Semana 41	GTC			20	S1 - 2007	MUROS	ACABADOS	Enchape	Trabajo inconcluso	Completar fragua faltante	Levantado	Semana 40	
2339	PROTOCOLO	OBS - 2339	1	5/10/2020	Semana 41	GTC			20	S5 - 2010	MUROS	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Cambio de pieza cajoneada	Levantado	Semana 40	
2340	PROTOCOLO	OBS - 2340	1	5/10/2020	Semana 41	GTC			12	S4 - 1201	BALCON	ACABADOS	Carpintería Metálica	Trabajo inconcluso	Dar retoque de masillado y pintado en zonas faltantes	Levantado	Semana 40	
2353	PROTOCOLO	OBS - 2353	1	14/10/2020	Semana 41	GTC			21	S2 - 2104	MUROS	ACABADOS	Enchape	Cajoneo/Soplado	Cambio de pieza cajoneada	Levantado	Semana 40	
2354	PROTOCOLO	OBS - 2354	2	26/10/2020	Semana 44	GTC			14	S1 - X07	BARANDAS - BALCONES	ACABADOS	Acabado de Carpintería Metálica	Quiñe	Masiñar zonas afectadas y dar acabado de pintura.	Levantado	Semana 44	
2355	PROTOCOLO	OBS - 2355	2	26/10/2020	Semana 44	GTC			12	S1 - X07	BARANDAS - BALCONES	ACABADOS	Acabado de Carpintería Metálica	Mal acabado	Lijar zonas con grumos y pulir	Levantado	Semana 44	
2356	PROTOCOLO	OBS - 2356	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	201	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Fisura	Cambio de pieza dañada	Levantado	SEMANA 44	
2357	PROTOCOLO	OBS - 2357	2	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	201	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Mal corte	Retirar papel con mal corte y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 44	
2358	PROTOCOLO	OBS - 2358	2	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	201	Cocina	ACABADOS	Pintura	Veteada	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 44	
2359	PROTOCOLO	OBS - 2359	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	202	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 44	
2360	PROTOCOLO	OBS - 2360	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	202	Baño Principal	ACABADOS	Aparato Sanitario	No funciona	Cambio de boya rota	Levantado	SEMANA 44	
2361	PROTOCOLO	OBS - 2361	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	202	Cocina	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 44	
2362	PROTOCOLO	OBS - 2362	3	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	203	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 44	
2363	PROTOCOLO	OBS - 2363	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	203	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 44	
2364	PROTOCOLO	OBS - 2364	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	203	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 44	
2365	PROTOCOLO	OBS - 2365	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	204	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 44	
2366	PROTOCOLO	OBS - 2366	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	204	Estar	ACABADOS	Equipamiento Eléctrico	No funciona	Cambio de luminaria que no enciende	Levantado	SEMANA 44	
2367	PROTOCOLO	OBS - 2367	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	204	Balcón	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 44	
2368	PROTOCOLO	OBS - 2368	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	205	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 44	
2369	PROTOCOLO	OBS - 2369	3	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	205	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 44	
2370	PROTOCOLO	OBS - 2370	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	205	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 44	
2371	PROTOCOLO	OBS - 2371	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	206	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 44	
2372	PROTOCOLO	OBS - 2372	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	206	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 44	
2373	PROTOCOLO	OBS - 2373	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	207	Sala	ACABADOS	Piso laminado	Quiñe	Masillar y dar acabado de pintura en zona afectada	Levantado	SEMANA 44	
2374	PROTOCOLO	OBS - 2374	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	207	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 44	
2375	PROTOCOLO	OBS - 2375	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	208	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 44	
2376	PROTOCOLO	OBS - 2376	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	208	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 44	
2377	PROTOCOLO	OBS - 2377	2	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	209	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 44	
2378	PROTOCOLO	OBS - 2378	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	209	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 44	
2379	PROTOCOLO	OBS - 2379	1	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	210	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 44	
2380	PROTOCOLO	OBS - 2380	2	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	210	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 44	
2381	PROTOCOLO	OBS - 2381	3	29/10/2020	SEMANA 44	GTC			2	210	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 44	
2382	PROTOCOLO	OBS - 2382	1	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	301	Cocina	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Masillar y dar acabado de pintura en zona afectada	Levantado	SEMANA 44	
2383	PROTOCOLO	OBS - 2383	2	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	301	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 44	
2384	PROTOCOLO	OBS - 2384	1	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	302	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 44	
2385	PROTOCOLO	OBS - 2385	3	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	302	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 44	
2386	PROTOCOLO	OBS - 2386	1	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	303	Cocina	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 44	
2387	PROTOCOLO	OBS - 2387	1	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	303	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 44	
2388	PROTOCOLO	OBS - 2388	2	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	304	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 44	
2389	PROTOCOLO	OBS - 2389	3	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	304	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 44	
2390	PROTOCOLO	OBS - 2390	1	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	305	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 44	
2391	PROTOCOLO	OBS - 2391	2	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	305	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 44	
2392	PROTOCOLO	OBS - 2392	1	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	306	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 44	
2393	PROTOCOLO	OBS - 2393	3	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	306	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 44	
2394	PROTOCOLO	OBS - 2394	2	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	307	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 44	
2395	PROTOCOLO	OBS - 2395	1	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	307	Cocina	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 44	
2396	PROTOCOLO	OBS - 2396	3	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	308	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 44	
2397	PROTOCOLO	OBS - 2397	1	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	308	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 44	
2398	PROTOCOLO	OBS - 2398	2	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	309	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 44	
2399	PROTOCOLO	OBS - 2399	1	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	309	Baño Principal	ACABADOS	Aparato Sanitario	No funciona	Cambio de boya rota	Levantado	SEMANA 44	
2400	PROTOCOLO	OBS - 2400	1	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	310	Cocina	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 44	
2401	PROTOCOLO	OBS - 2401	3	30/10/2020	SEMANA 44	GTC			3	310	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 44	
2402	PROTOCOLO	OBS - 2402	1	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	401	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 45	
2403	PROTOCOLO	OBS - 2403	3	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	401	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 45	
2404	PROTOCOLO	OBS - 2404	3	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	402	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2405	PROTOCOLO	OBS - 2405	1	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	402	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 45	
2406	PROTOCOLO	OBS - 2406	1	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	403	Cocina	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 45	
2407	PROTOCOLO	OBS - 2407	1	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	403	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 45	
2408	PROTOCOLO	OBS - 2408	2	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	404	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2409	PROTOCOLO	OBS - 2409	1	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	404	Baño Principal	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 45	
2410	PROTOCOLO	OBS - 2410	1	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	405	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 45	
2411	PROTOCOLO	OBS - 2411	3	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	405	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 45	
2412	PROTOCOLO	OBS - 2412	4	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	406	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 45	
2413	PROTOCOLO	OBS - 2413	1	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	406	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 45	
2414	PROTOCOLO	OBS - 2414	3	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	407	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 45	
2415	PROTOCOLO	OBS - 2415	1	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	407	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2416	PROTOCOLO	OBS - 2416	3	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	408	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2417	PROTOCOLO	OBS - 2417	1	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	408	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 45	
2418	PROTOCOLO	OBS - 2418	2	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	409	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 45	
2419	PROTOCOLO	OBS - 2419	1	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	409	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 45	
2420	PROTOCOLO	OBS - 2420	1	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	410	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2421	PROTOCOLO	OBS - 2421	1	2/11/2020	SEMANA 45	GTC			4	410	Balcón	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 45	
2422	PROTOCOLO	OBS - 2422	3	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	501	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2423	PROTOCOLO	OBS - 2423	2	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	501	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 45	
2424	PROTOCOLO	OBS - 2424	2	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	502	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 45	
2425	PROTOCOLO	OBS - 2425	1	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	502	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2426	PROTOCOLO	OBS - 2426	2	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	503	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 45	
2427	PROTOCOLO	OBS - 2427	1	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	503	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 45	
2428	PROTOCOLO	OBS - 2428	3	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	504	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 45	
2429	PROTOCOLO	OBS - 2429	1	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	504	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2430	PROTOCOLO	OBS - 2430	1	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	505	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 45	
2431	PROTOCOLO	OBS - 2431	3	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	505	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 45	
2432	PROTOCOLO	OBS - 2432	1	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	506	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 45	
2433	PROTOCOLO	OBS - 2433	1	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	506	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 45	
2434	PROTOCOLO	OBS - 2434	2	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	507	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 45	
2435	PROTOCOLO	OBS - 2435	1	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	507	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2436	PROTOCOLO	OBS - 2436	3	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	508	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 45	
2437	PROTOCOLO	OBS - 2437	1	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	508	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 45	
2438	PROTOCOLO	OBS - 2438	4	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	509	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 45	
2439	PROTOCOLO	OBS - 2439	1	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	509	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 45	
2440	PROTOCOLO	OBS - 2440	1	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	510	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 45	
2441	PROTOCOLO	OBS - 2441	1	4/11/2020	SEMANA 45	GTC			5	510	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 45	
2442	PROTOCOLO	OBS - 2442	2	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	601	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2443	PROTOCOLO	OBS - 2443	1	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	601	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 45	
2444	PROTOCOLO	OBS - 2444	2	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	602	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 45	
2445	PROTOCOLO	OBS - 2445	1	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	602	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 45	
2446	PROTOCOLO	OBS - 2446	1	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	603	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2447	PROTOCOLO	OBS - 2447	1	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	603	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 45	
2448	PROTOCOLO	OBS - 2448	1	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	604	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 45	
2449	PROTOCOLO	OBS - 2449	2	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	604	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2450	PROTOCOLO	OBS - 2450	2	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	605	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 45	
2451	PROTOCOLO	OBS - 2451	3	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	606	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2452	PROTOCOLO	OBS - 2452	3	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	606	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 45	
2453	PROTOCOLO	OBS - 2453	1	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	607	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 45	
2454	PROTOCOLO	OBS - 2454	2	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	608	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 45	

	FORMATO **REGISTRO DE OBSERVACIONES**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	
NOMBRE DEL PROYECTO:			
JEFE DE OBRA:			
SUB-JEFE DE GTC:			
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**		

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
2455	PROTOCOLO	OBS - 2455	1	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	608	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 45	
2456	PROTOCOLO	OBS - 2456	1	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	609	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 45	
2457	PROTOCOLO	OBS - 2457	3	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	609	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 45	
2458	PROTOCOLO	OBS - 2458	1	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	610	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 45	
2459	PROTOCOLO	OBS - 2459	2	6/11/2020	SEMANA 45	GTC			6	610	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 45	
2460	PROTOCOLO	OBS - 2460	3	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	701	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2461	PROTOCOLO	OBS - 2461	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	701	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 46	
2462	PROTOCOLO	OBS - 2462	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	702	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 46	
2463	PROTOCOLO	OBS - 2463	2	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	702	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 46	
2464	PROTOCOLO	OBS - 2464	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	703	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 46	
2465	PROTOCOLO	OBS - 2465	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	703	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 46	
2466	PROTOCOLO	OBS - 2466	2	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	704	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 46	
2467	PROTOCOLO	OBS - 2467	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	704	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2468	PROTOCOLO	OBS - 2468	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	705	Balcón	ACABADOS	Enchape	Quiñe	Cambiar pieza dañada	Levantado	SEMANA 46	
2469	PROTOCOLO	OBS - 2469	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	705	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 46	
2470	PROTOCOLO	OBS - 2470	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	706	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2471	PROTOCOLO	OBS - 2471	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	706	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 46	
2472	PROTOCOLO	OBS - 2472	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	707	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2473	PROTOCOLO	OBS - 2473	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	708	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 46	
2474	PROTOCOLO	OBS - 2474	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	708	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 46	
2475	PROTOCOLO	OBS - 2475	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	709	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 46	
2476	PROTOCOLO	OBS - 2476	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	709	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2477	PROTOCOLO	OBS - 2477	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	710	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 46	
2478	PROTOCOLO	OBS - 2478	1	9/11/2020	SEMANA 46	GTC			7	710	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2479	PROTOCOLO	OBS - 2479	3	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	801	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2480	PROTOCOLO	OBS - 2480	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	801	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2481	PROTOCOLO	OBS - 2481	2	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	802	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 46	
2482	PROTOCOLO	OBS - 2482	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	802	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 46	
2483	PROTOCOLO	OBS - 2483	2	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	803	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2484	PROTOCOLO	OBS - 2484	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	803	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2485	PROTOCOLO	OBS - 2485	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	804	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 46	
2486	PROTOCOLO	OBS - 2486	2	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	804	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2487	PROTOCOLO	OBS - 2487	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	805	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 46	
2488	PROTOCOLO	OBS - 2488	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	805	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 46	
2489	PROTOCOLO	OBS - 2489	2	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	806	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2490	PROTOCOLO	OBS - 2490	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	806	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 46	
2491	PROTOCOLO	OBS - 2491	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	807	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 46	
2492	PROTOCOLO	OBS - 2492	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	807	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 46	
2493	PROTOCOLO	OBS - 2493	2	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	808	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 46	
2494	PROTOCOLO	OBS - 2494	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	808	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 46	
2495	PROTOCOLO	OBS - 2495	2	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	809	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 46	
2496	PROTOCOLO	OBS - 2496	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	809	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2497	PROTOCOLO	OBS - 2497	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	810	Balcón	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 46	
2498	PROTOCOLO	OBS - 2498	1	10/11/2020	SEMANA 46	GTC			8	810	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 46	
2499	PROTOCOLO	OBS - 2499	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	901	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2500	PROTOCOLO	OBS - 2500	2	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	901	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 46	
2501	PROTOCOLO	OBS - 2501	3	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	902	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2502	PROTOCOLO	OBS - 2502	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	902	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 46	
2503	PROTOCOLO	OBS - 2503	2	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	903	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 46	
2504	PROTOCOLO	OBS - 2504	2	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	903	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 46	
2505	PROTOCOLO	OBS - 2505	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	904	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2506	PROTOCOLO	OBS - 2506	3	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	904	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 46	
2507	PROTOCOLO	OBS - 2507	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	905	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2508	PROTOCOLO	OBS - 2508	2	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	905	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2509	PROTOCOLO	OBS - 2509	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	906	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2510	PROTOCOLO	OBS - 2510	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	906	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 46	
2511	PROTOCOLO	OBS - 2511	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	907	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2512	PROTOCOLO	OBS - 2512	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	907	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 46	
2513	PROTOCOLO	OBS - 2513	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	908	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2514	PROTOCOLO	OBS - 2514	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	908	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 46	
2515	PROTOCOLO	OBS - 2515	2	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	909	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2516	PROTOCOLO	OBS - 2516	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	909	Sala	ACABADOS	Ventanas y Manparas	No funciona	Cambiar caracol roto	Levantado	SEMANA 46	
2517	PROTOCOLO	OBS - 2517	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	910	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 46	
2518	PROTOCOLO	OBS - 2518	1	12/11/2020	SEMANA 46	GTC			9	910	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 46	
2519	PROTOCOLO	OBS - 2519	2	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1001	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2520	PROTOCOLO	OBS - 2520	1	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1001	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 46	
2521	PROTOCOLO	OBS - 2521	1	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1002	Cocina	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2522	PROTOCOLO	OBS - 2522	1	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1002	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 46	
2523	PROTOCOLO	OBS - 2523	1	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1003	Baño Visita	ACABADOS	Aparato Sanitario	Mal siliconeado	Volver a siliconear lavadero	Levantado	SEMANA 46	
2524	PROTOCOLO	OBS - 2524	2	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1003	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 46	
2525	PROTOCOLO	OBS - 2525	3	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1004	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2526	PROTOCOLO	OBS - 2526	1	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1004	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2527	PROTOCOLO	OBS - 2527	3	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1005	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2528	PROTOCOLO	OBS - 2528	1	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1005	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2529	PROTOCOLO	OBS - 2529	1	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1006	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 46	
2530	PROTOCOLO	OBS - 2530	1	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1006	Cocina	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 46	
2531	PROTOCOLO	OBS - 2531	2	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1007	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2532	PROTOCOLO	OBS - 2532	1	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1007	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 46	
2533	PROTOCOLO	OBS - 2533	1	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1008	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 46	
2534	PROTOCOLO	OBS - 2534	2	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1008	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 46	
2535	PROTOCOLO	OBS - 2535	1	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1009	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 46	
2536	PROTOCOLO	OBS - 2536	2	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1009	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 46	
2537	PROTOCOLO	OBS - 2537	1	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1010	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 46	
2538	PROTOCOLO	OBS - 2538	2	14/11/2020	SEMANA 46	GTC			10	1010	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 46	
2539	PROTOCOLO	OBS - 2539	2	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1101	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 47	
2540	PROTOCOLO	OBS - 2540	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1101	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 47	
2541	PROTOCOLO	OBS - 2541	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1102	Balcón	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 47	
2542	PROTOCOLO	OBS - 2542	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1102	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 47	
2543	PROTOCOLO	OBS - 2543	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1103	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 47	
2544	PROTOCOLO	OBS - 2544	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1103	Baño Principal	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 47	
2545	PROTOCOLO	OBS - 2545	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1104	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 47	
2546	PROTOCOLO	OBS - 2546	3	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1104	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 47	
2547	PROTOCOLO	OBS - 2547	3	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1105	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 47	
2548	PROTOCOLO	OBS - 2548	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1105	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 47	
2549	PROTOCOLO	OBS - 2549	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1106	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 47	
2550	PROTOCOLO	OBS - 2550	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1106	Balcón	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 47	
2551	PROTOCOLO	OBS - 2551	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1107	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 47	
2552	PROTOCOLO	OBS - 2552	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1107	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 47	
2553	PROTOCOLO	OBS - 2553	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1108	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 47	
2554	PROTOCOLO	OBS - 2554	2	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1108	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 47	
2555	PROTOCOLO	OBS - 2555	2	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1109	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 47	
2556	PROTOCOLO	OBS - 2556	2	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1109	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 47	
2557	PROTOCOLO	OBS - 2557	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1110	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 47	
2558	PROTOCOLO	OBS - 2558	1	16/11/2020	SEMANA 47	GTC			11	1110	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 47	
2559	PROTOCOLO	OBS - 2559	2	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1201	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 47	
2560	PROTOCOLO	OBS - 2560	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1201	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 47	
2561	PROTOCOLO	OBS - 2561	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1202	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 47	
2562	PROTOCOLO	OBS - 2562	2	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1202	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 47	
2563	PROTOCOLO	OBS - 2563	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1203	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 47	
2564	PROTOCOLO	OBS - 2564	2	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1203	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 47	
2565	PROTOCOLO	OBS - 2565	2	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1204	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 47	
2566	PROTOCOLO	OBS - 2566	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1204	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 47	
2567	PROTOCOLO	OBS - 2567	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1205	Cocina	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 47	
2568	PROTOCOLO	OBS - 2568	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1205	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 47	
2569	PROTOCOLO	OBS - 2569	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1206	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 47	
2570	PROTOCOLO	OBS - 2570	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1206	Baño Principal	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 47	
2571	PROTOCOLO	OBS - 2571	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1207	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 47	
2572	PROTOCOLO	OBS - 2572	2	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1207	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 47	
2573	PROTOCOLO	OBS - 2573	3	18/11/2020	SEMANA 47	GTC			12	1208	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 47	

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA: [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
JEFE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**18-Ene**

Item	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Cantidad de Obs.	Fecha de Emisión	Semana	Área Identificadora	Responsable Identificador	Torre	Piso	Sector/Dpto.	Ambiente	Especialidad	Categoría	Error Detectado	Corrección	Estado de la Observación	Semana de Levantamiento	Responsable de Levantamiento
2574	PROTOCOLO	OBS - 2574	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1208	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2575	PROTOCOLO	OBS - 2575	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1209	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2576	PROTOCOLO	OBS - 2576	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1209	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2577	PROTOCOLO	OBS - 2577	2	18/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1210	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2578	PROTOCOLO	OBS - 2578	1	18/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	12	1210	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2579	PROTOCOLO	OBS - 2579	1	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1301	Cocina	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2580	PROTOCOLO	OBS - 2580	1	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1301	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2581	PROTOCOLO	OBS - 2581	1	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1302	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2582	PROTOCOLO	OBS - 2582	2	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1302	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2583	PROTOCOLO	OBS - 2583	3	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1303	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2584	PROTOCOLO	OBS - 2584	1	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1303	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2585	PROTOCOLO	OBS - 2585	2	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1304	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2586	PROTOCOLO	OBS - 2586	1	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1305	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2587	PROTOCOLO	OBS - 2587	1	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1305	Dorm Principal	ACABADOS	Equipamiento Eléctrico	Roto	Cambiar placa de interruptor	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2588	PROTOCOLO	OBS - 2588	1	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1306	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2589	PROTOCOLO	OBS - 2589	1	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1306	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2590	PROTOCOLO	OBS - 2590	1	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1307	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2591	PROTOCOLO	OBS - 2591	1	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1308	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2592	PROTOCOLO	OBS - 2592	2	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1308	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2593	PROTOCOLO	OBS - 2593	1	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1309	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2594	PROTOCOLO	OBS - 2594	4	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1309	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2595	PROTOCOLO	OBS - 2595	2	20/11/2020	SEMANA 47	GTC	[redacted]	[redacted]	13	1310	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 47	[redacted]
2596	PROTOCOLO	OBS - 2596	1	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1401	Balcón	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2597	PROTOCOLO	OBS - 2597	1	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1401	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2598	PROTOCOLO	OBS - 2598	2	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1402	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2599	PROTOCOLO	OBS - 2599	1	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1402	Baño Principal	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2600	PROTOCOLO	OBS - 2600	1	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1403	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2601	PROTOCOLO	OBS - 2601	3	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1404	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2602	PROTOCOLO	OBS - 2602	2	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1405	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2603	PROTOCOLO	OBS - 2603	1	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1405	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2604	PROTOCOLO	OBS - 2604	3	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1406	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2605	PROTOCOLO	OBS - 2605	1	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1406	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2606	PROTOCOLO	OBS - 2606	1	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1407	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2607	PROTOCOLO	OBS - 2607	2	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1408	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2608	PROTOCOLO	OBS - 2608	1	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1409	Dormitorio 2	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2609	PROTOCOLO	OBS - 2609	3	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1409	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2610	PROTOCOLO	OBS - 2610	1	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1410	Cocina	ACABADOS	Equipamiento Eléctrico	Falta rotular	Colocar rotulo a tablero general del departamento	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2611	PROTOCOLO	OBS - 2611	2	23/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	14	1410	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2612	PROTOCOLO	OBS - 2612	1	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1501	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2613	PROTOCOLO	OBS - 2613	1	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1501	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2614	PROTOCOLO	OBS - 2614	2	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1502	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2615	PROTOCOLO	OBS - 2615	1	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1502	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2616	PROTOCOLO	OBS - 2616	2	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1503	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2617	PROTOCOLO	OBS - 2617	3	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1503	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2618	PROTOCOLO	OBS - 2618	1	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1504	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2619	PROTOCOLO	OBS - 2619	1	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1504	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2620	PROTOCOLO	OBS - 2620	2	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1505	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2621	PROTOCOLO	OBS - 2621	1	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1505	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2622	PROTOCOLO	OBS - 2622	2	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1506	Dorm Principal	ACABADOS	Rodon	Mal acabado	Dar retoque de pintura en rodon	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2623	PROTOCOLO	OBS - 2623	1	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1506	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2624	PROTOCOLO	OBS - 2624	1	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1507	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2625	PROTOCOLO	OBS - 2625	3	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1507	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2626	PROTOCOLO	OBS - 2626	1	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1508	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2627	PROTOCOLO	OBS - 2627	1	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1508	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2628	PROTOCOLO	OBS - 2628	1	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1509	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2629	PROTOCOLO	OBS - 2629	2	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1509	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2630	PROTOCOLO	OBS - 2630	1	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1510	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2631	PROTOCOLO	OBS - 2631	3	25/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	15	1510	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2632	PROTOCOLO	OBS - 2632	2	27/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	16	1601	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2633	PROTOCOLO	OBS - 2633	2	27/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	16	1602	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2634	PROTOCOLO	OBS - 2634	1	27/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	16	1603	Sala	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2635	PROTOCOLO	OBS - 2635	1	27/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	16	1604	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2636	PROTOCOLO	OBS - 2636	3	27/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	16	1605	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2637	PROTOCOLO	OBS - 2637	1	27/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	16	1606	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2638	PROTOCOLO	OBS - 2638	1	27/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	16	1607	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2639	PROTOCOLO	OBS - 2639	3	27/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	16	1608	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2640	PROTOCOLO	OBS - 2640	1	27/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	16	1609	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2641	PROTOCOLO	OBS - 2641	1	27/11/2020	SEMANA 48	GTC	[redacted]	[redacted]	16	1610	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 48	[redacted]
2642	PROTOCOLO	OBS - 2642	1	30/11/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	1701	Sala	ACABADOS	Contrazocalos y rodones	Mal acabado	Mejorar acabado y volver a colocar los rodones de madera	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2643	PROTOCOLO	OBS - 2643	3	30/11/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	1702	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2644	PROTOCOLO	OBS - 2644	1	30/11/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	1703	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2645	PROTOCOLO	OBS - 2645	1	30/11/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	1704	Cocina	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2646	PROTOCOLO	OBS - 2646	1	30/11/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	1705	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2647	PROTOCOLO	OBS - 2647	3	30/11/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	1706	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2648	PROTOCOLO	OBS - 2648	1	30/11/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	1707	Baño Principal	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2649	PROTOCOLO	OBS - 2649	2	30/11/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	1708	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2650	PROTOCOLO	OBS - 2650	1	30/11/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	1709	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	Manchado	Volver a dar retoque de pintura a puerta	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2651	PROTOCOLO	OBS - 2651	3	30/11/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	17	1710	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2652	PROTOCOLO	OBS - 2652	1	2/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	18	1801	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2653	PROTOCOLO	OBS - 2653	2	2/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	18	1802	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2654	PROTOCOLO	OBS - 2654	1	2/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	18	1803	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2655	PROTOCOLO	OBS - 2655	1	2/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	18	1804	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Mal fraguado	Corregir fraguado	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2656	PROTOCOLO	OBS - 2656	3	2/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	18	1805	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2657	PROTOCOLO	OBS - 2657	2	2/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	18	1806	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2658	PROTOCOLO	OBS - 2658	1	2/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	18	1807	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2659	PROTOCOLO	OBS - 2659	3	2/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	18	1808	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2660	PROTOCOLO	OBS - 2660	1	2/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	18	1809	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Fisura	Cambio de pieza dañada	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2661	PROTOCOLO	OBS - 2661	1	2/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	18	1810	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Mal corte	Retirar papel con mal corte y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2662	PROTOCOLO	OBS - 2662	2	4/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	19	1901	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2663	PROTOCOLO	OBS - 2663	4	4/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	19	1902	Pasadizo	ACABADOS	Rodon	Despegado	Pegar rodon	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2664	PROTOCOLO	OBS - 2664	3	4/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	19	1903	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2665	PROTOCOLO	OBS - 2665	1	4/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	19	1904	Baño Visita	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2666	PROTOCOLO	OBS - 2666	1	4/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	19	1905	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Mal corte	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2667	PROTOCOLO	OBS - 2667	1	4/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	19	1906	Balcón	ACABADOS	Enchape	Falta Fraguar	Completar fragua	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2668	PROTOCOLO	OBS - 2668	1	4/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	19	1907	Pasadizo	ACABADOS	Escarchado	Mancha	Dar retoque de escarchado en zona afectada	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2669	PROTOCOLO	OBS - 2669	1	4/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	19	1908	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2670	PROTOCOLO	OBS - 2670	1	4/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	19	1909	Baño Principal	ACABADOS	Pintura	Veteado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2671	PROTOCOLO	OBS - 2671	3	4/12/2020	SEMANA 49	GTC	[redacted]	[redacted]	19	1910	Dorm Principal	ACABADOS	Papel Mural	Rasgado	Cortar zona afectada y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 49	[redacted]
2672	PROTOCOLO	OBS - 2672	4	7/12/2020	SEMANA 50	GTC	[redacted]	[redacted]	20	2001	Dormitorio 2	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2673	PROTOCOLO	OBS - 2673	2	7/12/2020	SEMANA 50	GTC	[redacted]	[redacted]	20	2002	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2674	PROTOCOLO	OBS - 2674	1	7/12/2020	SEMANA 50	GTC	[redacted]	[redacted]	20	2003	Sala	ACABADOS	Escarchado	Mal recorte	Volver a dar recorte y volver a pintarlo	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2675	PROTOCOLO	OBS - 2675	2	7/12/2020	SEMANA 50	GTC	[redacted]	[redacted]	20	2004	Cocina	ACABADOS	Pintura	Manchado	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2676	PROTOCOLO	OBS - 2676	1	7/12/2020	SEMANA 50	GTC	[redacted]	[redacted]	20	2005	Baño Visita	ACABADOS	Enchape	Fisura	Cambio de pieza dañada	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2677	PROTOCOLO	OBS - 2677	1	7/12/2020	SEMANA 50	GTC	[redacted]	[redacted]	20	2006	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Mal corte	Retirar papel con mal corte y volver a pegar papel nuevo	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2678	PROTOCOLO	OBS - 2678	1	7/12/2020	SEMANA 50	GTC	[redacted]	[redacted]	20	2007	Cocina	ACABADOS	Pintura	Veteada	Volver a dar retoque de pintura	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2679	PROTOCOLO	OBS - 2679	1	7/12/2020	SEMANA 50	GTC	[redacted]	[redacted]	20	2008	Dorm Principal	ACABADOS	Puerta y Marcos	quiñado	Volver a dar retoque de pintura y subsanar quiñe	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2680	PROTOCOLO	OBS - 2680	1	7/12/2020	SEMANA 50	GTC	[redacted]	[redacted]	20	2009	Baño Principal	ACABADOS	Aparato Sanitario	No funciona	Cambio de boya rota	Levantado	SEMANA 32	[redacted]
2681	PROTOCOLO	OBS - 2681	3	7/12/2020	SEMANA 50	GTC	[redacted]	[redacted]	20	2010	Sala	ACABADOS	Papel Mural	Despegado	Corregir papel y volver a pegarlo	Levantado	SEMANA 32	[redacted]

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
NOV	2020	2	FB	Estructura	Dimensión incorrecta	18 de noviembre de 2020, 19:00:00	closed	E-19	[redacted]	Error en procedimiento	18 de noviembre de 2020	20 de noviembre de 2020	20 de noviembre de 2020, 08:32:35	18/11/2020	SEMANA 47
DIC	2020	6	BA	Estructura	Trabajo inconcluso	3 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	E-19		Error en procedimiento	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	15 de diciembre de 2020, 16:09:07	4/12/2020	SEMANA 49
DIC	2020	7	BA	Estructura	Trabajo inconcluso	3 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	E-19		Error en procedimiento	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	15 de diciembre de 2020, 16:09:11	4/12/2020	SEMANA 49
DIC	2020	8	CB	Estructura	Tiempo de espera mayor al aceptable	3 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	E-19		Error en procedimiento	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	15 de diciembre de 2020, 16:09:22	4/12/2020	SEMANA 49
DIC	2020	9	CB	Estructura	Tiempo de espera mayor al aceptable	3 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	E-19		Error en procedimiento	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	15 de diciembre de 2020, 16:09:31	4/12/2020	SEMANA 49
DIC	2020	10	CB	Estructura	Exudación excesiva del concreto	3 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	E-20		Error en procedimiento	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	17 de diciembre de 2020, 07:46:06	4/12/2020	SEMANA 49
DIC	2020	11	CB	Estructura	Exudación excesiva del concreto	3 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	E-20		Error en procedimiento	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	17 de diciembre de 2020, 07:46:12	4/12/2020	SEMANA 49
DIC	2020	13	CB	Estructura	Trabajo inconcluso	4 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	E-20		Error en procedimiento	4 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	17 de diciembre de 2020, 07:46:17	4/12/2020	SEMANA 49
DIC	2020	14	BA	Estructura	Desalineamiento	6 de diciembre de 2020, 19:00:00	closed	E-19		Error en procedimiento	7 de diciembre de 2020	10 de diciembre de 2020	17 de diciembre de 2020, 07:46:35	7/12/2020	SEMANA 50
ENE	2021	23	BA	Estructura	Falla en procedimiento	4 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-20		Observación común	4 de enero de 2021	8 de enero de 2021	13 de enero de 2021, 15:38:09	4/01/2021	SEMANA 01
ENE	2021	24	BE	Estructura	Daño en material	4 de enero de 2021, 19:00:00	closed	A-01		Observación común	5 de enero de 2021	8 de enero de 2021	12 de enero de 2021, 17:12:39	5/01/2021	SEMANA 01
ENE	2021	25	BE	Estructura	Falla en procedimiento	5 de enero de 2021, 19:00:00	closed	A-01		Observación común	6 de enero de 2021	20 de enero de 2021	2 de febrero de 2021, 07:56:36	6/01/2021	SEMANA 01
ENE	2021	26	BA	Estructura	Falla en instalación	11 de enero de 2021, 19:00:00	closed	IS-01		Observación común	12 de enero de 2021	29 de enero de 2021	2 de febrero de 2021, 07:56:33	12/01/2021	SEMANA 02
ENE	2021	27	BA	Estructura	Trabajo inconcluso	11 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-05		Observación común	12 de enero de 2021	29 de enero de 2021	2 de febrero de 2021, 07:56:31	12/01/2021	SEMANA 02
ENE	2021	28	BA	Estructura	Falla en procedimiento	12 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-02		Observación común	12 de enero de 2021	29 de enero de 2021	2 de febrero de 2021, 07:56:28	12/01/2021	SEMANA 02
DIC	2020	30	BC	Estructura	Falla de slump	17 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-02		Observación común	22 de diciembre de 2020	22 de diciembre de 2020	18 de enero de 2021, 11:16:33	22/12/2020	SEMANA 52
DIC	2020	32	BF	Estructura	Daño en material	17 de enero de 2021, 19:00:00	closed	IS-01		Error en procedimiento	22 de diciembre de 2020	22 de diciembre de 2020	18 de enero de 2021, 11:16:36	22/12/2020	SEMANA 52
ENE	2021	33	BA	Estructura	Trabajo inconcluso	18 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-10		Error en lectura de planos	18 de enero de 2021	23 de enero de 2021	20 de enero de 2021, 10:18:55	18/01/2021	SEMANA 03
ENE	2021	34	BA	Estructura	Dimensión incorrecta	18 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-10		Falta de información	18 de enero de 2021	23 de enero de 2021	19 de enero de 2021, 11:17:20	18/01/2021	SEMANA 03
ENE	2021	35	BF	Estructura	Ubicación incorrecta	18 de enero de 2021, 19:00:00	closed	IS-37		Error en lectura de planos	18 de enero de 2021	23 de enero de 2021	19 de enero de 2021, 11:17:12	18/01/2021	SEMANA 03
ENE	2021	36	DG	Estructura	Falla en instalación	18 de enero de 2021, 19:00:00	closed	IE-49		Error en procedimiento	18 de enero de 2021	23 de enero de 2021	19 de enero de 2021, 11:16:47	18/01/2021	SEMANA 03
ENE	2021	37	BA	Estructura	Trabajo inconcluso	18 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-10		Error en procedimiento	18 de enero de 2021	23 de enero de 2021	20 de enero de 2021, 10:14:54	18/01/2021	SEMANA 03
NOV	2020	38	BA	Estructura	Ubicación incorrecta	24 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-19		Error en procedimiento	23 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020	25 de enero de 2021, 15:42:45	23/11/2020	SEMANA 48
NOV	2020	39	BA	Estructura	Trabajo inconcluso	24 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-19		Error en procedimiento	24 de noviembre de 2020	25 de noviembre de 2020	25 de enero de 2021, 15:49:49	24/11/2020	SEMANA 48
NOV	2020	40	BA	Estructura	Falla en instalación	24 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-19		Error en procedimiento	25 de noviembre de 2020	25 de noviembre de 2020	25 de enero de 2021, 15:54:11	25/11/2020	SEMANA 48
NOV	2020	41	AA	Estructura	Dimensión incorrecta	24 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-19		Error en procedimiento	26 de noviembre de 2020	26 de noviembre de 2020	25 de enero de 2021, 16:02:58	26/11/2020	SEMANA 48
DIC	2020	44	AA	Estructura	Dimensión incorrecta	24 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-20		Error en procedimiento	11 de diciembre de 2020	11 de diciembre de 2020	25 de enero de 2021, 16:09:27	11/12/2020	SEMANA 50
DIC	2020	45	BB	Estructura	Desalineamiento	24 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-02		Error en procedimiento	12 de diciembre de 2020	12 de diciembre de 2020	25 de enero de 2021, 17:30:36	12/12/2020	SEMANA 50
DIC	2020	46	BC	Estructura	Tiempo de espera mayor al aceptable	24 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-20		Error en procedimiento	9 de diciembre de 2020	9 de diciembre de 2020	25 de enero de 2021, 17:39:10	9/12/2020	SEMANA 50
DIC	2020	47	BA	Estructura	Trabajo inconcluso	24 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-02		Error en procedimiento	18 de diciembre de 2020	21 de diciembre de 2020	25 de enero de 2021, 17:48:28	18/12/2020	SEMANA 51
DIC	2020	48	BE	Estructura	Daño en material	24 de enero de 2021, 19:00:00	closed	IE-12		Error en procedimiento	18 de diciembre de 2020	21 de diciembre de 2020	25 de enero de 2021, 17:56:12	18/12/2020	SEMANA 51
DIC	2020	49	BA	Estructura	Falla en instalación	24 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-02		Error en procedimiento	18 de diciembre de 2020	21 de diciembre de 2020	1 de febrero de 2021, 14:24:07	18/12/2020	SEMANA 51

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
DIC	2020	50	BC	Estructura	Material defectuoso	24 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-02	[redacted]	Observación común	29 de diciembre de 2020	29 de diciembre de 2020	25 de enero de 2021, 18:09:35	29/12/2020	SEMANA 53
DIC	2020	51	CB	Estructura	Curado inadecuado	24 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-02		Error en procedimiento	30 de diciembre de 2020	30 de diciembre de 2020	26 de enero de 2021, 07:12:57	30/12/2020	SEMANA 53
ENE	2021	52	BA	Estructura	Falla en procedimiento	25 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-10		Error en procedimiento	25 de enero de 2021	20 de enero de 2021	26 de enero de 2021, 09:34:00	25/01/2021	SEMANA 04
ENE	2021	53	BG	Estructura	Trabajo inconcluso	25 de enero de 2021, 19:00:00	closed	GN-09		Error en procedimiento	22 de enero de 2021	23 de enero de 2021	26 de enero de 2021, 09:33:43	22/01/2021	SEMANA 03
ENE	2021	54	BA	Estructura	Desalineamiento	25 de enero de 2021, 19:00:00	closed	E-10		Error en procedimiento	22 de enero de 2021	22 de enero de 2021	26 de enero de 2021, 09:41:02	22/01/2021	SEMANA 03
MAY	2021	58	BA	Estructura	Dimensión incorrecta	11 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	E-11		Falta de información	8 de mayo de 2021	10 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021, 07:25:44	8/05/2021	SEMANA 18
MAY	2021	59	CB	Concreto Post-Vaciado	Alambre expuesto	11 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	A-16		Observación común	11 de mayo de 2021	15 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021, 07:25:08	15/05/2021	SEMANA 19
MAY	2021	60	CB	Concreto Post-Vaciado	Segregación	11 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	A-16		Error en procedimiento	11 de mayo de 2021	15 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021, 07:24:59	15/05/2021	SEMANA 19
MAY	2021	61	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	A-16		Error en procedimiento	12 de mayo de 2021	15 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021, 07:24:46	15/05/2021	SEMANA 19
MAY	2021	62	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	A-16		Error en procedimiento	12 de mayo de 2021	15 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021, 15:35:50	15/05/2021	SEMANA 19
MAY	2021	63	BG	Estructura	Daño en material	18 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	GN-10		Error en procedimiento	17 de mayo de 2021	18 de mayo de 2021	19 de mayo de 2021, 17:05:28	18/05/2021	SEMANA 20
MAY	2021	64	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	A-16		Error en procedimiento	19 de mayo de 2021	29 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021, 07:24:18	29/05/2021	SEMANA 21
MAY	2021	65	BF	Estructura	Falla en procedimiento	18 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	IS-38		Mano de obra	18 de mayo de 2021	19 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021, 07:23:54	19/05/2021	SEMANA 20
MAY	2021	66	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	A-16		Error en procedimiento	17 de mayo de 2021	29 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021, 07:23:32	29/05/2021	SEMANA 21
MAY	2021	67	BB	Estructura	Dimensión incorrecta	18 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	E-11		Error en lectura de planos	17 de mayo de 2021	18 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021, 16:17:23	18/05/2021	SEMANA 20
MAY	2021	74	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	25 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	A-16		Error en procedimiento	24 de mayo de 2021	12 de junio de 2021	31 de mayo de 2021, 07:22:02	12/06/2021	SEMANA 23
MAY	2021	75	CB	Concreto Post-Vaciado	Despostillamiento	25 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	A-16		Observación común	24 de mayo de 2021	12 de junio de 2021	2 de junio de 2021, 07:28:08	12/06/2021	SEMANA 23
MAY	2021	76	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	25 de mayo de 2021, 19:00:00	closed	A-16		Error en procedimiento	24 de mayo de 2021	12 de junio de 2021	9 de junio de 2021, 17:26:51	12/06/2021	SEMANA 23
MAY	2021	77	BC	Estructura	Exudación excesiva del concreto	2 de junio de 2021, 16:55:26	closed	E-05		Error en procedimiento	31 de mayo de 2021	5 de junio de 2021	2 de junio de 2021, 16:55:26	31/05/2021	SEMANA 22
JUN	2021	78	BF	Estructura	Ubicación incorrecta	2 de junio de 2021, 17:20:32	closed	IS-02		Incompatibilización de planos	2 de junio de 2021	5 de junio de 2021	2 de junio de 2021, 17:27:52	2/06/2021	SEMANA 22
JUN	2021	79	CB	Concreto Post-Vaciado	Cangrejera	2 de junio de 2021, 17:30:46	closed	A-02		Error en procedimiento	1 de junio de 2021	8 de junio de 2021	9 de junio de 2021, 17:21:12	1/06/2021	SEMANA 22
JUN	2021	82	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de junio de 2021, 17:42:10	closed	A-02		Error en procedimiento	8 de junio de 2021	30 de junio de 2021	1 de julio de 2021, 17:41:09	8/06/2021	SEMANA 23
JUN	2021	83	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de junio de 2021, 17:46:56	closed	A-03		Error en procedimiento	9 de junio de 2021	30 de junio de 2021	1 de julio de 2021, 17:41:32	9/06/2021	SEMANA 23
JUN	2021	84	CB	Concreto Post-Vaciado	Ubicación incorrecta	9 de junio de 2021, 17:51:40	closed	A-03		Error en procedimiento	9 de junio de 2021	30 de junio de 2021	1 de julio de 2021, 17:41:43	9/06/2021	SEMANA 23
JUN	2021	85	CB	Concreto Post-Vaciado	Burbujas	9 de junio de 2021, 17:56:02	closed	A-03		Error en procedimiento	9 de junio de 2021	30 de junio de 2021	1 de julio de 2021, 17:42:14	9/06/2021	SEMANA 23
JUN	2021	86	BC	Estructura	Material Defectuoso	9 de junio de 2021, 18:10:14	closed	E-05		Error en procedimiento	7 de junio de 2021	12 de junio de 2021	18 de junio de 2021, 17:59:52	7/06/2021	SEMANA 23
JUN	2021	88	CB	Concreto Post-Vaciado	Ubicación incorrecta	16 de junio de 2021, 11:57:00	closed	A-04		Error en procedimiento	10 de junio de 2021	3 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:10:45	10/06/2021	SEMANA 23
JUN	2021	89	CB	Concreto Post-Vaciado	Acero expuesto	16 de junio de 2021, 12:04:00	closed	A-04		Error en procedimiento	11 de junio de 2021	6 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:11:02	11/06/2021	SEMANA 23
JUN	2021	90	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de junio de 2021, 12:11:31	closed	A-04		Observación común	10 de junio de 2021	8 de julio de 2021	1 de julio de 2021, 17:42:41	10/06/2021	SEMANA 23
JUN	2021	91	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de junio de 2021, 12:19:37	closed	A-04		Error en procedimiento	14 de junio de 2021	8 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:10:36	14/06/2021	SEMANA 24
JUN	2021	92	CB	Concreto Post-Vaciado	Ubicación incorrecta	16 de junio de 2021, 12:26:26	closed	A-04		Error en procedimiento	14 de junio de 2021	7 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:10:51	14/06/2021	SEMANA 24
JUN	2021	93	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	16 de junio de 2021, 12:38:30	closed	A-04		Error en procedimiento	14 de junio de 2021	7 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:10:55	14/06/2021	SEMANA 24
JUN	2021	94	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de junio de 2021, 12:48:25	closed	A-04		Error en procedimiento	11 de junio de 2021	7 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:11:08	11/06/2021	SEMANA 23
JUN	2021	95	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	19 de junio de 2021, 12:08:01	closed	A-04		Observación común	15 de junio de 2021	13 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:11:36	15/06/2021	SEMANA 24
JUN	2021	97	CB	Concreto Post-Vaciado	Cangrejera	21 de junio de 2021, 19:00:00	closed	A-04		Error en procedimiento	15 de junio de 2021	17 de julio de 2021	14 de agosto de 2021, 10:14:55	15/06/2021	SEMANA 24
JUN	2021	98	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	22 de junio de 2021, 08:30:38	closed	A-04		Error en procedimiento	16 de junio de 2021	16 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:11:50	16/06/2021	SEMANA 24
JUN	2021	99	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	22 de junio de 2021, 08:33:44	closed	A-04		Error en procedimiento	17 de junio de 2021	17 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:11:56	17/06/2021	SEMANA 24
JUN	2021	100	CB	Concreto Post-Vaciado	Cangrejera	22 de junio de 2021, 08:36:43	closed	A-04		Error en procedimiento	17 de junio de 2021	17 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:12:03	17/06/2021	SEMANA 24
JUN	2021	101	CB	Concreto Post-Vaciado	Despostillamiento	22 de junio de 2021, 08:39:26	closed	A-04		Error en procedimiento	18 de junio de 2021	19 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:11:43	18/06/2021	SEMANA 24
JUN	2021	102	BA	Estructura	Falla en instalación	22 de junio de 2021, 14:44:36	closed	E-26		Error en lectura de planos	18 de junio de 2021	26 de junio de 2021	27 de junio de 2021, 12:22:04	18/06/2021	SEMANA 24
JUN	2021	104	BA	Estructura	Trabajo inconcluso	22 de junio de 2021, 15:36:52	closed	E-26		Error en lectura de planos	18 de junio de 2021	26 de junio de 2021	27 de junio de 2021, 12:17:36	18/06/2021	SEMANA 24
JUN	2021	105	BC	Estructura	Diseño Inadecuado de concreto	22 de junio de 2021, 15:59:01	closed	E-05		Error en procedimiento	17 de junio de 2021	26 de junio de 2021	22 de junio de 2021, 16:42:20	17/06/2021	SEMANA 24
JUN	2021	106	CB	Concreto Post-Vaciado	Trabajo inconcluso	28 de junio de 2021, 14:25:05	closed	A-04		Observación común	23 de junio de 2021	23 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:12:10	23/06/2021	SEMANA 25
JUN	2021	107	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de junio de 2021, 14:30:32	closed	A-04		Error en procedimiento	23 de junio de 2021	23 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:12:24	23/06/2021	SEMANA 25
JUN	2021	108	CB	Concreto Post-Vaciado	Despostillamiento	28 de junio de 2021, 14:36:30	closed	A-04		Error en procedimiento	23 de junio de 2021	24 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:12:27	23/06/2021	SEMANA 25
JUN	2021	109	CB	Concreto Post-Vaciado	Acero Expuesto	28 de junio de 2021, 14:42:23	closed	A-04		Error en procedimiento	21 de junio de 2021	21 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:12:39	21/06/2021	SEMANA 25

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
JUN	2021	110	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	28 de junio de 2021, 14:49:00	closed	A-04	[redacted]	Observación común	21 de junio de 2021	23 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:12:34	21/06/2021	SEMANA 25
JUN	2021	111	CB	Concreto Post-Vaciado	Trabajo Inconcluso	28 de junio de 2021, 14:52:18	closed	A-04		Error en procedimiento	21 de junio de 2021	23 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:12:38	21/06/2021	SEMANA 25
JUN	2021	112	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	1 de julio de 2021, 13:32:04	closed	A-05		Error en procedimiento	26 de junio de 2021	26 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:12:41	26/06/2021	SEMANA 25
JUN	2021	113	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	1 de julio de 2021, 13:37:11	closed	A-05		Observación común	28 de junio de 2021	28 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:12:44	28/06/2021	SEMANA 26
JUN	2021	114	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	1 de julio de 2021, 13:42:53	closed	A-05		Observación común	30 de junio de 2021	30 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:12:47	30/06/2021	SEMANA 26
JUN	2021	115	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	1 de julio de 2021, 13:53:22	closed	A-05		Error en procedimiento	30 de junio de 2021	30 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:12:49	30/06/2021	SEMANA 26
JUN	2021	116	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	1 de julio de 2021, 13:56:30	closed	A-05		Error en procedimiento	30 de junio de 2021	30 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:12:52	30/06/2021	SEMANA 26
JUN	2021	117	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de julio de 2021, 11:39:21	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de julio de 2021	1 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 08:50:40	30/06/2021	SEMANA 26
JUL	2021	118	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	7 de julio de 2021, 11:42:51	closed	A-05		Error en procedimiento	2 de julio de 2021	2 de agosto de 2021	23 de julio de 2021, 08:13:17	2/07/2021	SEMANA 26
JUL	2021	119	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de julio de 2021, 11:47:23	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de julio de 2021	4 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 08:51:43	1/07/2021	SEMANA 26
JUL	2021	120	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de julio de 2021, 11:51:23	closed	A-05		Error en procedimiento	2 de julio de 2021	2 de agosto de 2021	23 de julio de 2021, 08:13:22	2/07/2021	SEMANA 26
JUL	2021	121	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de julio de 2021, 11:58:09	closed	A-05		Error en procedimiento	3 de julio de 2021	3 de agosto de 2021	23 de julio de 2021, 08:13:28	3/07/2021	SEMANA 26
JUL	2021	122	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de julio de 2021, 12:00:56	closed	A-05		Error en procedimiento	3 de julio de 2021	3 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 08:53:13	3/07/2021	SEMANA 26
JUL	2021	123	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de julio de 2021, 12:44:36	closed	A-05		Error en procedimiento	6 de julio de 2021	2 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 08:54:38	6/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	124	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de julio de 2021, 12:48:35	closed	A-05		Error en procedimiento	6 de julio de 2021	3 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 08:57:30	6/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	125	CB	Concreto Post-Vaciado	Cangrejera	10 de julio de 2021, 12:51:39	closed	A-05		Error en procedimiento	7 de julio de 2021	3 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 09:01:30	7/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	126	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	10 de julio de 2021, 12:54:02	closed	A-05		Observación común	7 de julio de 2021	4 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 09:03:04	7/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	127	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de julio de 2021, 13:02:18	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de julio de 2021	5 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 09:20:35	8/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	128	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	10 de julio de 2021, 13:05:35	closed	A-05		Observación común	8 de julio de 2021	4 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 10:58:10	8/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	129	CB	Concreto Post-Vaciado	Cangrejera	10 de julio de 2021, 13:13:20	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de julio de 2021	7 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 10:59:12	9/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	130	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de julio de 2021, 13:16:42	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 11:01:42	9/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	131	CC	Solaqueo	Desalineamiento	12 de julio de 2021, 13:22:31	closed	A-02		Error en procedimiento	6 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	23 de julio de 2021, 08:13:33	6/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	132	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	12 de julio de 2021, 13:25:13	closed	A-02		Error en procedimiento	6 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	23 de julio de 2021, 08:13:37	6/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	133	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	12 de julio de 2021, 13:29:52	closed	A-02		Error en procedimiento	6 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	23 de julio de 2021, 08:13:44	6/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	134	CC	Solaqueo	Desalineamiento	12 de julio de 2021, 13:34:07	closed	A-02		Error en procedimiento	6 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	23 de julio de 2021, 08:13:48	6/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	135	CC	Solaqueo	Protuberancia	12 de julio de 2021, 13:41:32	closed	A-02		Observación común	6 de julio de 2021	7 de agosto de 2021	23 de julio de 2021, 08:13:54	6/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	136	CC	Solaqueo	Desalineamiento	12 de julio de 2021, 13:48:35	closed	A-02		Error en procedimiento	7 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	23 de julio de 2021, 08:14:01	7/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	137	CC	Solaqueo	Desalineamiento	12 de julio de 2021, 13:54:39	closed	A-03		Error en procedimiento	9 de julio de 2021	16 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:14:06	9/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	138	CC	Solaqueo	Despostillamiento	12 de julio de 2021, 14:13:13	closed	A-03		Error en procedimiento	9 de julio de 2021	16 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:14:12	9/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	139	CC	Solaqueo	Desalineamiento	12 de julio de 2021, 14:19:32	closed	A-03		Error en procedimiento	9 de julio de 2021	16 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:14:18	9/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	140	CC	Solaqueo	Protuberancia	12 de julio de 2021, 14:23:18	closed	A-03		Observación común	9 de julio de 2021	16 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:14:29	9/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	141	CC	Solaqueo	Desalineamiento	12 de julio de 2021, 14:28:26	closed	A-03		Error en procedimiento	9 de julio de 2021	16 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:14:34	9/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	142	CC	Solaqueo	Desalineamiento	12 de julio de 2021, 14:37:52	closed	A-03		Error en procedimiento	9 de julio de 2021	16 de julio de 2021	6 de agosto de 2021, 11:03:02	9/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	143	CC	Solaqueo	Burbujas	12 de julio de 2021, 14:43:06	closed	A-03		Error en procedimiento	9 de julio de 2021	16 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:14:43	9/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	144	CC	Solaqueo	Desalineamiento	12 de julio de 2021, 14:52:38	closed	A-03		Error en procedimiento	9 de julio de 2021	16 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:14:47	9/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	145	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	12 de julio de 2021, 14:57:31	closed	A-03		Error en procedimiento	9 de julio de 2021	16 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:14:52	9/07/2021	SEMANA 27
JUL	2021	146	CC	Solaqueo	Desalineamiento	12 de julio de 2021, 15:03:24	closed	A-03		Observación común	12 de julio de 2021	19 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:14:58	12/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	147	CC	Solaqueo	Desalineamiento	12 de julio de 2021, 15:22:15	closed	A-03		Error en procedimiento	12 de julio de 2021	19 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:15:21	12/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	148	CC	Solaqueo	Desalineamiento	12 de julio de 2021, 15:32:05	closed	A-03		Error en procedimiento	12 de julio de 2021	19 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:15:25	12/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	149	CC	Solaqueo	Burbujas	12 de julio de 2021, 15:35:40	closed	A-03		Error en procedimiento	12 de julio de 2021	19 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:15:29	12/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	150	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	14 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de julio de 2021	12 de agosto de 2021	26 de agosto de 2021, 08:17:03	13/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	152	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	14 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de julio de 2021	12 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 11:09:09	13/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	154	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	14 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	13 de julio de 2021	12 de agosto de 2021	14 de agosto de 2021, 10:15:59	13/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	155	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	14 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de julio de 2021	12 de agosto de 2021	14 de agosto de 2021, 10:19:53	13/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	156	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	14 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	13 de julio de 2021	12 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 11:12:19	13/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	157	CB	Concreto Post-Vaciado	Cangrejera	14 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de julio de 2021	12 de agosto de 2021	14 de agosto de 2021, 10:21:19	13/07/2021	SEMANA 28

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
JUL	2021	158	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	14 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05	[redacted]	Error en procedimiento	13 de julio de 2021	12 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 08:32:24	13/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	159	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	14 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de julio de 2021	12 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 08:32:32	13/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	160	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	14 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de julio de 2021	12 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 08:32:38	13/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	161	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de julio de 2021	13 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 11:17:31	14/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	162	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	14 de julio de 2021	13 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 11:18:43	14/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	163	CB	Concreto Post-Vaciado	Burbujas	16 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de julio de 2021	13 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 11:19:37	14/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	164	CB	Concreto Post-Vaciado	Cangrejera	16 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de julio de 2021	13 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 08:32:45	14/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	165	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	14 de julio de 2021	13 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 08:32:54	14/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	166	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de julio de 2021	13 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 11:21:49	14/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	167	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	14 de julio de 2021	13 de agosto de 2021	9 de agosto de 2021, 07:54:29	14/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	169	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	16 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	14 de julio de 2021	13 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 11:34:18	14/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	170	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	15 de julio de 2021	15 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 08:33:04	15/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	171	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	15 de julio de 2021	15 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 08:33:16	15/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	172	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	15 de julio de 2021	15 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 08:33:24	15/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	173	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	16 de julio de 2021	17 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:26:43	16/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	174	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	17 de julio de 2021	17 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:26:51	17/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	175	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	17 de julio de 2021	17 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:26:59	17/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	176	CB	Concreto Post-Vaciado	Burbujas	18 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	17 de julio de 2021	17 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 08:33:48	17/07/2021	SEMANA 28
JUL	2021	178	CC	Solaqueo	Desalineamiento	18 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-04		Error en procedimiento	19 de julio de 2021	19 de agosto de 2021	23 de julio de 2021, 08:16:07	19/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	179	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	18 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-04		Error en procedimiento	19 de julio de 2021	19 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 11:39:36	19/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	180	CC	Solaqueo	Desalineamiento	20 de julio de 2021, 13:16:55	closed	A-04		Error en procedimiento	19 de julio de 2021	26 de julio de 2021	1 de agosto de 2021, 10:59:40	19/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	181	CC	Solaqueo	Protuberancia	20 de julio de 2021, 14:17:14	closed	A-04		Observación común	19 de julio de 2021	26 de julio de 2021	14 de agosto de 2021, 10:11:10	19/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	182	CC	Solaqueo	Desalineamiento	20 de julio de 2021, 14:24:44	closed	A-04		Error en procedimiento	19 de julio de 2021	26 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:15:42	19/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	183	CC	Solaqueo	Desalineamiento	20 de julio de 2021, 14:30:01	closed	A-04		Error en procedimiento	19 de julio de 2021	26 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:16:00	19/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	184	CC	Solaqueo	Desalineamiento	20 de julio de 2021, 14:38:33	closed	A-04		Error en procedimiento	19 de julio de 2021	26 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:15:57	19/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	185	CC	Solaqueo	Protuberancia	20 de julio de 2021, 14:43:22	closed	A-04		Observación común	19 de julio de 2021	26 de julio de 2021	14 de agosto de 2021, 10:12:15	19/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	186	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	20 de julio de 2021, 14:53:33	closed	A-04		Error en procedimiento	19 de julio de 2021	26 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:15:54	19/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	187	CC	Solaqueo	Desalineamiento	20 de julio de 2021, 14:59:23	closed	A-04		Error en procedimiento	19 de julio de 2021	26 de julio de 2021	23 de julio de 2021, 08:16:01	19/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	190	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	19 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	20 de julio de 2021	20 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:27:07	20/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	191	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	19 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	20 de julio de 2021	20 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:27:12	20/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	192	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	19 de julio de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de julio de 2021	20 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:27:17	20/07/2021	SEMANA 29
JUL	2021	194	CC	Solaqueo	Desalineamiento	30 de julio de 2021, 13:56:33	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 11:41:29	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	195	CC	Solaqueo	Oxido	30 de julio de 2021, 13:59:09	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 08:35:30	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	196	CC	Solaqueo	Oxido	30 de julio de 2021, 14:02:25	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 11:47:07	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	197	CC	Solaqueo	Desalineamiento	30 de julio de 2021, 14:05:19	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	6 de agosto de 2021, 11:49:56	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	198	CC	Solaqueo	Desalineamiento	30 de julio de 2021, 14:09:24	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	9 de agosto de 2021, 07:57:17	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	199	CC	Solaqueo	Desalineamiento	30 de julio de 2021, 14:11:07	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	9 de agosto de 2021, 07:58:58	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	200	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	30 de julio de 2021, 14:14:57	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	9 de agosto de 2021, 08:00:14	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	201	CC	Solaqueo	Desalineamiento	30 de julio de 2021, 14:26:42	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	9 de agosto de 2021, 08:01:14	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	202	CC	Solaqueo	Despostillamiento	30 de julio de 2021, 14:33:27	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	9 de agosto de 2021, 08:02:43	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	203	CC	Solaqueo	Desalineamiento	30 de julio de 2021, 14:35:54	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 08:35:38	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	204	CC	Solaqueo	Desalineamiento	30 de julio de 2021, 14:38:23	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	9 de agosto de 2021, 08:04:04	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	205	CC	Solaqueo	Desalineamiento	30 de julio de 2021, 14:43:21	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 08:46:22	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	206	CC	Solaqueo	Desalineamiento	30 de julio de 2021, 14:50:31	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	9 de agosto de 2021, 08:05:24	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	207	CC	Solaqueo	Protuberancia	30 de julio de 2021, 14:53:11	closed	A-04		Observación común	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	14 de agosto de 2021, 10:13:09	30/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	208	CC	Solaqueo	Desalineamiento	30 de julio de 2021, 14:55:14	closed	A-04		Error en procedimiento	30 de julio de 2021	6 de agosto de 2021	9 de agosto de 2021, 08:06:35	30/07/2021	SEMANA 30

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
JUL	2021	209	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 11:39:06	closed	A-05	[redacted]	Error en procedimiento	30 de julio de 2021	21 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:27:22	31/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	210	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 11:42:14	closed	A-05		Error en procedimiento	31 de julio de 2021	21 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:27:28	31/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	211	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 11:44:53	closed	A-05		Error en procedimiento	31 de julio de 2021	21 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:27:33	31/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	212	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 11:58:56	closed	A-05		Error en procedimiento	31 de julio de 2021	21 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:27:43	31/07/2021	SEMANA 30
JUL	2021	213	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 12:03:21	closed	A-05		Error en procedimiento	31 de julio de 2021	21 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:27:47	31/07/2021	SEMANA 30
AGO	2021	214	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 12:06:01	closed	A-05		Error en procedimiento	2 de agosto de 2021	30 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:27:54	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	215	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 12:09:39	closed	A-05		Error en procedimiento	2 de agosto de 2021	30 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:27:59	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	216	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 12:12:13	closed	A-05		Error en procedimiento	2 de agosto de 2021	30 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:28:05	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	217	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 12:14:46	closed	A-05		Error en procedimiento	3 de agosto de 2021	31 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:28:11	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	218	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 12:17:20	closed	A-05		Error en procedimiento	3 de agosto de 2021	31 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:28:16	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	219	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 12:19:19	closed	A-05		Error en procedimiento	3 de agosto de 2021	31 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:28:19	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	220	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 12:22:12	closed	A-05		Error en procedimiento	2 de agosto de 2021	30 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:28:24	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	221	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de agosto de 2021, 12:25:42	closed	A-05		Error en procedimiento	2 de agosto de 2021	30 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021, 08:28:27	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	222	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	3 de agosto de 2021	3 de setiembre de 2021	23 de agosto de 2021, 08:28:35	3/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	223	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	3 de agosto de 2021	3 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:10:02	3/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	224	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	3 de agosto de 2021	6 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:10:08	3/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	225	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	4 de agosto de 2021	6 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:10:13	4/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	226	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	4 de agosto de 2021	5 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:10:17	4/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	227	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	4 de agosto de 2021	6 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:10:33	4/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	228	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	5 de agosto de 2021	6 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:10:43	5/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	229	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	5 de agosto de 2021	6 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:10:47	5/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	230	CB	Concreto Post-Vaciado	Burbujas	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	5 de agosto de 2021	6 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:11:30	5/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	231	CB	Concreto Post-Vaciado	Despostillamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	6 de agosto de 2021	7 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:11:26	6/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	232	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	6 de agosto de 2021	7 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:11:23	6/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	233	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	6 de agosto de 2021	6 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:11:06	6/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	234	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	6 de agosto de 2021	7 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:11:00	6/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	235	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	7 de agosto de 2021	9 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:01:13	7/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	236	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	7 de agosto de 2021	8 de setiembre de 2021	27 de agosto de 2021, 10:11:17	7/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	237	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	9 de agosto de 2021	10 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:01:28	9/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	238	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	9 de agosto de 2021	10 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:01:40	9/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	239	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	9 de agosto de 2021	10 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:01:48	9/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	241	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	9 de agosto de 2021	10 de setiembre de 2021	21 de setiembre de 2021, 15:30:21	9/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	242	CD	Tabiquería	Desalineamiento	10 de agosto de 2021, 18:05:10	closed	A-02		Error en procedimiento	2 de agosto de 2021	4 de setiembre de 2021	26 de agosto de 2021, 08:20:31	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	243	CD	Tabiquería	Quiñe	11 de agosto de 2021, 11:18:00	closed	A-02		Observación común	2 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021	18 de agosto de 2021, 13:44:21	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	244	CD	Tabiquería	Desalineamiento	11 de agosto de 2021, 11:20:49	closed	A-02		Error en procedimiento	2 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021	18 de agosto de 2021, 13:44:25	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	245	CD	Tabiquería	Desalineamiento	11 de agosto de 2021, 11:23:28	closed	A-03		Error en procedimiento	2 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021	18 de agosto de 2021, 13:44:29	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	246	CD	Tabiquería	Trabajo Inconcluso	11 de agosto de 2021, 11:25:42	closed	A-03		Error en procedimiento	2 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021	18 de agosto de 2021, 13:44:32	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	247	CD	Tabiquería	Desalineamiento	11 de agosto de 2021, 11:27:39	closed	A-03		Error en procedimiento	2 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021	18 de agosto de 2021, 13:44:36	2/08/2021	SEMANA 31
AGO	2021	248	CC	Solaqueo	Discontinuidad	13 de agosto de 2021, 07:45:45	closed	A-04		Observación común	12 de agosto de 2021	19 de agosto de 2021	13 de agosto de 2021, 17:28:43	12/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	249	CC	Solaqueo	Discontinuidad	13 de agosto de 2021, 07:50:44	closed	A-04		Observación común	12 de agosto de 2021	19 de agosto de 2021	13 de agosto de 2021, 17:29:23	12/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	250	CC	Solaqueo	Discontinuidad	13 de agosto de 2021, 07:55:49	closed	A-04		Observación común	12 de agosto de 2021	19 de agosto de 2021	13 de agosto de 2021, 17:30:19	12/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	251	CC	Solaqueo	Desalineamiento	13 de agosto de 2021, 07:58:24	closed	A-04		Observación común	12 de agosto de 2021	19 de agosto de 2021	13 de agosto de 2021, 17:30:47	12/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	252	CC	Solaqueo	Desalineamiento	13 de agosto de 2021, 08:02:29	closed	A-04		Error en procedimiento	12 de agosto de 2021	19 de agosto de 2021	13 de agosto de 2021, 17:31:14	12/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	253	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	13 de agosto de 2021, 08:07:26	closed	A-04		Error en procedimiento	12 de agosto de 2021	19 de agosto de 2021	13 de agosto de 2021, 17:31:49	12/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	254	CC	Solaqueo	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 14:03:59	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de agosto de 2021	21 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 16:09:22	14/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	255	CC	Solaqueo	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 14:07:30	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de agosto de 2021	21 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 16:09:16	14/08/2021	SEMANA 32

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
AGO	2021	256	CC	Solaqueo	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 14:10:46	closed	A-05	[redacted]	Error en procedimiento	14 de agosto de 2021	21 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 16:09:08	14/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	257	CC	Solaqueo	Discontinuidad	16 de agosto de 2021, 14:12:53	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de agosto de 2021	21 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 16:09:04	14/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	258	CC	Solaqueo	Despostillamiento	16 de agosto de 2021, 14:16:24	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de agosto de 2021	21 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 16:08:58	14/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	259	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	16 de agosto de 2021, 14:26:30	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de agosto de 2021	21 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 16:08:54	14/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	260	CC	Solaqueo	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 14:29:08	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de agosto de 2021	21 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 16:08:50	14/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	261	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	16 de agosto de 2021, 14:32:03	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de agosto de 2021	21 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 16:08:44	14/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	262	CC	Solaqueo	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 14:34:00	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de agosto de 2021	21 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 16:08:41	14/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	263	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	16 de agosto de 2021, 14:36:20	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de agosto de 2021	21 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021, 16:08:36	14/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	264	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	10 de agosto de 2021	10 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:02:01	10/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	265	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	10 de agosto de 2021	10 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:02:11	10/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	266	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	10 de agosto de 2021	10 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:02:19	10/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	267	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	10 de agosto de 2021	10 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:02:26	10/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	268	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	10 de agosto de 2021	10 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:02:36	10/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	269	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de agosto de 2021	11 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:03:10	11/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	270	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Observación común	11 de agosto de 2021	11 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:04:02	11/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	271	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	16 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de agosto de 2021	11 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:04:24	11/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	272	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de agosto de 2021	11 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:04:35	11/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	273	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de agosto de 2021, 19:00:00	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de agosto de 2021	11 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:05:24	11/08/2021	SEMANA 32
AGO	2021	274	CD	Tabiquería	Quiñe	18 de agosto de 2021, 13:55:18	closed	A-04		Observación común	17 de agosto de 2021	24 de agosto de 2021	18 de agosto de 2021, 14:22:15	17/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	275	CD	Tabiquería	Quiñe	18 de agosto de 2021, 14:01:51	closed	A-04		Observación común	17 de agosto de 2021	25 de agosto de 2021	18 de agosto de 2021, 14:22:12	17/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	276	CD	Tabiquería	Desalineamiento	18 de agosto de 2021, 14:05:39	closed	A-05		Error en procedimiento	17 de agosto de 2021	24 de agosto de 2021	18 de agosto de 2021, 14:22:09	17/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	277	CD	Tabiquería	Desalineamiento	18 de agosto de 2021, 14:07:34	closed	A-05		Error en procedimiento	17 de agosto de 2021	25 de agosto de 2021	18 de agosto de 2021, 14:22:05	17/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	278	CC	Solaqueo	Desalineamiento	18 de agosto de 2021, 17:32:53	closed	A-05		Error en procedimiento	18 de agosto de 2021	25 de agosto de 2021	20 de agosto de 2021, 14:14:34	18/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	279	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	18 de agosto de 2021, 17:36:43	closed	A-05		Error en procedimiento	18 de agosto de 2021	25 de agosto de 2021	20 de agosto de 2021, 14:14:26	18/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	280	CC	Solaqueo	Desalineamiento	18 de agosto de 2021, 17:38:43	closed	A-05		Error en procedimiento	18 de agosto de 2021	25 de agosto de 2021	20 de agosto de 2021, 14:14:21	18/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	281	CC	Solaqueo	Discontinuidad	18 de agosto de 2021, 17:40:57	closed	A-05		Error en procedimiento	18 de agosto de 2021	25 de agosto de 2021	20 de agosto de 2021, 14:14:15	18/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	282	CC	Solaqueo	Desalineamiento	18 de agosto de 2021, 17:43:20	closed	A-05		Error en procedimiento	18 de agosto de 2021	25 de agosto de 2021	20 de agosto de 2021, 14:14:09	18/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	283	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	24 de agosto de 2021, 12:34:54	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	28 de agosto de 2021	27 de agosto de 2021, 09:03:03	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	284	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	24 de agosto de 2021, 12:37:37	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	28 de agosto de 2021	24 de agosto de 2021, 13:10:41	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	285	CC	Solaqueo	Quiñe	24 de agosto de 2021, 12:45:18	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	28 de agosto de 2021	24 de agosto de 2021, 13:10:30	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	286	CC	Solaqueo	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 12:50:57	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	28 de agosto de 2021	24 de agosto de 2021, 16:26:48	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	287	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 13:37:19	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:02:48	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	288	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 14:07:49	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:02:53	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	289	CB	Concreto Post-Vaciado	Burbujas	24 de agosto de 2021, 14:10:36	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:13:14	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	290	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 14:12:21	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:13:11	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	291	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 14:16:33	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:13:06	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	292	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 14:19:15	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:13:01	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	293	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 14:22:15	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:12:54	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	294	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 14:25:07	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:12:48	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	295	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 14:28:12	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:12:43	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	296	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 14:30:49	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:12:36	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	297	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	24 de agosto de 2021, 14:44:37	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:12:29	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	298	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 14:48:27	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:12:17	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	299	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 14:52:25	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	7 de setiembre de 2021, 11:03:01	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	300	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 14:56:01	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:07:33	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	301	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 15:00:23	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:07:27	20/08/2021	SEMANA 33

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
AGO	2021	302	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 15:03:54	closed	A-05	[redacted]	Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:07:18	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	303	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 15:07:23	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:07:10	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	304	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 15:09:07	closed	A-05		Error en procedimiento	20 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	7 de setiembre de 2021, 11:02:05	20/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	305	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 15:46:42	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	25 de setiembre de 2021	7 de setiembre de 2021, 11:02:12	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	306	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 15:48:52	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	25 de setiembre de 2021	7 de setiembre de 2021, 11:02:22	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	307	CB	Concreto Post-Vaciado	Ubicación incorrecta	24 de agosto de 2021, 15:51:50	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	24 de setiembre de 2021	29 de setiembre de 2021, 09:23:29	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	308	CB	Concreto Post-Vaciado	Cangrejera	24 de agosto de 2021, 15:53:30	closed	A-05		Observación común	21 de agosto de 2021	25 de setiembre de 2021	29 de setiembre de 2021, 09:23:36	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	309	CB	Concreto Post-Vaciado	Burbujas	24 de agosto de 2021, 15:55:21	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	25 de setiembre de 2021	7 de setiembre de 2021, 11:02:36	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	310	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 15:57:00	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	25 de setiembre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:03:16	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	311	CB	Concreto Post-Vaciado	Despostillamiento	24 de agosto de 2021, 15:58:41	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	25 de setiembre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:03:22	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	312	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 16:01:34	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	25 de setiembre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:03:25	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	313	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 16:03:44	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	25 de setiembre de 2021	7 de setiembre de 2021, 11:05:32	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	314	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 16:05:40	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	25 de setiembre de 2021	21 de setiembre de 2021, 15:35:39	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	315	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 16:07:07	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de agosto de 2021	25 de setiembre de 2021	21 de setiembre de 2021, 15:40:04	21/08/2021	SEMANA 33
AGO	2021	316	CC	Solaqueo	Desalineamiento	24 de agosto de 2021, 16:11:18	closed	A-05		Error en procedimiento	23 de agosto de 2021	30 de agosto de 2021	25 de agosto de 2021, 11:53:09	23/08/2021	SEMANA 34
AGO	2021	317	CD	Tabiquería	Desalineamiento	27 de agosto de 2021, 16:16:15	closed	A-05		Error en procedimiento	27 de agosto de 2021	3 de setiembre de 2021	28 de agosto de 2021, 15:00:59	27/08/2021	SEMANA 34
AGO	2021	318	CD	Tabiquería	Desalineamiento	27 de agosto de 2021, 16:24:22	closed	A-05		Error en procedimiento	27 de agosto de 2021	3 de setiembre de 2021	28 de agosto de 2021, 15:00:55	27/08/2021	SEMANA 34
AGO	2021	319	CD	Tabiquería	Desalineamiento	27 de agosto de 2021, 16:27:17	closed	A-05		Error en procedimiento	27 de agosto de 2021	2 de setiembre de 2021	28 de agosto de 2021, 15:00:52	27/08/2021	SEMANA 34
AGO	2021	320	CD	Tabiquería	Desalineamiento	27 de agosto de 2021, 16:30:01	closed	A-05		Error en procedimiento	27 de agosto de 2021	3 de setiembre de 2021	28 de agosto de 2021, 15:00:49	27/08/2021	SEMANA 34
AGO	2021	321	CD	Tabiquería	Desalineamiento	27 de agosto de 2021, 16:32:44	closed	A-05		Error en procedimiento	27 de agosto de 2021	2 de setiembre de 2021	28 de agosto de 2021, 15:00:45	27/08/2021	SEMANA 34
AGO	2021	322	CD	Tabiquería	Desalineamiento	27 de agosto de 2021, 16:36:45	closed	A-05		Error en procedimiento	27 de agosto de 2021	3 de setiembre de 2021	28 de agosto de 2021, 15:00:42	27/08/2021	SEMANA 34
AGO	2021	323	CD	Tabiquería	Desalineamiento	27 de agosto de 2021, 16:38:49	closed	A-05		Error en procedimiento	27 de agosto de 2021	3 de setiembre de 2021	28 de agosto de 2021, 15:00:38	27/08/2021	SEMANA 34
AGO	2021	324	CD	Tabiquería	Desalineamiento	27 de agosto de 2021, 16:41:25	closed	A-05		Error en procedimiento	27 de agosto de 2021	3 de setiembre de 2021	28 de agosto de 2021, 15:00:32	27/08/2021	SEMANA 34
AGO	2021	325	CC	Solaqueo	Discontinuidad	28 de agosto de 2021, 15:05:11	closed	A-05		Error en procedimiento	28 de agosto de 2021	4 de setiembre de 2021	1 de setiembre de 2021, 11:16:13	28/08/2021	SEMANA 34
SET	2021	326	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 08:04:30	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2021	1 de octubre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:03:50	1/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	327	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 08:06:01	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2021	1 de octubre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:03:54	1/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	328	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 08:07:39	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2021	1 de octubre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:03:59	1/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	329	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 08:09:33	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2021	1 de octubre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:04:07	1/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	330	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 08:10:46	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2021	1 de octubre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:04:42	1/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	331	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 08:16:09	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2021	1 de octubre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:05:34	1/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	332	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 08:18:22	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2021	1 de octubre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:05:39	1/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	333	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 08:20:00	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2021	1 de octubre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:05:43	1/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	334	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 08:21:07	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2021	1 de octubre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:05:48	1/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	335	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 08:22:58	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2021	1 de octubre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:05:52	1/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	336	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 08:24:53	closed	A-05		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2021	1 de octubre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:06:00	1/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	337	CC	Solaqueo	Discontinuidad	4 de setiembre de 2021, 15:37:20	closed	A-05		Error en procedimiento	4 de setiembre de 2021	11 de setiembre de 2021	7 de setiembre de 2021, 11:01:49	4/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	338	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	4 de setiembre de 2021, 15:39:19	closed	A-05		Error en procedimiento	4 de setiembre de 2021	11 de setiembre de 2021	7 de setiembre de 2021, 11:01:43	4/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	339	CC	Solaqueo	Tubería Rota	4 de setiembre de 2021, 15:51:14	closed	A-05		Error en procedimiento	4 de setiembre de 2021	11 de setiembre de 2021	18 de setiembre de 2021, 08:37:59	4/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	340	CC	Solaqueo	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 15:52:38	closed	A-05		Error en procedimiento	4 de setiembre de 2021	11 de setiembre de 2021	7 de setiembre de 2021, 11:01:34	4/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	341	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	4 de setiembre de 2021, 16:11:18	closed	A-05		Error en procedimiento	4 de setiembre de 2021	11 de setiembre de 2021	7 de setiembre de 2021, 11:01:29	4/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	342	CC	Solaqueo	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 16:16:54	closed	A-05		Error en procedimiento	4 de setiembre de 2021	11 de setiembre de 2021	7 de setiembre de 2021, 11:01:22	4/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	343	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	4 de setiembre de 2021, 16:24:20	closed	A-05		Error en procedimiento	4 de setiembre de 2021	11 de setiembre de 2021	7 de setiembre de 2021, 11:01:13	4/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	344	CD	Tabiquería	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 16:39:46	closed	A-05		Error en procedimiento	4 de setiembre de 2021	11 de setiembre de 2021	6 de setiembre de 2021, 16:42:28	4/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	345	CD	Tabiquería	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 16:42:02	closed	A-05		Error en procedimiento	4 de setiembre de 2021	11 de setiembre de 2021	6 de setiembre de 2021, 16:42:23	4/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	346	CD	Tabiquería	Desalineamiento	4 de setiembre de 2021, 16:48:01	closed	A-05		Error en procedimiento	4 de setiembre de 2021	11 de setiembre de 2021	6 de setiembre de 2021, 16:42:10	4/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	347	CD	Tabiquería	Desalineamiento	6 de setiembre de 2021, 08:01:56	closed	A-05		Error en procedimiento	4 de setiembre de 2021	25 de setiembre de 2021	6 de setiembre de 2021, 16:42:07	4/09/2021	SEMANA 35

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
SET	2021	348	CD	Tabiquería	Desalineamiento	6 de setiembre de 2021, 08:12:14	closed	A-05	[redacted]	Error en procedimiento	4 de setiembre de 2021	25 de setiembre de 2021	6 de setiembre de 2021, 16:42:01	4/09/2021	SEMANA 35
SET	2021	349	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de setiembre de 2021, 12:15:45	closed	A-05		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2021	5 de octubre de 2021	21 de setiembre de 2021, 15:40:08	7/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	350	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de setiembre de 2021, 12:17:41	closed	A-05		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2021	5 de octubre de 2021	21 de setiembre de 2021, 15:40:19	7/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	351	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de setiembre de 2021, 13:33:29	closed	A-05		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2021	5 de octubre de 2021	21 de setiembre de 2021, 15:40:26	7/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	352	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de setiembre de 2021, 13:35:42	closed	A-05		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2021	5 de octubre de 2021	29 de setiembre de 2021, 09:23:42	7/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	353	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de setiembre de 2021, 13:48:49	closed	A-05		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2021	5 de octubre de 2021	21 de setiembre de 2021, 15:40:32	7/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	354	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de setiembre de 2021, 13:50:36	closed	A-05		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2021	5 de octubre de 2021	29 de setiembre de 2021, 09:23:47	7/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	355	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de setiembre de 2021, 13:52:24	closed	A-05		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2021	5 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:56:54	7/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	356	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de setiembre de 2021, 13:56:27	closed	A-05		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2021	5 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:56:58	7/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	357	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de setiembre de 2021, 13:59:18	closed	A-05		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2021	5 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:02	7/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	358	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	7 de setiembre de 2021, 14:01:43	closed	A-05		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2021	5 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:05	7/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	359	CC	Solaqueo	Desalineamiento	9 de setiembre de 2021, 10:52:41	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2021	16 de setiembre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:01:49	9/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	360	CC	Solaqueo	Despostillamiento	9 de setiembre de 2021, 10:59:39	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2021	16 de setiembre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:01:44	9/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	361	CC	Solaqueo	Desalineamiento	9 de setiembre de 2021, 11:01:40	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2021	16 de setiembre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:01:40	9/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	362	CC	Solaqueo	Desalineamiento	9 de setiembre de 2021, 11:09:00	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2021	16 de setiembre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:01:34	9/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	363	CC	Solaqueo	Discontinuidad	9 de setiembre de 2021, 13:41:10	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2021	16 de setiembre de 2021	14 de setiembre de 2021, 11:01:28	9/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	364	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	14 de setiembre de 2021, 16:28:32	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de setiembre de 2021	16 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:08	11/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	365	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	14 de setiembre de 2021, 16:29:37	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de setiembre de 2021	16 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:11	11/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	366	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	14 de setiembre de 2021, 16:31:02	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de setiembre de 2021	16 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:13	11/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	367	CB	Concreto Post-Vaciado	Despostillamiento	14 de setiembre de 2021, 16:39:22	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de setiembre de 2021	16 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:16	11/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	368	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	14 de setiembre de 2021, 16:41:19	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de setiembre de 2021	16 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:19	11/09/2021	SEMANA 36
SET	2021	369	CD	Tabiquería	Desalineamiento	14 de setiembre de 2021, 16:45:10	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de setiembre de 2021	21 de setiembre de 2021	15 de setiembre de 2021, 17:12:21	14/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	370	CD	Tabiquería	Protuberancia	14 de setiembre de 2021, 16:49:32	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de setiembre de 2021	21 de setiembre de 2021	15 de setiembre de 2021, 17:12:27	14/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	371	CD	Tabiquería	Protuberancia	14 de setiembre de 2021, 16:54:15	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de setiembre de 2021	21 de setiembre de 2021	15 de setiembre de 2021, 17:12:34	14/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	372	CD	Tabiquería	Desalineamiento	14 de setiembre de 2021, 16:57:52	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de setiembre de 2021	21 de setiembre de 2021	15 de setiembre de 2021, 17:12:37	14/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	373	CD	Tabiquería	Desalineamiento	14 de setiembre de 2021, 16:59:11	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de setiembre de 2021	21 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021, 07:59:09	14/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	374	CD	Tabiquería	Despostillamiento	14 de setiembre de 2021, 17:13:02	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de setiembre de 2021	21 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021, 07:59:05	14/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	375	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	21 de setiembre de 2021, 15:59:22	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de setiembre de 2021	28 de setiembre de 2021	29 de setiembre de 2021, 09:36:49	21/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	376	CC	Solaqueo	Desalineamiento	21 de setiembre de 2021, 16:01:22	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de setiembre de 2021	28 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021, 08:15:00	21/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	377	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	21 de setiembre de 2021, 16:03:43	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de setiembre de 2021	28 de setiembre de 2021	29 de setiembre de 2021, 09:41:22	21/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	378	CC	Solaqueo	Desalineamiento	21 de setiembre de 2021, 16:07:51	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de setiembre de 2021	28 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021, 08:15:13	21/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	379	CC	Solaqueo	Desalineamiento	21 de setiembre de 2021, 16:11:06	closed	A-05		Error en procedimiento	21 de setiembre de 2021	28 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021, 08:15:21	21/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	380	CC	Solaqueo	Protuberancia	21 de setiembre de 2021, 16:12:39	closed	A-05		Observación común	21 de setiembre de 2021	28 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021, 08:15:28	21/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	381	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	22 de setiembre de 2021, 15:42:11	closed	A-06		Error en procedimiento	18 de setiembre de 2021	23 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:22	18/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	383	CB	Concreto Post-Vaciado	Cangrejera	22 de setiembre de 2021, 15:46:31	closed	A-06		Error en procedimiento	18 de setiembre de 2021	23 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:24	18/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	384	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	22 de setiembre de 2021, 15:48:46	closed	A-06		Error en procedimiento	18 de setiembre de 2021	23 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:29	18/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	385	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	22 de setiembre de 2021, 15:57:32	closed	A-06		Error en procedimiento	18 de setiembre de 2021	23 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:31	18/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	386	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	22 de setiembre de 2021, 16:00:41	closed	A-06		Error en procedimiento	18 de setiembre de 2021	23 de octubre de 2021	7 de octubre de 2021, 14:53:55	18/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	387	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	22 de setiembre de 2021, 16:04:37	closed	A-06		Error en procedimiento	18 de setiembre de 2021	23 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:34	18/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	388	CB	Concreto Post-Vaciado	Discontinuidad	22 de setiembre de 2021, 16:10:19	closed	A-06		Error en procedimiento	18 de setiembre de 2021	23 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 13:21:02	18/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	389	CE	Enchape	Falla de fábrica	21 de setiembre de 2021, 19:00:00	closed	A-03		Error en procedimiento	15 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021, 13:29:09	15/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	390	CE	Enchape	Cajoneo	21 de setiembre de 2021, 19:00:00	closed	A-03		Error en procedimiento	15 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:45	15/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	391	CE	Enchape	Cajoneo	21 de setiembre de 2021, 19:00:00	closed	A-03		Error en procedimiento	15 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:48	15/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	392	CE	Enchape	Mal acabado	21 de setiembre de 2021, 19:00:00	closed	A-03		Error en procedimiento	15 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:51	15/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	393	CE	Enchape	Mal acabado	21 de setiembre de 2021, 19:00:00	closed	A-04		Error en procedimiento	15 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:55	15/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	394	CE	Enchape	Falla en instalación	21 de setiembre de 2021, 19:00:00	closed	A-04		Error en procedimiento	15 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:57:59	15/09/2021	SEMANA 37

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
SET	2021	395	CE	Enchape	Mal acabado	21 de setiembre de 2021, 19:00:00	closed	A-04	[redacted]	Error en procedimiento	15 de setiembre de 2021	27 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:58:03	15/09/2021	SEMANA 37
SET	2021	396	CC	Solaqueo	Desalineamiento	25 de setiembre de 2021, 10:29:15	closed	A-05		Error en procedimiento	25 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021	29 de setiembre de 2021, 09:58:21	25/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	397	CC	Solaqueo	Desalineamiento	25 de setiembre de 2021, 10:30:38	closed	A-05		Error en procedimiento	25 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021	29 de setiembre de 2021, 09:58:40	25/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	398	CC	Solaqueo	Desalineamiento	27 de setiembre de 2021, 15:00:10	closed	A-05		Error en procedimiento	25 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 13:00:56	25/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	399	CC	Solaqueo	Oxido	27 de setiembre de 2021, 15:00:46	closed	A-05		Error en procedimiento	25 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 13:00:51	25/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	400	CC	Solaqueo	Discontinuidad	27 de setiembre de 2021, 15:03:15	closed	A-05		Error en procedimiento	25 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 13:05:47	25/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	401	CC	Solaqueo	Desalineamiento	27 de setiembre de 2021, 15:04:37	closed	A-05		Error en procedimiento	25 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021	7 de octubre de 2021, 13:46:17	25/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	402	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	27 de setiembre de 2021, 15:06:43	closed	A-05		Error en procedimiento	25 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021	7 de octubre de 2021, 13:47:19	25/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	403	CC	Solaqueo	Desalineamiento	27 de setiembre de 2021, 15:07:50	closed	A-05		Error en procedimiento	25 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 13:00:46	25/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	404	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	27 de setiembre de 2021, 15:10:26	closed	A-05		Error en procedimiento	25 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021	7 de octubre de 2021, 13:51:28	25/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	405	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de setiembre de 2021, 15:18:45	closed	A-07		Error en procedimiento	24 de setiembre de 2021	23 de octubre de 2021	7 de octubre de 2021, 14:54:14	24/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	406	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de setiembre de 2021, 15:20:27	closed	A-07		Error en procedimiento	24 de setiembre de 2021	23 de octubre de 2021	7 de octubre de 2021, 14:54:11	24/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	407	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de setiembre de 2021, 15:22:03	closed	A-07		Error en procedimiento	24 de setiembre de 2021	23 de octubre de 2021	7 de octubre de 2021, 14:54:08	24/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	408	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de setiembre de 2021, 15:23:48	closed	A-07		Error en procedimiento	24 de setiembre de 2021	23 de octubre de 2021	7 de octubre de 2021, 14:54:05	24/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	409	CC	Solaqueo	Trabajo Inconcluso	27 de setiembre de 2021, 16:56:58	closed	A-05		Error en procedimiento	25 de setiembre de 2021	2 de octubre de 2021	7 de octubre de 2021, 14:54:01	25/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	411	CE	Enchape	Cajoneo	29 de setiembre de 2021, 16:06:31	closed	A-04		Error en procedimiento	24 de setiembre de 2021	24 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 13:30:48	24/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	412	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	29 de setiembre de 2021, 16:08:35	closed	A-04		Error en procedimiento	24 de setiembre de 2021	24 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 11:58:12	24/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	413	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	29 de setiembre de 2021, 16:10:52	closed	A-04		Error en procedimiento	24 de setiembre de 2021	24 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 13:35:05	24/09/2021	SEMANA 38
SET	2021	414	CE	Enchape	Cajoneo	29 de setiembre de 2021, 16:13:22	closed	A-04		Error en procedimiento	24 de setiembre de 2021	24 de octubre de 2021	2 de octubre de 2021, 13:28:00	24/09/2021	SEMANA 38
OCT	2021	415	CD	Tabiquería	Protuberancia	5 de octubre de 2021, 16:52:53	closed	A-05		Error en procedimiento	5 de octubre de 2021	12 de octubre de 2021	7 de octubre de 2021, 14:55:24	5/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	416	CD	Tabiquería	Protuberancia	5 de octubre de 2021, 16:54:47	closed	A-05		Error en procedimiento	5 de octubre de 2021	12 de octubre de 2021	7 de octubre de 2021, 14:55:21	5/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	417	CD	Tabiquería	Desalineamiento	5 de octubre de 2021, 16:56:46	closed	A-05		Error en procedimiento	5 de octubre de 2021	12 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:41:57	5/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	418	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	9 de octubre de 2021, 13:11:25	closed	A-05		Error en procedimiento	5 de octubre de 2021	2 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:32:19	5/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	419	CE	Enchape	Cajoneo	9 de octubre de 2021, 13:14:31	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de octubre de 2021	12 de noviembre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:41:49	9/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	420	CE	Enchape	Cajoneo	9 de octubre de 2021, 13:16:04	closed	A-05		Error en procedimiento	5 de octubre de 2021	9 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:32:26	5/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	421	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	9 de octubre de 2021, 13:17:35	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de octubre de 2021	6 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:32:32	9/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	422	CE	Enchape	Desprendimiento	9 de octubre de 2021, 13:19:08	closed	A-05		Error en procedimiento	5 de octubre de 2021	9 de noviembre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:40:23	5/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	423	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	9 de octubre de 2021, 13:20:39	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de octubre de 2021	13 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:32:36	9/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	424	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	9 de octubre de 2021, 13:22:18	closed	A-05		Error en procedimiento	5 de octubre de 2021	9 de noviembre de 2021	26 de octubre de 2021, 12:02:58	5/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	425	BC	Estructura	Exudación excesiva del concreto	9 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	E-11		Error en procedimiento	6 de octubre de 2021	11 de octubre de 2021	29 de octubre de 2021, 10:28:31	6/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	426	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	13 de octubre de 2021, 10:38:42	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de octubre de 2021	20 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 12:02:40	9/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	427	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	13 de octubre de 2021, 10:42:32	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de octubre de 2021	20 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:38:54	9/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	428	CC	Solaqueo	Protuberancia	13 de octubre de 2021, 10:55:25	closed	A-05		Observación común	9 de octubre de 2021	20 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 13:19:41	9/10/2021	SEMANA 40
OCT	2021	429	CC	Solaqueo	Desalineamiento	13 de octubre de 2021, 17:13:20	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de octubre de 2021	20 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:38:24	13/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	430	CC	Solaqueo	Desalineamiento	13 de octubre de 2021, 17:14:40	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de octubre de 2021	20 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:38:20	13/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	431	CC	Solaqueo	Cangrejera	13 de octubre de 2021, 17:16:03	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de octubre de 2021	20 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:38:17	13/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	432	CC	Solaqueo	Desalineamiento	14 de octubre de 2021, 16:55:27	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de octubre de 2021	21 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:38:12	14/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	433	CC	Solaqueo	Protuberancia	14 de octubre de 2021, 16:57:33	closed	A-05		Observación común	14 de octubre de 2021	21 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:38:05	14/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	434	CC	Solaqueo	Despostillamiento	14 de octubre de 2021, 17:03:12	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de octubre de 2021	21 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 13:19:29	14/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	435	CD	Tabiquería	Protuberancia	14 de octubre de 2021, 17:06:49	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de octubre de 2021	28 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:39:57	14/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	436	CD	Tabiquería	Protuberancia	14 de octubre de 2021, 17:09:32	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de octubre de 2021	28 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 12:02:23	14/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	437	CD	Tabiquería	Protuberancia	14 de octubre de 2021, 17:13:44	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de octubre de 2021	28 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:39:46	14/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	438	CE	Enchape	Cajoneo	16 de octubre de 2021, 15:15:06	closed	A-05		Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	13 de noviembre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:39:41	16/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	439	CE	Enchape	Cajoneo	16 de octubre de 2021, 15:17:31	closed	A-05		Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	6 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:32:45	16/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	440	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	16 de octubre de 2021, 15:19:32	closed	A-05		Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	5 de noviembre de 2021	26 de octubre de 2021, 12:02:16	16/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	441	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	16 de octubre de 2021, 15:21:10	closed	A-05		Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	6 de noviembre de 2021	26 de octubre de 2021, 12:02:10	16/10/2021	SEMANA 41

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
OCT	2021	442	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	16 de octubre de 2021, 15:22:43	closed	A-05	[redacted]	Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	13 de noviembre de 2021	26 de octubre de 2021, 12:02:05	16/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	443	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 08:19:51	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:02:12	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	444	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 08:22:06	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:02:20	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	445	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 08:30:41	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:02:30	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	446	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 08:31:56	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:02:34	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	447	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 08:34:42	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:02:38	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	448	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 08:37:06	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:02:42	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	449	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 08:49:29	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:02:45	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	450	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 08:51:46	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:02:48	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	451	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 08:56:38	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:02:52	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	452	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 08:59:49	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:02:55	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	453	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:01:41	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:02:59	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	454	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:03:30	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:03:02	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	455	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:05:15	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:03:08	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	456	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:16:59	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:03:10	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	457	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:18:14	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:03:14	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	458	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:19:30	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:03:17	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	459	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:21:26	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:03:23	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	460	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:28:41	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:03:26	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	461	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:29:49	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:03:29	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	462	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:32:22	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	11 de noviembre de 2021, 09:03:33	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	463	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:34:09	closed	A-17		Error en procedimiento	11 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:34:27	11/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	464	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:46:50	closed	A-18		Error en procedimiento	13 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:34:33	13/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	465	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:48:25	closed	A-18		Error en procedimiento	13 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:34:40	13/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	466	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:51:24	closed	A-18		Error en procedimiento	13 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:34:50	13/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	467	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:56:52	closed	A-18		Error en procedimiento	13 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:34:54	13/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	468	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 09:58:13	closed	A-18		Error en procedimiento	13 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:34:58	13/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	469	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:01:02	closed	A-18		Error en procedimiento	14 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:03	14/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	470	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:02:05	closed	A-18		Error en procedimiento	14 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:07	14/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	471	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:06:32	closed	A-18		Error en procedimiento	14 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:11	14/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	472	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:11:35	closed	A-18		Error en procedimiento	14 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:17	14/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	473	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:13:32	closed	A-18		Error en procedimiento	14 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:21	14/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	474	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:18:54	closed	A-18		Error en procedimiento	15 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:26	15/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	475	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:20:38	closed	A-18		Error en procedimiento	15 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:31	15/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	476	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:22:10	closed	A-18		Error en procedimiento	15 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:35	15/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	477	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:23:38	closed	A-18		Error en procedimiento	15 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:39	15/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	478	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:28:30	closed	A-18		Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:43	16/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	479	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:29:34	closed	A-18		Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:47	16/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	480	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:30:28	closed	A-18		Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:51	16/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	481	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 10:31:53	closed	A-18		Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:55	16/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	482	CC	Solaqueo	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 14:00:32	closed	A-05		Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	23 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:37:59	16/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	483	CC	Solaqueo	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 14:04:25	closed	A-05		Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	23 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:37:55	16/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	484	CC	Solaqueo	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 14:16:52	closed	A-05		Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	23 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:37:51	16/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	485	CC	Solaqueo	Protuberancia	18 de octubre de 2021, 14:19:07	closed	A-05		Error en procedimiento	16 de octubre de 2021	23 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:37:43	16/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	486	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 18:25:55	closed	A-18		Error en procedimiento	18 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:35:59	18/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	487	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 18:27:00	closed	A-18		Error en procedimiento	18 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:36:03	18/10/2021	SEMANA 42

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
OCT	2021	488	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 18:28:28	closed	A-18	[redacted]	Error en procedimiento	18 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:36:07	18/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	489	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 18:33:07	closed	A-18		Error en procedimiento	18 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:36:13	18/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	490	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	A-18		Error en procedimiento	19 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:36:18	19/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	491	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	A-18		Error en procedimiento	19 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:36:22	19/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	492	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	18 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	A-18		Error en procedimiento	19 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:36:31	19/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	493	CB	Concreto Post-Vaciado	Ubicación incorrecta	18 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	A-18		Error en procedimiento	19 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:34:15	19/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	494	BB	Estructura	Trabajo inconcluso	18 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	E-11		Error en procedimiento	14 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	29 de octubre de 2021, 10:29:11	14/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	495	BF	Estructura	Ubicación incorrecta	18 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	E-11		Error en lectura de planos	15 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	29 de octubre de 2021, 10:31:18	15/10/2021	SEMANA 41
OCT	2021	496	BB	Estructura	Trabajo inconcluso	18 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	E-11		Error en procedimiento	18 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	29 de octubre de 2021, 10:31:30	18/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	497	BA	Estructura	Dimensión incorrecta	18 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	E-11		Error en procedimiento	19 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	29 de octubre de 2021, 14:01:07	19/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	498	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	21 de octubre de 2021, 10:38:31	closed	A-18		Error en procedimiento	20 de octubre de 2021	7 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:36:39	20/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	499	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	21 de octubre de 2021, 10:40:52	closed	A-18		Error en procedimiento	20 de octubre de 2021	7 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:36:44	20/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	500	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	21 de octubre de 2021, 10:44:20	closed	A-18		Error en procedimiento	20 de octubre de 2021	7 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:36:51	20/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	501	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	21 de octubre de 2021, 10:46:08	closed	A-18		Error en procedimiento	20 de octubre de 2021	7 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:36:56	20/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	502	BA	Estructura	Trabajo inconcluso	21 de octubre de 2021, 19:25:32	closed	E-11		Error en procedimiento	20 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	29 de octubre de 2021, 10:31:55	20/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	503	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	22 de octubre de 2021, 07:57:44	closed	A-18		Error en procedimiento	21 de octubre de 2021	7 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:37:02	21/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	504	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	22 de octubre de 2021, 07:59:04	closed	A-18		Error en procedimiento	21 de octubre de 2021	7 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:37:10	21/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	505	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	22 de octubre de 2021, 08:00:41	closed	A-18		Error en procedimiento	21 de octubre de 2021	7 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:37:15	21/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	506	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	22 de octubre de 2021, 08:08:01	closed	A-18		Error en procedimiento	21 de octubre de 2021	7 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:37:19	21/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	507	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	22 de octubre de 2021, 19:39:44	closed	A-18		Error en procedimiento	22 de octubre de 2021	7 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:34:20	22/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	508	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	22 de octubre de 2021, 19:41:47	closed	A-18		Error en procedimiento	22 de octubre de 2021	7 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:37:31	22/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	509	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	22 de octubre de 2021, 19:42:36	closed	A-18		Error en procedimiento	22 de octubre de 2021	7 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:37:34	22/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	510	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	22 de octubre de 2021, 20:12:55	closed	A-18		Error en procedimiento	22 de octubre de 2021	7 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:37:41	22/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	511	CC	Solaqueo	Desalineamiento	23 de octubre de 2021, 12:08:33	closed	A-06		Error en procedimiento	23 de octubre de 2021	30 de octubre de 2021	28 de octubre de 2021, 17:07:53	23/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	512	CC	Solaqueo	Desalineamiento	23 de octubre de 2021, 12:10:41	closed	A-06		Error en procedimiento	23 de octubre de 2021	30 de octubre de 2021	28 de octubre de 2021, 17:07:48	23/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	513	CD	Tabiquería	Protuberancia	23 de octubre de 2021, 12:14:58	closed	A-05		Error en procedimiento	23 de octubre de 2021	30 de octubre de 2021	26 de octubre de 2021, 11:30:36	23/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	514	CD	Tabiquería	Protuberancia	23 de octubre de 2021, 12:16:51	closed	A-06		Error en procedimiento	23 de octubre de 2021	30 de octubre de 2021	28 de octubre de 2021, 17:07:43	23/10/2021	SEMANA 42
OCT	2021	516	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	26 de octubre de 2021, 13:53:42	closed	A-05		Error en procedimiento	26 de octubre de 2021	23 de noviembre de 2021	28 de octubre de 2021, 17:07:36	26/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	517	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	26 de octubre de 2021, 13:55:26	closed	A-05		Error en procedimiento	26 de octubre de 2021	23 de noviembre de 2021	28 de octubre de 2021, 17:07:32	26/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	518	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	26 de octubre de 2021, 14:12:56	closed	A-05		Error en procedimiento	26 de octubre de 2021	23 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:32:51	26/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	519	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	26 de octubre de 2021, 14:14:52	closed	A-05		Error en procedimiento	26 de octubre de 2021	23 de noviembre de 2021	28 de octubre de 2021, 17:07:14	26/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	520	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 15:36:01	closed	A-18		Error en procedimiento	26 de octubre de 2021	26 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:34:33	26/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	521	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 15:44:58	closed	A-18		Error en procedimiento	26 de octubre de 2021	26 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021, 16:45:02	26/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	522	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 15:53:14	closed	A-18		Error en procedimiento	26 de octubre de 2021	26 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021, 16:45:12	26/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	523	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 22:41:54	closed	A-18		Error en procedimiento	27 de octubre de 2021	27 de noviembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:40:31	27/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	524	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 22:43:59	closed	A-18		Error en procedimiento	27 de octubre de 2021	27 de noviembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:31:31	27/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	525	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 22:46:48	closed	A-18		Error en procedimiento	27 de octubre de 2021	27 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:35:44	27/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	526	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 22:48:16	closed	A-18		Error en procedimiento	27 de octubre de 2021	27 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:36:01	27/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	527	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 22:52:03	closed	A-18		Error en procedimiento	28 de octubre de 2021	28 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:36:11	28/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	528	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 22:53:22	closed	A-18		Error en procedimiento	28 de octubre de 2021	28 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:36:23	28/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	529	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 22:54:40	closed	A-18		Error en procedimiento	28 de octubre de 2021	28 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:36:32	28/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	530	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 22:56:08	closed	A-18		Error en procedimiento	28 de octubre de 2021	28 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:36:41	28/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	531	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 22:57:57	closed	A-18		Error en procedimiento	29 de octubre de 2021	29 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:36:48	29/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	532	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 22:59:06	closed	A-18		Error en procedimiento	29 de octubre de 2021	29 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:36:55	29/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	533	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	30 de octubre de 2021, 23:00:11	closed	A-18		Error en procedimiento	29 de octubre de 2021	29 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:37:06	29/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	534	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	29 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	A-18		Error en procedimiento	25 de octubre de 2021	25 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:37:13	25/10/2021	SEMANA 43

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
OCT	2021	535	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	29 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	A-18	[redacted]	Error en procedimiento	25 de octubre de 2021	25 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:37:20	25/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	536	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	29 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	A-18		Error en procedimiento	25 de octubre de 2021	25 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:37:29	25/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	537	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	29 de octubre de 2021, 19:00:00	closed	A-18		Error en procedimiento	25 de octubre de 2021	25 de noviembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:37:38	25/10/2021	SEMANA 43
OCT	2021	538	BC	Estructura	Falla de slump	1 de noviembre de 2021, 14:25:47	closed	E-12		Error en procedimiento	30 de octubre de 2021	2 de noviembre de 2021	1 de noviembre de 2021, 14:30:58	30/10/2021	SEMANA 43
NOV	2021	539	CE	Enchape	Cajoneo	2 de noviembre de 2021, 14:42:44	closed	A-05		Error en procedimiento	2 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:32:58	2/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	540	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	2 de noviembre de 2021, 14:44:37	closed	A-05		Error en procedimiento	2 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:33:02	2/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	541	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	2 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de noviembre de 2021	2 de diciembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:37:44	2/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	542	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	2 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de noviembre de 2021	2 de diciembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:37:48	2/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	543	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	2 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-18		Observación común	2 de noviembre de 2021	2 de diciembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:37:57	2/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	544	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	2 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-18		Observación común	2 de noviembre de 2021	2 de diciembre de 2021	29 de noviembre de 2021, 09:38:07	2/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	545	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	3 de noviembre de 2021, 10:23:10	closed	A-07		Error en procedimiento	3 de noviembre de 2021	10 de noviembre de 2021	11 de noviembre de 2021, 08:52:14	3/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	546	CD	Tabiquería	Protuberancia	6 de noviembre de 2021, 15:32:35	closed	A-07		Error en procedimiento	6 de noviembre de 2021	20 de noviembre de 2021	10 de noviembre de 2021, 16:42:23	6/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	547	CD	Tabiquería	Protuberancia	6 de noviembre de 2021, 15:35:43	closed	A-07		Error en procedimiento	6 de noviembre de 2021	20 de noviembre de 2021	10 de noviembre de 2021, 16:42:31	6/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	548	CD	Tabiquería	Protuberancia	6 de noviembre de 2021, 15:37:52	closed	A-07		Error en procedimiento	6 de noviembre de 2021	20 de noviembre de 2021	10 de noviembre de 2021, 16:42:59	6/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	549	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	8 de noviembre de 2021, 19:48:33	closed	A-19		Observación común	2 de noviembre de 2021	2 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:40:35	2/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	550	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de noviembre de 2021, 19:51:19	closed	A-19		Error en procedimiento	2 de noviembre de 2021	2 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:40:38	2/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	551	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de noviembre de 2021, 19:52:58	closed	A-19		Error en procedimiento	2 de noviembre de 2021	2 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:40:41	2/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	552	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de noviembre de 2021, 19:57:46	closed	A-19		Error en procedimiento	2 de noviembre de 2021	2 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:40:44	2/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	553	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de noviembre de 2021, 20:01:42	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de noviembre de 2021	3 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:40:47	3/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	554	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de noviembre de 2021, 20:02:53	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de noviembre de 2021	3 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:40:51	3/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	555	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de noviembre de 2021, 20:06:30	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de noviembre de 2021	3 de diciembre de 2021	30 de noviembre de 2021, 16:45:36	3/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	556	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de noviembre de 2021, 20:07:49	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de noviembre de 2021	3 de diciembre de 2021	30 de noviembre de 2021, 16:45:41	3/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	557	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de noviembre de 2021, 20:09:15	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de noviembre de 2021	3 de diciembre de 2021	30 de noviembre de 2021, 16:45:46	3/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	558	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de noviembre de 2021, 20:15:40	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de noviembre de 2021	6 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:40:54	6/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	559	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de noviembre de 2021, 09:10:54	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de noviembre de 2021	6 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:40:58	6/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	560	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de noviembre de 2021, 10:12:45	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de noviembre de 2021	6 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:41:03	6/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	561	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de noviembre de 2021, 10:17:18	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de noviembre de 2021	6 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:41:06	6/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	562	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de noviembre de 2021, 13:54:58	closed	A-19		Error en procedimiento	4 de noviembre de 2021	4 de diciembre de 2021	30 de noviembre de 2021, 16:45:55	4/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	563	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de noviembre de 2021, 13:57:31	closed	A-19		Error en procedimiento	4 de noviembre de 2021	4 de diciembre de 2021	30 de noviembre de 2021, 16:46:00	4/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	564	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de noviembre de 2021, 14:24:21	closed	A-19		Error en procedimiento	4 de noviembre de 2021	4 de diciembre de 2021	30 de noviembre de 2021, 16:46:05	4/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	565	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	9 de noviembre de 2021, 14:27:06	closed	A-19		Error en procedimiento	4 de noviembre de 2021	4 de diciembre de 2021	30 de noviembre de 2021, 16:46:12	4/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	566	CE	Enchape	Falta de Fragua	9 de noviembre de 2021, 14:38:23	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:33:13	9/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	567	CE	Enchape	Falta de Fragua	9 de noviembre de 2021, 14:39:52	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:33:23	9/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	568	CE	Enchape	Rebaba	9 de noviembre de 2021, 14:41:38	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:33:32	9/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	569	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	9 de noviembre de 2021, 14:43:35	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021, 10:33:36	9/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	570	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de noviembre de 2021, 14:44:09	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de noviembre de 2021	5 de diciembre de 2021	30 de noviembre de 2021, 16:46:16	5/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	571	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de noviembre de 2021, 15:13:26	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de noviembre de 2021	5 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:41:13	5/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	572	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de noviembre de 2021, 15:17:03	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de noviembre de 2021	5 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:41:16	5/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	573	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de noviembre de 2021, 15:20:57	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de noviembre de 2021	5 de diciembre de 2021	4 de diciembre de 2021, 09:41:19	5/11/2021	SEMANA 44
NOV	2021	575	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	10 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	8 de noviembre de 2021	8 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:31:36	8/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	576	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de noviembre de 2021	8 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:31:39	8/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	577	CB	Concreto Post-Vaciado	Burbujas	10 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de noviembre de 2021	9 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:31:44	9/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	578	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de noviembre de 2021	9 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:31:51	9/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	579	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de noviembre de 2021	9 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:31:56	9/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	580	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de noviembre de 2021	9 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:31:59	9/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	581	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de noviembre de 2021	9 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:29:16	9/11/2021	SEMANA 45

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
NOV	2021	582	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19	[redacted]	Error en procedimiento	10 de noviembre de 2021	10 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:29:22	10/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	583	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	10 de noviembre de 2021	10 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:29:25	10/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	584	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	10 de noviembre de 2021	10 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:29:29	10/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	585	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de noviembre de 2021	11 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:29:32	11/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	586	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de noviembre de 2021	11 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:29:37	11/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	587	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	12 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	12 de noviembre de 2021	12 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:29:43	12/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	588	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	12 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	12 de noviembre de 2021	12 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:29:46	12/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	589	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	12 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de noviembre de 2021	11 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:29:50	11/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	590	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	13 de noviembre de 2021	13 de diciembre de 2022	29 de diciembre de 2021, 13:54:58	13/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	591	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	13 de noviembre de 2021	13 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:30:09	13/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	592	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	13 de noviembre de 2021	13 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:30:12	13/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	593	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	15 de noviembre de 2021	15 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:30:16	15/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	594	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	15 de noviembre de 2021	15 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:30:19	15/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	595	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	15 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:30:22	15/11/2021	SEMANA 45
NOV	2021	596	CE	Enchape	Cajoneo	17 de noviembre de 2021, 15:12:46	closed	A-05		Error en procedimiento	17 de noviembre de 2021	15 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:30:29	17/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	597	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	17 de noviembre de 2021, 15:15:52	closed	A-05		Error en lectura de planos	17 de noviembre de 2021	22 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:30:35	17/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	598	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	19 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	16 de noviembre de 2021	16 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:30:39	16/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	599	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	19 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	16 de noviembre de 2021	16 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:30:43	16/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	600	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	19 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	16 de noviembre de 2021	16 de diciembre de 2022	22 de diciembre de 2021, 11:30:45	17/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	601	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	19 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	17 de noviembre de 2021	17 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:30:49	17/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	602	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	19 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	17 de noviembre de 2021	17 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:30:52	17/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	603	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	19 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	17 de noviembre de 2021	17 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:30:55	17/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	604	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	19 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	17 de noviembre de 2021	17 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:30:58	17/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	605	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	19 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	18 de noviembre de 2021	18 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:31:03	18/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	606	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	19 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	18 de noviembre de 2021	18 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:31:05	18/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	607	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	19 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	18 de noviembre de 2021	18 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:31:08	18/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	608	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	21 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	20 de noviembre de 2021	20 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:02	20/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	609	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	21 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	20 de noviembre de 2021	20 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:05	20/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	610	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	21 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	20 de noviembre de 2021	20 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:08	20/11/2021	SEMANA 46
NOV	2021	612	BA	Estructura	Dimensión incorrecta	24 de noviembre de 2021, 14:55:06	closed	E-12		Error en procedimiento	24 de noviembre de 2021	27 de noviembre de 2021	27 de diciembre de 2021, 08:21:14	24/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	613	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	22 de noviembre de 2021	22 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:12	24/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	614	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	22 de noviembre de 2021	22 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:15	22/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	615	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	22 de noviembre de 2021	22 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:21	22/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	616	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	23 de noviembre de 2021	23 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:26	23/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	617	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	23 de noviembre de 2021	23 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:30	23/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	618	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	23 de noviembre de 2021	23 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:34	23/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	619	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	24 de noviembre de 2021	24 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:37	24/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	620	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	24 de noviembre de 2021	24 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:40	24/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	621	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	25 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	24 de noviembre de 2021	24 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:46	24/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	622	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	25 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	24 de noviembre de 2021	24 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:53	24/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	623	CE	Enchape	Cajoneo	27 de noviembre de 2021, 09:51:33	closed	A-06		Error en procedimiento	26 de noviembre de 2021	10 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:55:56	26/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	624	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de noviembre de 2021	25 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:56:02	25/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	625	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de noviembre de 2021	25 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:56:14	25/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	626	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de noviembre de 2021	25 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021, 13:56:17	25/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	627	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	26 de noviembre de 2021	26 de diciembre de 2021	7 de enero de 2022, 16:38:41	26/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	628	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	26 de noviembre de 2021	26 de diciembre de 2021	30 de diciembre de 2021, 11:48:27	26/11/2021	SEMANA 47

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
NOV	2021	630	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19	[redacted]	Error en procedimiento	27 de noviembre de 2021	27 de diciembre de 2021	30 de diciembre de 2021, 11:48:30	27/09/2021	SEMANA 47
NOV	2021	631	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	27 de noviembre de 2021	27 de diciembre de 2021	30 de diciembre de 2021, 11:48:33	27/11/2021	SEMANA 47
NOV	2021	632	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	29 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	29 de noviembre de 2021	29 de diciembre de 2021	30 de diciembre de 2021, 11:48:35	29/11/2021	SEMANA 48
NOV	2021	633	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	29 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	29 de noviembre de 2021	29 de diciembre de 2021	30 de diciembre de 2021, 11:48:38	29/11/2021	SEMANA 48
NOV	2021	634	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	29 de noviembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	29 de noviembre de 2021	29 de diciembre de 2021	30 de diciembre de 2021, 11:48:41	29/11/2021	SEMANA 48
NOV	2021	635	CD	Tabiquería	Protuberancia	30 de noviembre de 2021, 15:27:26	closed	A-17		Error en procedimiento	30 de noviembre de 2021	7 de diciembre de 2021	27 de diciembre de 2021, 08:21:44	30/11/2021	SEMANA 48
NOV	2021	636	CD	Tabiquería	Protuberancia	30 de noviembre de 2021, 15:29:03	closed	A-17		Error en procedimiento	30 de noviembre de 2021	7 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:28:46	30/11/2021	SEMANA 48
NOV	2021	637	CD	Tabiquería	Quiñe	30 de noviembre de 2021, 15:30:43	closed	A-17		Error en procedimiento	30 de noviembre de 2021	7 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:28:22	30/11/2021	SEMANA 48
NOV	2021	638	CD	Tabiquería	Desalineamiento	30 de noviembre de 2021, 15:33:22	closed	A-17		Error en procedimiento	30 de noviembre de 2021	7 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021, 11:28:29	30/11/2021	SEMANA 48
DIC	2021	639	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	1 de diciembre de 2021	1 de enero de 2022	30 de diciembre de 2021, 11:48:44	1/12/2021	SEMANA 48
DIC	2021	640	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	1 de diciembre de 2021	1 de enero de 2022	30 de diciembre de 2021, 11:48:47	1/12/2021	SEMANA 48
DIC	2021	641	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	1 de diciembre de 2021	1 de enero de 2022	30 de diciembre de 2021, 11:48:50	1/12/2021	SEMANA 48
DIC	2021	642	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	1 de diciembre de 2021	1 de enero de 2022	30 de diciembre de 2021, 11:48:52	1/12/2021	SEMANA 48
DIC	2021	643	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	1 de diciembre de 2022	1 de enero de 2022	30 de diciembre de 2021, 11:48:55	1/12/2021	SEMANA 48
DIC	2021	644	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	3 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	1 de diciembre de 2021	1 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:38:44	1/12/2021	SEMANA 48
DIC	2021	645	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	2 de diciembre de 2021	2 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:38:46	2/12/2021	SEMANA 48
DIC	2021	646	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	6 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	2 de diciembre de 2021	2 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:38:49	2/12/2021	SEMANA 48
DIC	2021	647	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	2 de diciembre de 2021	2 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:38:52	2/12/2021	SEMANA 47
DIC	2021	648	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de diciembre de 2021	6 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:38:54	6/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	649	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de diciembre de 2021	6 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:38:57	6/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	650	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de diciembre de 2021	6 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:39:00	6/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	651	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de diciembre de 2021	6 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:39:04	6/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	652	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de diciembre de 2021	6 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:39:08	6/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	653	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de diciembre de 2021	6 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:39:11	6/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	654	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de diciembre de 2021	7 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:39:17	7/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	655	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de diciembre de 2021	7 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:39:19	7/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	656	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de diciembre de 2021	7 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:39:22	7/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	657	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	8 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de diciembre de 2021	7 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 16:39:25	7/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	658	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	12 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de diciembre de 2021	9 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:18:52	9/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	659	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	12 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de diciembre de 2021	9 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:18:56	9/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	660	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	12 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de diciembre de 2021	9 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:01	9/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	661	CB	Concreto Post-Vaciado	Burbujas	12 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	10 de diciembre de 2021	10 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:04	10/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	662	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	12 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	10 de diciembre de 2021	10 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:07	10/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	663	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	12 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	10 de diciembre de 2021	10 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:13	10/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	664	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	12 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de diciembre de 2022	11 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:17	11/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	665	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	12 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de diciembre de 2021	11 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:21	11/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	666	CD	Tabiquería	Protuberancia	15 de diciembre de 2021, 08:11:17	closed	A-18		Error en procedimiento	14 de diciembre de 2021	21 de diciembre de 2021	20 de diciembre de 2021, 16:10:30	14/11/2021	SEMANA 50
DIC	2021	667	CE	Enchape	Mancha	15 de diciembre de 2021, 14:31:04	closed	A-02		Error en procedimiento	11 de diciembre de 2021	8 de enero de 2022	27 de diciembre de 2021, 08:20:43	11/12/2021	SEMANA 49
DIC	2021	668	CC	Solaqueo	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 16:15:47	closed	A-17		Error en procedimiento	17 de diciembre de 2021	24 de diciembre de 2021	7 de enero de 2022, 08:20:09	17/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	669	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	20 de diciembre de 2021, 16:21:06	closed	A-17		Error en procedimiento	17 de diciembre de 2021	24 de diciembre de 2021	7 de enero de 2022, 15:40:46	17/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	670	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 16:43:40	closed	A-19		Error en procedimiento	13 de diciembre de 2021	13 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:24	13/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	671	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 16:52:10	closed	A-19		Error en procedimiento	14 de diciembre de 2021	14 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:29	14/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	672	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	20 de diciembre de 2021, 17:01:39	closed	A-19		Observación común	15 de diciembre de 2021	15 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:33	15/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	673	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 17:25:36	closed	A-19		Error en procedimiento	15 de diciembre de 2021	15 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:36	15/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	674	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 18:02:35	closed	A-19		Error en procedimiento	15 de diciembre de 2021	15 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:39	15/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	675	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	21 de diciembre de 2021, 08:38:26	closed	A-19		Error en procedimiento	15 de diciembre de 2021	15 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:42	15/12/2021	SEMANA 50

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
DIC	2021	676	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	21 de diciembre de 2021, 08:54:35	closed	A-19	[redacted]	Error en procedimiento	16 de diciembre de 2021	16 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:46	16/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	677	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	21 de diciembre de 2021, 09:07:55	closed	A-19		Error en procedimiento	16 de diciembre de 2021	16 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:54	16/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	678	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	16 de diciembre de 2021	16 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:19:57	16/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	679	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	16 de diciembre de 2021	16 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:20:02	16/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	680	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	17 de diciembre de 2021	17 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:20:06	17/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	681	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	17 de diciembre de 2021	17 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:20:11	17/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	682	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	17 de diciembre de 2021	17 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:20:15	17/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	683	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	17 de diciembre de 2021	17 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:20:19	17/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	684	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	18 de diciembre de 2021	18 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:20:22	18/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	685	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	18 de diciembre de 2021	18 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:20:26	18/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	686	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	18 de diciembre de 2021	18 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:20:31	18/12/2021	SEMANA 50
DIC	2021	687	CC	Solaqueo	Protuberancia	22 de diciembre de 2021, 14:20:03	closed	A-18		Observación común	21 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021	30 de diciembre de 2021, 11:49:22	21/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	688	CC	Solaqueo	Desalineamiento	22 de diciembre de 2021, 15:11:01	closed	A-18		Error en procedimiento	22 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021	30 de diciembre de 2021, 11:49:28	22/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	689	CC	Solaqueo	Desalineamiento	22 de diciembre de 2021, 15:17:41	closed	A-18		Error en procedimiento	22 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021	30 de diciembre de 2021, 11:49:33	22/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	690	CC	Solaqueo	Protuberancia	22 de diciembre de 2021, 15:19:35	closed	A-18		Observación común	22 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021	30 de diciembre de 2021, 11:49:37	22/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	691	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	26 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	20 de diciembre de 2021	20 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:20:34	20/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	692	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	26 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	20 de diciembre de 2021	20 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:20:37	20/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	693	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	26 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	20 de diciembre de 2021	20 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:20:41	20/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	694	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	26 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	20 de diciembre de 2021	20 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:20:44	20/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	695	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	26 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	21 de diciembre de 2021	21 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:34:03	21/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	696	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	26 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	21 de diciembre de 2021	21 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:34:05	21/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	697	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	26 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	21 de diciembre de 2021	21 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:34:08	21/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	698	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	26 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	21 de diciembre de 2021	21 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:34:10	21/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	699	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	22 de diciembre de 2021	22 de enero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:50	22/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	700	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	22 de diciembre de 2021	22 de enero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:47	22/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	701	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	22 de diciembre de 2021	22 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:34:32	22/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	702	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	22 de diciembre de 2021	22 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:34:37	22/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	703	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	23 de diciembre de 2021	23 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:34:40	23/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	704	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	23 de diciembre de 2021	23 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:34:42	23/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	705	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	23 de diciembre de 2021	23 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:34:45	23/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	706	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	23 de diciembre de 2021	23 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:34:49	23/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	707	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	23 de diciembre de 2021	23 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:34:56	23/12/2021	SEMANA 51
DIC	2021	708	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	27 de diciembre de 2021	27 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:34:59	27/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	709	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	27 de diciembre de 2021	27 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:35:03	27/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	710	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	27 de diciembre de 2021	27 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:35:06	27/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	711	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	27 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	27 de diciembre de 2021	27 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:35:13	27/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	712	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	28 de diciembre de 2021	28 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:35:16	28/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	713	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	28 de diciembre de 2021	28 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:35:21	28/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	714	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	28 de diciembre de 2021	28 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:35:24	28/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	715	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	28 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	28 de diciembre de 2021	28 de enero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:35:26	28/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	716	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	29 de diciembre de 2021	29 de enero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:44	29/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	717	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	29 de diciembre de 2021	29 de enero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:40	29/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	718	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	29 de diciembre de 2021	29 de enero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:38	29/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	719	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	28 de diciembre de 2021, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	29 de diciembre de 2021	29 de enero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:34	29/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	720	CC	Solaqueo	Desalineamiento	30 de diciembre de 2021, 13:35:58	closed	A-18		Error en procedimiento	29 de diciembre de 2021	12 de enero de 2022	30 de diciembre de 2021, 13:50:24	29/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	721	CC	Solaqueo	Protuberancia	30 de diciembre de 2021, 13:40:14	closed	A-18		Observación común	28 de diciembre de 2021	11 de enero de 2022	30 de diciembre de 2021, 13:50:21	28/12/2021	SEMANA 52

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
DIC	2021	722	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	30 de diciembre de 2021, 13:43:04	closed	A-18	[redacted]	Error en procedimiento	29 de diciembre de 2021	12 de enero de 2022	30 de diciembre de 2021, 13:50:16	29/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	723	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	30 de diciembre de 2021, 13:45:25	closed	A-18		Error en procedimiento	28 de diciembre de 2021	11 de enero de 2022	30 de diciembre de 2021, 13:49:54	28/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	724	CC	Solaqueo	Desalineamiento	30 de diciembre de 2021, 14:20:04	closed	A-18		Error en procedimiento	30 de diciembre de 2021	13 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 15:40:20	30/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	725	CC	Solaqueo	Discontinuidad	30 de diciembre de 2021, 14:21:26	closed	A-18		Error en procedimiento	30 de diciembre de 2021	13 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 15:40:15	30/12/2021	SEMANA 52
DIC	2021	726	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	30 de diciembre de 2021, 14:23:11	closed	A-18		Error en procedimiento	30 de diciembre de 2021	6 de enero de 2022	7 de enero de 2022, 15:40:12	30/12/2021	SEMANA 52
ENE	2022	728	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de enero de 2022	3 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:31	3/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	729	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de enero de 2022	3 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:28	3/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	730	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de enero de 2022	3 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:25	3/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	731	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de enero de 2022	3 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:21	3/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	732	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de enero de 2022	3 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:18	3/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	733	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	3 de enero de 2022	3 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:14	3/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	734	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de enero de 2022	3 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:10	3/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	735	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de enero de 2022	3 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:37:06	3/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	736	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	4 de enero de 2022	4 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:59	4/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	737	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	4 de enero de 2022	4 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:54	4/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	738	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	4 de enero de 2022	4 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:50	4/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	739	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de enero de 2022	5 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:46	5/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	740	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de enero de 2022	5 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:44	5/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	741	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	5 de enero de 2022	5 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:41	5/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	742	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de enero de 2022	5 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:36	5/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	743	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	6 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de enero de 2022	6 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:33	6/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	744	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de enero de 2022	6 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:28	6/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	745	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de enero de 2022	6 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:25	6/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	746	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de enero de 2022	6 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:21	6/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	747	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	9 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de enero de 2022	6 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:17	6/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	748	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de enero de 2022	7 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:12	7/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	749	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de enero de 2022	7 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:07	7/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	750	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de enero de 2022	7 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:36:03	7/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	751	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de enero de 2022	7 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:59	7/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	752	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:56	8/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	753	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:53	8/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	754	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:49	8/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	755	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	10 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:45	8/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	756	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	11 de enero de 2022, 17:51:56	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de enero de 2022	22 de enero de 2022	16 de febrero de 2022, 13:52:03	8/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	757	CC	Solaqueo	Protuberancia	11 de enero de 2022, 17:53:20	closed	A-19		Observación común	8 de enero de 2022	22 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:21:12	8/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	758	CC	Solaqueo	Desalineamiento	11 de enero de 2022, 17:54:41	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de enero de 2022	22 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:21:16	8/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	759	CC	Solaqueo	Desalineamiento	11 de enero de 2022, 17:56:06	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de enero de 2022	22 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:21:19	8/01/2022	SEMANA 01
ENE	2022	760	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	10 de enero de 2022	10 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:42	10/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	761	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	10 de enero de 2022	10 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:38	10/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	762	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	10 de enero de 2022	10 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:33	10/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	763	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	10 de enero de 2022	10 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:29	10/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	764	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de enero de 2022	11 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:25	11/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	765	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de enero de 2022	11 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:20	11/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	766	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de enero de 2022	11 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:17	11/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	767	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de enero de 2022	11 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:12	11/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	768	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	13 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	12 de enero de 2022	12 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:34:39	12/01/2022	SEMANA 02

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
ENE	2022	769	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	13 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19	[redacted]	Error en procedimiento	12 de enero de 2022	12 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:34:44	12/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	770	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	13 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	12 de enero de 2022	12 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:34:47	12/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	771	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	13 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	12 de enero de 2022	12 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:34:50	12/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	772	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	13 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	12 de enero de 2022	12 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:34:54	12/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	773	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	13 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	13 de enero de 2022	13 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:34:57	13/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	774	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	13 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	13 de enero de 2022	13 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:04	13/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	775	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	13 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	13 de enero de 2022	13 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:35:06	13/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	776	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	13 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	13 de enero de 2022	13 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:38:35	13/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	777	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	14 de enero de 2022	14 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:38:38	14/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	778	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	14 de enero de 2022	14 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:38:41	14/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	779	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	14 de enero de 2022	14 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:38:45	14/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	780	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	14 de enero de 2022	14 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:38:50	14/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	781	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	16 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	15 de enero de 2022	15 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:38:53	15/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	782	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	16 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	15 de enero de 2022	15 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:38:56	15/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	783	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	17 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	15 de enero de 2022	15 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:38:59	15/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	784	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	17 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	15 de enero de 2022	15 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:39:02	15/01/2022	SEMANA 02
ENE	2022	785	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	17 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	17 de enero de 2022	17 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:39:05	17/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	786	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	17 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	17 de enero de 2022	17 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:39:08	17/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	787	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	17 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	17 de enero de 2022	17 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:45:33	17/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	788	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	18 de enero de 2022	18 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:00	17/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	789	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	18 de enero de 2022	18 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:03	18/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	790	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	18 de enero de 2022	18 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:05	18/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	791	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	18 de enero de 2022	18 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:09	18/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	792	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	18 de enero de 2022	18 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:12	18/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	793	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	19 de enero de 2022	19 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:17	18/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	794	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	19 de enero de 2022	19 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:20	19/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	795	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	19 de enero de 2022	19 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:24	19/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	796	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	19 de enero de 2022	19 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:26	19/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	797	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	20 de enero de 2022	20 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:29	19/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	798	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	20 de enero de 2022	20 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:32	20/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	799	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	20 de enero de 2022	20 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:35	20/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	800	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	20 de enero de 2022	20 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:39	20/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	801	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	20 de enero de 2022	20 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:41	20/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	802	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	21 de enero de 2022	21 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:47	20/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	803	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	21 de enero de 2022	21 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:50	21/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	804	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	24 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	22 de enero de 2022	22 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:52	21/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	805	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	22 de enero de 2022	22 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:55	22/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	806	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	24 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	22 de enero de 2022	22 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:28:58	22/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	807	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	22 de enero de 2022	22 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:02	22/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	808	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	24 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	22 de enero de 2022	22 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:05	22/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	809	CD	Tabiquería	Protuberancia	25 de enero de 2022, 16:40:10	closed	A-19		Error en procedimiento	24 de enero de 2022	31 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:29:45	22/01/2022	SEMANA 03
ENE	2022	810	CD	Tabiquería	Protuberancia	25 de enero de 2022, 16:42:47	closed	A-19		Error en procedimiento	24 de enero de 2022	31 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:29:50	24/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	811	CD	Tabiquería	Protuberancia	25 de enero de 2022, 16:45:34	closed	A-19		Error en procedimiento	24 de enero de 2022	31 de enero de 2022	26 de enero de 2022, 10:29:53	24/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	812	CC	Solaqueo	Protuberancia	25 de enero de 2022, 16:58:55	closed	A-19		Observación común	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:36:06	24/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	813	CC	Solaqueo	Protuberancia	25 de enero de 2022, 17:00:44	closed	A-19		Observación común	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:36:10	24/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	814	CC	Solaqueo	Protuberancia	25 de enero de 2022, 17:02:55	closed	A-19		Observación común	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:36:13	24/01/2022	SEMANA 04

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
ENE	2022	815	CC	Solaqueo	Protuberancia	25 de enero de 2022, 17:05:10	closed	A-19	[redacted]	Observación común	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:36:22	24/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	816	CC	Solaqueo	Protuberancia	25 de enero de 2022, 17:08:56	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:36:26	24/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	817	CC	Solaqueo	Protuberancia	25 de enero de 2022, 17:11:36	closed	A-19		Observación común	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:36:28	24/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	818	CC	Solaqueo	Protuberancia	25 de enero de 2022, 17:12:47	closed	A-19		Observación común	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:36:32	24/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	819	CC	Solaqueo	Protuberancia	25 de enero de 2022, 17:15:02	closed	A-19		Observación común	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:36:35	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	820	CC	Solaqueo	Protuberancia	25 de enero de 2022, 17:17:18	closed	A-19		Observación común	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:36:39	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	821	CC	Solaqueo	Desalineamiento	25 de enero de 2022, 17:20:49	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:36:42	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	822	CC	Solaqueo	Protuberancia	25 de enero de 2022, 17:25:51	closed	A-19		Observación común	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:36:46	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	823	CD	Solaqueo	Desalineamiento	25 de enero de 2022, 17:34:37	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	1 de febrero de 2022, 16:36:49	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	824	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	25 de enero de 2022, 17:38:30	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de enero de 2022	8 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:46:45	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	825	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	24 de enero de 2022	24 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:07	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	826	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	24 de enero de 2022	24 de febrero de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:03	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	827	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	24 de enero de 2022	24 de febrero de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:06	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	828	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	24 de enero de 2022	24 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:20	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	829	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	24 de enero de 2022	24 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:23	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	830	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	24 de enero de 2022	24 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:26	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	831	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de enero de 2022	25 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:28	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	832	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de enero de 2022	25 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:31	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	833	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de enero de 2022	25 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:34	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	834	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de enero de 2022	25 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:38	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	835	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de enero de 2022	25 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:41	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	836	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	26 de enero de 2022	26 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:45	25/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	837	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	26 de enero de 2022	26 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:47	26/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	838	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	26 de enero de 2022	26 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:50	26/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	839	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	26 de enero de 2022	26 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:53	26/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	840	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	26 de enero de 2022	26 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:29:57	26/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	841	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	27 de enero de 2022	27 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:00	26/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	842	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	27 de enero de 2022	27 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:05	27/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	843	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	27 de enero de 2022	27 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:08	27/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	844	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	27 de enero de 2022	27 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:13	27/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	845	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	27 de enero de 2022	27 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:17	27/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	846	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	27 de enero de 2022	27 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:22	27/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	847	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	28 de enero de 2022	28 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:27	27/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	848	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	28 de enero de 2022	28 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:30	28/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	849	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	28 de enero de 2022	28 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:35	28/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	850	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	28 de enero de 2022	28 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:39	28/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	851	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Error en procedimiento	28 de enero de 2022	28 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:43	28/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	852	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	31 de enero de 2022, 19:00:00	closed	A-19		Observación común	28 de enero de 2022	28 de febrero de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:46	28/01/2022	SEMANA 04
ENE	2022	853	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	7 de febrero de 2022, 11:17:54	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de febrero de 2022	10 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:45:53	28/01/2022	SEMANA 04
FEB	2022	854	CC	Solaqueo	Desalineamiento	7 de febrero de 2022, 11:20:36	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de febrero de 2022	10 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:45:56	3/02/2022	SEMANA 05
FEB	2022	855	CC	Solaqueo	Protuberancia	7 de febrero de 2022, 11:22:49	closed	A-19		Observación común	3 de febrero de 2022	10 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:45:59	3/02/2022	SEMANA 05
FEB	2022	856	CC	Solaqueo	Desalineamiento	7 de febrero de 2022, 11:27:19	closed	A-19		Error en procedimiento	3 de febrero de 2022	10 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:46:02	3/02/2022	SEMANA 05
FEB	2022	857	CC	Solaqueo	Protuberancia	7 de febrero de 2022, 11:29:57	closed	A-19		Observación común	7 de febrero de 2022	14 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:46:04	3/02/2022	SEMANA 05
FEB	2022	858	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	7 de febrero de 2022, 11:33:39	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de febrero de 2022	14 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:46:07	3/02/2022	SEMANA 05
FEB	2022	859	CC	Solaqueo	Desalineamiento	7 de febrero de 2022, 11:41:29	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de febrero de 2022	14 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:46:11	3/02/2022	SEMANA 05
FEB	2022	860	CC	Solaqueo	Desalineamiento	7 de febrero de 2022, 11:42:46	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de febrero de 2022	14 de febrero de 2022	18 de febrero de 2022, 11:46:14	3/02/2022	SEMANA 05

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
FEB	2022	861	CE	Enchape	Cajoneo	12 de febrero de 2022, 08:28:58	closed	A-17	[redacted]	Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	4 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:48	3/02/2022	SEMANA 05
FEB	2022	862	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	12 de febrero de 2022, 08:30:21	closed	A-17		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	4 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:51	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	863	CE	Enchape	Cajoneo	12 de febrero de 2022, 08:31:30	closed	A-18		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	4 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:54	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	864	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	12 de febrero de 2022, 08:32:23	closed	A-18		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	4 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:30:59	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	865	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	11 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Observación común	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:08	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	866	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:11	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	867	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:16	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	868	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:18	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	869	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:22	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	870	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	11 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:24	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	871	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:27	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	872	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:31	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	873	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Observación común	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:33	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	874	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:36	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	875	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Observación común	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:38	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	876	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Observación común	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:41	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	877	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:44	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	878	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:47	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	879	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Observación común	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:50	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	880	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Observación común	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:53	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	881	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Observación común	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:55	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	882	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Observación común	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:29:59	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	883	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Observación común	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:02	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	884	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:06	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	885	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:08	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	886	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:13	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	887	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:16	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	888	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:19	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	889	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Observación común	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:22	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	890	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:25	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	891	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Observación común	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:29	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	892	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:31	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	893	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Observación común	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:38	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	894	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:40	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	895	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	15 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-20		Error en procedimiento	10 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:46	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	897	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-21		Error en procedimiento	17 de febrero de 2022	20 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:50	10/02/2022	SEMANA 06
FEB	2022	898	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-21		Error en procedimiento	17 de febrero de 2022	20 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:54	17/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	899	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	20 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-21		Observación común	17 de febrero de 2022	20 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:30:59	17/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	900	CB	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia	20 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-21		Observación común	17 de febrero de 2022	20 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:31:02	17/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	901	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-21		Observación común	17 de febrero de 2022	20 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:31:07	17/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	902	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-21		Error en procedimiento	17 de febrero de 2022	20 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:31:10	17/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	903	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-21		Observación común	17 de febrero de 2022	20 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:31:13	17/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	904	CB	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	20 de febrero de 2022, 19:00:00	closed	A-21		Error en procedimiento	17 de febrero de 2022	20 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:31:16	17/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	905	CC	Solaqueo	Protuberancia	23 de febrero de 2022, 13:50:46	closed	A-19		Error en procedimiento	19 de febrero de 2022	12 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:32:22	17/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	906	CC	Solaqueo	Desalineamiento	23 de febrero de 2022, 13:52:22	closed	A-19		Error en procedimiento	19 de febrero de 2022	12 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:31:41	18/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	907	CC	Solaqueo	Desalineamiento	23 de febrero de 2022, 13:55:30	closed	A-19		Error en procedimiento	19 de febrero de 2022	19 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:31:19	18/02/2022	SEMANA 07

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
FEB	2022	908	CC	Solaqueo	Protuberancia	23 de febrero de 2022, 14:00:31	closed	A-19	[redacted]	Error en procedimiento	18 de febrero de 2022	11 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:31:35	18/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	909	CC	Solaqueo	Desalineamiento	23 de febrero de 2022, 14:47:13	closed	A-19		Error en procedimiento	18 de febrero de 2022	18 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:31:25	19/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	910	CC	Solaqueo	Desalineamiento	23 de febrero de 2022, 14:50:03	closed	A-19		Error en procedimiento	18 de febrero de 2022	11 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:31:31	19/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	911	CC	Solaqueo	Protuberancia	23 de febrero de 2022, 14:51:46	closed	A-19		Error en procedimiento	23 de febrero de 2022	23 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:31:28	19/02/2022	SEMANA 07
FEB	2022	912	CC	Solaqueo	Desalineamiento	23 de febrero de 2022, 14:55:07	closed	A-19		Error en procedimiento	23 de febrero de 2022	23 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:31:23	23/02/2022	SEMANA 08
FEB	2022	913	CD	Tabiquería	Desalineamiento	23 de febrero de 2022, 16:34:26	closed	A-19		Error en procedimiento	17 de febrero de 2022	10 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:31:18	23/02/2022	SEMANA 08
FEB	2022	914	CC	Solaqueo	Protuberancia	1 de marzo de 2022, 08:26:30	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de febrero de 2022	18 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:31:14	25/02/2022	SEMANA 08
FEB	2022	915	CC	Solaqueo	Protuberancia	1 de marzo de 2022, 08:28:22	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de febrero de 2022	18 de marzo de 2022	7 de marzo de 2022, 14:31:11	25/02/2022	SEMANA 08
FEB	2022	916	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	1 de marzo de 2022, 08:34:42	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de febrero de 2022	22 de abril de 2022	26 de marzo de 2022, 09:17:38	25/02/2022	SEMANA 08
FEB	2022	917	CE	Enchape	Cajoneo	1 de marzo de 2022, 08:36:46	closed	A-19		Error en procedimiento	25 de febrero de 2022	25 de marzo de 2022	26 de marzo de 2022, 09:17:31	25/02/2022	SEMANA 08
MAR	2022	918	CD	Tabiquería	Protuberancia	9 de marzo de 2022, 13:38:55	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de marzo de 2022	26 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:31:31	5/03/2022	SEMANA 09
MAR	2022	919	CD	Tabiquería	Fisura	9 de marzo de 2022, 13:44:33	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de marzo de 2022	26 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:31:34	5/03/2022	SEMANA 09
MAR	2022	920	CC	Solaqueo	Desalineamiento	9 de marzo de 2022, 13:52:51	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de marzo de 2022	19 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:31:37	5/03/2022	SEMANA 09
MAR	2022	921	CC	Solaqueo	Desalineamiento	9 de marzo de 2022, 13:55:29	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de marzo de 2022	19 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:31:40	5/03/2022	SEMANA 09
MAR	2022	922	CC	Solaqueo	Desalineamiento	9 de marzo de 2022, 13:57:12	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de marzo de 2022	19 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:31:44	5/03/2022	SEMANA 09
MAR	2022	923	BF	Prueba Final de Agua	Obstrucción	15 de marzo de 2022, 17:21:05	closed	A-03		Fallas de material	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:31:38	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	924	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de marzo de 2022, 17:28:57	closed	A-03		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:31:38	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	925	CE	Enchape	Falta de Fragua	15 de marzo de 2022, 17:30:13	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	7 de abril de 2022	16 de marzo de 2022, 11:32:17	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	926	CE	Enchape	Falta de Fragua	15 de marzo de 2022, 17:31:20	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	8 de abril de 2022	16 de marzo de 2022, 11:32:20	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	927	CE	Enchape	Falta de Fragua	15 de marzo de 2022, 17:33:27	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	8 de abril de 2022	16 de marzo de 2022, 11:32:27	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	928	BF	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso	15 de marzo de 2022, 17:33:59	closed	A-03		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:31:38	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	929	CD	Tabiquería	Protuberancia	15 de marzo de 2022, 17:37:13	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	25 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:32:35	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	930	CC	Solaqueo	Desalineamiento	15 de marzo de 2022, 17:40:47	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	25 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:32:39	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	931	BF	Prueba Final de Agua	Obstrucción	15 de marzo de 2022, 17:41:44	closed	A-03		Fallas de material	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:31:21	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	932	CC	Solaqueo	Protuberancia	15 de marzo de 2022, 17:42:07	closed	A-19		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	25 de marzo de 2022	16 de marzo de 2022, 11:32:50	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	933	BF	Prueba Final de Agua	Obstrucción	15 de marzo de 2022, 17:48:00	closed	A-04		Fallas de material	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:31:09	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	934	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de marzo de 2022, 17:55:51	closed	A-04		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:31:06	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	935	BF	Prueba Final de Agua	Obstrucción	15 de marzo de 2022, 18:01:20	closed	A-04		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:31:02	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	936	BF	Prueba Final de Agua	Obstrucción	15 de marzo de 2022, 19:00:25	closed	A-04		Fallas de material	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:59	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	937	BF	Prueba Final de Agua	Obstrucción	15 de marzo de 2022, 19:05:27	closed	A-04		Fallas de material	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:57	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	938	BF	Prueba Final de Agua	Obstrucción	15 de marzo de 2022, 19:14:20	closed	A-04		Fallas de material	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:54	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	939	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de marzo de 2022, 19:19:00	closed	A-04		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:52	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	940	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de marzo de 2022, 19:23:09	closed	A-04		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:50	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	941	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de marzo de 2022, 19:30:08	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:47	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	942	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de marzo de 2022, 19:32:21	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:45	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	943	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 08:08:36	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:42	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	944	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 08:10:39	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:39	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	945	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 11:19:25	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:37	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	946	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 11:21:29	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:33	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	947	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 11:24:35	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:26	11/03/2022	SEMANA 10
MAR	2022	948	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 11:27:45	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:24	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	949	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 11:29:52	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:21	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	950	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 11:33:19	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:17	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	951	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 11:39:07	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:13	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	952	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 11:44:55	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:08	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	953	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 11:48:50	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:04	14/03/2022	SEMANA 11

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
MAR	2022	954	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 11:51:02	closed	A-05	[redacted]	Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:30:00	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	955	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 11:56:20	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:57	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	956	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 11:58:57	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:54	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	957	BF	Prueba Final de Agua	Obstrucción	16 de marzo de 2022, 13:31:47	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:52	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	958	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 13:49:36	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:49	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	959	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 14:22:37	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:47	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	960	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 14:31:42	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:43	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	961	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 14:35:43	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:41	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	962	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 14:40:02	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:38	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	963	BF	Prueba Final de Agua	Obstrucción	16 de marzo de 2022, 14:42:11	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:35	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	964	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 14:47:50	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:32	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	965	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 14:49:57	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:27	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	966	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 14:55:29	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:25	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	967	BF	Prueba Final de Agua	Obstrucción	16 de marzo de 2022, 17:10:23	closed	A-05		Fallas de material	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:22	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	968	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 17:18:25	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:20	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	969	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 17:23:49	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:16	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	970	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 17:38:56	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:13	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	971	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 17:41:28	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:10	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	972	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 17:45:07	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:06	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	973	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 17:50:28	closed	A-05		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:29:03	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	978	BF	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso	16 de marzo de 2022, 18:15:45	closed	A-07		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:28:38	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	979	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	16 de marzo de 2022, 18:24:05	closed	A-07		Error en procedimiento	14 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022	28 de marzo de 2022, 11:28:34	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	980	CE	Enchape	Trabajo Inconcluso	29 de marzo de 2022, 14:49:38	closed	A-19		Error en procedimiento	26 de marzo de 2022	9 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:01:31	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	981	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	29 de marzo de 2022, 14:53:11	closed	A-19		Error en procedimiento	26 de marzo de 2022	9 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:01:28	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	982	CC	Solaqueo	Protuberancia	6 de abril de 2022, 11:19:49	closed	A-19		Error en procedimiento	1 de abril de 2022	8 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:01:26	14/03/2022	SEMANA 11
MAR	2022	983	CC	Solaqueo	Protuberancia	6 de abril de 2022, 11:22:43	closed	A-19		Error en procedimiento	1 de abril de 2022	8 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:01:23	14/03/2022	SEMANA 11
ABR	2022	984	CC	Solaqueo	Protuberancia	6 de abril de 2022, 11:25:47	closed	A-19		Error en procedimiento	1 de abril de 2022	8 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:01:20	26/03/2022	SEMANA 12
MAR	2022	985	CC	Solaqueo	Protuberancia	6 de abril de 2022, 11:27:29	closed	A-19		Error en procedimiento	1 de abril de 2022	8 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:01:17	26/03/2022	SEMANA 12
ABR	2022	986	CC	Solaqueo	Despostillamiento	6 de abril de 2022, 11:37:42	closed	A-20		Error en procedimiento	2 de abril de 2022	9 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:01:14	1/04/2022	SEMANA 13
ABR	2022	987	CC	Solaqueo	Protuberancia	6 de abril de 2022, 11:39:00	closed	A-20		Error en procedimiento	2 de abril de 2022	9 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:01:10	1/04/2022	SEMANA 13
ABR	2022	988	CC	Solaqueo	Trabajo inconcluso	6 de abril de 2022, 11:41:03	closed	A-20		Error en procedimiento	2 de abril de 2022	9 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:01:08	1/04/2022	SEMANA 13
ABR	2022	989	CC	Solaqueo	Protuberancia	6 de abril de 2022, 11:42:38	closed	A-20		Error en procedimiento	2 de abril de 2022	9 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:01:06	1/04/2022	SEMANA 13
ABR	2022	990	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	7 de abril de 2022, 08:36:15	closed	A-19		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:01:03	2/04/2022	SEMANA 13
ABR	2022	991	CE	Enchape	Cajoneo	7 de abril de 2022, 08:37:30	closed	A-19		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022, 12:12:48	2/04/2022	SEMANA 13
ABR	2022	992	CE	Enchape	Cajoneo	7 de abril de 2022, 08:39:04	closed	A-19		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022, 12:12:44	2/04/2022	SEMANA 13
ABR	2022	993	CD	Tabiquería	Desalineamiento	9 de abril de 2022, 09:49:26	closed	A-20		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	16 de abril de 2022	9 de abril de 2022, 09:58:08	2/04/2022	SEMANA 13
ABR	2022	994	CD	Tabiquería	Quiñe	9 de abril de 2022, 09:50:51	closed	A-20		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	16 de abril de 2022	9 de abril de 2022, 09:58:05	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	995	CD	Tabiquería	Quiñe	9 de abril de 2022, 09:51:53	closed	A-21		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	16 de abril de 2022	9 de abril de 2022, 09:58:01	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	992	CE	Enchape	Cajoneo	7 de abril de 2022, 08:39:04	closed	A-19		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022, 12:12:44	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	997	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de abril de 2022, 08:42:28	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022, 16:28:27	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	998	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de abril de 2022, 08:45:43	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022, 16:28:24	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	999	CE	Revisión UI	Despegue	13 de abril de 2022, 08:53:05	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022, 16:28:22	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1000	CE	Revisión UI	Fisura	13 de abril de 2022, 08:56:41	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022, 16:28:19	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1001	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	13 de abril de 2022, 09:00:31	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022, 16:28:17	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1002	CE	Revisión UI	Error de corte	13 de abril de 2022, 09:06:39	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022, 16:28:13	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1003	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de abril de 2022, 09:11:41	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022, 16:28:07	4/04/2022	SEMANA 14

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
ABR	2022	1004	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	13 de abril de 2022, 09:14:11	closed	A-03	[redacted]	Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022, 16:28:04	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1005	CE	Revisión UI	Despegue	13 de abril de 2022, 09:19:09	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:00:58	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1006	CE	Revisión UI	Fisura	13 de abril de 2022, 09:22:45	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:00:55	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1007	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de abril de 2022, 09:26:05	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:00:53	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1008	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de abril de 2022, 09:40:13	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:00:50	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1009	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de abril de 2022, 09:42:48	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:00:47	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1010	CE	Revisión UI	Fisura	13 de abril de 2022, 09:45:06	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:49	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1011	CE	Revisión UI	Fisura	13 de abril de 2022, 09:58:40	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:46	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1012	CE	Revisión UI	Fisura	13 de abril de 2022, 10:01:01	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:43	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1013	CE	Revisión UI	Fisura	13 de abril de 2022, 10:02:37	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:40	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1014	CE	Revisión UI	Fisura	13 de abril de 2022, 10:04:42	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:38	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1015	CE	Revisión UI	Error de corte	13 de abril de 2022, 10:09:51	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:35	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1016	CE	Revisión UI	Dilatación	13 de abril de 2022, 10:14:59	closed	A-03		Error en procedimiento	4 de abril de 2022	18 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:33	4/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1017	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de abril de 2022, 10:40:13	closed	A-04		Error en procedimiento	5 de abril de 2022	19 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:30	5/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1018	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de abril de 2022, 10:43:23	closed	A-04		Error en procedimiento	5 de abril de 2022	19 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:27	5/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1019	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de abril de 2022, 10:48:38	closed	A-04		Error en procedimiento	5 de abril de 2022	19 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:25	5/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1020	CE	Revisión UI	Dilatación	13 de abril de 2022, 11:03:19	closed	A-04		Error en procedimiento	5 de abril de 2022	19 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:21	5/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1021	CE	Revisión UI	Dilatación	13 de abril de 2022, 11:11:39	closed	A-04		Error en procedimiento	5 de abril de 2022	19 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:19	5/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1022	CE	Revisión UI	Fisura	13 de abril de 2022, 11:15:49	closed	A-04		Error en procedimiento	5 de abril de 2022	19 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:16	5/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1023	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de abril de 2022, 11:17:21	closed	A-04		Error en procedimiento	5 de abril de 2022	19 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:13	5/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1024	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de abril de 2022, 11:20:27	closed	A-04		Error en procedimiento	5 de abril de 2022	19 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:59:08	5/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1025	CE	Revisión UI	Despegue	13 de abril de 2022, 11:24:16	closed	A-04		Error en procedimiento	5 de abril de 2022	19 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:55:40	5/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1026	CE	Revisión UI	Mancha	13 de abril de 2022, 11:27:14	closed	A-04		Error en procedimiento	5 de abril de 2022	19 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:55:36	5/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1027	CE	Revisión UI	Mancha	13 de abril de 2022, 11:47:42	closed	A-04		Error en procedimiento	5 de abril de 2022	19 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:55:32	5/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1028	CE	Revisión UI	Despegue	13 de abril de 2022, 11:50:25	closed	A-04		Error en procedimiento	5 de abril de 2022	19 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:55:29	5/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1029	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	13 de abril de 2022, 11:55:11	closed	A-04		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:55:25	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1030	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de abril de 2022, 13:25:53	closed	A-04		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:55:22	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1031	CE	Revisión UI	Mancha	13 de abril de 2022, 13:29:02	closed	A-04		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:55:18	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1032	CE	Revisión UI	Mancha	13 de abril de 2022, 13:33:57	closed	A-04		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:59	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1033	CE	Revisión UI	Mancha	13 de abril de 2022, 13:36:52	closed	A-04		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:56	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1034	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de abril de 2022, 15:40:43	closed	A-04		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:52	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1035	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de abril de 2022, 15:46:22	closed	A-04		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:49	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1036	CE	Revisión UI	Falla en instalación	13 de abril de 2022, 16:02:39	closed	A-04		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:47	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1037	CE	Revisión UI	Error de corte	13 de abril de 2022, 16:07:10	closed	A-04		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:45	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1038	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de abril de 2022, 16:11:42	closed	A-04		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:41	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1039	CE	Revisión UI	Falla en instalación	13 de abril de 2022, 16:15:15	closed	A-04		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:39	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1072	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 15:02:01	closed	A-04		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:04:13	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1074	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 15:10:42	closed	A-05		Error en procedimiento	6 de abril de 2022	20 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:04:08	6/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1040	CE	Revisión UI	Despegue	13 de abril de 2022, 16:46:57	closed	A-04		Error en procedimiento	7 de abril de 2022	21 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:37	7/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1041	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	13 de abril de 2022, 16:53:35	closed	A-04		Error en procedimiento	7 de abril de 2022	21 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:32	7/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1042	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	19 de abril de 2022, 09:16:12	closed	A-04		Error en procedimiento	7 de abril de 2022	21 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:15	7/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1043	CE	Revisión UI	Ubicación incorrecta	19 de abril de 2022, 09:25:19	closed	A-04		Error en procedimiento	7 de abril de 2022	21 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:12	7/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1044	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 09:29:30	closed	A-04		Error en procedimiento	7 de abril de 2022	21 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:09	7/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1045	CE	Revisión UI	Falla en instalación	19 de abril de 2022, 09:31:39	closed	A-04		Error en procedimiento	7 de abril de 2022	21 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:05	7/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1046	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 09:44:15	closed	A-04		Error en procedimiento	7 de abril de 2022	21 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:16:01	7/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1047	CE	Revisión UI	Quiñe	19 de abril de 2022, 09:47:29	closed	A-04		Error en procedimiento	7 de abril de 2022	21 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:58	7/04/2022	SEMANA 14

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
ABR	2022	1048	CE	Revisión UI	Quiñe	19 de abril de 2022, 09:51:12	closed	A-04	[redacted]	Error en procedimiento	7 de abril de 2022	21 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:55	7/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1049	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 09:52:35	closed	A-04		Error en procedimiento	7 de abril de 2022	21 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:17:41	7/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1073	CE	Revisión UI	Quiñe	19 de abril de 2022, 15:06:35	closed	A-04		Error en procedimiento	7 de abril de 2022	21 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:04:11	7/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	996	CE	Enchape	Quiñe	13 de abril de 2022, 08:35:54	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	15 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:01:01	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1050	CE	Revisión UI	Dilatación	19 de abril de 2022, 10:01:21	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:17:38	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1051	CE	Revisión UI	Rayadura	19 de abril de 2022, 10:07:39	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:17:35	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1052	CE	Revisión UI	Quiñe	19 de abril de 2022, 10:12:51	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:17:33	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1053	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 10:19:52	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:17:30	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1054	CE	Revisión UI	Despegue	19 de abril de 2022, 10:46:07	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:16:14	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1055	CE	Revisión UI	Mal acabado	19 de abril de 2022, 10:53:03	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:16:11	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1056	CE	Revisión UI	Quiñe	19 de abril de 2022, 10:56:48	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:16:08	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1057	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 10:59:24	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:16:05	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1058	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 11:02:04	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:16:02	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1059	CE	Revisión UI	Falla en instalación	19 de abril de 2022, 11:04:32	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:15:59	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1060	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 11:06:22	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:15:57	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1075	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 15:33:05	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:04:05	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1076	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	19 de abril de 2022, 15:40:01	closed	A-05		Error en procedimiento	8 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:04:03	8/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	993	CD	Tabiquería	Desalineamiento	9 de abril de 2022, 09:49:26	closed	A-20		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	16 de abril de 2022	9 de abril de 2022, 09:58:08	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	994	CD	Tabiquería	Quiñe	9 de abril de 2022, 09:50:51	closed	A-20		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	16 de abril de 2022	9 de abril de 2022, 09:58:05	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	995	CD	Tabiquería	Quiñe	9 de abril de 2022, 09:51:53	closed	A-21		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	16 de abril de 2022	9 de abril de 2022, 09:58:01	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1061	CE	Revisión UI	Quiñe	19 de abril de 2022, 11:10:01	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:15:54	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1062	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 11:16:24	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:15:52	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1063	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	19 de abril de 2022, 11:18:42	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:15:49	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1064	CE	Revisión UI	Quiñe	19 de abril de 2022, 11:24:15	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:15:44	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1065	CE	Revisión UI	Quiñe	19 de abril de 2022, 11:27:19	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:08:31	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1066	CE	Revisión UI	Mal acabado	19 de abril de 2022, 11:27:52	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:08:29	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1067	CE	Revisión UI	Quiñe	19 de abril de 2022, 11:31:00	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:08:26	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1068	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	19 de abril de 2022, 11:32:41	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:08:24	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1069	CE	Revisión UI	Falla en instalación	19 de abril de 2022, 11:34:44	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:04:21	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1070	CE	Revisión UI	Quiñe	19 de abril de 2022, 12:01:35	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:04:19	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1071	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	19 de abril de 2022, 13:52:43	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:04:16	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1077	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 15:51:19	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:04:00	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1078	CE	Revisión UI	Mancha	19 de abril de 2022, 15:53:35	closed	A-05		Error en procedimiento	9 de abril de 2022	23 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:03:58	9/04/2022	SEMANA 14
ABR	2022	1079	CE	Revisión UI	Quiñe	22 de abril de 2022, 10:33:34	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:03:55	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1080	CE	Revisión UI	Quiñe	22 de abril de 2022, 10:36:07	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:03:52	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1081	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	22 de abril de 2022, 10:40:59	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 22:03:49	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1082	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	22 de abril de 2022, 10:43:55	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:55:10	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1083	CE	Revisión UI	Quiñe	22 de abril de 2022, 10:47:00	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:55:08	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1084	CE	Revisión UI	Despegue	22 de abril de 2022, 10:50:44	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:55:05	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1085	CE	Revisión UI	Mancha	22 de abril de 2022, 10:55:19	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:55:03	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1086	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	22 de abril de 2022, 10:58:38	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:54:59	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1087	CE	Revisión UI	Mancha	22 de abril de 2022, 11:03:00	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:57	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1088	CE	Revisión UI	Mancha	22 de abril de 2022, 11:05:14	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:52	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1089	CE	Revisión UI	Mancha	22 de abril de 2022, 17:01:05	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:50	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1090	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	23 de abril de 2022, 08:29:30	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:48	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1091	CE	Revisión UI	Despegue	23 de abril de 2022, 08:35:25	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:45	11/04/2022	SEMANA 15

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
ABR	2022	1092	CE	Revisión UI	Mancha	23 de abril de 2022, 08:42:03	closed	A-05	[redacted]	Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:42	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1093	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	23 de abril de 2022, 08:44:27	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:39	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1094	CE	Revisión UI	Quiñe	23 de abril de 2022, 08:47:47	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:36	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1095	CE	Revisión UI	Quiñe	23 de abril de 2022, 08:55:15	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:34	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1096	CE	Revisión UI	Abolladura	23 de abril de 2022, 08:59:18	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:31	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1097	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	23 de abril de 2022, 09:59:17	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:29	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1098	CE	Revisión UI	Quiñe	23 de abril de 2022, 10:16:42	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:26	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1099	CE	Revisión UI	Quiñe	23 de abril de 2022, 10:20:53	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:24	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1100	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	23 de abril de 2022, 10:23:26	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:21	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1101	CE	Revisión UI	Despegue	23 de abril de 2022, 10:26:48	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:18	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1102	CE	Revisión UI	Mancha	23 de abril de 2022, 10:32:40	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:16	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1103	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	23 de abril de 2022, 10:37:35	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:13	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1104	CE	Revisión UI	Quiñe	23 de abril de 2022, 10:41:36	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:10	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1105	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	23 de abril de 2022, 10:51:41	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:07	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1106	CE	Revisión UI	Quiñe	23 de abril de 2022, 10:53:34	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:53:05	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1107	CE	Revisión UI	Mancha	23 de abril de 2022, 10:56:33	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:52:25	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1108	CE	Revisión UI	Mancha	23 de abril de 2022, 10:58:45	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:52:22	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1109	CE	Revisión UI	Mancha	23 de abril de 2022, 11:02:17	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:52:19	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1110	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	23 de abril de 2022, 11:08:29	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:52:16	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1111	CE	Revisión UI	Quiñe	23 de abril de 2022, 11:16:49	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:52:12	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1112	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	23 de abril de 2022, 11:19:01	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:52:09	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1113	CE	Revisión UI	Rayadura	23 de abril de 2022, 11:24:31	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:52:06	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1114	CE	Revisión UI	Quiñe	23 de abril de 2022, 11:26:48	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:52:02	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1115	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	23 de abril de 2022, 11:28:51	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:52:00	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1116	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	23 de abril de 2022, 11:34:49	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:51:58	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1117	CE	Revisión UI	Quiñe	23 de abril de 2022, 11:37:11	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:51:55	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1118	CE	Revisión UI	Despegue	23 de abril de 2022, 11:40:14	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:50:26	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1119	CE	Revisión UI	Quiñe	23 de abril de 2022, 11:57:00	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:50:23	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1120	CE	Revisión UI	Despegue	23 de abril de 2022, 11:58:39	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:50:21	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1121	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	23 de abril de 2022, 12:02:01	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:50:19	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1122	CE	Revisión UI	Dilatación	23 de abril de 2022, 12:40:03	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:50:16	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1123	CE	Revisión UI	Quiñe	23 de abril de 2022, 12:43:18	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:50:14	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1124	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	23 de abril de 2022, 12:45:47	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:50:12	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1125	CE	Revisión UI	Despegue	23 de abril de 2022, 12:50:04	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:50:09	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1126	CE	Revisión UI	Mancha	23 de abril de 2022, 12:53:35	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:50:06	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1127	CE	Revisión UI	Desalineamiento	25 de abril de 2022, 08:13:26	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:50:04	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1128	CE	Revisión UI	Dilatación	25 de abril de 2022, 08:21:43	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:50:02	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1129	CE	Revisión UI	Mal acabado	25 de abril de 2022, 08:25:15	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:49:59	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1130	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 08:34:08	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:52	11/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1131	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 08:35:43	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:49	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1132	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 08:42:26	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:30	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1133	CE	Revisión UI	Dilatación	25 de abril de 2022, 09:12:03	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:27	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1134	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 09:14:14	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:24	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1135	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 09:16:10	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:21	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1136	CE	Revisión UI	Mal acabado	25 de abril de 2022, 09:18:25	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:18	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1137	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 09:22:19	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:16	12/04/2022	SEMANA 15

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
ABR	2022	1138	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 09:23:49	closed	A-05	[redacted]	Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:14	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1139	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 09:25:12	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:12	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1140	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 09:29:27	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:09	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1141	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 09:31:16	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:07	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1142	CE	Revisión UI	Dilatación	25 de abril de 2022, 09:33:24	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:04	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1143	CE	Revisión UI	Mal acabado	25 de abril de 2022, 09:46:06	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:15:02	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1144	CE	Revisión UI	Mal acabado	25 de abril de 2022, 09:48:51	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:59	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1145	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 09:50:36	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:56	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1146	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 09:52:22	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:54	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1147	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 09:54:06	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:52	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1148	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 09:56:15	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:49	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1149	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 09:58:48	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:45	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1150	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 10:00:31	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:42	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1151	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 10:02:26	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:40	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1152	CE	Revisión UI	Mal acabado	25 de abril de 2022, 10:05:40	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:36	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1153	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 10:07:15	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:32	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1154	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 10:08:45	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:30	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1155	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 10:26:20	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:28	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1156	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 10:28:30	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:25	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1157	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 10:36:57	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:22	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1158	CE	Revisión UI	Dilatación	25 de abril de 2022, 10:39:39	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:19	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1159	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 10:41:29	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:17	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1160	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 10:43:45	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:13	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1161	CE	Revisión UI	Despegue	25 de abril de 2022, 10:45:19	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:10	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1162	CE	Revisión UI	Desalineamiento	25 de abril de 2022, 10:46:59	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:07	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1163	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 10:49:14	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:05	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1164	CE	Revisión UI	Fisura	25 de abril de 2022, 10:55:06	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:14:01	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1165	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 10:57:18	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:13:58	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1166	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 11:00:35	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:13:40	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1167	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 11:09:24	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:13:44	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1168	CE	Revisión UI	Mal acabado	25 de abril de 2022, 11:13:44	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:13:29	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1169	CE	Revisión UI	Desalineamiento	25 de abril de 2022, 11:16:12	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:13:25	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1170	CE	Revisión UI	Despegue	25 de abril de 2022, 11:18:52	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:13:22	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1171	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 11:21:57	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:13:17	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1172	CE	Revisión UI	Desalineamiento	25 de abril de 2022, 11:23:39	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:13:13	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1173	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 11:25:58	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:13:09	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1174	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 11:29:15	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:13:07	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1175	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 11:35:37	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:13:05	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1176	CE	Revisión UI	Despegue	25 de abril de 2022, 11:38:32	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:13:01	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1177	CE	Revisión UI	Error de corte	25 de abril de 2022, 11:43:26	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:12:56	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1178	CE	Revisión UI	Rayadura	25 de abril de 2022, 11:47:47	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:12:53	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1179	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 13:18:52	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:12:51	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1180	CE	Revisión UI	Dilatación	25 de abril de 2022, 13:23:41	closed	A-05		Error en procedimiento	12 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:12:48	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1181	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 13:26:07	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	4 de mayo de 2022, 08:12:45	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1182	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 13:29:23	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:41	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1183	CE	Revisión UI	Dilatación	25 de abril de 2022, 13:32:26	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:36	12/04/2022	SEMANA 15

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
ABR	2022	1184	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 13:37:37	closed	A-05	[redacted]	Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:33	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1185	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 13:40:06	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:30	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1186	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 13:42:12	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:20	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1187	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 13:44:23	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:17	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1188	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 13:49:23	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:14	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1189	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 13:51:26	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:12	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1190	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 13:53:59	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:09	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1191	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 13:57:51	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:04	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1192	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 14:00:57	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:48:02	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1193	CE	Revisión UI	Despegue	25 de abril de 2022, 14:04:20	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:59	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1194	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 14:06:27	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:56	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1195	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 14:08:52	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:53	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1196	CE	Revisión UI	Desalineamiento	25 de abril de 2022, 14:10:34	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:49	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1197	CE	Revisión UI	Despegue	25 de abril de 2022, 14:12:48	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:46	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1198	CE	Revisión UI	Mal acabado	25 de abril de 2022, 14:15:59	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:40	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1199	CE	Revisión UI	Rayadura	25 de abril de 2022, 14:19:03	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:36	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1200	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 14:22:04	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:33	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1201	CE	Revisión UI	Despegue	25 de abril de 2022, 14:24:14	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:30	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1202	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 14:28:50	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:26	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1203	CE	Revisión UI	Desalineamiento	25 de abril de 2022, 14:30:38	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:24	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1204	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 14:32:51	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:20	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1205	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 14:34:38	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:17	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1206	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 14:36:54	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:14	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1207	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 14:39:20	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:12	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1208	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 14:52:18	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:09	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1209	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 14:55:35	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:07	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1210	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 15:01:58	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:04	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1211	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 15:03:38	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:47:01	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1212	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 15:05:39	closed	A-06		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:57	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1213	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 15:07:55	closed	A-06		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:54	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1214	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 15:11:11	closed	A-06		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:51	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1215	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 15:15:29	closed	A-06		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:49	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1216	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 15:18:24	closed	A-06		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:46	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1217	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 15:20:40	closed	A-05		Error en procedimiento	13 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:41	12/04/2022	SEMANA 15
ABR	2022	1218	CE	Revisión UI	Quiñe	25 de abril de 2022, 16:36:17	closed	A-02		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:38	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1219	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 16:39:39	closed	A-05		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:35	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1220	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 16:41:50	closed	A-02		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:30	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1221	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	25 de abril de 2022, 16:56:38	closed	A-02		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:26	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1222	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 16:59:01	closed	A-02		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:24	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1223	CE	Revisión UI	Mancha	25 de abril de 2022, 17:02:18	closed	A-02		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:15	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1224	CE	Revisión UI	Trabajo Inconcluso	26 de abril de 2022, 08:05:19	closed	A-02		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:12	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1225	CE	Revisión UI	Mancha	26 de abril de 2022, 08:07:04	closed	A-02		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:08	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1226	CE	Revisión UI	Mancha	26 de abril de 2022, 08:09:00	closed	A-07		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:46:05	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1227	CE	Revisión UI	Quiñe	26 de abril de 2022, 08:11:49	closed	A-07		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:45:56	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1228	CE	Revisión UI	Mancha	26 de abril de 2022, 08:13:56	closed	A-07		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:45:54	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1229	CE	Revisión UI	Despostillamiento	26 de abril de 2022, 10:06:33	closed	A-07		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:45:51	18/04/2022	SEMANA 16

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
ABR	2022	1230	CE	Revisión UI	Mancha	26 de abril de 2022, 10:08:08	closed	A-07	[redacted]	Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:45:49	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1231	CE	Revisión UI	Mancha	26 de abril de 2022, 10:11:55	closed	A-07		Error en procedimiento	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022	3 de mayo de 2022, 21:45:45	18/04/2022	SEMANA 16
ABR	2022	1232	CC	Solaqueo	Despositillamiento	4 de mayo de 2022, 08:21:09	closed	A-21		Error en procedimiento	26 de abril de 2022	9 de mayo de 2022	4 de mayo de 2022, 08:38:05	26/04/2022	SEMANA 17
ABR	2022	1233	BF	Prueba Final de Agua	Obstrucción	4 de mayo de 2022, 10:35:06	closed	A-02		Error en procedimiento	27 de abril de 2022	11 de mayo de 2022	4 de junio de 2022, 15:19:20	27/04/2022	SEMANA 17
MAY	2022	1243	CE	Entregas	Descuadrado	4 de junio de 2022, 14:24:09	closed	A-03		Error en procedimiento	11 de mayo de 2022	14 de mayo de 2022	4 de junio de 2022, 15:19:20	11/05/2022	SEMANA 15
MAY	2022	1242	CE	Entregas	Falta de limpieza	4 de junio de 2022, 14:17:46	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de mayo de 2022	14 de mayo de 2022	4 de junio de 2022, 15:19:12	11/05/2022	SEMANA 15
MAY	2022	1241	CE	Entregas	Falta de limpieza	4 de junio de 2022, 14:14:28	closed	A-05		Error en procedimiento	11 de mayo de 2022	14 de mayo de 2022	4 de junio de 2022, 15:19:07	11/05/2022	SEMANA 15
MAY	2022	1240	CE	Entregas	Mal acabado	4 de junio de 2022, 14:09:19	closed	A-13		Error en procedimiento	11 de mayo de 2022	14 de mayo de 2022	4 de junio de 2022, 15:18:51	11/05/2022	SEMANA 15
MAY	2022	1239	CE	Entregas	Mal acabado	4 de junio de 2022, 13:56:20	closed	A-13		Error en procedimiento	11 de mayo de 2022	14 de mayo de 2022	4 de junio de 2022, 15:18:45	11/05/2022	SEMANA 15
MAY	2022	1238	CE	Entregas	Mal acabado	4 de junio de 2022, 13:41:38	closed	A-01		Error en procedimiento	11 de mayo de 2022	14 de mayo de 2022	4 de junio de 2022, 15:18:36	11/05/2022	SEMANA 15
MAY	2022	1236	CE	Enchape	Cajoneo	18 de mayo de 2022, 17:32:22	closed	A-19		Error en procedimiento	12 de mayo de 2022	26 de mayo de 2022	31 de mayo de 2022, 16:28:37	12/05/2022	SEMANA 19
MAY	2022	1235	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	18 de mayo de 2022, 17:31:22	closed	A-19		Error en procedimiento	12 de mayo de 2022	26 de mayo de 2022	31 de mayo de 2022, 16:28:37	12/05/2022	SEMANA 19
MAY	2022	1234	CE	Enchape	Dimensión incorrecta	18 de mayo de 2022, 17:30:18	closed	A-19		Error en procedimiento	12 de mayo de 2022	26 de mayo de 2022	31 de mayo de 2022, 16:28:37	12/05/2022	SEMANA 19
MAY	2022	1237	CE	Enchape	Trabajo inconcluso	25 de mayo de 2022, 13:08:45	closed	A-21		Error en procedimiento	23 de mayo de 2022	6 de junio de 2022	31 de mayo de 2022, 16:28:37	23/05/2022	SEMANA 21
JUL	**2022**	1244	CE	Pilotaje	Trabajo inconcluso	18 de julio de 2022, 11:42:05	closed	IE-37		Error en procedimiento	9 de julio de 2022	23 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	9/07/2022	SEMANA 27
JUL	**2022**	1245	CE	Pilotaje	Trabajo inconcluso	18 de julio de 2022, 11:46:52	closed	IE-44		Error en procedimiento	9 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	9/07/2022	SEMANA 27
JUL	**2022**	1246	CE	Pilotaje	Trabajo inconcluso	18 de julio de 2022, 11:53:00	closed	IE-37		Error en procedimiento	9 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	9/07/2022	SEMANA 27
JUL	**2022**	1247	CE	Pilotaje	Falla de instalación	18 de julio de 2022, 11:56:09	closed	IE-38		Error en procedimiento	9 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	9/07/2022	SEMANA 27
JUL	**2022**	1248	CE	Pilotaje	Falla de instalación	23 de julio de 2022, 08:10:23	closed	IE-45		Error en procedimiento	9 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	9/07/2022	SEMANA 27
JUL	**2022**	1249	CE	Pilotaje	Falla de instalación	23 de julio de 2022, 08:16:21	closed	IE-45		Error en procedimiento	9 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	9/07/2022	SEMANA 27
JUL	**2022**	1250	CE	Pilotaje	Falla de instalación	23 de julio de 2022, 08:19:30	closed	IE-38		Error en procedimiento	9 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	9/07/2022	SEMANA 27
JUL	**2022**	1251	CE	Pilotaje	Falla de instalación	23 de julio de 2022, 08:32:07	closed	IE-38		Error en procedimiento	9 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	9/07/2022	SEMANA 27
JUL	**2022**	1252	CE	Pilotaje	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 11:09:33	closed	IE-39		Error en procedimiento	9 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	9/07/2022	SEMANA 27
JUL	**2022**	1253	CE	Pilotaje	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 13:32:32	closed	IE-39		Error en procedimiento	9 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	9/07/2022	SEMANA 27
JUL	**2022**	1254	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 13:33:58	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1255	CE	Pilotaje	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 13:36:55	closed	IE-46		Error en procedimiento	9 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	9/07/2022	SEMANA 27
JUL	**2022**	1256	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 13:40:04	closed	IS-38		Error en procedimiento	21 de julio de 2022	28 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	21/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1257	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 13:57:10	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1258	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 14:05:05	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1260	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 14:09:36	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1261	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 14:10:45	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1263	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 14:17:47	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1264	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 14:18:00	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1265	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 14:21:02	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1266	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 14:24:42	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1267	BF	Prueba Final de Agua	Quiñe	25 de julio de 2022, 14:28:55	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1269	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 14:33:28	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1270	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 14:34:16	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1271	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 14:35:42	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1272	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 14:40:09	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1273	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 14:40:35	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1274	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 14:43:50	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1275	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 14:47:22	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1276	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 14:48:39	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1277	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 14:54:01	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	**2022**	1278	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 14:55:15	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
JUL	2022	1279	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 14:57:38	closed	IS-40	[redacted]	Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1280	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 15:00:26	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1281	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 15:01:13	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1282	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 15:05:11	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1283	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 15:07:42	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1284	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 15:10:43	closed	IS-39		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1285	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 15:11:52	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1286	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 15:14:12	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1287	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 15:17:23	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1288	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 15:20:37	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1289	BF	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso	25 de julio de 2022, 15:37:37	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1290	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 15:50:53	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1291	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 15:53:07	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1292	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 15:53:30	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1293	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 15:54:52	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1294	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 15:57:38	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1295	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 15:59:31	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1296	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 16:01:02	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1297	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 16:02:30	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1298	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 16:02:59	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1299	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 16:05:52	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1300	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 16:06:35	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1301	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 16:09:12	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1302	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	25 de julio de 2022, 16:10:52	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1303	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 16:12:12	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1304	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 16:14:05	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1305	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 16:14:53	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	23/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1306	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	25 de julio de 2022, 16:16:13	closed	IS-39		Error en procedimiento	22 de julio de 2022	29 de julio de 2022	31 de junio de 2022, 16:28:37	22/07/2022	SEMANA 29
JUL	2022	1307	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	1 de agosto de 2022, 08:43:57	closed	IS-40		Error en procedimiento	23 de julio de 2022	30 de julio de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	23/07/2022	SEMANA 29
AGO	2022	1308	BF	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso	15 de agosto de 2022, 10:21:26	closed	IS-37		Error en procedimiento	13 de agosto de 2022	27 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	13/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1309	BF	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso	15 de agosto de 2022, 10:26:18	closed	IS-37		Error en procedimiento	13 de agosto de 2022	27 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	13/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1310	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 10:29:17	closed	IS-37		Error en procedimiento	13 de agosto de 2022	27 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	13/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1311	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 10:31:07	closed	IS-37		Error en procedimiento	13 de agosto de 2022	27 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	13/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1312	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 10:34:19	closed	IS-42		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1313	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 10:36:48	closed	IS-41		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1314	BF	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso	15 de agosto de 2022, 11:11:22	closed	IS-41		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1315	BF	Prueba Final de Agua	Falla de instalación	15 de agosto de 2022, 11:17:16	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1316	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 11:21:19	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1317	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 11:23:42	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1318	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 11:26:23	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1319	BF	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso	15 de agosto de 2022, 11:32:00	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1320	BF	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso	15 de agosto de 2022, 11:35:38	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1321	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 13:25:48	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1322	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 13:28:50	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1323	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 13:31:00	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1324	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 13:33:14	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
AGO	2022	1325	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 13:35:23	closed	IS-40	[redacted]	Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1326	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 13:37:36	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1327	BF	Prueba Final de Agua	Rayadura	15 de agosto de 2022, 13:41:14	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1328	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 13:45:09	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1329	BF	Prueba Final de Agua	Quiñe	15 de agosto de 2022, 13:49:23	closed	IS-40		Error en procedimiento	12 de agosto de 2022	26 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	12/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1330	BF	Prueba Final de Agua	Filtración	15 de agosto de 2022, 13:51:04	closed	IS-40		Error en procedimiento	11 de agosto de 2022	25 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	11/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1331	BF	Prueba Final de Agua	Presión insuficiente	15 de agosto de 2022, 13:55:45	closed	IS-40		Error en procedimiento	11 de agosto de 2022	25 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	11/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1332	BF	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso	15 de agosto de 2022, 14:01:54	closed	IS-40		Error en procedimiento	11 de agosto de 2022	25 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	11/08/2022	SEMANA 32
AGO	2022	1333	BF	Prueba Final de Agua	Presión insuficiente	15 de agosto de 2022, 14:04:18	closed	IS-40		Error en procedimiento	11 de agosto de 2022	25 de agosto de 2022	29 de agosto de 2022, 13:55:37	11/08/2022	SEMANA 32
SET	2022	1652	CE	Revisión UI	Mancha	13 de setiembre de 2022, 17:37:10	open	A-17		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1653	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:10	closed	A-17		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1654	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:10	open	A-17		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1655	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:10	closed	A-17		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1656	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:10	closed	A-17		Error en procedimiento	1 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1657	CE	Revisión UI	Material defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:11	closed	A-18		Fallas de material	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1658	CE	Revisión UI	fisura	13 de setiembre de 2022, 17:37:11	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1659	CE	Revisión UI	Material defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:11	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1660	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:11	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1661	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:12	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1662	CE	Revisión UI	Protuberancia	13 de setiembre de 2022, 17:37:12	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1663	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:12	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1664	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:12	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1665	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:12	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1666	CE	Revisión UI	Oxido	13 de setiembre de 2022, 17:37:13	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1667	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:13	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1668	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:13	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1669	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:13	open	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1670	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:13	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1671	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:14	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1672	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:14	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1673	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:14	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1674	CE	Revisión UI	fisura	13 de setiembre de 2022, 17:37:14	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1675	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:15	open	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1676	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:15	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1677	CE	Revisión UI	Protuberancia	13 de setiembre de 2022, 17:37:15	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1678	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:15	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1679	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:15	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1680	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:16	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1681	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:16	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1682	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:16	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1683	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:16	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1684	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:17	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1685	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:17	open	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1686	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:17	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1687	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:17	closed	A-18			3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1688	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:17	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
SET	2022	1689	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:18	closed	A-18	[redacted]	Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1690	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:18	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1691	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:18	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1692	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:18	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1693	CE	Revisión UI	Protuberancia	13 de setiembre de 2022, 17:37:18	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1694	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:18	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1695	CE	Revisión UI	Protuberancia	13 de setiembre de 2022, 17:37:19	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1696	CE	Revisión UI	Separación de piso laminado	13 de setiembre de 2022, 17:37:19	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1697	CE	Revisión UI	Material defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:19	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1698	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:19	closed	A-18			3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1699	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:20	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1700	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:20	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1701	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:20	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1702	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:20	open	A-18		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1703	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:20	open	A-18		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1704	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:21	open	A-18		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1705	CE	Revisión UI	Despegado	13 de setiembre de 2022, 17:37:21	open	A-18		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1706	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:21	open	A-18		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1707	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:21	open	A-18		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1708	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:21	open	A-18		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1709	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:21	open	A-18		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1710	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:37:22	open	A-18		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1711	CE	Revisión UI	Material defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:22	open	A-18		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1712	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:22	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1713	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:22	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1714	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:22	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1715	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:23	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1716	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:23	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1717	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:23	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1718	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:23	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1719	CE	Revisión UI	Material defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:23	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1720	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:24	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1721	CE	Revisión UI	Material defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:24	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1722	CE	Revisión UI	Oxido	13 de setiembre de 2022, 17:37:24	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1723	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:24	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1724	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:25	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1725	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:25	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1726	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:25	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1727	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:25	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1728	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:25	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:50		
SET	2022	1729	CE	Revisión UI	Oxido	13 de setiembre de 2022, 17:37:26	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1730	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:26	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:09		
SET	2022	1731	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:26	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1732	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:26	open	A-16		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1733	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:26	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:19:02		
SET	2022	1734	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:27	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
SET	2022	1735	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:27	closed	A-19	[redacted]	Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:53		
SET	2022	1736	CE	Revisión UI	Despegado	13 de setiembre de 2022, 17:37:27	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:49		
SET	2022	1737	CE	Revisión UI	Mancha	13 de setiembre de 2022, 17:37:27	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:46		
SET	2022	1738	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:28	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1739	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:28	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1740	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:28	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:43		
SET	2022	1741	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:28	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1742	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:28	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:37		
SET	2022	1743	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:29	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1744	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:29	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1745	CE	Revisión UI	Mancha	13 de setiembre de 2022, 17:37:29	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1746	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:29	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1747	CE	Revisión UI	Material defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:29	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1748	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:29	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1749	CE	Revisión UI	Material defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:30	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:34		
SET	2022	1750	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:30	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1751	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:30	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:31		
SET	2022	1752	CE	Revisión UI	Mancha	13 de setiembre de 2022, 17:37:30	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1753	CE	Revisión UI	Material defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:30	open	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1754	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:31	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1755	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:31	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1756	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:31	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1758	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:31	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1759	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:32	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1760	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:32	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1761	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:32	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1762	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:32	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1763	CE	Revisión UI	Protuberancia	13 de setiembre de 2022, 17:37:32	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1764	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:33	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1765	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:33	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1766	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:33	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1767	CE	Revisión UI	Mancha	13 de setiembre de 2022, 17:37:33	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1768	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:33	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1769	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:34	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:21:19		
SET	2022	1770	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:34	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:28		
SET	2022	1771	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:34	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1772	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:34	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1773	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:34	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1774	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:35	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1775	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:35	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:25		
SET	2022	1776	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:35	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:22		
SET	2022	1777	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:35	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1778	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:35	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1779	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:36	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1780	CE	Revisión UI	Protuberancia	13 de setiembre de 2022, 17:37:36	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1781	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:36	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
SET	2022	1782	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:36	open	A-19	[redacted]	Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1783	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:36	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1784	CE	Revisión UI	Material defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:37	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1785	CE	Revisión UI	Despostillamiento	13 de setiembre de 2022, 17:37:37	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1786	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:37	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1787	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:37	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1788	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:37	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1789	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:38	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1790	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:37:38	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:03:17		
SET	2022	1791	CE	Revisión UI	Humedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:38	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1792	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:38	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1793	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:38	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1794	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:39	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1795	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:39	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1796	CE	Revisión UI	Desprendimiento	13 de setiembre de 2022, 17:37:39	open	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1797	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:39	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1798	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:39	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1799	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:40	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1800	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:40	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1801	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:40	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1802	CE	Revisión UI	Protuberancia	13 de setiembre de 2022, 17:37:40	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1803	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:40	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1804	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:41	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:19		
SET	2022	1805	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:41	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1806	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:41	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:15		
SET	2022	1807	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:41	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1808	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:41	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1809	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:41	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1810	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:42	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1811	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:42	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1812	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:42	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1813	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:42	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1814	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:43	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1815	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:43	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1816	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:43	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1817	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:43	open	A-18		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1818	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:43	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1819	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:44	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1820	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:44	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1821	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:44	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1822	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:44	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1823	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:44	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1824	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:45	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1825	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:45	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1826	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:45	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1827	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:45	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
SET	2022	1828	CE	Revisión UI	Oxido	13 de setiembre de 2022, 17:37:46	open	A-19	[redacted]	Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1829	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:46	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1830	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:46	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1831	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:46	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1832	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:46	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1833	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:47	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1834	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:47	closed	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1835	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:47	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1836	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:47	open	A-19		Error en procedimiento	7 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1837	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:48	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1838	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:48	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1839	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:48	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1840	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:48	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1841	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:48	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1842	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:48	open	A-19			8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1843	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:49	closed	A-19			8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1844	CE	Revisión UI	Protuberancia	13 de setiembre de 2022, 17:37:49	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1845	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:49	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1846	CE	Revisión UI	Material defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:49	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1847	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:49	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1848	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:50	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1849	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:50	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1850	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:50	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1851	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:50	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1852	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:50	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1853	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:51	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1854	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:51	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1855	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:51	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1856	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:51	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1857	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:51	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:11		
SET	2022	1858	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:52	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:08		
SET	2022	1859	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:52	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1860	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:52	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1861	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:52	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1862	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:52	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1863	CE	Revisión UI	Cajoneo	13 de setiembre de 2022, 17:37:53	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1864	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:53	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1865	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:37:53	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1866	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:53	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1867	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:53	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1868	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:54	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1869	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:37:54	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1870	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:54	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1871	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:54	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:05		
SET	2022	1872	CE	Revisión UI	Suciedad	13 de setiembre de 2022, 17:37:54	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1873	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:55	open	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
SET	2022	1874	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:55	closed	A-19	[redacted]	Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:18:02		
SET	2022	1875	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:55	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:59		
SET	2022	1876	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:55	open	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1877	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:55	open	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1878	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:56	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1879	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:56	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1880	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:56	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1881	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:37:56	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:56		
SET	2022	1882	CE	Revisión UI	Protuberancia	13 de setiembre de 2022, 17:37:56	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:53		
SET	2022	1883	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:57	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:50		
SET	2022	1884	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:57	open	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1885	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:57	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:47		
SET	2022	1886	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:57	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1887	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:37:57	open	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1888	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:58	closed	A-19			9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1889	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:58	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1890	CE	Revisión UI	Protuberancia	13 de setiembre de 2022, 17:37:58	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1891	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:37:58	closed	A-19			9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:44		
SET	2022	1892	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:58	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1893	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:37:59	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1894	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:59	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1895	CE	Revisión UI	Cajoneo	13 de setiembre de 2022, 17:37:59	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1896	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:37:59	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1897	CE	Revisión UI	Despegado	13 de setiembre de 2022, 17:37:59	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1898	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:38:00	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1899	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:38:00	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:41		
SET	2022	1900	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:00	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:38		
SET	2022	1901	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:38:00	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1902	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:01	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1903	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:01	open	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1904	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:38:01	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1905	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:38:01	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1906	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:38:01	closed	A-19		Error en procedimiento	9 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1907	CE	Revisión UI	Error en instalación	13 de setiembre de 2022, 17:38:02	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:57		
SET	2022	1908	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:02	open	A-20			12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1909	CE	Revisión UI	Error en instalación	13 de setiembre de 2022, 17:38:02	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1910	CE	Revisión UI	Error en instalación	13 de setiembre de 2022, 17:38:02	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1911	CE	Revisión UI	Despegado	13 de setiembre de 2022, 17:38:02	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1912	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:38:03	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1913	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:38:03	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1914	CE	Revisión UI	Despegado	13 de setiembre de 2022, 17:38:03	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:35		
SET	2022	1915	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:38:03	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1916	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:04	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1917	CE	Revisión UI	Mancha	13 de setiembre de 2022, 17:38:04	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1918	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:38:04	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1919	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:38:04	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
SET	2022	1920	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:38:04	closed	A-20	[redacted]	Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1921	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:38:05	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:32		
SET	2022	1922	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:38:05	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1923	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:38:05	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1924	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	13 de setiembre de 2022, 17:38:05	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:29		
SET	2022	1925	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:05	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:26		
SET	2022	1926	CE	Revisión UI	Despegado	13 de setiembre de 2022, 17:38:06	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:23		
SET	2022	1927	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:06	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1928	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:38:06	open	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1929	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:38:06	open	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1930	CE	Revisión UI	Protuberancia	13 de setiembre de 2022, 17:38:06	closed	A-20		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:20		
SET	2022	1931	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:07	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:18		
SET	2022	1932	CE	Revisión UI	Despostillamiento	13 de setiembre de 2022, 17:38:07	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1933	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:38:07	open	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1934	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:38:07	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1935	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:38:07	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1936	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:08	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1937	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:08	open	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1938	CE	Revisión UI	Mancha	13 de setiembre de 2022, 17:38:08	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:15		
SET	2022	1939	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:08	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:17:12		
SET	2022	1940	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:38:08	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1941	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:09	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1942	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:09	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1943	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:09	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:16:58		
SET	2022	1944	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:38:09	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1945	CE	Revisión UI	Mancha	13 de setiembre de 2022, 17:38:09	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1946	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:38:10	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:16:55		
SET	2022	1947	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:10	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1948	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:38:10	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1949	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:38:10	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1950	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:38:10	open	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1951	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:11	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1952	CE	Revisión UI	Quiñe	13 de setiembre de 2022, 17:38:11	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:16:50		
SET	2022	1953	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:11	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1954	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:11	open	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1955	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:38:11	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:16:47		
SET	2022	1956	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:38:12	open	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1957	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:12	open	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1958	CE	Revisión UI	Rayadura	13 de setiembre de 2022, 17:38:12	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1959	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:12	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1960	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:12	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1961	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:38:13	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1962	CE	Revisión UI	Fisura	13 de setiembre de 2022, 17:38:13	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1963	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:13	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1964	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:38:13	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1965	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	13 de setiembre de 2022, 17:38:13	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:16:39		

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	5/06/2022

MES	AÑO	Task #	Stamp	Title	Description	Date	Status	Sheet	Location	Root Cause	Start Date	Due Date	Closed On	FECHA	SEMANA
SET	2022	1966	CE	Revisión UI	Despostillamiento	13 de setiembre de 2022, 17:38:14	closed	A-21	[redacted]	Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:16:35		
SET	2022	1967	CE	Revisión UI	Mal acabado	13 de setiembre de 2022, 17:38:14	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1968	CE	Revisión UI	Otros relativo al proceso	14 de setiembre de 2022, 19:07:56	closed	A-16		Error en procedimiento	13 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1969	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	14 de setiembre de 2022, 19:07:56	closed	A-16		Error en procedimiento	13 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1970	CE	Revisión UI	Quiñe	14 de setiembre de 2022, 19:07:57	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1971	CE	Revisión UI	Filtración	14 de setiembre de 2022, 19:07:57	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1972	CE	Revisión UI	Filtración	14 de setiembre de 2022, 19:07:57	closed	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1973	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	14 de setiembre de 2022, 19:07:58	open	A-18		Error en procedimiento	2 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1974	CE	Revisión UI	Filtración	14 de setiembre de 2022, 19:07:58	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1975	CE	Revisión UI	Material defectuoso	14 de setiembre de 2022, 19:07:58	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1976	CE	Revisión UI	Filtración	14 de setiembre de 2022, 19:07:58	closed	A-18		Error en procedimiento	3 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1977	CE	Revisión UI	Filtración	14 de setiembre de 2022, 19:07:58	open	A-18		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1978	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	14 de setiembre de 2022, 19:07:59	open	A-18		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1979	CE	Revisión UI	Material defectuoso	14 de setiembre de 2022, 19:07:59	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:16:30		
SET	2022	1980	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	14 de setiembre de 2022, 19:07:59	closed	A-19		Error en procedimiento	5 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:16:28		
SET	2022	1981	CE	Revisión UI	Mal acabado	14 de setiembre de 2022, 19:07:59	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1982	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	14 de setiembre de 2022, 19:07:59	closed	A-19		Error en procedimiento	6 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	19 de setiembre de 2022, 16:16:22		
SET	2022	1983	CE	Revisión UI	Trabajo inconcluso	14 de setiembre de 2022, 19:08:00	closed	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1984	CE	Revisión UI	Filtración	14 de setiembre de 2022, 19:08:00	open	A-19		Error en procedimiento	8 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022			
SET	2022	1985	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	14 de setiembre de 2022, 19:08:00	closed	A-19		Error en procedimiento	10 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1986	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	14 de setiembre de 2022, 19:08:00	closed	A-19		Error en procedimiento	10 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1987	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	14 de setiembre de 2022, 19:08:01	closed	A-19		Error en procedimiento	10 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		
SET	2022	1988	CE	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso	14 de setiembre de 2022, 19:08:01	closed	A-21		Error en procedimiento	12 de setiembre de 2022	14 de setiembre de 2022	3 de octubre de 2022, 12:02:23		

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1	Movimiento de Tierras C3	closed	Quality	Movimiento de Tierras C3	Trabajo inconcluso	[redacted]	13 de febrero de 2022	13 de enero de 2022	T16	A-1A	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
2	Movimiento de Tierras C4	closed	Quality	Movimiento de Tierras C4	C4 T16 franja pendiente de relleno		13 de febrero de 2022	13 de enero de 2022	T16	A-1A	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
3	Movimiento de Tierras C5	closed	Quality	Movimiento de Tierras C5	C5 T16 franja pendiente de relleno		14 de febrero de 2022	14 de enero de 2022	T16	A-1A	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
4	Movimiento de Tierras C6	closed	Quality	Movimiento de Tierras C6	C6 T16 franja pendiente de relleno		14 de febrero de 2022	14 de enero de 2022	T16	A-1A	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
5	Movimiento de Tierras C7	closed	Quality	Movimiento de Tierras C7	C7 T16 franja pendiente de relleno		14 de febrero de 2022	14 de enero de 2022	T16	A-1A	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
6	Movimiento de Tierras C8	closed	Quality	Movimiento de Tierras C8	C8 T16 franja pendiente de relleno		19 de febrero de 2022	19 de enero de 2022	T16	A-1A	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
7	Movimiento de Tierras C9	closed	Quality	Movimiento de Tierras C9	C9 T16 franja pendiente de relleno		19 de febrero de 2022	19 de enero de 2022	T16	A-1A	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
8	Movimiento de Tierra C9 T 15	closed	Quality	Movimiento de Tierra C9 T 15	Esponjamiento T15 C9		28 de febrero de 2022	31 de enero de 2022	T15	A-1A	Error en procedimiento	Estructuras	2	2022
9	Estructuras M. Sost P4	closed	Quality	Estructuras M. Sost P4	incompletos en refuerzo de muro pantalla en		14 de febrero de 2022	14 de enero de 2022	Estacionamiento	S-3	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
10	Estructuras M. Sost P13	closed	Quality	Estructuras M. Sost P13	ncompletos en refuerzo de muro pantalla en p		14 de febrero de 2022	14 de enero de 2022	Estacionamiento	S-3	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
11	Estructuras M. Sost P5	closed	Quality	Estructuras M. Sost P5	Estribos incompletos en refuerzo		15 de febrero de 2022	15 de enero de 2022	Estacionamiento	S-3	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
12	Estructuras M. Sost P14	closed	Quality	Estructuras M. Sost P14	ncompletos en refuerzo de muro pantalla en p		15 de febrero de 2022	15 de enero de 2022	Estacionamiento	S-3	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
13	Estructuras M. Sost P21	closed	Quality	Estructuras M. Sost P21	Shootcreet imparejo		20 de febrero de 2022	20 de enero de 2022	O.E.	S-3	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
15	Estructuras M. Sost P22	closed	Quality	Estructuras M. Sost P22	Shootcrete imparejo		20 de febrero de 2022	20 de enero de 2022	O.E.	S-3	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
16	EST. Zapata estacionamiento 1	closed	Quality	EST. Zapata estacionamiento 1	ompactación en terreno nat. Por material suel		12 de febrero de 2022	12 de enero de 2022	Estacionamiento	E-19	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
17	EST. Zapata estacionamiento 2	closed	Quality	EST. Zapata estacionamiento 2	ompactación en terreno nat. Por material suel		12 de febrero de 2022	12 de enero de 2022	Estacionamiento	E-19	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
18	EST. Zapata estacionamiento 3	closed	Quality	EST. Zapata estacionamiento 3	ompactación en terreno nat. Por material suel		12 de febrero de 2022	12 de enero de 2022	Estacionamiento	E-19	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
19	EST. Zapata estacionamiento 4	closed	Quality	EST. Zapata estacionamiento 4	ompactación en terreno nat. por material suel		12 de febrero de 2022	12 de febrero de 2022	Estacionamiento	E-19	Error en procedimiento	Estructuras	2	2022
20	EST. Zapata estacionamiento 5	closed	Quality	EST. Zapata estacionamiento 5	ompactación en terreno nat. Por material suel		13 de febrero de 2022	13 de enero de 2022	Estacionamiento	E-19	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
21	ST. RECUBRIMIENTO CORTE 1-	closed	Quality	EST. RECUBRIMIENTO CORTE 1-1	Recubrimiento menor a los 4 cm según planos		20 de febrero de 2022	20 de enero de 2022	Estacionamiento	E-19	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
22	T - CIMIENTO CORRIDO CORTE	closed	Quality	EST - CIMIENTO CORRIDO CORTE 8 9	Limpieza previa al vaciado		27 de febrero de 2022	27 de enero de 2022	Estacionamiento	E-19	Error en procedimiento	Estructuras	1	2022
24	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Junta fría no controlada		15 de febrero de 2022	2 de febrero de 2022	Zona 04 av. Nogales	S-1	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2022
25	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Junta fría no controlada		15 de febrero de 2022	2 de febrero de 2022	Zona 04 av. Nogales	S-1	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2022
26	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Junta fría no controlada		15 de febrero de 2022	4 de febrero de 2022	Zona 05 av. Nogales	S-1	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2022
27	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Junta fría no controlada		15 de febrero de 2022	2 de febrero de 2022	Zona 05 av. Nogales	S-1	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2022
28	Relleno	closed	Quality	Relleno	Otros relativo al proceso - Esponjamiento		15 de febrero de 2022	3 de febrero de 2022	T15	A-1	Error en procedimiento	Estructuras	2	2022
29	Acero	closed	Quality	Acero	Ausencia de recubrimiento		17 de febrero de 2022	17 de febrero de 2022	Estacionamiento	E-23	Error en procedimiento	Estructuras	2	2022
30	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Junta fría no controlada		17 de febrero de 2022	17 de febrero de 2022	Estacionamiento	E-23	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2022
31	Entubado PVC SAP	closed	Quality	Entubado PVC SAP	Ubicación Incorrecta		17 de marzo de 2022	17 de febrero de 2022	Estacionamiento	IE-63A	Error en procedimiento	Estructuras	2	2022
32	Acero	closed	Quality	Acero	Ausencia de recubrimiento		24 de marzo de 2022	24 de febrero de 2022	Estacionamiento	E-20	Error en procedimiento	Estructuras	2	2022
33	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Ausencia de accesorio		24 de marzo de 2022	24 de febrero de 2022	Estacionamiento	E-20	Error en procedimiento	Estructuras	2	2022
34	Acero	closed	Quality	Acero	Error en empalme		12 de marzo de 2022	5 de marzo de 2022	Estacionamiento	E-23	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
35	Acero	closed	Quality	Acero	Suciedad		12 de marzo de 2022	5 de marzo de 2022	Estacionamiento	E-23	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
36	Acero	closed	Quality	Acero	Ausencia de recubrimiento		12 de marzo de 2022	5 de marzo de 2022	Estacionamiento	E-22	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
37	Acero	closed	Quality	Acero	Suciedad		12 de marzo de 2022	10 de marzo de 2022	O.E.	E-23	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
38	Acero	closed	Quality	Acero	Armado incorrecto		12 de marzo de 2022	10 de marzo de 2022	O.E.	E-23	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
39	Acero	closed	Quality	Acero	Falta de refuerzo		17 de marzo de 2022	12 de marzo de 2022	Estacionamiento	E-23	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
40	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Ausencia de pase		17 de marzo de 2022	12 de marzo de 2022	Estacionamiento	E-23	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
41	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Apuntalamiento inadecuado		17 de marzo de 2022	12 de marzo de 2022	Estacionamiento	E-23	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
42	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Ausencia de pase		24 de marzo de 2022	1 de marzo de 2022	Estacionamiento	A-31	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2022
43	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Ausencia de pase		26 de marzo de 2022	17 de marzo de 2022	Estacionamiento	A-31	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2022
44	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Otros relativo al proceso		17 de marzo de 2022	17 de marzo de 2022	Estacionamiento	E-23	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
45	Entubado PVC SAP	closed	Quality	Entubado PVC SAP	Ubicación incorrecta		24 de marzo de 2022	19 de marzo de 2022	O.E.	E-23	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
46	Acero	closed	Quality	Acero	Falta de refuerzo		26 de marzo de 2022	18 de marzo de 2022	Estacionamiento	E-24A	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
47	Acero	closed	Quality	Acero	Falta recubrimiento		31 de marzo de 2022	19 de marzo de 2022	Estacionamiento	E-24A	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
48	Concreto Pre-mezclado	closed	Quality	Concreto Pre-mezclado	Diseño Inadecuado		24 de marzo de 2022	24 de marzo de 2022	Estacionamiento	E-23	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
50	Excavación	closed	Quality	Excavación	Otros relativo al proceso		7 de abril de 2022	21 de marzo de 2022	T16	A-1	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
51	Relleno	closed	Quality	Relleno	Material defectuoso		9 de abril de 2022	21 de marzo de 2022	T18	A-1	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
52	Acero	closed	Quality	Acero	Ausencia de recubrimiento		4 de abril de 2022	21 de marzo de 2022	T15	E-02	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
53	Acero	closed	Quality	Acero	Armado incorrecto		9 de abril de 2022	21 de marzo de 2022	Estacionamiento	E-21	Error en procedimiento	Estructuras	3	2022
54	Concreto Pre-mezclado	closed	Quality	Concreto Pre-mezclado	Falla de slump		14 de abril de 2022	12 de abril de 2022	T15	E-5	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
56	Acero	closed	Quality	Acero	Armado incorrecto		24 de abril de 2022	28 de marzo de 2022	T15	E-02	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
57	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Desalineamiento		24 de abril de 2022	29 de marzo de 2022	T15	E-02	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
58	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Armado incorrecto		24 de abril de 2022	29 de marzo de 2022	T15	E-02	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
59	Acero	closed	Quality	Acero	Material incorrecto		24 de abril de 2022	29 de marzo de 2022	T15	E-02	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
60	Concreto Pre-mezclado	closed	Quality	Concreto Pre-mezclado	Exudación excesiva del concreto		24 de abril de 2022	31 de marzo de 2022	T15	E-02	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
61	Acero	closed	Quality	Acero	Material defectuoso		24 de abril de 2022	4 de abril de 2022	T15	E-02	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
62	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Desalineamiento		23 de abril de 2022	4 de abril de 2022	T15	E-02	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
63	Concreto Pre-mezclado	closed	Quality	Concreto Pre-mezclado	Exudación excesiva del concreto		24 de abril de 2022	7 de abril de 2022	T15	E-02	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
66	Acero	closed	Quality	Acero	Dimensión incorrecta		7 de abril de 2022	28 de marzo de 2022	T15	E-5	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
67	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Desalineamiento		11 de abril de 2022	11 de abril de 2022	T15	E-5	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
68	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Desplome		11 de abril de 2022	11 de abril de 2022	T15	E-5	0	Estructuras	4	2022
69	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Elemento no considerado		12 de abril de 2022	12 de abril de 2022	T15	E-5	0	Estructuras	4	2022
70	Acero	closed	Quality	Acero	Ausencia de recubrimiento		20 de abril de 2022	18 de abril de 2022	T15	E-5	0	Estructuras	4	2022
71	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		12 de mayo de 2022	12 de abril de 2022	T15-P1-S1-104-DP	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
72	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		12 de mayo de 2022	12 de abril de 2022	T15-P1-S1-104-Sala	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
73	Conceto Post-vaciado	closed	Quality	Conceto Post-vaciado	Protuberancia		12 de mayo de 2022	12 de abril de 2022	T15-P1-S1-104-Sala	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
74	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Protuberancia	[redacted]	12 de mayo de 2022	12 de abril de 2022	T1S-P1-S1-104-Sala	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
75	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		12 de mayo de 2022	12 de abril de 2022	T1S-P1-S1-104-Cocina	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
76	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		12 de mayo de 2022	12 de abril de 2022	T1S-P1-S1-103-DP	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
77	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		12 de mayo de 2022	12 de abril de 2022	T1S-P1-S1-103-Cocina	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
78	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		12 de mayo de 2022	12 de abril de 2022	T1S-P1-S1-103-Sala	A-2	0	Arquitectura	4	2022
79	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		20 de mayo de 2022	20 de abril de 2022	T1S-P2-S1-104-D2	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
80	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		20 de mayo de 2022	20 de abril de 2022	T1S-P2-S1-104-D2	A-3	0	Arquitectura	4	2022
81	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		20 de mayo de 2022	20 de abril de 2022	T1S-P2-S1-104-D3	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
82	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		20 de mayo de 2022	20 de abril de 2022	T1S-P2-S1-103-Sala	A-3	0	Arquitectura	4	2022
83	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		13 de mayo de 2022	13 de abril de 2022	T1S-P1-S2-105-D2	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
84	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Protuberancia		13 de mayo de 2022	13 de abril de 2022	T1S-P1-S2-105-D2	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
85	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		13 de mayo de 2022	13 de abril de 2022	T1S-P1-S2-105-D2	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
86	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Protuberancia		13 de mayo de 2022	13 de abril de 2022	T1S-P1-S2-106-sala	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
87	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Protuberancia		13 de mayo de 2022	13 de abril de 2022	T1S-P1-S2-106-sala	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
88	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Protuberancia		18 de mayo de 2022	16 de abril de 2022	T1S-P1-S3-107-DP	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
89	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		18 de mayo de 2022	16 de abril de 2022	T1S-P1-S3-107-D2	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
90	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		18 de mayo de 2022	16 de abril de 2022	T1S-P1-S3-107-sala	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
91	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desplome		18 de mayo de 2022	16 de abril de 2022	T1S-P1-S3-108-cocina	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
92	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		19 de mayo de 2022	16 de abril de 2022	T1S-P1-S4-101-sala	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
93	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Protuberancia		19 de mayo de 2022	16 de abril de 2022	T1S-P1-S4-101-hall	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
94	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		19 de mayo de 2022	16 de abril de 2022	T1S-P1-S4-101-DP	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
95	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		19 de mayo de 2022	16 de abril de 2022	T1S-P1-S4-102-cocina	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
96	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		19 de mayo de 2022	16 de abril de 2022	T1S-P1-S4-102-sala	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
97	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		19 de mayo de 2022	16 de abril de 2022	T1S-P1-S4-102-D2	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
98	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		19 de mayo de 2022	16 de abril de 2022	T1S-P1-S4-102-BP	A-2	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
99	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		21 de mayo de 2022	21 de abril de 2022	T1S-P2-S2-105-cocina	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
100	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		21 de mayo de 2022	21 de abril de 2022	T1S-P2-S2-105-cocina	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
101	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desplome		21 de mayo de 2022	21 de abril de 2022	T1S-P2-S2-106-cocina	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
102	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		21 de mayo de 2022	21 de abril de 2022	T1S-P2-S2-106-sala	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
103	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		22 de mayo de 2022	22 de abril de 2022	T1S-P2-S3-107-DP	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
104	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		22 de mayo de 2022	22 de abril de 2022	T1S-P2-S3-107-D2	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
105	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		22 de mayo de 2022	22 de abril de 2022	T1S-P2-S3-107-sala	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
106	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		22 de mayo de 2022	22 de abril de 2022	T1S-P2-S3-108-sshh P	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
107	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		25 de mayo de 2022	25 de abril de 2022	T1S-P2-S4-101-DP	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
108	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desplome		25 de mayo de 2022	25 de abril de 2022	T1S-P2-S4-101-D2	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
109	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		25 de mayo de 2022	25 de abril de 2022	T1S-P2-S4-102-Cocina	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
110	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desplome		25 de mayo de 2022	25 de abril de 2022	T1S-P2-S4-102-Sala	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
111	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		26 de mayo de 2022	26 de abril de 2022	T1S-P3-S1-104-cocina	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
112	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		26 de mayo de 2022	26 de abril de 2022	T1S-P3-S1-104-D2	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
113	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		26 de mayo de 2022	26 de abril de 2022	T1S-P3-S1-104sshh P	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
114	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desplome		26 de mayo de 2022	26 de abril de 2022	T1S-P3-S1-103 cocina	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
115	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		26 de mayo de 2022	26 de abril de 2022	T1S-P3-S1-103 sala	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
116	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		27 de mayo de 2022	27 de abril de 2022	T1S-P3-S2-105 DP	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
117	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		27 de mayo de 2022	27 de abril de 2022	T1S-P3-S2-106-D3	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
118	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		27 de mayo de 2022	27 de abril de 2022	T1S-P3-S2-106-sala	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
119	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desplome		27 de mayo de 2022	27 de abril de 2022	T1S-P3-S2-106-cocina	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
120	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		28 de mayo de 2022	28 de abril de 2022	T1S-P3-S3-108-cocina	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
121	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		28 de mayo de 2022	28 de abril de 2022	T1S-P3-S3-108-cocina	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
122	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		28 de mayo de 2022	28 de abril de 2022	T1S-P3-S3-107-cocina	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
123	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		28 de mayo de 2022	28 de abril de 2022	T1S-P3-S3-107-cocina	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
124	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		28 de mayo de 2022	28 de abril de 2022	T1S-P3-S3-107-sala	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
125	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Protuberancia		29 de mayo de 2022	29 de abril de 2022	T1S-P3-S4-101-D2	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
126	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		29 de mayo de 2022	29 de abril de 2022	T1S-P3-S4-101-sshh P	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
127	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Protuberancia		29 de mayo de 2022	29 de abril de 2022	T1S-P3-S4-102-Sala	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
128	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		29 de mayo de 2022	29 de abril de 2022	T1S-P3-S4-102-D3	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
129	Relleno	closed	Quality	Relleno	Trabajo inconcluso		24 de mayo de 2022	21 de abril de 2022	T18	A-1A	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
130	Acero	closed	Quality	Acero	Ausencia de recubrimiento		30 de abril de 2022	29 de abril de 2022	T1S-P4	A-4	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
131	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Ausencia de accesorio		15 de mayo de 2022	30 de abril de 2022	T1S-P4	E-5	Error en procedimiento	Estructuras	4	2022
133	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Protuberancia		29 de mayo de 2022	29 de abril de 2022	T1S-P4-S1	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
134	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		29 de mayo de 2022	29 de abril de 2022	T1S-P4-S1	A-5	Fallas del material	Arquitectura	4	2022
135	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		29 de mayo de 2022	29 de abril de 2022	T1S-P4-S1	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2022
136	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		29 de mayo de 2022	29 de abril de 2022	T1S-P4-S1	A-5	Fallas del material	Arquitectura	4	2022
138	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de junio de 2022	2 de mayo de 2022	T5-P4-S2-406-DP	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
139	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		2 de junio de 2022	2 de mayo de 2022	T1S-P4-S2-406-DP	A-4	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
140	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de junio de 2022	2 de mayo de 2022	T1S-P4-S2-406-D2	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
141	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de junio de 2022	2 de mayo de 2022	T1S-P4-S2-406-Bv	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
142	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de junio de 2022	2 de mayo de 2022	T1S-P4-S2-405-D2	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
143	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	[redacted]	2 de junio de 2022	2 de mayo de 2022	T1S-P4-S2-405-estar	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
144	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		4 de junio de 2022	3 de mayo de 2022	T1S-P4-S3-407-Dp	A-4	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
145	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de junio de 2022	3 de mayo de 2022	T1S-P4-S3-407-DP	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
146	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de junio de 2022	3 de mayo de 2022	T1S-P4-S3-407-D2	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
147	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		3 de junio de 2022	3 de mayo de 2022	T1S-P4-S3-407-sala	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
148	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de junio de 2022	3 de mayo de 2022	T1S-P4-S3-408-Cocina	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
149	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de junio de 2022	3 de mayo de 2022	T1S-P4-S3-408-Sala	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
150	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		3 de junio de 2022	3 de mayo de 2022	T1S-P4-S3-408-Estar	A-4	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
151	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de junio de 2022	3 de mayo de 2022	T1S-P4-S3-408-DP	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
152	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de junio de 2022	4 de mayo de 2022	T1S-P4-S4-401-D2	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
153	ConcretoPost-Vaciado	closed	Quality	ConcretoPost-Vaciado	Desalineamiento		4 de junio de 2022	4 de mayo de 2022	T1S-P4-S4-401-D2	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
154	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		4 de junio de 2022	4 de mayo de 2022	T1S-P4-S4-401-DP	A-4	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
155	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		4 de junio de 2022	4 de mayo de 2022	T1S-P4-S4-401-BV	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
156	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de junio de 2022	4 de mayo de 2022	T1S-P4-S4-402-cocina	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
157	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		4 de junio de 2022	4 de mayo de 2022	T1S-P4-S4-402-DP	A-4	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
158	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		4 de junio de 2022	4 de mayo de 2022	T1S-P4-S4-402-Dp	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
159	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		5 de junio de 2022	5 de mayo de 2022	T1S-P5-S1-503-DP	A-4	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
160	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de junio de 2022	5 de mayo de 2022	T1S-P5-S1-503-D2	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
161	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de junio de 2022	5 de mayo de 2022	T1S-P5-S1-503-Cocina	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
162	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de junio de 2022	5 de mayo de 2022	T1S-P5-S1-504-Cocina	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
163	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		5 de junio de 2022	5 de mayo de 2022	T1S-P5-S1-504-estar	A-4	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
164	Estructuras	closed	Quality	Estructuras	Trabajo inconcluso		14 de mayo de 2022	13 de mayo de 2022	T1S-P7-S1-703-DP	E-5	0	Estructuras	5	2022
165	Estructura	closed	Quality	Estructura	Falta de recubrimiento		14 de mayo de 2022	13 de mayo de 2022	T1S-P7-S1-703- Sala	E-5	Error en procedimiento	Estructuras	5	2022
168	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		6 de junio de 2022	6 de mayo de 2022	T1S-P5-S2-505-DP	A-4	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
169	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		6 de junio de 2022	6 de mayo de 2022	T1S-P5-S2-505-D2	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
170	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		6 de junio de 2022	6 de mayo de 2022	T1S-P5-S2-506-cocina	A-4	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
171	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		6 de junio de 2022	6 de mayo de 2022	T1S-P5-S2-506-Pasadizo	A-4	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
172	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		6 de junio de 2022	6 de mayo de 2022	T1S-P5-S2-506-DP	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
173	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		7 de junio de 2022	7 de mayo de 2022	T1S-P5-S3-507-D2	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
174	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		7 de junio de 2022	7 de mayo de 2022	T1S-P5-S3-507-sala	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
175	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		7 de junio de 2022	7 de mayo de 2022	T1S-P5-S3-507-Cocina	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
176	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		7 de junio de 2022	7 de mayo de 2022	T1S-P5-S3-508-cocina	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
177	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		7 de junio de 2022	7 de mayo de 2022	T1S-P5-S3-508-sala	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
178	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		7 de junio de 2022	7 de mayo de 2022	T1S-P5-S3-508-Estar	A-4	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
179	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de junio de 2022	9 de mayo de 2022	T1S-P5-S4-501-D2	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
180	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		9 de junio de 2022	9 de mayo de 2022	T1S-P5-S4-501-estar	A-4	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
181	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de junio de 2022	9 de mayo de 2022	T1S-P5-S4-501-Cocina	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
182	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de junio de 2022	9 de mayo de 2022	T1S-P5-S4-502-cocina	A-4	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
183	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		9 de junio de 2022	9 de mayo de 2022	T1S-P5-S4-502-DP	A-4	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
184	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de junio de 2022	10 de mayo de 2022	T1S-P6-S1-603-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
185	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de junio de 2022	10 de mayo de 2022	T1S-P6-S1-603-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
186	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de junio de 2022	10 de mayo de 2022	T1S-P6-S1-604-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
187	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		10 de junio de 2022	10 de mayo de 2022	T1S-P6-S1-604-Sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
188	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de junio de 2022	11 de mayo de 2022	T1S-P6-S2-605-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
189	ConcretoPost-Vaciado	closed	Quality	ConcretoPost-Vaciado	Protuberancia		11 de junio de 2022	11 de mayo de 2022	T1S-P6-S2-605-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
190	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		11 de junio de 2022	11 de mayo de 2022	T1S-P6-S2-605-cocina	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
191	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		11 de junio de 2022	11 de mayo de 2022	T1S-P6-S2-606-cocina	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
192	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de junio de 2022	11 de mayo de 2022	T1S-P6-S2-606-D3	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
193	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de junio de 2022	11 de mayo de 2022	T1S-P6-S2-606-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
194	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		12 de junio de 2022	12 de mayo de 2022	T1S-P6-S3-607-DP	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
195	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de junio de 2022	12 de mayo de 2022	T1S-P6-S3-607-Cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
196	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		12 de junio de 2022	12 de mayo de 2022	T1S-P6-S3-607-Cocina	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
197	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		12 de junio de 2022	12 de mayo de 2022	T1S-P6-S3-608-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
198	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de junio de 2022	12 de mayo de 2022	T1S-P6-S3-608-D3	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
199	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		12 de junio de 2022	12 de mayo de 2022	T1S-P6-S3-608-Pasadizo	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
200	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de junio de 2022	13 de mayo de 2022	T1S-P6-S4-601-D2	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
201	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		13 de junio de 2022	13 de mayo de 2022	T1S-P6-S4-601-D3	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
202	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de junio de 2022	13 de mayo de 2022	T1S-P6-S4-601-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
203	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de junio de 2022	13 de mayo de 2022	T1S-P6-S4-602-Cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
204	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		13 de junio de 2022	13 de mayo de 2022	T1S-P6-S4-602-cocina	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
205	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		13 de junio de 2022	13 de mayo de 2022	T1S-P6-S4-602-Sala	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
206	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de junio de 2022	13 de mayo de 2022	T1S-P6-S4-602-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
207	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de junio de 2022	14 de mayo de 2022	T1S-P7-S1-703-Dp	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
208	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de junio de 2022	14 de mayo de 2022	T1S-P7-S1-703-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
209	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		14 de junio de 2022	14 de mayo de 2022	T1S-P7-S1-703-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
210	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de junio de 2022	14 de mayo de 2022	T1S-P7-S1-703-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
211	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de junio de 2022	14 de mayo de 2022	T1S-P7-S1-704-Cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
212	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	[redacted]	14 de junio de 2022	14 de mayo de 2022	T1S-P7-S1-704-sala	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
213	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		14 de junio de 2022	14 de mayo de 2022	T1S-P7-S1-704-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
214	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		16 de junio de 2022	16 de mayo de 2022	T1S-P7-S2-705-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
215	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		16 de junio de 2022	16 de mayo de 2022	T1S-P7-S2-705-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
216	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		16 de junio de 2022	16 de mayo de 2022	T1S-P7-S2-705-cocina	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
217	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		16 de junio de 2022	16 de mayo de 2022	T1S-P7-S2-706-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
218	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		16 de junio de 2022	16 de mayo de 2022	T1S-P7-S2-706-BV	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
219	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		16 de junio de 2022	16 de mayo de 2022	T1S-P7-S2-706-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
220	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de junio de 2022	17 de mayo de 2022	T1S-P7-S3-707-DP	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
221	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		17 de junio de 2022	17 de mayo de 2022	T1S-P7-S3-707-D2	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
222	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de junio de 2022	17 de mayo de 2022	T1S-P7-S3-707-Pasadizo	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
223	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de junio de 2022	17 de mayo de 2022	T1S-P7-S3-707-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
224	ConcretoPost-Vaciado	closed	Quality	ConcretoPost-Vaciado	Desalineamiento		17 de junio de 2022	17 de mayo de 2022	T1S-P7-S3-708-Cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
225	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		17 de junio de 2022	17 de mayo de 2022	T1S-P7-S3-708-D3	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
226	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de junio de 2022	17 de mayo de 2022	T1S-P7-S3-708-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
228	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		18 de junio de 2022	18 de mayo de 2022	T1S-P7-S4-702-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
229	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		18 de junio de 2022	18 de mayo de 2022	T1S-P7-S4-702-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
230	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		18 de junio de 2022	18 de mayo de 2022	T1S-P7-S4-702-Sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
231	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		18 de junio de 2022	18 de mayo de 2022	T1S-P7-S4-701-Cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
232	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		18 de junio de 2022	18 de mayo de 2022	T1S-P7-S4-701-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
233	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		18 de junio de 2022	18 de mayo de 2022	T1S-P7-S4-701-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
234	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		19 de junio de 2022	19 de mayo de 2022	T1S-P8-S1-803-D2	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
235	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		19 de junio de 2022	19 de mayo de 2022	T1S-P8-S1-803-Sala	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
236	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		19 de junio de 2022	19 de mayo de 2022	T1S-P8-S1-803-Sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
237	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		19 de junio de 2022	19 de mayo de 2022	T1S-P8-S1-804-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
238	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		19 de junio de 2022	19 de mayo de 2022	T1S-P8-S1-804-D3	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
239	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		19 de junio de 2022	19 de mayo de 2022	T1S-P8-S1-804-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
240	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		20 de junio de 2022	20 de mayo de 2022	T1S-P8-S2-805-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
241	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		20 de junio de 2022	20 de mayo de 2022	T1S-P8-S2-805-BV	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
242	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		20 de junio de 2022	20 de mayo de 2022	T1S-P8-S2-806-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
243	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		20 de junio de 2022	20 de mayo de 2022	T1S-P8-S2-806-D3	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
244	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		20 de junio de 2022	20 de mayo de 2022	T1S-P8-S2-806-DP	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
245	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		21 de junio de 2022	21 de mayo de 2022	T1S-P8-S3-807-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
246	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de junio de 2022	21 de mayo de 2022	T1S-P8-S3-807-cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
247	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de junio de 2022	21 de mayo de 2022	T1S-P8-S3-807-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
248	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de junio de 2022	21 de mayo de 2022	T1S-P8-S3-808-cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
249	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamieno		21 de junio de 2022	21 de mayo de 2022	T1S-P8-S3-808-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
250	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		21 de junio de 2022	21 de mayo de 2022	T1S-P8-S3-808-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
251	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		23 de junio de 2022	23 de mayo de 2022	T1S-P8-S4-801-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
252	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		23 de junio de 2022	23 de mayo de 2022	T1S-P8-S4-801-D2	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
253	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		23 de junio de 2022	23 de mayo de 2022	T1S-P8-S4-801-Cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
254	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		23 de junio de 2022	23 de mayo de 2022	T1S-P8-S4-802-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
255	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		23 de junio de 2022	23 de mayo de 2022	T1S-P8-S4-802-D3	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
256	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalieamiento		23 de junio de 2022	23 de mayo de 2022	T1S-P8-S4-802-DP	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
257	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		24 de junio de 2022	24 de mayo de 2022	T1S-P9-S1-903-DP	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
258	Concreto Post-vaciado	closed	Quality	Concreto Post-vaciado	Desalineamiento		27 de junio de 2022	24 de mayo de 2022	T1S-P9-S1-903-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
259	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de junio de 2022	24 de mayo de 2022	T1S-P9-S1-903-sala	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
260	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		24 de junio de 2022	24 de mayo de 2022	T1S-P9-S1-904-Cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
261	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de junio de 2022	24 de mayo de 2022	T1S-P9-S1-904-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
262	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		24 de junio de 2022	24 de mayo de 2022	T1S-P9-S1-904-D2	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
263	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		25 de junio de 2022	25 de mayo de 2022	T1S-P9-S2-905-Cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
264	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		25 de junio de 2022	25 de mayo de 2022	T1S-P9-S2-905-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
265	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		25 de junio de 2022	25 de mayo de 2022	T1S-P9-S2-906-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
266	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		25 de junio de 2022	25 de mayo de 2022	T1S-P9-S2-906-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
267	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		25 de junio de 2022	25 de mayo de 2022	T1S-P9-S2-906-DP	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
268	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		27 de junio de 2022	26 de mayo de 2022	T1S-P9-S3-907-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
269	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		27 de junio de 2022	26 de mayo de 2022	T1S-P9-S3-907-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
270	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		27 de junio de 2022	26 de mayo de 2022	T1S-P9-S3-907-DP	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
271	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		27 de junio de 2022	26 de mayo de 2022	T1S-P9-S3-908-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
272	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		27 de junio de 2022	26 de mayo de 2022	T1S-P9-S3-908-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
273	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		27 de junio de 2022	27 de mayo de 2022	T1S-P9-S4-901-D2	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
274	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		27 de junio de 2022	27 de mayo de 2022	T1S-P9-S4-901-cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
275	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		27 de junio de 2022	27 de mayo de 2022	T1S-P9-S4-902-cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
276	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		27 de junio de 2022	27 de mayo de 2022	T1S-P9-S4-902-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
277	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		27 de junio de 2022	27 de mayo de 2022	T1S-P9-S4-902-DP	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
278	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		28 de junio de 2022	28 de mayo de 2022	T1S-P10-S1-1003-BV	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
279	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		28 de junio de 2022	28 de mayo de 2022	T1S-P10-S1-1003-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
280	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	[redacted]	28 de junio de 2022	28 de mayo de 2022	T1S-P10-S1-1003-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
281	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		28 de junio de 2022	28 de mayo de 2022	T1S-P10-S1-1004-cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
282	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		28 de junio de 2022	28 de mayo de 2022	T1S-P10-S1-1004-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
283	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		28 de junio de 2022	28 de mayo de 2022	T1S-P10-S1-1004-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
285	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de junio de 2022	30 de mayo de 2022	T1S-P10-S2-1005-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
286	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		30 de junio de 2022	30 de mayo de 2022	T1S-P10-S2-1005-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
287	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de junio de 2022	30 de mayo de 2022	T1S-P10-S2-1005-BV	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
288	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de junio de 2022	30 de mayo de 2022	T1S-P10-S2-1005-sala	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
289	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		30 de junio de 2022	30 de mayo de 2022	T1S-P10-S2-1006-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
290	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de junio de 2022	30 de mayo de 2022	T1S-P10-S2-1006-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
291	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		30 de junio de 2022	30 de mayo de 2022	T1S-P10-S2-1006-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
292	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de junio de 2022	30 de mayo de 2022	T1S-P10-S2-1006-D3	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
293	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de junio de 2022	31 de mayo de 2022	T1S-P10-S3-1007-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
294	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de junio de 2022	31 de mayo de 2022	T1S-P10-S3-1007-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
295	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de junio de 2022	31 de mayo de 2022	T1S-P10-S3-1007-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
296	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		30 de junio de 2022	31 de mayo de 2022	T1S-P10-S3-1008-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
297	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		30 de junio de 2022	31 de mayo de 2022	T1S-P10-S3-1008-cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
298	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		30 de junio de 2022	31 de mayo de 2022	T1S-P10-S3-1008-D3	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
299	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de julio de 2022	1 de junio de 2022	T1S-P10-S4-1001-D3	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
323	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		1 de julio de 2022	1 de junio de 2022	T1S-P10-S4-1001-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
324	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de julio de 2022	1 de junio de 2022	T1S-P10-S4-1002-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
325	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de julio de 2022	1 de junio de 2022	T1S-P10-S4- 1002-D3	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
326	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de julio de 2022	1 de junio de 2022	T1S-P10-S4-1002-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
327	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de julio de 2022	2 de junio de 2022	T1S-P11-S1-1104-BP	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
328	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de julio de 2022	2 de junio de 2022	T1S-P11-S1-1104-D2	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
329	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de julio de 2022	2 de junio de 2022	T1S-P11-S1-1104-pazadiso	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
330	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de julio de 2022	2 de junio de 2022	T1S-P11-S1-1103-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
331	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de julio de 2022	2 de junio de 2022	T1S-P11-S1-1103-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
332	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de julio de 2022	3 de junio de 2022	T1S-P11-S2-1105-D3	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
333	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		3 de julio de 2022	3 de junio de 2022	T1S-P11-S2-1105-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
334	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de julio de 2022	3 de junio de 2022	T1S-P11-S2-1106-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
335	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de julio de 2022	3 de junio de 2022	T1S-P11-S2-1106-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
336	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de julio de 2022	4 de junio de 2022	T1S-P11-S3-1107-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
337	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de julio de 2022	4 de junio de 2022	T1S-P11-S3-1107-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
338	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		4 de julio de 2022	4 de junio de 2022	T1S-P11-S3-1107-cocina	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
339	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de julio de 2022	4 de junio de 2022	T1S-P11-S3-1108-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
340	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		4 de julio de 2022	4 de junio de 2022	T1S-P11-S3-1108-D3	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	5	2022
341	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de julio de 2022	4 de junio de 2022	T1S-P11-S4-1101-BP	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
342	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de julio de 2022	4 de junio de 2022	T1S-P11-S4-1101-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
343	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de julio de 2022	4 de junio de 2022	T1S-P11-S4-1101-D3	A-5	Mano de obra	Arquitectura	5	2022
344	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de julio de 2022	4 de junio de 2022	T1S-P11-S4-1102-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
345	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de julio de 2022	4 de junio de 2022	T1S-P11-S4-1102-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	5	2022
346	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Dimensión incorrecta		28 de junio de 2022	15 de junio de 2022	T1S-P3-302-D3	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	6	2022
347	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Dimensión incorrecta		28 de junio de 2022	15 de junio de 2022	T1S-P3-304-D2	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	6	2022
348	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		28 de junio de 2022	14 de junio de 2022	T1S-P2-S4-201-Sala	A-3	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
349	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		28 de junio de 2022	14 de junio de 2022	T1S-P2-S4-201-Sala	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	6	2022
350	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		28 de junio de 2022	14 de junio de 2022	T1S-P2-S3-208-Sala	A-3	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
351	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		28 de junio de 2022	14 de junio de 2022	T1S-P2-S2-205-DS	A-3	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
352	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		28 de junio de 2022	14 de junio de 2022	T1S-P2-S2-206-Cocina	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	6	2022
353	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		28 de junio de 2022	14 de junio de 2022	T1S-P2-S2-206-pasillo	A-3	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
354	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		28 de junio de 2022	14 de junio de 2022	T1S-P2-S2-206-DS	A-3	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
355	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		7 de julio de 2022	7 de junio de 2022	T1S-P12-S1-1204-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
356	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		7 de julio de 2022	7 de junio de 2022	T1S-P12-S1-1204-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
357	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		7 de julio de 2022	7 de junio de 2022	T1S-P12-S1-1204-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
358	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		7 de julio de 2022	7 de junio de 2022	T1S-P12-S1-1203-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
359	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		7 de julio de 2022	7 de junio de 2022	T1S-P12-S1-1203-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
360	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de julio de 2022	8 de junio de 2022	T1S-P12-S2-1205-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
361	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de julio de 2022	8 de junio de 2022	T1S-P12-S2-1205-D3	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
362	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de julio de 2022	8 de junio de 2022	T1S-P12-S2-1205-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
363	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de julio de 2022	8 de junio de 2022	T1S-P12-S2-1206-cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	6	2022
364	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de julio de 2022	8 de junio de 2022	T1S-P12-S2-1206-pasadizo	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
365	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de julio de 2022	9 de junio de 2022	T1S-P12-S3-1207-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
366	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		9 de julio de 2022	9 de junio de 2022	T1S-P12-S3-1207-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
367	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		9 de julio de 2022	9 de junio de 2022	T1S-P12-S3-1208-sala	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	6	2022
368	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		9 de julio de 2022	9 de junio de 2022	T1S-P12-S3-1208-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
369	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		10 de julio de 2022	10 de junio de 2022	T1S-P12-S4-1201-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
370	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de julio de 2022	10 de junio de 2022	T1S-P12-S4-1201-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
371	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	[redacted]	10 de julio de 2022	10 de junio de 2022	T1S-P12-S4-1201-D3	A-5	Mano de obra	Arquitectura	6	2022
372	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de julio de 2022	10 de junio de 2022	T1S-P12-S4-1202-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
373	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de julio de 2022	10 de junio de 2022	T1S-P12-S4-1202-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
374	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		10 de julio de 2022	10 de junio de 2022	T1S-P12-S4-1202-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
375	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		11 de julio de 2022	11 de junio de 2022	T1S-P13-S1-1304-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
376	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		11 de julio de 2022	11 de junio de 2022	T1S-P13-S1-1304-D3	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
377	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		11 de julio de 2022	11 de junio de 2022	T1S-P13-S1-1304-pasadizo	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
378	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de julio de 2022	11 de junio de 2022	T1S-P13-S1-1303-DP	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
379	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de julio de 2022	11 de junio de 2022	T1S-P13-S1-1303-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
380	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de julio de 2022	11 de junio de 2022	T1S-P13-S2-1305-D3	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
381	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		14 de julio de 2022	11 de junio de 2022	T1S-P13-S2-1305-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
382	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		14 de julio de 2022	11 de junio de 2022	T1S-P13-S2-1305-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
383	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		14 de julio de 2022	11 de junio de 2022	T1S-P13-S2-1306-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
384	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de julio de 2022	11 de junio de 2022	T1S-P13-S2-1306-cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	6	2022
416	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		2 de julio de 2022	18 de junio de 2022	T1S-P4-S1-403-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
417	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		2 de julio de 2022	18 de junio de 2022	T1S-P4-S1-403-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
418	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		2 de julio de 2022	18 de junio de 2022	T1S-P4-S3-407-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
419	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		2 de julio de 2022	18 de junio de 2022	T1S-P4-S3-407-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
420	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		2 de julio de 2022	18 de junio de 2022	T1S-P4-S3-408-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
421	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		2 de julio de 2022	18 de junio de 2022	T1S-P4-S4-402-pasadizo	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
447	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de julio de 2022	15 de junio de 2022	T1S-P13-S3-1307-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
448	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de julio de 2022	15 de junio de 2022	T1S-P13-S3-1307-sala	A-5	Mano de obra	Arquitectura	6	2022
449	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de julio de 2022	15 de junio de 2022	T1S-P13-S3-1307-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
450	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		15 de julio de 2022	15 de junio de 2022	T1S-P13-S3-1308-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
451	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		15 de julio de 2022	15 de junio de 2022	T1S-P13-S3-1308-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
452	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		15 de julio de 2022	15 de junio de 2022	T1S-P13-S3-1308-D3	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
453	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de julio de 2022	15 de junio de 2022	T1S-P13-S3-1308-BP	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
454	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		16 de julio de 2022	16 de junio de 2022	T1S-P13-S4-1301-D2	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
455	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		16 de julio de 2022	16 de junio de 2022	T1S-P13-S4-1301-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
456	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		16 de julio de 2022	16 de junio de 2022	T1S-P13-S4-1301-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
457	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		16 de julio de 2022	16 de junio de 2022	T1S-P13-S4-1301-cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	6	2022
458	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		16 de julio de 2022	16 de junio de 2022	T1S-P13-S4-1302-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
459	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		16 de julio de 2022	16 de junio de 2022	T1S-P13-S4-1302-cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	6	2022
460	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		16 de julio de 2022	16 de junio de 2022	T1S-P13-S4-1302-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
461	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		16 de julio de 2022	16 de junio de 2022	T1S-P13-S4-1302-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
462	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		17 de julio de 2022	17 de junio de 2022	T1S-P14-S1-1404-D2	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
463	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		17 de julio de 2022	17 de junio de 2022	T1S-P14-S1-1404-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
464	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de julio de 2022	17 de junio de 2022	T1S-P14-S1-1403-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
465	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		17 de julio de 2022	17 de junio de 2022	T1S-P14-S1-1403-sala	A-5	Mano de obra	Arquitectura	6	2022
466	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de julio de 2022	17 de junio de 2022	T1S-P14-S1-1403-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
467	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		18 de julio de 2022	18 de junio de 2022	T1S-P14-S2-1405-sala	A-5	Mano de obra	Arquitectura	6	2022
468	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		18 de julio de 2022	18 de junio de 2022	T1S-P14-S2-1405-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
469	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		18 de julio de 2022	18 de junio de 2022	T1S-P14-S2-1405-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
470	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		18 de julio de 2022	18 de junio de 2022	T1S-P14-S2-1406-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
471	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		18 de julio de 2022	18 de junio de 2022	T1S-P14-S2-1406-D3	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
472	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desplome		6 de julio de 2022	22 de junio de 2022	T1S-P5-S4-501-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
473	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		20 de julio de 2022	20 de junio de 2022	T1S-P14-S3-1407-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
474	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		20 de julio de 2022	20 de junio de 2022	T1S-P14-S3-1407-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
475	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		20 de julio de 2022	20 de junio de 2022	T1S-P14-S3-1407-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
501	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		20 de julio de 2022	20 de junio de 2022	T1S-P14-S3-1408-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
502	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		20 de julio de 2022	20 de junio de 2022	T1S-P14-S3-1408-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
503	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de julio de 2022	21 de junio de 2022	T1S-P14-S4-1401-DP	A-5	Mano de obra	Arquitectura	6	2022
504	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de julio de 2022	21 de junio de 2022	T1S-P14-S4-1401-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
505	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de julio de 2022	21 de junio de 2022	T1S-P14-S4-1402-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
506	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de julio de 2022	21 de junio de 2022	T1S-P14-S4-1402-D3	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
507	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		21 de julio de 2022	21 de junio de 2022	T1S-P14-S4-1402-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
508	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		22 de julio de 2022	22 de junio de 2022	T1S-P15-S1-1504-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
509	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		22 de julio de 2022	22 de junio de 2022	T1S-P15-S1-1504-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
510	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		22 de julio de 2022	22 de junio de 2022	T1S-P15-S1-1504-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
511	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		22 de julio de 2022	22 de junio de 2022	T1S-P15-S1-1503-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
512	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		22 de julio de 2022	22 de junio de 2022	T1S-P15-S1-1503-D2	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
513	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		23 de julio de 2022	23 de junio de 2022	T1S-P15-S2-1505-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
514	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		23 de julio de 2022	23 de junio de 2022	T1S-P15-S2-1505-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
515	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		23 de julio de 2022	23 de junio de 2022	T1S-P15-S2-1506-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
516	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de julio de 2022	24 de junio de 2022	T1S-P15-S3-1507-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
517	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		24 de julio de 2022	24 de junio de 2022	T1S-P15-S3-1507-D2	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
518	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		24 de julio de 2022	24 de junio de 2022	T1S-P15-S3-1508-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
519	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias	[redacted]	24 de julio de 2022	24 de junio de 2022	T1S-P1S-S3-1508-sala	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
520	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		25 de julio de 2022	25 de junio de 2022	T1S-P1S-S4-1501-sala	A-S	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
521	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		25 de julio de 2022	25 de junio de 2022	T1S-P1S-S4-1502-cocina	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
522	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		25 de julio de 2022	25 de junio de 2022	T1S-P1S-S4-1502-sala	A-S	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
523	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		27 de julio de 2022	27 de junio de 2022	T1S-P16-S1-1604-sala	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
524	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		27 de julio de 2022	27 de junio de 2022	T1S-P16-S1-1604-BV	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
525	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		27 de julio de 2022	27 de junio de 2022	T1S-P16-S1-1604-BV	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
526	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		27 de julio de 2022	27 de junio de 2022	T1S-P16-S1-1603-cocina	A-S	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
527	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		28 de julio de 2022	28 de junio de 2022	T1S-P16-S2-1605-D3	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
528	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		28 de julio de 2022	28 de junio de 2022	T1S-P16-S2-1605-sala	A-S	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
529	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		28 de julio de 2022	28 de junio de 2022	T1S-P16-S2-1606-sala	A-S	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
530	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		28 de julio de 2022	28 de junio de 2022	T1S-P16-S2-1606-sala	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
531	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		28 de julio de 2022	28 de junio de 2022	T1S-P16-S2-1606-BV	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
532	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		30 de julio de 2022	30 de junio de 2022	T1S-P16-S3-1607-DP	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
533	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de julio de 2022	30 de junio de 2022	T1S-P16-S3-1607-pasadizo	A-S	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
534	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de julio de 2022	30 de junio de 2022	T1S-P16-S3-1608-D2	A-S	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
535	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de julio de 2022	30 de junio de 2022	T1S-P16-S3-1608-DP	A-S	Mano de obra	Arquitectura	6	2022
541	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		1 de agosto de 2022	1 de julio de 2022	T1S-P16-S4-1601-D2	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
542	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de agosto de 2022	1 de julio de 2022	T1S-P16-S4-1601-cocina	A-S	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
543	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de agosto de 2022	1 de julio de 2022	T1S-P16-S4-1601-cocina	A-S	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
544	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de agosto de 2022	1 de julio de 2022	T1S-P16-S4-1602-D2	A-S	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
545	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		1 de agosto de 2022	1 de julio de 2022	T1S-P16-S4-1602-DP	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
546	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		2 de agosto de 2022	2 de julio de 2022	T1S-P7-S1-703-D2	A-S	Fallas del material	Arquitectura	6	2022
547	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		8 de agosto de 2022	8 de julio de 2022	T1S-P8-S1-805-DP	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
548	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		2 de agosto de 2022	2 de julio de 2022	T1S-P17-S1-1704-BV	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
549	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		2 de agosto de 2022	2 de julio de 2022	T1S-P17-S1-1704-BV	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
550	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		2 de agosto de 2022	2 de julio de 2022	T1S-P17-S1-1704-D3	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
551	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		2 de agosto de 2022	2 de julio de 2022	T1S-P17-S1-1703-DP	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
552	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		2 de agosto de 2022	2 de julio de 2022	T1S-P17-S1-1703-cocina	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	6	2022
553	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		4 de agosto de 2022	4 de julio de 2022	T1S-P17-S2-1705-cocina	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
554	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de agosto de 2022	4 de julio de 2022	T1S-P17-S2-1705-cocina	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
555	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		4 de agosto de 2022	4 de julio de 2022	T1S-P17-S2-1705-D3	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
556	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de agosto de 2022	4 de julio de 2022	T1S-P17-S2-1706-cocina	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
557	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		4 de agosto de 2022	4 de julio de 2022	T1S-P17-S2-1706-sala	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
558	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de agosto de 2022	5 de julio de 2022	T1S-P17-S3-1707-sala	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
559	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de agosto de 2022	5 de julio de 2022	T1S-P17-S3-1707-cocina	A-S	Mano de obra	Arquitectura	7	2022
560	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de agosto de 2022	5 de julio de 2022	T1S-P17-S3-1707-cocina	A-S	Mano de obra	Arquitectura	7	2022
561	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de agosto de 2022	5 de julio de 2022	T1S-P17-S3-1708-cocina	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
562	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		5 de agosto de 2022	5 de julio de 2022	T1S-P17-S3-1708-sala	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
563	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		6 de agosto de 2022	6 de julio de 2022	T1S-P17-S4-1701-DP	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
564	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		6 de agosto de 2022	6 de julio de 2022	T1S-P17-S4-1701-D3	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
565	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		6 de agosto de 2022	6 de julio de 2022	T1S-P17-S4-1702-D3	A-S	Mano de obra	Arquitectura	7	2022
566	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		6 de agosto de 2022	6 de julio de 2022	T1S-P17-S4-1702-DP	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
567	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		7 de agosto de 2022	7 de julio de 2022	T1S-P18-S1-1804-BV	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
568	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		7 de agosto de 2022	7 de julio de 2022	T1S-P18-S1-1804-BV	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
569	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		7 de agosto de 2022	7 de julio de 2022	T1S-P18-S1-1803-DP	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
570	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		7 de agosto de 2022	7 de julio de 2022	T1S-P18-S1-1803-D3	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
571	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de agosto de 2022	8 de julio de 2022	T1S-P18-S2-1805-DP	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
572	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		8 de agosto de 2022	8 de julio de 2022	T1S-P18-S2-1805-D2	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
573	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		8 de agosto de 2022	8 de julio de 2022	T1S-P18-S2-1806-sala	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
574	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de agosto de 2022	8 de julio de 2022	T1S-P18-S2-1806-D3	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
575	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		9 de agosto de 2022	9 de julio de 2022	T1S-P18-S3-1807-cocina	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
576	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de agosto de 2022	9 de julio de 2022	T1S-P18-S3-1807-D2	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
577	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		9 de agosto de 2022	9 de julio de 2022	T1S-P18-S3-1807-DP	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
578	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de agosto de 2022	9 de julio de 2022	T1S-P18-S3-1808-DP	A-S	Mano de obra	Arquitectura	7	2022
579	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Desalineamiento		18 de julio de 2022	11 de julio de 2022	T1S-801-Bv	A-S	Error en procedimiento	Arquitectura	7	2022
580	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Protuberancias		22 de julio de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P10-1002-BP	A-S	Error en procedimiento	Arquitectura	7	2022
581	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Protuberancias		22 de julio de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P10-108-BP	A-S	Error en procedimiento	Arquitectura	7	2022
582	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Dimensiones incorrectas		25 de julio de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P9-S4-901-Star	A-S	Error en procedimiento	Arquitectura	7	2022
583	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Trabajo inconcluso		25 de julio de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P9-903-DS	A-S	Error en procedimiento	Arquitectura	7	2022
586	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1801-DP	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
587	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1801-DP	A-S	Mano de obra	Arquitectura	7	2022
588	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1801-DP	A-S	Mano de obra	Arquitectura	7	2022
589	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1801-D3	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
590	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1801-D3	A-S	Mano de obra	Arquitectura	7	2022
591	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1801-Sala	A-S	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
592	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1801-Sala	A-S	Fallas del material	Arquitectura	7	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
593	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	[redacted]	11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1802-Sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
594	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1802-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
595	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1802-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
596	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1802-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
597	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1802-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
598	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desplome		11 de agosto de 2022	11 de julio de 2022	T1S-P18-S4-1802-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
599	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de agosto de 2022	12 de julio de 2022	T1S-P19-S1-1904-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
600	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de agosto de 2022	12 de julio de 2022	T1S-P19-S1-1904-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
601	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		12 de agosto de 2022	12 de julio de 2022	T1S-P19-S1-1904-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
602	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de agosto de 2022	12 de julio de 2022	T1S-P19-S1-1904-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
603	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de agosto de 2022	12 de julio de 2022	T1S-P19-S1-1904-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
604	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		12 de agosto de 2022	12 de julio de 2022	T1S-P19-S1-1903-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
605	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de agosto de 2022	12 de julio de 2022	T1S-P19-S1-1903-cocina	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
606	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de agosto de 2022	12 de julio de 2022	T1S-P19-S1-1903-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
607	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de agosto de 2022	12 de julio de 2022	T1S-P19-S1-1903-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
608	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de agosto de 2022	12 de julio de 2022	T1S-P19-S1-1903-pasadizo	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
609	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		13 de agosto de 2022	13 de julio de 2022	T1S-P19-S2-1905-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
610	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		13 de agosto de 2022	13 de julio de 2022	T1S-P19-S2-1905-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
611	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		13 de agosto de 2022	13 de julio de 2022	T1S-P19-S2-1905-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
612	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		13 de agosto de 2022	13 de julio de 2022	T1S-P19-S2-1905-cocina	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
613	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		13 de agosto de 2022	13 de julio de 2022	T1S-P19-S2-1906-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
614	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		13 de agosto de 2022	13 de julio de 2022	T1S-P19-S2-1906-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
615	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		13 de agosto de 2022	13 de julio de 2022	T1S-P19-S2-1906-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
616	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		13 de agosto de 2022	13 de julio de 2022	T1S-P19-S2-1906-BV	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
617	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		14 de agosto de 2022	14 de julio de 2022	T1S-P19-S3-1907-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
618	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		14 de agosto de 2022	14 de julio de 2022	T1S-P19-S3-1907-pasadizo	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
619	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de agosto de 2022	14 de julio de 2022	T1S-P19-S3-1907-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
620	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		14 de agosto de 2022	14 de julio de 2022	T1S-P19-S3-1908-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
621	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		14 de agosto de 2022	14 de julio de 2022	T1S-P19-S3-1908-D3	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
622	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de agosto de 2022	14 de julio de 2022	T1S-P19-S3-1908-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
623	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		14 de agosto de 2022	14 de julio de 2022	T1S-P19-S3-1908-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
624	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		15 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P19-S4-1901-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
625	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		15 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P19-S4-1901-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
626	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P19-S4-1901-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
627	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P19-S4-1901-D2	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
628	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P19-S4-1901-pasadizo	A-5	Mano de obra	Arquitectura	7	2022
629	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P19-S4-1901-D3	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
630	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P19-S4-1902-sala	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
631	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		15 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P19-S4-1902-sala	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
632	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P19-S4-1902-cocina	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
633	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P19-S4-1902-D3	A-5	Fallas del material	Arquitectura	7	2022
634	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		15 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P19-S4-1902-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
635	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		15 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	T1S-P19-S4-1902-DP	A-5	Usos del encofrado	Arquitectura	7	2022
636	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Quiñe		19 de agosto de 2022	5 de agosto de 2022	T1S-1301-DP	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
637	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Fisura		19 de agosto de 2022	5 de agosto de 2022	T1S-1302-DP	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
638	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		28 de julio de 2022	21 de julio de 2022	T1S-P10-S1-1004-sala	A-5	Mano de obra	Arquitectura	7	2022
639	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		28 de julio de 2022	21 de julio de 2022	T1S-P10-S1-1003-cocina	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	7	2022
640	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Trabajo inconcluso		28 de julio de 2022	21 de julio de 2022	T1S-P10-S4-1001-cocina	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	7	2022
641	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Trabajo inconcluso		28 de julio de 2022	21 de julio de 2022	T1S-P10-S3-1007-cocina	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	7	2022
646	Acero	closed	Quality	Acero	Trabajo inconcluso		1 de agosto de 2022	25 de julio de 2022	T1S-P21-S2	E-7	Error en procedimiento	Estructuras	7	2022
647	Acero	closed	Quality	Acero	Armado incorrecto		1 de agosto de 2022	25 de julio de 2022	T1S-P21-S1	E-7	Error en procedimiento	Estructuras	7	2022
648	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de setiembre de 2022	11 de agosto de 2022	T1S-P20-S4-2001-Sala	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
649	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de setiembre de 2022	11 de agosto de 2022	T1S-P20-S4-2001-Sala	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
650	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de setiembre de 2022	11 de agosto de 2022	T1S-P20-S4-2002-DP	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
651	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de setiembre de 2022	11 de agosto de 2022	T1S-P20-S4-2002-D3	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
652	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de setiembre de 2022	11 de agosto de 2022	T1S-P20-S4-2002-D3	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
653	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de setiembre de 2022	11 de agosto de 2022	T1S-P20-S4-2002-D2	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
654	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de setiembre de 2022	11 de agosto de 2022	T1S-P20-S4-2002-Cocina	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
656	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T1S-P20-S1-2003-Sala	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
657	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T1S-P20-S1-2003-D2	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
658	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T1S-P20-S1-2003-D2.	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
659	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T1S-P20-S1-2003-Estar	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
660	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T1S-P21-S1-2003	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
661	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T1S-P21-S1-2003	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
662	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T1S-P20-S1-2004-DP	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
663	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T1S-P20-S1-2004-Sala	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
664	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T1S-P20-S1-2004-D3	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
665	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	[redacted]	13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S1-2004-D3	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
666	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P21-S1-2004	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
667	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P21-S1-2004	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
668	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P21-S1-2004	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
669	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S2-2005-DP	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
670	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S2-2005-DP	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
672	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S2-2006-Sala	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
673	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S2-2005-Sala	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
674	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S2-2005-Sala	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
675	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P21-S2-2005	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
676	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P21-S2-2005	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
678	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S2-2006-Sala	A-6	Usos del encofrado	Arquitectura	8	2022
679	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Segregación		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S2-2006-Sala	A-6	Mano de obra	Arquitectura	8	2022
680	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S2-2006-Sala	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
681	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P21-S2-2006	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
682	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S3-2007-DP	A-6	Usos del encofrado	Arquitectura	8	2022
684	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S3-2007-D2	A-6	Usos del encofrado	Arquitectura	8	2022
685	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Segregación		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S3-2007-DP	A-6	Mano de obra	Arquitectura	8	2022
686	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S3-2007-Sala	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
688	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S3-2007-Sala	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
689	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S3-2007-Cocina	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
692	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S3-2008-DP	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
693	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S3-2008-D2	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
694	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S3-2008-DP	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
695	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P20-S3-2008-D3	A-6	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
696	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancias		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P21-S3	A-7	Usos del encofrado	Arquitectura	8	2022
697	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P21-S3	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
698	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P21-S3	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
699	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P21-S4	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
700	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P21-S4	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
701	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de setiembre de 2022	13 de agosto de 2022	T15-P21-S4	A-7	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
702	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		25 de agosto de 2022	18 de agosto de 2022	T15-1301-DS	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
703	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia		25 de agosto de 2022	18 de agosto de 2022	T15-1302-Sala	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
704	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		25 de agosto de 2022	18 de agosto de 2022	T15-1302-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
705	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		25 de agosto de 2022	18 de agosto de 2022	T15-1305-DS	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
706	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		2 de setiembre de 2022	23 de agosto de 2022	T15-P14-1404-DP	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
707	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		2 de setiembre de 2022	23 de agosto de 2022	T15-P14-1405-cocina	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
708	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		2 de setiembre de 2022	23 de agosto de 2022	T15-P14-1408-D2	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
709	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S1-107-Cocina	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
711	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S1-107-Estar	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
712	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S1-107-DP	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
713	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S1-107-Pasadizo	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
714	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S1-108-D2	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
715	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S1-108-DP	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
716	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S1-108-Pasadizo	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
717	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S1-108-Pasadizo	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
718	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S2-104-Cocina	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
719	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S2-104-Cocina	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
720	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S2-104-Cocina	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
721	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S2-104-Sala	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
722	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S2-105-Cocina	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
723	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S2-105-D2	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
725	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S2-105-Pasadizo	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
726	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S3-102-DP	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
727	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S3-102-Pasadizo	A-16	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
728	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S3-102-Sala	A-16	0	Arquitectura	8	2022
729	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S3-103-Cocina	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
730	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S3-103-Pasadizo	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
732	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S4-101-BV	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
733	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S4-101-D2	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
734	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S4-101-D2	A-16	0	Arquitectura	8	2022
735	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S4-101-D2	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
736	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S4-101-DP	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
737	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S4-106-BV	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
738	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S4-106-Cocina	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
739	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S4-106-D2	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
740	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S4-106-DP	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
741	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	[redacted]	17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S5-109-Cocina	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
742	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S5-109-DP	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
743	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S5-109-pasadizo	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
744	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S5-109-pasadizo	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
745	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S5-109-pasadizo	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
746	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S5-110-Cocina	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
747	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de setiembre de 2022	17 de agosto de 2022	T16-P1-S5-110-DP	A-16	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
748	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Trabajo inconcluso		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T1S-P15-1504-BP	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
749	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T1S-P15-1504-DP	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
750	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Trabajo inconcluso		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T1S-P15-1501-Sala	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
751	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T1S-P15-1506-D2	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	8	2022
752	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S1-207-D2	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
753	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S1-207-DP	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
754	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S1-208-Cocina.	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
755	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S1-208-Cocina	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
756	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S1-208-DP	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
757	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S2-204-Cocina.	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
758	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S2-204-Cocina	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
759	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S2-205-Cocina	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
760	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S3-202-D2.	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
761	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S3-202-D2	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
762	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S3-204-cocina	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
763	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S3-204-sala	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
764	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S4-201-Cocina	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
765	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S4-201-D2	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
766	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S4-206-cocina-	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
767	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S4-206-D2.	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
768	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S4-206-D2	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
769	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de setiembre de 2022	24 de agosto de 2022	T16-P2-S4-206-DP	A-17	Fallas del material	Arquitectura	8	2022
770	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Trabajo inconcluso		14 de setiembre de 2022	7 de setiembre de 2022	T1S-P18-1805-DP	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	9	2022
771	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P2-S5-209-DP	A-17	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
772	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P2-S5-209-pasillo	A-17	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
773	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P2-S5-210-D2	A-17	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
774	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P2-S5-210-D3	A-17	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
775	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P3-S1-307-cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
776	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P3-S1-307-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
777	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P3-S1-307-pasillo	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
778	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P3-S1-308-cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
779	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P3-S1-308-D3	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
780	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P3-S1-308-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
781	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P3-S2-304-Cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
782	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P3-S2-304-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
783	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P3-S2-304-sala	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
784	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P3-S2-305-D2	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
785	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P3-S2-305-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
786	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		30 de setiembre de 2022	31 de agosto de 2022	T16-P3-S2-305-Lavanderia	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
787	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de octubre de 2022	2 de setiembre de 2022	T16-P3-S3-302-Pasillo	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
788	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de octubre de 2022	2 de setiembre de 2022	T16-P3-S3-302-Sala	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
789	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de octubre de 2022	2 de setiembre de 2022	T16-P3-S3-303-BV	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
790	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de octubre de 2022	2 de setiembre de 2022	T16-P3-S3-303-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
791	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		2 de octubre de 2022	2 de setiembre de 2022	T16-P3-S3-303-sala	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
987	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P3-S4-301-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
988	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P3-S4-301-Estar	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
989	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P3-S4-306-Cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
990	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P3-S4-306-D3	A-18	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
991	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P3-S4-306-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
992	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P3-S5-309-Cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
993	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P3-S5-309-D2	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
994	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P3-S5-309-Sala	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
995	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		5 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P3-S5-310-BV	A-18	Usos del encofrado	Arquitectura	9	2022
996	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P3-S5-310-Cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
997	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P3-S5-310-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
998	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		6 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S1-408-Cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
999	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		6 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S1-408-D3	A-18	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1000	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		6 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S1-408-Pasaillo	A-18	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1001	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		6 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S2-404-BP	A-18	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1002	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S2-404-Cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1003	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	[redacted]	8 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S2-404-D2	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1004	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S2-405-cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1005	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S2-405-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1006	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S2-405-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1007	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S2-405-Estar	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1008	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S2-405-sala	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1009	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S3-402-Cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1010	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S3-402-D2	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1011	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S3-402-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1012	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		9 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S3-403-BV	A-18	Usos del encofrado	Arquitectura	9	2022
1013	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S3-403-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1014	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S3-403-Sala.	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1016	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S4-401-BP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1017	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S4-401-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1018	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S4-401-Estar	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1019	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S4-401-Sala	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1020	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		10 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S4-406-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1021	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S5-409-Cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1022	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S5-409-D2	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1023	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S5-409-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1024	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S5-410-Cocina.	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1025	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de octubre de 2022	12 de setiembre de 2022	T16-P4-S5-410-D3	A-18	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1026	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Trabajo inconcluso		29 de setiembre de 2022	22 de setiembre de 2022	T15-2001-DP	A-6	Error en procedimiento	Arquitectura	9	2022
1027	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Quiñe		29 de setiembre de 2022	22 de setiembre de 2022	T15-2003-DP	A-6	Error en procedimiento	Arquitectura	9	2022
1028	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Despostillamiento		29 de setiembre de 2022	22 de setiembre de 2022	T15-2101-Star	A-7	Error en procedimiento	Arquitectura	9	2022
1029	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Desalineamiento		29 de setiembre de 2022	22 de setiembre de 2022	T15-2102-Escalera	A-7	Error en procedimiento	Arquitectura	9	2022
1030	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de octubre de 2022	13 de setiembre de 2022	T16-P5-S1-507-DP	A-18	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1031	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de octubre de 2022	13 de setiembre de 2022	T16-P5-S1-507-Star	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1032	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		13 de octubre de 2022	13 de setiembre de 2022	T16-P5-S1-508-BV	A-18	Usos del encofrado	Arquitectura	9	2022
1033	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de octubre de 2022	14 de setiembre de 2022	T16-P5-S2-504-Cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1034	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de octubre de 2022	14 de setiembre de 2022	T16-P5-S2-504-D2	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1035	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de octubre de 2022	14 de setiembre de 2022	T16-P5-S2-504-Dp	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1036	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de octubre de 2022	14 de setiembre de 2022	T16-P5-S2-505-Cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1037	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de octubre de 2022	14 de setiembre de 2022	T16-P5-S2-505-D2	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1038	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de octubre de 2022	14 de setiembre de 2022	T16-P5-S2-505-DP	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1039	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de octubre de 2022	15 de setiembre de 2022	T16-P5-S3-502-Star	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1040	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		15 de octubre de 2022	15 de setiembre de 2022	T16-P5-S3-503-BV1	A-18	Usos del encofrado	Arquitectura	9	2022
1041	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de octubre de 2022	16 de setiembre de 2022	T16-P5-S4-501-BV	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1042	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de octubre de 2022	16 de setiembre de 2022	T16-P5-S4-501-Star	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1043	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de octubre de 2022	16 de setiembre de 2022	T16-P5-S4-506-cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1044	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de octubre de 2022	16 de setiembre de 2022	T16-P5-S4-506-D3	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1045	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de octubre de 2022	17 de setiembre de 2022	T16-P5-S5-509-D2	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1046	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de octubre de 2022	17 de setiembre de 2022	T16-P5-S5-509-sala	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1047	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de octubre de 2022	17 de setiembre de 2022	T16-P5-S5-510-sala	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1048	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de octubre de 2022	17 de setiembre de 2022	T16-P5-S5-510-pasillo	A-18	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1049	Enchape	closed	Quality	Enchape	Quiñe		1 de octubre de 2022	17 de setiembre de 2022	T15-P14-1406	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	9	2022
1050	Enchape	closed	Quality	Enchape	Despostillamiento		1 de octubre de 2022	17 de setiembre de 2022	T15-P14-1407	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	9	2022
1051	Enchape	closed	Quality	Enchape	Quiñe		5 de octubre de 2022	21 de setiembre de 2022	T15-P20-AC	A-6	Error en procedimiento	Arquitectura	9	2022
1052	Enchape	closed	Quality	Enchape	Material defectuoso		5 de octubre de 2022	21 de setiembre de 2022	T15-P20-AC	A-6	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1053	Enchape	closed	Quality	Enchape	Quiñe		5 de octubre de 2022	21 de setiembre de 2022	T15-P20-Balcón	A-6	Error en procedimiento	Arquitectura	9	2022
1054	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		19 de octubre de 2022	19 de setiembre de 2022	T16-P6-S1-608-pasillo	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1055	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		19 de octubre de 2022	19 de setiembre de 2022	T16-P6-S1-608-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1056	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		19 de octubre de 2022	19 de setiembre de 2022	T16-P6-S1-608-BV	A-19	Usos del encofrado	Arquitectura	9	2022
1057	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		19 de octubre de 2022	19 de setiembre de 2022	T16-P6-S1-607-Star	A-19	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1058	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		19 de octubre de 2022	19 de setiembre de 2022	T16-P6-S1-607-Pasillo	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1059	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		23 de octubre de 2022	23 de setiembre de 2022	T16-P6-S5-609-Sala	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1060	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		23 de octubre de 2022	23 de setiembre de 2022	T16-P6-S5-609-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1061	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		23 de octubre de 2022	23 de setiembre de 2022	T16-P6-S5-610-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1062	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		23 de octubre de 2022	23 de setiembre de 2022	T16-P6-S5-610-Pasillo	A-19	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1063	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		22 de octubre de 2022	22 de setiembre de 2022	T16-P6-S4-601-Cocina	A-19	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1064	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		22 de octubre de 2022	22 de setiembre de 2022	T16-P6-S4-601-Star	A-19	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1065	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		22 de octubre de 2022	22 de setiembre de 2022	T16-P6-S4-601-DP	A-19	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1066	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		22 de octubre de 2022	22 de setiembre de 2022	T16-P6-S4-606-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1067	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		22 de octubre de 2022	22 de setiembre de 2022	T16-P6-S4-606-DP	A-19	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1068	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		22 de octubre de 2022	22 de setiembre de 2022	T16-P6-S4-606-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1069	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		20 de octubre de 2022	20 de setiembre de 2022	T16-P6-S2-605-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1070	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		20 de octubre de 2022	20 de setiembre de 2022	T16-P6-S2-605-Pasillo	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1071	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	[redacted]	20 de octubre de 2022	20 de setiembre de 2022	T16-P6-S2-604-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1072	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		20 de octubre de 2022	20 de setiembre de 2022	T16-P6-S2-604-BP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1073	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de octubre de 2022	20 de setiembre de 2022	T16-P6-S2-604-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1074	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		21 de octubre de 2022	21 de setiembre de 2022	T16-P6-S3-603-BV	A-19	Usos del encofrado	Arquitectura	9	2022
1075	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de octubre de 2022	21 de setiembre de 2022	T16-P6-S3-603-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1076	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de octubre de 2022	21 de setiembre de 2022	T16-P6-S3-602-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1077	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de octubre de 2022	21 de setiembre de 2022	T16-P6-S3-602-Star	A-19	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1078	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S1-708-d2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1079	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S1-708-BV	A-19	Usos del encofrado	Arquitectura	9	2022
1080	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S1-707-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1081	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S5-709-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1082	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S5-709-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1083	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S4-701-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1084	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S4-706-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1085	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S4-706-DP	A-19	Usos del encofrado	Arquitectura	9	2022
1086	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S2-704-BV	A-19	Usos del encofrado	Arquitectura	9	2022
1087	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S2-704-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1088	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S2-705-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1089	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S3-703-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1090	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S3-703-BV	A-19	Usos del encofrado	Arquitectura	9	2022
1091	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S3-702-Cocina	A-19	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1092	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S3-702-Star	A-19	Mano de obra	Arquitectura	9	2022
1093	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S4-701-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1094	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de noviembre de 2022	1 de octubre de 2022	T16-P7-S5-710-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	9	2022
1095	Enchape	closed	Quality	Enchape	Mal acabado		20 de octubre de 2022	6 de octubre de 2022	T15-P18-1802-BP	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1096	Enchape	closed	Quality	Enchape	Mal acabado		20 de octubre de 2022	6 de octubre de 2022	T15-P181803-BP	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1097	Enchape	closed	Quality	Enchape	Mal acabado		20 de octubre de 2022	6 de octubre de 2022	T15-P18-1807-Cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	10	2022
1098	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de noviembre de 2022	4 de octubre de 2022	T16-P8-S1-808-BP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1099	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		4 de noviembre de 2022	4 de octubre de 2022	T16-P8-S1-808-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1100	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de noviembre de 2022	4 de octubre de 2022	T16-P8-S1-807-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1101	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de noviembre de 2022	6 de octubre de 2022	T16-P8-S5-809-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1102	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de noviembre de 2022	6 de octubre de 2022	T16-P8-S5-809-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1103	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de noviembre de 2022	6 de octubre de 2022	T16-P8-S5-810-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1104	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de noviembre de 2022	6 de octubre de 2022	T16-P8-S5-810-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1105	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de noviembre de 2022	5 de octubre de 2022	T16-P8-S4-801-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1106	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de noviembre de 2022	5 de octubre de 2022	T16-P8-S4-806-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1107	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de noviembre de 2022	5 de octubre de 2022	T16-P8-S2-805-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1108	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de noviembre de 2022	4 de octubre de 2022	T16-P8-S2-804-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1109	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		4 de noviembre de 2022	4 de octubre de 2022	T16-P8-S2-804-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1110	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		5 de noviembre de 2022	5 de octubre de 2022	T16-P8-S3-803-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1111	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de noviembre de 2022	5 de octubre de 2022	T16-P8-S3-803-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1112	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de noviembre de 2022	5 de octubre de 2022	T16-P8-S3-802-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1113	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		11 de noviembre de 2022	11 de octubre de 2022	T16-P9-S1-908-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1114	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de noviembre de 2022	11 de octubre de 2022	T16-P9-S1-908-Sala	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1115	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de noviembre de 2022	11 de octubre de 2022	T16-P9-S1-907-BP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1116	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de noviembre de 2022	11 de octubre de 2022	T16-P9-S1-907-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1117	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		7 de octubre de 2022	3 de octubre de 2022	T15-P20-X02	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1118	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		7 de octubre de 2022	3 de octubre de 2022	T15-P17-X02	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1119	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Rayadura		7 de octubre de 2022	3 de octubre de 2022	T15-P15-X02	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1120	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Quiñe		7 de octubre de 2022	3 de octubre de 2022	T15-P14-X02	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1121	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Pintura veteada		7 de octubre de 2022	3 de octubre de 2022	T15-P13-X02	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1122	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		7 de octubre de 2022	3 de octubre de 2022	T15-P10-X02	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1123	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Quiñe		7 de octubre de 2022	3 de octubre de 2022	T15-P10-X02	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1124	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		7 de octubre de 2022	3 de octubre de 2022	T15-P06-X02	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1125	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Quiñe		7 de octubre de 2022	3 de octubre de 2022	T15-P04-X02	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1126	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		7 de octubre de 2022	3 de octubre de 2022	T15-P02-X02	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1127	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de noviembre de 2022	10 de octubre de 2022	T16-P9-S2-905-DP	A-19	Mano de obra	Arquitectura	10	2022
1128	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de noviembre de 2022	10 de octubre de 2022	T16-P9-S2-905-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1129	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de noviembre de 2022	10 de octubre de 2022	T16-P9-S2-904-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1130	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		12 de noviembre de 2022	10 de octubre de 2022	T16-P9-S2-904-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1131	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de noviembre de 2022	10 de octubre de 2022	T16-P9-S3-903-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1132	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de noviembre de 2022	10 de octubre de 2022	T16-P9-S3-903-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1133	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de noviembre de 2022	10 de octubre de 2022	T16-P9-S3-902-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1134	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de noviembre de 2022	11 de octubre de 2022	T16-P9-S4-906-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1135	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de noviembre de 2022	12 de octubre de 2022	T16-P9-S5-910-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1136	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		12 de noviembre de 2022	12 de octubre de 2022	T16-P9-S5-909-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1137	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de diciembre de 2022	12 de octubre de 2022	T16-P9-S5-909-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1138	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Rayadura	[redacted]	19 de octubre de 2022	12 de octubre de 2022	T15-P15-X06	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1139	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		19 de octubre de 2022	12 de octubre de 2022	T15-P14-X06	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1140	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		19 de octubre de 2022	12 de octubre de 2022	T15-P6-X06	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1141	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Protuberancia		19 de octubre de 2022	12 de octubre de 2022	T15-P3-X06	A-4	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1146	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Trabajo inconcluso		11 de octubre de 2022	11 de octubre de 2022	T16-P9-S5	E-12	Error en procedimiento	Estructuras	10	2022
1147	Acero	closed	Quality	Acero	Trabajo inconcluso		13 de octubre de 2022	13 de octubre de 2022	T16-P10-S2	E-12	Error en procedimiento	Estructuras	10	2022
1148	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Trabajo inconcluso		15 de octubre de 2022	15 de octubre de 2022	T16-P10-S4	E-12	Error en procedimiento	Estructuras	10	2022
1149	Enchape	closed	Quality	Enchape	Mal acabado		20 de octubre de 2022	13 de octubre de 2022	T15-P20-2004-Terraza	A-7	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1150	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Quiñe		24 de octubre de 2022	17 de octubre de 2022	T16-P2-S4-201-BP	A-17	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1151	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de noviembre de 2022	13 de octubre de 2022	T16-P10-S1-1007-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1152	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de noviembre de 2022	13 de octubre de 2022	T16-P10-S1-1007-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1153	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		13 de noviembre de 2022	13 de octubre de 2022	T16-P10-S1-1008-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1154	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de noviembre de 2022	14 de octubre de 2022	T16-P10-S2-1004-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1155	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de noviembre de 2022	14 de octubre de 2022	T16-P10-S2-1005-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1156	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		14 de noviembre de 2022	14 de octubre de 2022	T16-P10-S2-1005-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1157	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de noviembre de 2022	15 de octubre de 2022	T16-P10-S3-1002-DP	A-19	Mano de obra	Arquitectura	10	2022
1158	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de noviembre de 2022	15 de octubre de 2022	T16-P10-S3-1003-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1159	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de noviembre de 2022	17 de octubre de 2022	T16-P10-S4-1001-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1160	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de noviembre de 2022	17 de octubre de 2022	T16-P10-S4-1001-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1162	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		18 de noviembre de 2022	18 de octubre de 2022	T16-P10-S5-1009-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1163	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		18 de noviembre de 2022	18 de octubre de 2022	T16-P10-S5-1009-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1164	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mancha		29 de octubre de 2022	22 de octubre de 2022	T15-P16-X05	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1165	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Quiñe		29 de octubre de 2022	22 de octubre de 2022	T15-P13-X05	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1166	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		29 de octubre de 2022	22 de octubre de 2022	T15-P12-X05	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1167	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		29 de octubre de 2022	22 de octubre de 2022	T15-P11-X05	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1168	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Quiñe		29 de octubre de 2022	22 de octubre de 2022	T15-P09-X05	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1169	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Rayadura		29 de octubre de 2022	22 de octubre de 2022	T15-P06-X05	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1170	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		29 de octubre de 2022	22 de octubre de 2022	T15-P05-X05	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1171	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		29 de octubre de 2022	22 de octubre de 2022	T15-P04-X05	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1172	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Rayadura		29 de octubre de 2022	22 de octubre de 2022	T15-P03-X05	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1173	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Falta resanar		29 de octubre de 2022	22 de octubre de 2022	T15-P02-X05	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1174	Enchape	closed	Quality	Enchape	Mal acabado		27 de octubre de 2022	20 de octubre de 2022	T15-P10-AC-Ascensor	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1175	Encofrado	closed	Quality	Encofrado	Falla en instalación		22 de octubre de 2022	22 de octubre de 2022	T16-P11-S5-1109	E-12	Mano de obra	Estructuras	10	2022
1176	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Falta resane		31 de octubre de 2022	21 de octubre de 2022	T16-P2-S5-209-DP	A-17	Mano de obra	Arquitectura	10	2022
1177	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		31 de octubre de 2022	21 de octubre de 2022	T16-P2-S5-208-D2	A-17	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1179	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Despotillamiento		31 de octubre de 2022	21 de octubre de 2022	T16-P2-S5-210-Pasillo	A-16	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1180	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Desalineamiento		28 de octubre de 2022	21 de octubre de 2022	T16-P3-S5-310	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1181	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Desalineamiento		28 de octubre de 2022	21 de octubre de 2022	T16-P3-S3-303-DP	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1182	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Quiñe		28 de octubre de 2022	21 de octubre de 2022	T16-P3-S5-309-DP	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1183	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S3-1103-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1184	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S3-1103-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1185	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S3-1102-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1186	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S3-1102-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1187	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S2-1105-Estar	A-19	Mano de obra	Arquitectura	10	2022
1188	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S2-1104-Sala	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1189	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S2-1104-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1190	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S2-1104-Bv	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1191	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S4-1101-DP	A-19	Mano de obra	Arquitectura	10	2022
1192	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S4-1106-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1193	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S1-1107-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1194	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S1-1108-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1195	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S1-1108-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1196	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		29 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P11-S5-1109-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	10	2022
1197	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Mal acabado		29 de octubre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P3-303-cocina	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1198	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Mal acabado		29 de octubre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P3-304-cocina	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1199	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Mal acabado		29 de octubre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P3-305-cocina	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1200	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Mal acabado		29 de octubre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P3-303-cocina	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	10	2022
1201	Acero	closed	Quality	Acero	Error en el procedimiento		29 de octubre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P12-1204-D2	E-12	Error en procedimiento	Estructuras	10	2022
1202	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Error en el procedimiento		5 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P4-407-BV	A-18	Mano de obra	Arquitectura	10	2022
1203	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Error en el procedimiento		5 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P4-407-DP	A-18	Mano de obra	Arquitectura	10	2022
1204	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Error en el procedimiento		5 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P4-408-BV	A-18	Mano de obra	Arquitectura	10	2022
1205	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Error en el procedimiento		5 de noviembre de 2022	29 de octubre de 2022	T16-P4-406-DP	A-18	Mano de obra	Arquitectura	10	2022
1206	Baranda metálica	closed	Quality	Baranda metálica	Mal acabado		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P20-X04	A-20	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1207	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P7-X04	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1208	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Quiñe		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P4-X04	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1209	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S1-P12-1208-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1210	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S1-P12-1208-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1211	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento	[redacted]	3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S5-P12-1210-BP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1212	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S5-P12-1210-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1213	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S5-P12-1209-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1214	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S5-P12-1209-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1215	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S4-P12-1201-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1216	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S4-P12-1206-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1217	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S4-P12-1206-Cocina	A-19	Falta de información	Arquitectura	11	2022
1218	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S2-P12-1205-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1219	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S2-P12-1204-Sala	A-19	Mano de obra	Arquitectura	11	2022
1220	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S2-P12-1204-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1221	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S2-P12-1204-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1222	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S3-P12-1203-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1223	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S3-P12-1203-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1224	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S3-P12-1202-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1225	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S3-P12-1202-Estar	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1226	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S1-P13-1307-BP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1227	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S1-P13-1307-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1228	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S1-P13-1308-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1229	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		3 de diciembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T16-S1-P13-1308-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1230	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de diciembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T16-P13-S2-1305-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1231	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de diciembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T16-S2-P13-1304-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1232	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		4 de diciembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T16-S2-P13-1304-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1233	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de diciembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T16-S3-P13-1303-BP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1234	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de diciembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T16-S3-P13-1303-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1235	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de diciembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T16-S3-P13-1302-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1236	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		11 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-205-BV	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1237	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Material defectuoso		10 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-202-DP	A-3	Fallas del material	Acabados	11	2022
1238	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en el procedimiento		10 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-202-BP	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1239	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		10 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-202-BV	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1240	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Fisura		10 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-203-BP	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1241	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-203-Sala	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1242	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-203-DP	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1243	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-204-DP	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1244	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-204-Mampara	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1245	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-204-Sala	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1246	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	fisura		10 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-204-BP	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1247	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		10 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-205-D2	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1248	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		10 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	T15-P2-206-D3	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1249	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mancha		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P3-301-BP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1250	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Material defectuoso		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P3-301-BV	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1251	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P3-301-Cocina	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1252	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mancha		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P3-302-Cocina	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1253	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P3-302-D3	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1254	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P3-303-DP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1255	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayadura		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P3-303-Cocina	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1256	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P3-304-BV	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1257	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P3-305-DP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1258	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P3-306-DP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1259	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en el procedimiento		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P3-307-Estar	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1260	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		11 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	T15-P3-307-Cocina	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1261	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-401-D2	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1262	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-401-D2	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1263	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-401-D2	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1264	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-402-Balcón	A-4	Fallas del material	Acabados	11	2022
1265	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-403-BV	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1266	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-405-BP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1267	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Despegado		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-405-D2	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1268	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-405-Cocina	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1269	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mancha		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-405-Cocina	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1270	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-406-	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1271	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Despegado		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-406-DP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1272	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-406-Cocina	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1273	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-406-Sala	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1274	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-407-BP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1275	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-407-DP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1276	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-407-DP	A-4	Fallas del material	Acabados	11	2022
1277	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-407-Cocina	A-4	Fallas del material	Acabados	11	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1278	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación	[redacted]	12 de noviembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T15-P4-407-BV	A-4	Mano de obra	Acabados	11	2022
1279	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		11 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T15-P20-2002	A-6	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1280	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		11 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T15-P20-2002	A-6	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1281	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		11 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T15-P20-2008	A-6	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1283	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Resane		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T16-P6-606-DP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1284	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Desalineamiento		12 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T16-P5-503-BP	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1285	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Falta resane		12 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T16-P5-506-BP	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1286	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Funcionamiento defectuoso		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P2-205-Balcón	A-3	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1287	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Funcionamiento defectuoso		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P4-402-Balcón	A-4	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1288	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Suciedad		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P5-505-BV	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1289	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Trabajo inconcluso		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-702-Balcón	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1290	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		16 de noviembre de 2022	9 de noviembre de 2022	T15-P5-504 BV	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1291	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		16 de noviembre de 2022	9 de noviembre de 2022	T15-P5-502 DP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1292	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Suciedad		16 de noviembre de 2022	9 de noviembre de 2022	T15-P5-502 BV	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1293	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		16 de noviembre de 2022	9 de noviembre de 2022	T15-P5-503 BV	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1294	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		16 de noviembre de 2022	9 de noviembre de 2022	T15-P5-505 BV	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1295	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en isntalación		16 de noviembre de 2022	9 de noviembre de 2022	T15-P5-506 BV	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1296	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Fisura		16 de noviembre de 2022	9 de noviembre de 2022	T15-P5-507 D2	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1297	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayadura		16 de noviembre de 2022	9 de noviembre de 2022	T15-P5-507 Pasillo	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1298	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayadura		16 de noviembre de 2022	9 de noviembre de 2022	T15-P5-507 Cocina	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1299	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		17 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T15-P6-601 DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1300	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		17 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T15-P6-601 Balcón	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1301	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		17 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T15-P6-602 Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1302	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		17 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T15-P6-602 Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1303	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en isntalación		17 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T15-P6-602 BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1304	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Despegado		17 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T15-P6-603 DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1305	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en isntalación		17 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T15-P6-605 BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1306	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Despostillamiento		17 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T15-P6-605 DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1307	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		17 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	T15-P6-607 BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1308	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayadura		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-701 D2	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1309	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-701 Balcon	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1310	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-702 D2	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1311	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Protuberancia		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-702 Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1312	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-702 BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1313	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-703 Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1314	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-703 D2	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1315	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-703 Sala	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1316	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-704 DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1317	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-705 BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1318	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-706 Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1319	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		19 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T15-P7-706 Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1320	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		21 de noviembre de 2022	14 de noviembre de 2022	T15-P8-801 BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1321	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		21 de noviembre de 2022	14 de noviembre de 2022	T15-P8-807 BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1322	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Suciedad		21 de noviembre de 2022	14 de noviembre de 2022	T15-P8-802 DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1323	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		21 de noviembre de 2022	14 de noviembre de 2022	T15-P8-803 BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1324	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		21 de noviembre de 2022	14 de noviembre de 2022	T15-P8-804 BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1325	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		21 de noviembre de 2022	14 de noviembre de 2022	T15-P8-804 D3	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1326	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de diciembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T16-P13-S4-1306-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1327	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de diciembre de 2022	5 de noviembre de 2022	T16-P13-S4-1301-DP	A-19	Mano de obra	Arquitectura	11	2022
1328	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		7 de diciembre de 2022	7 de noviembre de 2022	T16-P13-S5-1309-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1329	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de diciembre de 2022	9 de noviembre de 2022	T16-P14-S1-1408-D3	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1330	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		9 de diciembre de 2022	9 de noviembre de 2022	T16-P14-S1-1408-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1331	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		9 de diciembre de 2022	9 de noviembre de 2022	T16-P14-S1-1407-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1332	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		11 de diciembre de 2022	11 de noviembre de 2022	T16-P14-S2-1404-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1333	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		11 de diciembre de 2022	11 de noviembre de 2022	T16-P14-S2-1404-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1334	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		12 de diciembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T16-P14-S3-1403-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1335	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de diciembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T16-P14-S3-1403-Cocina	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1336	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de diciembre de 2022	14 de noviembre de 2022	T16-P14-S4-1406-Estar	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1337	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T16-P4-405-D3	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1338	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Mal acabado		12 de diciembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T16-P4	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1339	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Mal acabado		12 de diciembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T16-P5	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1340	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Mal acabado		12 de diciembre de 2022	12 de noviembre de 2022	T16-P5	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1341	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		23 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T15-P9-901-Lavanderia	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1342	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		23 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T15-P9-902-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1343	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		23 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T15-P9-906-DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1344	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falta resane		23 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T15-P9-907-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1345	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falta resane		23 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T15-P10-1003-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1346	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en isntalación	[redacted]	23 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T1S-P10-1003-D2	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1347	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		23 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T1S-P10-1004-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1348	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		23 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T1S-P10-1006-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1349	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		23 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T1S-P10-1006-D2	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1350	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		23 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T1S-P10-1006-DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1351	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		23 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T1S-P10-1007-DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1352	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Despegado		23 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T1S-P10-1007-Sala	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1353	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P11-1102-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1354	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P11-1105-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1355	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P12-1202-D2	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1356	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P12-1203-Pasillo	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1357	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P12-1205-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1358	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P2-205-BP	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1359	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Suciedad		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P2-205-Sala	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1360	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P2-206-D2	A-3	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1361	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P3-301-BP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1362	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P3-301-BV	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1363	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P3-302-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1364	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P3-302-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1365	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P3-303-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1366	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P3-306-D2	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1367	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P3-307-BV	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1368	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P4-402-Cocina	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1369	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P4-403-BP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1370	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P4-404-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1371	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P4-405-DP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1372	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P5-502-BP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1373	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P5-502-D3	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1374	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P5-503-BV	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1375	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		28 de noviembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T1S-P5-506-Cocina	A-4	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1376	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		16 de diciembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T16-P1S-1507-DP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1377	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		16 de diciembre de 2022	16 de noviembre de 2022	T16-P1S-1507-BV	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1378	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de diciembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T16-P1S-1509-Cocina	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1379	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de diciembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T16-P1S-1510-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1380	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		21 de diciembre de 2022	21 de noviembre de 2022	T16-P1S-1509-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1381	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		19 de diciembre de 2022	19 de noviembre de 2022	T16-P1S-1506-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1382	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		19 de diciembre de 2022	19 de noviembre de 2022	T16-P1S-1501-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1383	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de diciembre de 2022	17 de noviembre de 2022	T16-P1S-1505-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1384	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		17 de diciembre de 2022	17 de noviembre de 2022	T16-P1S-1504-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1385	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de diciembre de 2022	17 de noviembre de 2022	T16-P1S-1504-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1386	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		18 de diciembre de 2022	18 de noviembre de 2022	T16-P1S-1503-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1387	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		18 de diciembre de 2022	18 de noviembre de 2022	T16-P1S-1503-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1388	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		18 de diciembre de 2022	18 de noviembre de 2022	T16-P1S-1502-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1389	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		22 de diciembre de 2022	22 de noviembre de 2022	T16-P16-1608-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1390	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		22 de diciembre de 2022	22 de noviembre de 2022	T16-P16-1608-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1391	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Mal resane		26 de noviembre de 2022	19 de noviembre de 2022	T16-P7	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1392	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Mal acabado		24 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	T16-P6-605-cocina	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1393	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Mal acabado		24 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	T16-P6-608-cocina	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1394	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		26 de noviembre de 2022	19 de noviembre de 2022	T1S-P18-X08	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1395	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		26 de noviembre de 2022	19 de noviembre de 2022	T1S-P07-X08	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1396	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		26 de noviembre de 2022	19 de noviembre de 2022	T1S-P06-X08	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1397	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		26 de noviembre de 2022	19 de noviembre de 2022	T1S-P04-X08	A-4	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1398	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		26 de noviembre de 2022	19 de noviembre de 2022	T1S-P02-X08	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1399	Enchape	closed	Quality	Enchape	Mal acabado		3 de diciembre de 2022	26 de noviembre de 2022	T16-P4-407-BP	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1400	Enchape	closed	Quality	Enchape	Mal acabado		3 de diciembre de 2022	26 de noviembre de 2022	T16-P4-402-Cocina	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1401	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Daño en material		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P14-1404-Lavandería	A-5	Mano de obra	Acabados	11	2022
1402	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P14-1402-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1403	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P14-1403-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1404	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P14-1405-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1405	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Despegado		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P14-1405-DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1406	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mancha		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P9-902-D3	A-5	Observación común	Acabados	11	2022
1407	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Despegado		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P9-903-Sala	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1408	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Material defectuoso		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P1S-1507-D2	A-5	Fallas del material	Acabados	11	2022
1409	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P1S-1505-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1410	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mancha		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P10-1004	A-5	Observación común	Acabados	11	2022
1411	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Material defectuoso		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P10-1004-DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1412	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P10-1003-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022

[redacted]

FORMATO
REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**2/06/2023**

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1413	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mancha	[redacted]	5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P10-1002-Sala	A-5	Observación común	Acabados	11	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1414	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe	[redacted]	5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P15-1507-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1415	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		6 de diciembre de 2022	29 de noviembre de 2022	T1S-P15-1507-BV	A-5	Mano de obra	Acabados	11	2022
1416	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		23 de diciembre de 2022	23 de noviembre de 2022	T1G-P16-S2-1604-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1417	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		23 de diciembre de 2022	23 de noviembre de 2022	T1G-P16-S2-1604-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1418	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		24 de diciembre de 2022	24 de noviembre de 2022	T1G-P16-S3-1603-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1419	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		24 de diciembre de 2022	24 de noviembre de 2022	T1G-P16-S3-1602-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1420	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		25 de diciembre de 2022	25 de noviembre de 2022	T1G-P16-S4-1606-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1421	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		25 de diciembre de 2022	25 de noviembre de 2022	T1G-P16-S4-1601-Cocina	A-19	Mano de obra	Arquitectura	11	2022
1422	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		26 de diciembre de 2022	26 de noviembre de 2022	T1G-P16-S5-1609-BV	A-19	Mano de obra	Arquitectura	11	2022
1423	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		26 de diciembre de 2022	26 de noviembre de 2022	T1G-P16-S5-1609-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1424	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		26 de diciembre de 2022	26 de noviembre de 2022	T1G-P16-S5-1610-BP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1425	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		26 de diciembre de 2022	26 de noviembre de 2022	T1G-P16-S5-16010-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1426	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		28 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1G-P17-S1-1707-Cocina	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1427	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		28 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1G-P17-S1-1708-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1428	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		29 de diciembre de 2022	29 de noviembre de 2022	T1G-P17-S2-1704-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1429	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		29 de diciembre de 2022	29 de noviembre de 2022	T1S-P17-S2-1704-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1430	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P13-1306-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1431	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Suciedad		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P16-1601-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1432	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P15-1504-D2	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1433	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P15-1504-Lavandería	A-19	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1434	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayadura		5 de diciembre de 2022	28 de noviembre de 2022	T1S-P16-1606-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1435	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		9 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P17-1701-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1436	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalacion		9 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P17-1703-DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1437	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		9 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P17-1707-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1438	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P18-1801-Star	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1439	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Despegado		10 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P18-1802-Pasillo	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1440	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P18-1803-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1441	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		10 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P18-1804-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1442	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P18-1804-DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1443	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Despegado		10 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P18-1806-D2	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1444	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Despegado		10 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P19-1903-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1445	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		10 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P19-1903-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1446	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P19-1904-D2	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1447	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayadura		10 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P19-1904-DP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1448	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		10 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P19-1906-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1450	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		10 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-P19-1907-Ventana	A-5	Error en procedimiento	Acabados	11	2022
1451	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		30 de diciembre de 2022	30 de noviembre de 2022	T1G-P17-S3-1704-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1452	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		1 de enero de 2023	1 de diciembre de 2022	T1G-P17-S4-1706-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	11	2022
1453	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Trabajo inconcluso		8 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-X01-P20	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1454	Baranda Metálica	closed	Quality	Baranda Metálica	Mal acabado		8 de diciembre de 2022	1 de diciembre de 2022	T1S-X01-P10	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1455	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Funcionamiento defectuoso		7 de diciembre de 2022	30 de noviembre de 2022	T1S-P9-902-Balcón	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	11	2022
1457	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Mal acabado		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P17-1705-BV	A-6	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1458	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Mal acabado		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P10-1002-Cocina0	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1459	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Trabajo inconcluso		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P19-1902-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1460	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Falla en instalación		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P19-1904-Sala	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1461	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Material defectuoso		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P12-1206-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1462	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Trabajo inconcluso		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P16-1607-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1463	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Mal acabado		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P2-205-DP	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1464	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Trabajo inconcluso		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20.2006-Terraza	A-7	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1465	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Suciedad		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2008-Baño	A-6	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1466	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Mal acabado		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P17-1708-DP	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1467	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Falla en instalación		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P2-206-BP	A-3	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1468	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Trabajo inconcluso		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P3-305-Lavandería	A-4	Mano de obra	Arquitectura	12	2022
1469	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Trabajo inconcluso		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P4-Montante	A-4	Mano de obra	Arquitectura	12	2022
1470	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Trabajo inconcluso		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P9-901-Cocina	A-5	Mano de obra	Arquitectura	12	2022
1471	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Trabajo inconcluso		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P9-903-BP	A-5	Mano de obra	Arquitectura	12	2022
1472	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Filtración		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P6-601-Lavandería	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1473	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Filtración		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P7-701-Lavandería	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1474	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Filtración		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P7-708-BV	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1475	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Filtración		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P8-802-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1476	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Filtración		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P8-803-BV	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1477	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Filtración		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P9-901-BV	A-5	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1478	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Falla en instalación		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P9-902-BV	A-5	Mano de obra	Arquitectura	12	2022
1479	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Falla en instalación		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P12-1207-Lavandería	A-5	Mano de obra	Arquitectura	12	2022
1480	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Falla en instalación		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P14-1402-BP	A-5	Mano de obra	Arquitectura	12	2022
1481	Prueba final de agua	closed	Quality	Prueba final de agua	Filtración		8 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2005-Baño	A-6	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1532	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2005-BV	A-6	Error en procedimiento	Acabados	12	2022

[redacted] FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1533	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado	[redacted]	10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2005-Escalera Duple	A-6	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1534	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	1S-P20-2005-Entrada a Terra	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1535	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Filtración		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2005-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1536	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2006-Sala	A-6	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1537	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2006-Balcón	A-6	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1538	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2001-Balcón	A-6	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1539	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	1S-P20-2004-Mampara terraz	A-6	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1540	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	1S-P20-2004-Mampara terraz	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1541	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2004-Ingreso terraza	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1542	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2004- terraza	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1543	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P2-202-Balcón	A-3	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1544	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2003-Ventana	A-6	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1545	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P9-705-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1546	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P10-1007-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1547	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2002-Terraza	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1548	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2002-Terraza	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1549	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2022-Terraza	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1550	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2004-Terraza	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1551	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	1S-P20-2004-Fachada en terra	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1552	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2006-Terraza	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1553	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	0-2003-Puerta que ingresa a	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1554	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20 2008-Cocina	A-6	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1555	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2008-Escalera duple	A-6	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1556	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Despostillamiento		10 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	T1S-P20-2008-Terraza	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1557	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P19-1908-Lavandería	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1558	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P19-1908-Sala	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1559	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P19-1908-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1560	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P19-1908-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1561	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P18-1808-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1562	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P18-1808-D3	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1563	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P17-1708-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1564	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P17-1708-D2	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1565	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Filtración		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P16-1608-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1566	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P17-1608-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1567	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P16-1608-D3	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1568	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P15-1508-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1569	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayadura		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P13-1308-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1570	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P13-1308-Sala	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1571	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P13-1308-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1572	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P12-1208-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1573	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P12-1208-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1574	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P10-1008-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1575	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P9-908-D2	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1576	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P9-908-d2	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1577	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P18-1802-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1578	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P9-908-Cocina	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1579	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P1-104-BV	A-2	Mano de obra	Acabados	12	2022
1580	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P1-104-BV	A-2	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1581	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P1-101	A-2	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1582	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P1-105-Sala	A-2	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1583	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P1-101-Cocina	A-2	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1584	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P1-101-BV	A-2	Mano de obra	Acabados	12	2022
1585	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P1-102-Cocina	A-2	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1586	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P1-102-BV	A-2	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1587	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P1-103-BP	A-2	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1588	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P1-106-D2	A-2	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1589	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P8-808-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1590	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P8-808-Mampara	A-5	Mano de obra	Acabados	12	2022
1591	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P7-708-BP	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1592	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P5-508-D2	A-4	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1593	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P4-408-Sala	A-4	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1594	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P4-408-DP	A-4	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1595	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayadura		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P3-308-BV	A-4	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1596	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Falla en instalación		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P2-208-D3	A-3	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1597	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P2-208-Lavandería	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1598	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	óxido		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P2-207-BV	A-5	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1599	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T1S-P2-208-Cocina	A-3	Error en procedimiento	Acabados	12	2022

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1600	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso	[redacted]	12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T15-P20-2008-D2	A-6	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1601	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	T15-P20-2008-Ingreso a terraz	A-7	Error en procedimiento	Acabados	12	2022
1602	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Desalineamiento		15 de diciembre de 2022	5 de diciembre de 2022	T16-P8-807	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1603	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de enero de 2023	5 de diciembre de 2022	T16-P17-S5-1709-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1604	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de enero de 2023	5 de diciembre de 2022	T16-P17-S5-1710-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1605	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de enero de 2023	5 de diciembre de 2022	T16-P18-S1-1707-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1606	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de enero de 2023	5 de diciembre de 2022	T16-P18-S1-1807-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1607	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de enero de 2023	5 de diciembre de 2022	T16-P18-S1-1807-D3	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1608	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de enero de 2023	5 de diciembre de 2022	T16-P18-S1-1808-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1609	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		5 de enero de 2023	5 de diciembre de 2022	T16-P18-S2-1804-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1610	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de enero de 2023	5 de diciembre de 2022	T16-P18-S2-1804-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1611	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		5 de enero de 2023	5 de diciembre de 2022	T16-P18-S2-1805-Star	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1612	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		6 de enero de 2023	6 de diciembre de 2022	T16-P18-S3-1802-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1613	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		6 de enero de 2023	6 de diciembre de 2022	T16-P18-S3-1802-Star	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1614	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		6 de enero de 2023	6 de diciembre de 2022	T16-P18-S3-1803-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1615	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de enero de 2023	8 de diciembre de 2022	T16-P18-S4-1801-Star	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1616	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		8 de enero de 2023	8 de diciembre de 2022	T16-P18-S4-1806-BP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1617	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de enero de 2023	12 de diciembre de 2022	T16-P18-S5-1809-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1618	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de enero de 2023	12 de diciembre de 2022	T16-P18-S5-1810-Dp	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1619	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		12 de enero de 2023	12 de diciembre de 2022	T16-P18-S5-1810-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1620	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de enero de 2023	13 de diciembre de 2022	T16-P19-S1-1907-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1621	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		13 de enero de 2023	13 de diciembre de 2022	T16-P19-S1-1907-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1622	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de enero de 2023	14 de diciembre de 2022	T16-P19-S2-1904-D2	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1623	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de enero de 2023	14 de diciembre de 2022	T16-P19-S2-1904-Sala	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1624	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		14 de enero de 2023	14 de diciembre de 2022	T16-P19-S2-1904-D1	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1625	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de enero de 2023	15 de diciembre de 2022	T16-P19-S3-1903-Baño	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1626	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de enero de 2023	15 de diciembre de 2022	T16-P19-S3-1903-Cocina	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1627	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		15 de enero de 2023	15 de diciembre de 2022	T16-P19-S3-1902-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1628	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		16 de enero de 2023	16 de diciembre de 2022	T16-P19-S4-1901-pasillo	A-19	Mano de obra	Arquitectura	12	2022
1629	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		16 de enero de 2023	16 de diciembre de 2022	T16-P19-S4-1906-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1630	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de enero de 2023	17 de diciembre de 2022	T16-P19-S5-1909-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1631	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		17 de enero de 2023	17 de diciembre de 2022	T16-P19-S5-1910-DP	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1632	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Protuberancia		17 de enero de 2023	17 de diciembre de 2022	T16-P19-S5-1909-BV	A-19	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1633	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		19 de enero de 2023	19 de diciembre de 2022	T16-P20-S1-2007-DP	A-20	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1634	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		19 de enero de 2023	19 de diciembre de 2022	T16-P20-S1-2008-Cocina	A-20	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1635	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		20 de enero de 2023	20 de diciembre de 2022	T16-P20-S2-2005-D2	A-20	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1636	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		21 de enero de 2023	21 de diciembre de 2022	T16-P20-S3-2003-Sala	A-20	Error en procedimiento	Arquitectura	12	2022
1637	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		22 de enero de 2023	22 de diciembre de 2022	T16-P20-S4-2001-Cocina	A-20	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1638	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		22 de enero de 2023	22 de diciembre de 2022	T16-P20-S4-2001-D2	A-20	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1639	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		22 de enero de 2023	22 de diciembre de 2022	T16-P20-S4-2006-Sala	A-20	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1640	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		23 de enero de 2023	23 de diciembre de 2022	T16-P20-S5-2009-cocina	A-20	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1641	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		23 de enero de 2023	23 de diciembre de 2022	T16-P20-S5-2009-D2	A-20	Fallas del material	Arquitectura	12	2022
1642	Acero	closed	Quality	Acero	Trabajo inconcluso		16 de diciembre de 2022	16 de diciembre de 2022	T16-S5-P19-1909	E-13	Mano de obra	Estructuras	12	2022
1643	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Segregación		4 de febrero de 2023	4 de enero de 2023	T16-P21-S3-2102	A-21	Mano de obra	Arquitectura	1	2023
1644	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de febrero de 2023	4 de enero de 2023	T16-P21-S3-2102	A-21	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1645	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de febrero de 2023	4 de enero de 2023	T16-P21-S4-2101	A-21	Mano de obra	Arquitectura	1	2023
1646	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Segregación		4 de febrero de 2023	4 de enero de 2023	T16-P21-S4-2101	A-21	Mano de obra	Arquitectura	1	2023
1647	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de febrero de 2023	4 de enero de 2023	T16-P21-S4-2101	A-21	Fallas del material	Arquitectura	1	2023
1648	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de febrero de 2023	4 de enero de 2023	T16-P21-S4-2106	A-21	Mano de obra	Arquitectura	1	2023
1649	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de febrero de 2023	4 de enero de 2023	T16-P21-S4-2101	A-21	Fallas del material	Arquitectura	1	2023
1650	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de febrero de 2023	4 de enero de 2023	T16-P21-S4-2101	A-21	Fallas del material	Arquitectura	1	2023
1651	Concreto Post-Vaciado	closed	Quality	Concreto Post-Vaciado	Desalineamiento		4 de febrero de 2023	4 de enero de 2023	T16-P21-S4-2106	A-21	Mano de obra	Arquitectura	1	2023
1652	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		18 de enero de 2023	4 de enero de 2023	T16-P10-1002	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1653	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		18 de enero de 2023	4 de enero de 2023	T16-P10-1005	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1654	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		27 de enero de 2023	13 de enero de 2023	T16-P15-1503-Sala	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1655	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		27 de enero de 2023	13 de enero de 2023	T16-P15-1504-DP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1656	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		27 de enero de 2023	13 de enero de 2023	T16-P15-1505-Estar	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1657	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		27 de enero de 2023	13 de enero de 2023	T16-P15-1510-Sala	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1658	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		27 de enero de 2023	13 de enero de 2023	T16-P15-1507-DP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1659	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Desalineamiento		27 de enero de 2023	13 de enero de 2023	T16-P14-1401-DP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1660	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Mal acabado		30 de enero de 2023	23 de enero de 2023	T16-P16-1608-DP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1661	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Mal acabado		30 de enero de 2023	23 de enero de 2023	T16-P16-1610-DP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1662	Enchape	closed	Quality	Enchape	Trabajo inconcluso		3 de febrero de 2023	27 de enero de 2023	T16-P11-1101-BP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1663	Enchape	closed	Quality	Enchape	Trabajo inconcluso		3 de febrero de 2023	27 de enero de 2023	T16-P11-1108-BP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	1	2023
1666	Enchape	closed	Quality	Enchape	Trabajo inconcluso		14 de febrero de 2023	7 de febrero de 2023	T16-P14-AC	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2023
1667	Enchape	closed	Quality	Enchape	Trabajo inconcluso		14 de febrero de 2023	7 de febrero de 2023	T16-P15-AC	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2023
1668	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Trabajo inconcluso		10 de febrero de 2023	3 de febrero de 2023	T16-Duplex-2105-Escalera	D-128	Fallas del material	Arquitectura	2	2023

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1669	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Protuberancia	[redacted]	17 de febrero de 2023	10 de febrero de 2023	T16-P19-1909-Sala	A-19	Mano de obra	Arquitectura	2	2023
1670	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Mal acabado		17 de febrero de 2023	10 de febrero de 2023	T16-P20-2004-BAÑO	A-20	Mano de obra	Arquitectura	2	2023
1671	Tabiquería	closed	Quality	Tabiquería	Mal acabado		17 de febrero de 2023	10 de febrero de 2023	T16-P20-2010-Baño	A-20	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2023
1672	Carpintería metálica	closed	Quality	Carpintería metálica	Rayado		22 de febrero de 2023	15 de febrero de 2023	T16-P17-1704-Baranda	A-19	Mano de obra	Arquitectura	2	2023
1673	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		22 de febrero de 2023	15 de febrero de 2023	T16-P14-1404-Baranda	A-19	Mano de obra	Arquitectura	2	2023
1674	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		22 de febrero de 2023	15 de febrero de 2023	T16-P13-1304-Baranda	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2023
1675	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		22 de febrero de 2023	15 de febrero de 2023	T16-P8-804-Baranda	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2023
1676	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		22 de febrero de 2023	15 de febrero de 2023	T16-P10-1004-Baranda	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2023
1677	Solaqueo	closed	Quality	Solaqueo	Trabajo inconcluso		28 de febrero de 2023	21 de febrero de 2023	T16-P20-2002-DS	A-20	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2023
1678	Enchape	closed	Quality	Enchape	Trabajo inconcluso		21 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	T16-P15-1508-Cocina	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2023
1679	Enchape	closed	Quality	Enchape	Trabajo inconcluso		21 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	T16-P16-1601-BP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	2	2023
1680	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		28 de febrero de 2023	21 de febrero de 2023	T16-P17-1707-balcón	A-19	Mano de obra	Arquitectura	2	2023
1681	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		28 de febrero de 2023	21 de febrero de 2023	T16-P16-1607-Balcon	A-19	Mano de obra	Arquitectura	2	2023
1682	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		8 de marzo de 2023	1 de marzo de 2023	T16-P4-408-Balcon	A-19	Mano de obra	Arquitectura	3	2023
1684	Enchape	closed	Quality	Enchape	Trabajo inconcluso		15 de marzo de 2023	8 de marzo de 2023	T16-P21-2108	A-21	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1685	Enchape	closed	Quality	Enchape	Trabajo inconcluso		9 de marzo de 2023	2 de marzo de 2023	T16-P21-2110	A-21	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1686	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		14 de marzo de 2023	7 de marzo de 2023	T16-P3-306-Balcon	A-18	Mano de obra	Arquitectura	3	2023
1687	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		14 de marzo de 2023	7 de marzo de 2023	T16-P2-206-Balcon	A-19	Mano de obra	Arquitectura	3	2023
1688	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Funcionamento defectuoso		20 de marzo de 2023	13 de marzo de 2023	T16-P2-205-BV	A-17	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1689	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Sin energía		20 de marzo de 2023	13 de marzo de 2023	T16-P3-308-DP	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1690	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Sin energía		20 de marzo de 2023	13 de marzo de 2023	T16-P5-501-Sala	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1691	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Trabajo inconcluso		20 de marzo de 2023	13 de marzo de 2023	T16-P5-509-Sala	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1692	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Trabajo inconcluso		20 de marzo de 2023	13 de marzo de 2023	T16-P7-706-Balcon	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1693	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Trabajo inconcluso		20 de marzo de 2023	13 de marzo de 2023	T16-P7-708-D3	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1694	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Trabajo inconcluso		20 de marzo de 2023	13 de marzo de 2023	T16-P8-807-Balcón	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1695	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		22 de marzo de 2023	15 de marzo de 2023	T16-Duplex-2108-Escalera	A-21	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1696	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		22 de marzo de 2023	15 de marzo de 2023	T16-Duplex-2109-Escalera	A-21	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1697	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		1 de abril de 2023	25 de marzo de 2023	T16-Duplex-2106-Escalera	A-21	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1698	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		28 de marzo de 2023	21 de marzo de 2023	T16-Duplex-2107-Escalera	A-21	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1699	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		27 de marzo de 2023	20 de marzo de 2023	T16-P6-605-Balcon	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1700	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		7 de abril de 2023	30 de marzo de 2023	T16-Duplex-X05	A-21	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1701	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		7 de abril de 2023	30 de marzo de 2023	T16-P20-2002-Balcon	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	3	2023
1702	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Falla en instalación		12 de abril de 2023	5 de abril de 2023	T16-P9-910-Sala	A-19	Mano de obra	Arquitectura	4	2023
1703	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Suciedad		12 de abril de 2023	5 de abril de 2023	T16-P10-1007-BP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2023
1704	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Funcionamento defectuoso		12 de abril de 2023	5 de abril de 2023	T16-P11-1104-BP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2023
1705	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Funcionamento defectuoso		12 de abril de 2023	5 de abril de 2023	T16-P13-1302	A-19	Fallas del material	Arquitectura	4	2023
1706	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Funcionamento defectuoso		12 de abril de 2023	5 de abril de 2023	T16-P15-1507	A-19	Fallas del material	Arquitectura	4	2023
1707	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Funcionamento defectuoso		12 de abril de 2023	5 de abril de 2023	T16-P13-1303	A-19	Fallas del material	Arquitectura	4	2023
1708	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Funcionamento defectuoso		12 de abril de 2023	5 de abril de 2023	T16-P15-1508	A-19	Fallas del material	Arquitectura	4	2023
1709	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Funcionamiento defectuoso		12 de abril de 2023	5 de abril de 2023	T16-P15-1510	A-19	Fallas del material	Arquitectura	4	2023
1710	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Funcionamiento defectuoso		12 de abril de 2023	5 de abril de 2023	T16-P18-1806	A-19	Fallas del material	Arquitectura	4	2023
1711	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Mal acabado		12 de abril de 2023	5 de abril de 2023	T16-P19-1904-Dp	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2023
1712	Pilotaje	closed	Quality	Pilotaje	Mal acabado		12 de abril de 2023	5 de abril de 2023	T16-P19-1910	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2023
1713	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		12 de abril de 2023	5 de abril de 2023	T16-Duplex-2103-Escalera	A-21	Error en procedimiento	Arquitectura	4	2023
1714	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		21 de abril de 2023	14 de abril de 2023	T16-P20-2001-Balcón	A-20	Mano de obra	Arquitectura	4	2023
1715	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		21 de abril de 2023	14 de abril de 2023	T16-P9-901-Balcón	A-19	Mano de obra	Arquitectura	4	2023
1716	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		21 de abril de 2023	14 de abril de 2023	T16-P8-801-Balcón	A-19	Mano de obra	Arquitectura	4	2023
1717	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		2 de mayo de 2023	25 de abril de 2023	16-P17-Escalera de Emergenc	A-19	Mano de obra	Arquitectura	4	2023
1718	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Mal acabado		2 de mayo de 2023	25 de abril de 2023	T16-P5-Escalera de Emergenci	A-19	Mano de obra	Arquitectura	4	2023
1719	Carpintería Metálica	closed	Quality	Carpintería Metálica	Trabajo inconcluso		1 de mayo de 2023	24 de abril de 2023	T16-P17-1710-Balcón	A-16	Fallas del material	Arquitectura	4	2023
1720	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Desalineamiento		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P2-204-BV	A-17	Fallas del material	Arquitectura	5	2023
1721	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Baja presión de agua		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P2-210-BV	A-17	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1722	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Desalineamiento		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P2-210-BV	A-17	Fallas del material	Arquitectura	5	2023
1723	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Baja presión de agua		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P3-301-Cocina	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1724	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P3-301-Cocina	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1725	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P3-304-Lavanderia	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1726	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Desalineamiento		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P3-306-BV	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1727	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Quiñe		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P3-308-BV	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1728	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P4-401-Cocina	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1729	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P4-401-BV	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1730	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Desalineamiento		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P4-402-BV	A-18	Fallas del material	Arquitectura	5	2023
1731	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Quiñe		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P4-403-Lavanderia	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1732	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Óxido		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P4-404-Cocina	A-18	Fallas del material	Arquitectura	5	2023
1733	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P4-407-BP	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1734	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Quiñe		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P4-410-BP	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1735	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P4-410-BP	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1736	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Error en instalación		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P4-410-BP	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1737	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad	[redacted]	26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P5-502-BP	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1738	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P5-510-BP	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1739	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P5-510-BV	A-18	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1740	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P6-603-BV	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1741	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Mueble asentandose		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P6-607-BV	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1742	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P7-702-Lavandería	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1743	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P7-703-Lavandería	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1744	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Error en instalación		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P7-703-BP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1745	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P7-704-Cocina	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1746	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P7-705-Lavandería	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1747	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P7-707-Lavandería	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1748	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P7-709-Lavandería	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1749	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P7-709-Lavandería	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1750	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P8-802-Lavandería	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1751	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P8-806-BV	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1752	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P8-806-Lavandería	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1753	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P8-807-BV	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1754	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P8-807-BP	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1755	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P8-808-Lavandería	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1756	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P8-808-Lavandería	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1757	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P8-809-BV	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1758	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P8-810-Lavandería	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1759	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		26 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023	T16-P8-810-Cocina	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1862	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-201	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1863	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Fisura		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-201	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1864	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-201	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1865	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Suciedad		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-201	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1866	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-201	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1867	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-202	A-17	Fallas del material	Acabados	5	2023
1868	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-202	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1869	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Suciedad		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-202	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1870	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-202	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1871	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Suciedad		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-202	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1872	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-202	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1873	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Suciedad		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-202	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1874	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-202	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1875	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-202	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1876	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-203	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1877	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-203	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1878	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-203	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1879	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-203	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1880	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Fisura		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-203	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1881	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Fisura		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-203	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1882	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Fisura		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-203	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1883	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-203	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1884	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-203	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1885	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-203	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1886	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Fisura		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-204	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1887	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Fisura		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-204	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1888	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mueble asentado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-204	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1889	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-204	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1890	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-204	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1891	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-205	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1892	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-205	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1893	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-207	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1894	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-207	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1895	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-208	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1896	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-209	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1897	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-209	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1898	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-209	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1899	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-210	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1900	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-210	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1901	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-210	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1902	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P2-210	A-17	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1903	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-301	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1904	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-301	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1905	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-302	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1906	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación	[redacted]	24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-302	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1907	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-302	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1908	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-302	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1909	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Fisura		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-305	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1910	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-303	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1911	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-304	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1912	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Suciedad		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-305	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1913	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mueble asentado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-305	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1914	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-305	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1915	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-305	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1916	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Suciedad		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-305	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1917	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-306	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1918	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-306	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1919	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-306	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1920	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-306	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1921	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-306	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1922	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-307	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1923	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Protuberancia		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-307	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1924	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Protuberancia		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-308	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1925	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Suciedad		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-308	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1926	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-309	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1927	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-309	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1928	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-310	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1929	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-310	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1930	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		24 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023	T16-P3-310	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1931	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-401	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1932	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalacion		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-402	A-18	Fallas del material	Acabados	5	2023
1933	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-401	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1934	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-402	A-18	Fallas del material	Acabados	5	2023
1935	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-402	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1936	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-402	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1937	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-402	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1938	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-403	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1939	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayones		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-404	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1940	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-404	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1941	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-404	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1942	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-404	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1943	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-404	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1944	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Suciedad		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-405	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1945	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-405	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1946	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-405	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1947	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-407	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1948	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-407	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1949	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-407	A-18	Fallas del material	Acabados	5	2023
1950	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-409	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1951	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P4-409	A-18	Fallas del material	Acabados	5	2023
1952	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P5-502	A-18	Fallas del material	Acabados	5	2023
1953	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P5-502	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1954	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P5-503	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1955	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P5-504	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1956	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P5-504	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1957	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P5-507	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1958	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P5-508	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1959	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P5-508	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1960	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P5-508	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1961	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P5-508	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1962	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P5-508	A-18	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
1963	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	óxido		27 de mayo de 2023	13 de mayo de 2023	T16-P5-510	A-18	Fallas del material	Acabados	5	2023
1964	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P9-902	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1965	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P9-903	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1966	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P9-904	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1967	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Quiñe		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P9-909	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1968	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P9-910	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1969	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P10-1002	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1970	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P10-1002	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1971	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P10-1002	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1972	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P10-1003	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
1973	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Rayones	[redacted]	31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P10-1003	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1974	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P10-1005	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1976	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P10-1006	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1977	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Error en instalación		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P10-1006	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1978	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P10-1008	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1979	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	óxido		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P11-1102	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1980	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P11-1102	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1981	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P11-1102	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1982	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P11-1103	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1983	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P11-1104	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1984	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P11-1104	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1985	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P11-1105	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1986	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Desalineamiento		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P11-1107	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1987	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P11-1108	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1988	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P11-1109	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1989	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P11-1109	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1990	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P11-1110	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1991	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P12-1201	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1992	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P12-1202	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1993	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Funcionamiento defectuoso		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P12-1204	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1994	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Quiñe		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P12-1206	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1995	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P12-1209	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1996	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Error en instalación		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P12-1209	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1997	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P12-1210	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1998	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P13-1306	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
1999	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P13-1307	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2000	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Funcionamiento defectuoso		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P13-1307	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2001	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P14-1401	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2002	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P14-1401	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2003	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P14-1402	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2004	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P14-1403	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2005	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P14-1403	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2006	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P14-1404	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2007	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Quiñe		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P14-1404	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2008	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P14-1405	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2009	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P14-1410	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2010	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P15-1501	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2011	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P15-1501	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2012	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P15-1502	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2013	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P15-1502	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2014	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P15-1503	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2015	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Rayones		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P15-1504	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2016	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P15-1505	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2017	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P15-1505	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2018	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P16-1602	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2019	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Óxido		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P16-1602	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2020	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P16-1604	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2021	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P16-1605	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2022	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P16-1605	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2024	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Quiñe		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P16-1607	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2025	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P16-1608	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2026	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P16-1608	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2027	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P16-1610	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2028	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P17-1704	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2029	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P17-1705	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2030	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P17-1707	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2031	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P17-1707	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2032	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P18-1806	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2033	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P19-1901	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2034	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Quiñe		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P19-1901	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2035	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Trabajo inconcluso		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P19-1903	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2036	Prueba Final de Agua	closed	Quality	Prueba Final de Agua	Suciedad		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P19-1906	A-19	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2121	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-601	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2122	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-601	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2123	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-602	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2124	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-602	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2125	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-602	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
2126	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado	[redacted]	29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-602	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2127	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-602	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2128	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-602	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2129	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-602	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2130	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-602	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2131	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-602	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2132	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-602	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2133	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-605	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2134	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-605	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2135	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-605	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2136	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-606	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2137	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-606	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2138	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-606	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2139	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-607	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2140	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-607	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2141	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-608	A-19	Fallas del material	Acabados	5	2023
2142	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-608	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2143	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-609	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2144	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayones		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-609	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2145	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P6-610	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2146	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-701	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2147	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-701	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2148	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-701	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2149	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-701	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2150	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayones		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-702	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2151	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-702	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2152	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-702	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2153	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-702	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2154	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-702	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2155	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-703	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2156	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-703	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2157	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-703	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2158	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-704	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2159	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-704	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2160	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-705	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2161	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-705	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2162	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-705	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2163	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-705	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2164	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-705	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2165	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-705	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2166	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-706	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2167	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-706	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2168	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-706	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2169	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-706	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2170	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayones		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-706	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2171	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-707	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2172	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayones		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-707	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2173	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-707	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2174	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-708	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2175	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-708	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2176	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-708	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2177	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-709	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2178	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		29 de mayo de 2023	15 de mayo de 2023	T16-P7-710	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2179	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-801	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2180	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-802	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2181	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-802	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2182	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-803	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2183	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-803	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2184	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-804	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2185	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-804	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2186	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-805	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2187	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-805	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2188	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Protuberancia		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-806	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2189	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-806	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2190	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-807	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2191	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-809	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2192	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-809	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
2193	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación	[redacted]	31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-810	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2194	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-810	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2195	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-810	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2196	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-810	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2197	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		31 de mayo de 2023	17 de mayo de 2023	T16-P8-810	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2198	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-902	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2199	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-902	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2200	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-902	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2201	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-902	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2202	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-902	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2203	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-902	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2204	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-903	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2205	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-904	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2206	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-904	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2207	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-904	A-19	Fallas del material	Acabados	5	2023
2208	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-905	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2209	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-905	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2210	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-905	A-19	Fallas del material	Acabados	5	2023
2211	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayones		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-905	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2212	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-906	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2213	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-906	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2214	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-906	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2215	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-907	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2216	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-908	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2217	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-910	A-19	Fallas del material	Acabados	5	2023
2218	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P9-910	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2219	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1001	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2220	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1001	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2221	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1001	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2222	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1002	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2223	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1002	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2224	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1002	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2225	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1002	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2226	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayones		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1002	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2227	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1003	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2228	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1003	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2229	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1003	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2230	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1004	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2231	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1005	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2232	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1005	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2233	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1005	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2234	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1006	A-19	Fallas del material	Acabados	5	2023
2235	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1006	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2236	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Manchas		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1006	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2237	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1006	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2238	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1007	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2239	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1007	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2240	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1008	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2241	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P10-1010	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2242	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1101	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2243	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1102	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2244	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1102	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2245	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1102	A-19	Fallas del material	Acabados	5	2023
2246	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Hendidura		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1102	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2247	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1102	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2248	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1102	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2249	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1103	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2250	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1103	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2251	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Óxido		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1103	A-19	Fallas del material	Acabados	5	2023
2252	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1104	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2253	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1104	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2254	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1106	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2255	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1106	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2256	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Error en instalación		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1107	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2257	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Rayones		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1107	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2258	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1107	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2259	Revisión UI	closed	Quality	Revisión UI	Quiñe		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1108	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
2260	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Error en instalación	[redacted]	3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1108	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2261	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1108	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2262	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1110	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2263	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		3 de junio de 2023	20 de mayo de 2023	T16-P11-1110	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2264	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1202	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2265	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1202	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2266	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1202	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2267	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1202	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2268	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Quiñe		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1202	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2269	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Óxido		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1203	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2270	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Error en instalación		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1203	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2271	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1204	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2272	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1206	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2273	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Quiñe		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1206	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2274	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Quiñe		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1206	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2275	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1206	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2276	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1207	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2277	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1207	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2278	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1207	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2279	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1207	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2280	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Suciedad		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1208	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2281	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Manchas		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1208	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2282	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1208	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2283	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Quiñe		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1208	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2284	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1209	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2285	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Quiñe		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1210	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2286	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1209	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2287	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Quiñe		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1209	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2288	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1210	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2289	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1210	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2290	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Quiñe		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1210	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2291	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1210	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2292	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		10 de junio de 2023	27 de mayo de 2023	T16-P12-1202	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2293	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Manchas		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1301	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2294	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Error en instalación		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1301	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2295	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Quiñe		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1302	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2296	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1302	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2297	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Manchas		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1302	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2298	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Manchas		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1302	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2299	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1302	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2300	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Protuberancia		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1302	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2301	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Error en instalación		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1303	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2302	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1303	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2303	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1303	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2304	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1303	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2305	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Quiñe		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1303	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2306	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1304	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2307	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Óxido		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1304	A-19	Fallas del material	Acabados	5	2023
2308	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1305	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2309	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1306	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2310	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1306	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2311	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1307	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2312	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Óxido		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1307	A-19	Fallas del material	Acabados	5	2023
2313	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1307	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2314	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1308	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2315	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Quiñe		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1308	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2316	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Quiñe		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1309	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2317	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1309	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2318	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1309	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2319	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Rayones		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1310	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2320	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1310	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2321	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Manchas		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P13-1310	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2322	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P14-1401	A-19	Fallas del material	Acabados	5	2023
2323	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Quiñe		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P14-1401	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2324	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P14-1402	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2325	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P14-1402	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2326	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P14-1403	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023

[redacted]

FORMATO

REGISTRO DE OBSERVACIONES

[redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	**2/06/2023**

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	Estado	Categoría	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Detalles de la ubicación	Posición	Causa principal	Especialidad	MES	AÑO
2327	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso	[redacted]	12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P14-1403	A-19	Fallas del material	Acabados	5	2023
2328	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P14-1403	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2329	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P14-1403	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2330	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Trabajo inconcluso		12 de junio de 2023	29 de mayo de 2023	T16-P14-1404	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2331	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Funcionamiento defectuoso		16 de junio de 2023	2 de junio de 2023	T16-P14-1406	A-19	Fallas del material	Acabados	5	2023
2332	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		16 de junio de 2023	2 de junio de 2023	T17-P14-1408	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2333	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		16 de junio de 2023	2 de junio de 2023	T17-P14-1408	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2334	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Rayones		16 de junio de 2023	2 de junio de 2023	T16-P14-1409	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2335	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Manchas		16 de junio de 2023	2 de junio de 2023	T16-P14-1409	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2336	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		16 de junio de 2023	2 de junio de 2023	T16-P14-1409	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2337	Revisión UI	open	Quality	Revisión UI	Mal acabado		16 de junio de 2023	2 de junio de 2023	T16-P14-1410	A-19	Error en procedimiento	Acabados	5	2023
2340	Pilotaje	open	Quality	Pilotaje	Mal acabado		16 de junio de 2023	2 de junio de 2023	T16-P20-2005	A-20	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2341	Prueba Final de Agua	open	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		16 de junio de 2023	2 de junio de 2023	T16-P20-2003	A-20	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2342	Prueba Final de Agua	open	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		16 de junio de 2023	2 de junio de 2023	T16-P20-2004	A-20	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023
2343	Prueba Final de Agua	open	Quality	Prueba Final de Agua	Filtración		16 de junio de 2023	2 de junio de 2023	T16-P21-2109	A-21	Error en procedimiento	Arquitectura	5	2023

[redacted] RO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#6	Trabajo inconcluso-Instalaciones	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso	[redacted]	23/11/2022	23/11/2022	[redacted]	T18-Platea-S4	Error en procedimiento	Estructuras (E)	47	2022
#5	Trabajo inconcluso-Instalaciones	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso		23/11/2022	23/11/2022		T18-platea-S3	Error en procedimiento	Estructuras (E)	47	2022
#4	Trabajo inconcluso-Encofrado	Closed	Encofrado	Trabajo inconcluso		23/11/2022	23/11/2022		T18-Platea S3	Error en procedimiento	Estructuras (E)	47	2022
#3	Trabajo inconcluso-Instalaciones y pruebas	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso		23/11/2022	23/11/2022		T18-platea-S3	Error en procedimiento	Estructuras (E)	47	2022
#2	Trabajo inconcluso-Instalaciones y pruebas	Closed	Instalaciones y pruebas	Falta separar las tuberías		7/12/2022	5/12/2022		T18-Platea S2	Mano de Obra	Estructuras (E)	49	2022
#7	Trabajo inconcluso-Acero	Closed	Acero	Trabajo inconcluso		5/01/2023	5/01/2023		T18-P1-S4-Pasillo	Mano de Obra	Estructuras (E)	2	2023
#9	Desalineamiento-Concreto Post-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		7/02/2023	7/01/2023		T18-P1-S1-108	Fallas de material	Arquitectura (A)	2	2023
#8	Desalineamiento-Concreto Post-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		7/01/2023	7/01/2023		T18-P1-S1-108	Mano de Obra	Arquitectura (A)	2	2023
#13	Desalineamiento-ConcretoPost-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/02/2023	9/01/2023		T18-P1-S2-105	Fallas de material	Arquitectura (A)	2	2023
#12	Desalineamiento-ConcretoPost-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/02/2023	9/01/2023		T18-P1-S2-104	Fallas de material	Arquitectura (A)	2	2023
#11	Desalineamiento-Concreto Post-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/02/2023	9/01/2023		T18-P1-S2-104	Mano de Obra	Arquitectura (A)	2	2023
#14	Desalineamiento-ConcretoPost-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/02/2023	10/01/2023		T18-P1-S3-102	Fallas de material	Arquitectura (A)	2	2023
#16	Desalineamiento-ConcretoPost-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		11/02/2023	11/01/2023		T18-P1-S4-101	Fallas de material	Arquitectura (A)	2	2023
#15	Desalineamiento-ConcretoPost-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		11/02/2023	11/01/2023		T18-P1-S4-101	Mano de Obra	Arquitectura (A)	2	2023
#18	Desalineamiento-Concreto Post-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		13/02/2023	13/01/2023		T18-P2-S1-207-cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	3	2023
#17	Desalineamiento-Concreto Post-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		13/02/2023	13/01/2023		T18-P2-S1-208-D2	Fallas de material	Arquitectura (A)	3	2023
#20	Desalineamiento-Concreto Post-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		14/02/2023	14/01/2023		T18-P2-S2-204-D3	Mano de Obra	Arquitectura (A)	3	2023
#19	Desalineamiento-Concreto Post-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		14/02/2023	14/01/2023		T18-P2-S2-205-cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	3	2023
#23	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		16/02/2023	16/01/2023		T18-P2-S3-203-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	3	2023
#22	Desalineamiento-Concreto Post-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		16/01/2023	16/01/2023		T18-P2-S3-202-D2	Mano de Obra	Arquitectura (A)	3	2023
#21	Desalineamiento-Concreto Post-Vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		16/02/2023	16/01/2023		T18-P2-S3-202-DP	Fallas de material	Arquitectura (A)	3	2023
#10	Trabajo inconcluso-Encofrado	Closed	Encofrado	Trabajo inconcluso		16/01/2023	16/01/2023		T18-P2-S4-206-D2	Mano de Obra	Estructuras (E)	3	2023
#26	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		17/01/2023	17/01/2023		T18-P2-S4-201-DP	Fallas de material	Arquitectura (A)	3	2023
#25	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		17/01/2023	17/01/2023		T18-P2-S4-201-D2	Fallas de material	Arquitectura (A)	3	2023
#24	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		17/02/2023	17/01/2023		T18-P2-S4-206-D2	Mano de Obra	Arquitectura (A)	3	2023
#29	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		19/02/2023	19/01/2023		T18-P3-S1-308-Pasillo	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2023
#28	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		19/02/2023	19/01/2023		T18-P3-S1-308-Sala	Mano de Obra	Arquitectura (A)	4	2023
#27	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		19/02/2023	19/01/2023		T18-P3-S1-307-DP	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2023
#32	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		20/02/2023	20/01/2023		T18-P3-S2-305-DP	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2023
#31	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		20/02/2023	20/01/2023		T18-P3-S2-305-cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2023
#30	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		20/02/2023	20/01/2023		T18-P3-S2-304-cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2023
#34	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		21/02/2023	21/01/2023		T18-P3-S3-303-BP	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2023
#33	Protuberancias-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancias		21/02/2023	21/01/2023		T18-P3-S3-303-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2023
#37	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		23/02/2023	23/01/2023		T18-P3-S4-306-Sala	Mano de Obra	Arquitectura (A)	4	2023
#36	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		23/01/2023	23/01/2023		T18-P3-S4-301-Cocina	Mano de Obra	Arquitectura (A)	4	2023
#35	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		23/02/2023	23/01/2023		T18-P3-S4-301-D2	Mano de Obra	Arquitectura (A)	4	2023
#39	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		24/02/2023	24/01/2023		T18-P3-S5-310-DP	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2023
#38	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		24/02/2023	24/01/2023		T18-P3-S5-310-D2	Mano de Obra	Arquitectura (A)	4	2023
#49	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/02/2023	25/01/2023		T18-P4-S1-408-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2023
#48	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/02/2023	25/01/2023		T18-P4-S1-407-D2	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2023
#47	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		26/02/2023	26/01/2023		T18-P4-S2-405-D2	Mano de Obra	Arquitectura (A)	5	2023
#46	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		26/02/2023	26/01/2023		T18-P4-S2-404-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	5	2023
#45	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		26/02/2023	26/01/2023		T18-P4-S2-404-D2	Mano de Obra	Arquitectura (A)	5	2023
#44	Protuberancias-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancias		28/02/2023	27/01/2023		T18-P4-S3-403-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	5	2023
#43	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		26/02/2023	27/01/2023		T18-P4-S3-402-DP	Fallas de material	Arquitectura (A)	5	2023
#55	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/03/2023	1/02/2023		T18-P5-S1-508-Sala	Mano de Obra	Arquitectura (A)	5	2023
#54	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/03/2023	1/02/2023		T18-P5-S2-505-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	5	2023
#53	Protuberancias-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancias		1/03/2023	1/02/2023		T18-P5-S2-504-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	5	2023
#42	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		28/02/2023	1/02/2023		T18-P4-S5-409-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	5	2023
#41	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		28/02/2023	1/02/2023		T18-P4-S5-409-DP	Fallas de material	Arquitectura (A)	5	2023
#40	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		28/02/2023	1/02/2023		T18-P4-S5-410-Star	Fallas de material	Arquitectura (A)	5	2023
#52	Protuberancias-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancias		2/03/2023	2/02/2023		T18-P5-S3-503-COCINA	Fallas de material	Arquitectura (A)	6	2023
#51	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		2/03/2023	2/02/2023		T18-P5-S3-502-DP	Fallas de material	Arquitectura (A)	6	2023
#50	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		3/03/2023	3/02/2023		T18-P5-S4-501-D2	Mano de Obra	Arquitectura (A)	6	2023
#58	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		4/03/2023	4/02/2023		T18-P5-S5-510-Cocina	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	6	2023
#57	Protuberancias-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		4/03/2023	4/02/2023		T18-P5-S5-510-DP	Fallas de material	Arquitectura (A)	6	2023
#68	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		6/03/2023	6/02/2023		T18-P6-S1-608-DS	Mano de Obra	Arquitectura (A)	6	2023
#67	Protuberancia-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		6/03/2023	6/02/2023		T18-P6-S1-608-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	6	2023
#66	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		6/03/2023	6/02/2023		T18-P6-S1-607-Star	Mano de Obra	Arquitectura (A)	6	2023
#64	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		7/03/2023	7/02/2023		T18-P6-S2-604-DS	Mano de Obra	Arquitectura (A)	6	2023
#63	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		7/03/2023	7/02/2023		T18-P6-S2-604-DP	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	6	2023
#62	Protuberancia-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		7/03/2023	7/02/2023		T18-P6-S2-604-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	6	2023
#61	Protuberancias-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancias		8/03/2023	8/02/2023		T18-P6-S3-603-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	6	2023
#60	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/03/2023	8/02/2023		T18-P6-S3-602-Star	Fallas de material	Arquitectura (A)	6	2023
#65	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/03/2023	9/02/2023		T18-P6-S4-606-Cocina	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2023
#59	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/03/2023	9/02/2023		T18-P6-S4-601-Cocina	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2023
#73	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/03/2023	10/02/2023		T18-P6-S5-610-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2023
#72	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/03/2023	10/02/2023		T18-P6-S5-609-Sala	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2023
#71	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/03/2023	10/02/2023		T18-P6-S5-609-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2023
#70	Protuberancia-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		10/03/2023	10/02/2023		T18-P6-S5-609-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	7	2023

[redacted] RO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#69	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento	[redacted]	10/03/2023	10/02/2023	[redacted]	T18-P6-S5-609-BV	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2023
#76	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		11/03/2023	11/02/2023		T18-P7-S1-708-cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	7	2023
#75	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		11/03/2023	11/02/2023		T18-P7-S1-707-DP	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	7	2023
#74	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		11/03/2023	11/02/2023		T18-P7-S1-707-BV	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2023
#56	Daño en Material-Entubado PEALPE	Closed	Instalaciones y pruebas	Daño en Material		11/02/2023	11/02/2023		T18-P7-S2	Mano de Obra	Estructuras (E)	7	2023
#80	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		13/03/2023	13/02/2023		T18-P7-S2-704-Sala	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2023
#79	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		13/03/2023	13/02/2023		T18-P7-S2-704-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2023
#77	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		13/03/2023	13/02/2023		T18-P7-S4-701-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	7	2023
#78	Protuberancias-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancias		14/03/2023	14/02/2023		T18-P7-S3-703-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	7	2023
#81	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/03/2023	15/02/2023		T18-P7-S4-706-D2	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2023
#84	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		16/03/2023	16/02/2023		T18-P7-S5-710-D2	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2023
#83	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		16/03/2023	16/02/2023		T18-P7-S5-709-DP	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	8	2023
#82	Protuberancia-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		16/03/2023	16/02/2023		T18-P7-S5-709-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	8	2023
#97	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		17/03/2023	17/02/2023		T18-P8-808-D3	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2023
#96	Protuberancias-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancias		17/03/2023	17/02/2023		T18-P8-S1-808-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	8	2023
#95	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		17/03/2023	17/02/2023		T18-P8-S1-807-DS	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2023
#94	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		17/03/2023	17/02/2023		T18-P8-S1-807-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	8	2023
#92	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/03/2023	18/02/2023		T18-P8-S2-805-Sala	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2023
#91	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/03/2023	18/02/2023		T18-P8-S2-805-DS	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2023
#90	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/03/2023	18/02/2023		T18-P8-S2-804-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2023
#88	Protuberancia-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		18/03/2023	18/02/2023		T18-P8-S2-804-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	8	2023
#87	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/03/2023	18/02/2023		T18-P8-S2-804-BV	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2023
#93	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		21/03/2023	20/02/2023		T18-P8-S4-806-D2	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2023
#89	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		20/03/2023	20/02/2023		T18-P8-S3-802-Star	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2023
#86	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		20/03/2023	20/02/2023		T18-P8-S2-803-D2	Fallas de material	Arquitectura (A)	8	2023
#85	Protuberancia-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancias		20/03/2023	20/02/2023		T18-P8-S3-803-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	8	2023
#105	Error en procedimiento-Instalaciones	Closed	Instalaciones y pruebas	Error en procedimiento		21/03/2023	21/02/2023		T18-P9	Error en procedimiento	Estructuras (E)	8	2023
#100	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/03/2023	22/02/2023		T18-P8-S5-809-Sala	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	8	2023
#99	Protuberancia-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		22/03/2023	22/02/2023		T18-P8-S5-809-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	8	2023
#98	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/03/2023	22/02/2023		T18-P8-S5-809-BV	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2023
#101	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		23/03/2023	23/02/2023		T18-P9-907-D2	Fallas de material	Arquitectura (A)	9	2023
#103	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		24/03/2023	24/02/2023		T18-P9-904-Cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	9	2023
#102	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		24/03/2023	24/02/2023		T18-P9-904-DP	Fallas de material	Arquitectura (A)	9	2023
#107	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/03/2023	25/02/2023		T18-P9-902-Sala	Mano de Obra	Arquitectura (A)	9	2023
#106	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/03/2023	25/02/2023		T18-P9-902-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	9	2023
#104	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/03/2023	25/02/2023		T18-P9-903-Sala	Mano de Obra	Arquitectura (A)	9	2023
#122	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/04/2023	1/03/2023		T18-P10-S1-1008	Fallas de material	Arquitectura (A)	9	2023
#121	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/04/2023	1/03/2023		T18-P10-1007-DP	Fallas de material	Arquitectura (A)	9	2023
#120	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/04/2023	1/03/2023		T18-P10-S1-1007	Mano de Obra	Arquitectura (A)	9	2023
#111	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/04/2023	1/03/2023		T18-P9-S5-909-DP	Fallas de material	Arquitectura (A)	9	2023
#110	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/04/2023	1/03/2023		T18-P9-S4-906-Star	Mano de Obra	Arquitectura (A)	9	2023
#109	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/04/2023	1/03/2023		T18-P9-S4-901-Star	Fallas de material	Arquitectura (A)	9	2023
#108	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/04/2023	1/03/2023		T18-P9-S4-901-BV	Mano de Obra	Arquitectura (A)	9	2023
#118	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		3/04/2023	2/03/2023		T18-P10-S2-1005	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#117	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		2/04/2023	2/03/2023		T18-P10-S2-1005	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#123	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		3/04/2023	3/03/2023		T18-P10-S3-1002	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#116	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		3/04/2023	3/03/2023		T18-P10-S3-1003	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#115	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		3/04/2023	3/03/2023		T18-P10-S3-1003	Fallas de material	Arquitectura (A)	10	2023
#114	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		3/04/2023	3/03/2023		T18-P10-S3-1002	Fallas de material	Arquitectura (A)	10	2023
#119	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		4/04/2023	4/03/2023		T18-P10-S4-1006	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#113	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		4/04/2023	4/03/2023		T18-P10-S4-1001	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#112	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		4/04/2023	4/03/2023		T18-P10-S4-1001	Fallas de material	Arquitectura (A)	10	2023
#131	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		6/04/2023	6/03/2023		T18-P10-S5-1010	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#130	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		6/04/2023	6/03/2023		T18-P10-S5-1010	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#129	Cangrejera-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Cangrejera		6/04/2023	6/03/2023		T18-P10-S5-1009	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#135	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		7/04/2023	7/03/2023		T18-P11-S1-1108	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#134	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		7/04/2023	7/03/2023		T18-P11-S1-1108	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#133	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		7/04/2023	7/03/2023		T18-P11-S1-1107	Fallas de material	Arquitectura (A)	10	2023
#132	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		7/04/2023	7/03/2023		T18-P11-S1-1107	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#137	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/04/2023	8/03/2023		T18-P11-S2-1105	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#136	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/04/2023	8/03/2023		T18-P11-S2-1104	Mano de Obra	Arquitectura (A)	10	2023
#142	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/04/2023	9/03/2023		T18-P11-S3-1103	Mano de Obra	Arquitectura (A)	11	2023
#141	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/04/2023	9/03/2023		T18-P11-S3-1103	Mano de Obra	Arquitectura (A)	11	2023
#140	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/04/2023	9/03/2023		T18-P11-S3-1103	Mano de Obra	Arquitectura (A)	11	2023
#139	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/04/2023	9/03/2023		T18-P11-S3-1102	Mano de Obra	Arquitectura (A)	11	2023
#138	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/04/2023	9/03/2023		T18-P11-S3-1102	Fallas de material	Arquitectura (A)	11	2023
#143	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/04/2023	10/03/2023		T18-P11-S4-1101	Mano de Obra	Arquitectura (A)	11	2023
#128	Protuberancia-Solaqueo	Closed	Solaqueo	Protuberancia		17/03/2023	10/03/2023		T18-P2-S5-210-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	11	2023
#127	Trabajo inconcluso-Solaqueo	Closed	Solaqueo	Trabajo inconcluso		17/03/2023	10/03/2023		T18-P2-S2-204-DS	Mano de Obra	Arquitectura (A)	11	2023
#126	Protuberancia-Solaqueo	Closed	Solaqueo	Protuberancia		17/03/2023	10/03/2023		T18-P2-S3-202-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	11	2023

[redacted] TRO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#125	Protuberancia-Solaqueo	Closed	Solaqueo	Protuberancias	[redacted]	17/03/2023	10/03/2023	[redacted]	T18-P2-S3-202-Cocina	Mano de Obra	Arquitectura (A)	11	2023
#124	Trabajo Inconcluso-Solaqueo	Closed	Solaqueo	Trabajo inconcluso		17/03/2023	10/03/2023		T18-P2-S4-201-BV	Mano de Obra	Arquitectura (A)	11	2023
#145	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		11/04/2023	11/03/2023		T18-P11-S2-1105	Mano de Obra	Arquitectura (A)	11	2023
#144	Desalineamiento-Concreto Post vaciado	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		11/04/2023	11/03/2023		T18-P11-S5-1109	Mano de Obra	Arquitectura (A)	11	2023
#149	Quiñe-Tabiquería	Closed	Tabiquería	Quiñe		17/04/2023	16/03/2023		T18-P5-S4-506-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#148	Desalineamiento-Tabiquería	Closed	Tabiquería	Desalineamiento		16/04/2023	16/03/2023		T18-P5-S3-503-BP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#147	Despostillamiento-Tabiquería	Closed	Tabiquería	Despostillamiento		17/04/2023	16/03/2023		T18-P5-S3-502-BP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#146	Trabajo inconcluso-Tabiquería	Closed	Tabiquería	Trabajo inconcluso		17/04/2023	16/03/2023		T18-P4-S4-401-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#168	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S5-1210	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#167	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S5-1210	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#166	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S5-1209	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#165	Protuberancias	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancias		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S5-1209	Fallas de material	Arquitectura (A)	12	2023
#164	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S1-1208	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#163	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S1-1207	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#162	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S1-1207	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#161	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S4-1206	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#160	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S2-1205	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#159	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S2-1205	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#158	Protuberancias	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancias		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S2-1204	Fallas de material	Arquitectura (A)	12	2023
#157	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S2-1204	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#156	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S3-1203	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#155	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S3-1203	Fallas de material	Arquitectura (A)	12	2023
#154	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S3-1202	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#153	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S3-1202	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#152	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S3-1202	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#151	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S4-1201	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#150	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		18/04/2023	18/03/2023		T18-P12-S4-1201	Mano de Obra	Arquitectura (A)	12	2023
#184	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P14-S1-1408	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#183	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P14-S1-1407	Fallas de material	Arquitectura (A)	13	2023
#182	Desalineamineto	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P14-S1-1407	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#181	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P14-S1-1407	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#180	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P13-S5-1310	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#179	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P13-S5-1310	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#178	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P13-S5-1309	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#177	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P13-S5-1309	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#176	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P13-S1-1308	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#175	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P13-S1-1307	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#174	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P13-S4-1306	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#173	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P13-S4-1306	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#172	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P13-S2-1305	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#171	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P13-S2-1305	Fallas de material	Arquitectura (A)	13	2023
#170	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P13-S4-1301	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#169	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		25/04/2023	25/03/2023		T18-P13-S4-1301	Mano de Obra	Arquitectura (A)	13	2023
#194	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/05/2023	1/04/2023		T18-P15-S1-1508	Mano de Obra	Arquitectura (A)	14	2023
#193	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/05/2023	1/04/2023		T18-P14-S4-1406	Mano de Obra	Arquitectura (A)	14	2023
#191	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/05/2023	1/04/2023		T18-P14-S5-1409	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	14	2023
#190	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/05/2023	1/04/2023		T18-P14-S2-1404	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	14	2023
#189	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/05/2023	1/04/2023		T18-P14-S3-1403	Mano de Obra	Arquitectura (A)	14	2023
#188	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/05/2023	1/04/2023		T18-P14-S3-1402	Mano de Obra	Arquitectura (A)	14	2023
#187	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/05/2023	1/04/2023		T18-P14-S4-1406	Mano de Obra	Arquitectura (A)	14	2023
#186	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/05/2023	1/04/2023		T18-P14-S2-1405	Mano de Obra	Arquitectura (A)	14	2023
#185	Protuberancia	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/05/2023	1/04/2023		T18-P14-S2-1404	Fallas de material	Arquitectura (A)	14	2023
#197	Protunerancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		10/04/2023	3/04/2023		T18-P3-S5-309	Mano de Obra	Arquitectura (A)	14	2023
#196	Solaqueo	Closed	Solaqueo	Trabajo inconcluso		10/04/2023	3/04/2023		T18-P3-S1-307	Mano de Obra	Arquitectura (A)	14	2023
#195	Mal Acabado	Closed	Solaqueo	Mal acabado		10/04/2023	3/04/2023		T18-P3-S4-306	Mano de Obra	Arquitectura (A)	14	2023
#200	Trabajo inconcluso	Closed	Tabiquería	Trabajo Inconcluso		11/04/2023	4/04/2023		T18-P8-S1-807	Mano de Obra	Arquitectura (A)	14	2023
#199	Protuberancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		11/04/2023	4/04/2023		T18-P4-S1-407	Mano de Obra	Arquitectura (A)	14	2023
#198	Dimensiones incorrectas	Closed	Solaqueo	Dimensiones incorrectas		11/04/2023	4/04/2023		T18-P4-S2-405	Mano de Obra	Arquitectura (A)	14	2023
#214	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/05/2023	8/04/2023		T18-P16-S1-1607	Fallas de material	Arquitectura (A)	15	2023
#213	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/05/2023	8/04/2023		T18-P15-S3-1502	Fallas de material	Arquitectura (A)	15	2023
#212	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/05/2023	8/04/2023		T18-P15-S3-1502	Fallas de material	Arquitectura (A)	15	2023
#211	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/05/2023	8/04/2023		T18-P15-S3-1503	Fallas de material	Arquitectura (A)	15	2023
#210	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/05/2023	8/04/2023		T18-P15-S2-1504	Fallas de material	Arquitectura (A)	15	2023
#209	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/05/2023	8/04/2023		T18-P15-S2-1505	Fallas de material	Arquitectura (A)	15	2023
#208	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/05/2023	8/04/2023		T18-P15-S4-1506	Mano de Obra	Arquitectura (A)	15	2023
#207	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/05/2023	8/04/2023		T18-P15-S5-1509	Fallas de material	Arquitectura (A)	15	2023
#206	Dimensiones incorrectas	Closed	Solaqueo	Dimensiones incorrectas		17/04/2023	10/04/2023		T18-P6-S4-606	Mano de Obra	Arquitectura (A)	15	2023
#205	Trabajo inconcluso	Closed	Solaqueo	Trabajo Inconcluso		17/04/2023	10/04/2023		T18-P6-S3-603	Mano de Obra	Arquitectura (A)	15	2023
#204	Dimension incorrecta	Closed	Solaqueo	Dimension incorrecta		17/04/2023	10/04/2023		T18-P6-S4-601	Mano de Obra	Arquitectura (A)	15	2023
#203	Desalineamiento	Closed	Solaqueo	Desalineamiento		17/04/2023	10/04/2023		T18-P5-S5-509	Mano de Obra	Arquitectura (A)	15	2023

[redacted] TRO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#202	Trabajo inconcluso	Closed	Solaqueo	Trabajo inconcluso	[redacted]	17/04/2023	10/04/2023	[redacted]	T18-P5-S1-507	Mano de Obra	Arquitectura (A)	15	2023
#201	Desalineamiento	Closed	Solaqueo	Desalineamiento		17/04/2023	10/04/2023		T18-P5-S3-503	Mano de Obra	Arquitectura (A)	15	2023
#225	Trabajo inconcluso	Closed	Enchape	Trabajo inconcluso		19/04/2023	12/04/2023		T18-P2-S1-208	Mano de Obra	Arquitectura (A)	15	2023
#226	Ubicación incorrecta	Closed	Enchape	Ubicación incorrecta		20/04/2023	13/04/2023		T18-P4-AC	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#224	Protuberancia	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		15/05/2023	15/04/2023		T18-P16-S5-1610	Fallas de material	Arquitectura (A)	16	2023
#223	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/05/2023	15/04/2023		T18-P16-S1-1607	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#222	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/05/2023	15/04/2023		T18-P16-S4-1606	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#221	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/05/2023	15/04/2023		T18-P16-S2-1605	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#220	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/05/2023	15/04/2023		T18-P16-S2-1604	Fallas de material	Arquitectura (A)	16	2023
#218	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/05/2023	15/04/2023		T18-P16-S3-1603	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#217	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/05/2023	15/04/2023		T18-P16-S3-1602	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#216	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/05/2023	15/04/2023		T18-P16-S3-1602	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#215	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/06/2023	15/04/2023		T18-P16-S4-1601	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#240	Trabajo inconcluso	Closed	Solaqueo	Trabajo inconcluso		17/05/2023	17/04/2023		T18-P7-S5-709	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#239	Trabajo inconcluso	Closed	Solaqueo	Trabajo inconcluso		17/05/2023	17/04/2023		T18-P7-S1-707	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#238	Trabajo inconcluso	Closed	Solaqueo	Trabajo inconcluso		17/05/2023	17/04/2023		T18-P7-S2-705	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#246	Trabajo inconcluso	Closed	Tabiquería	Trabajo inconcluso		18/05/2023	18/04/2023		T18-P11-S5-1110	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#245	Trabajo inconcluso	Closed	Enchape	Trabajo inconcluso		18/05/2023	18/04/2023		T18-P4-S5-409	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#244	Trabajo inconcluso	Closed	Enchape	Trabajo inconcluso		18/05/2023	18/04/2023		T18-P4-S2-403	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#243	Protuberancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		18/05/2023	18/04/2023		T18-P8-S1-807	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#242	Protuberancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		18/05/2023	18/04/2023		T18-P8-S2-805	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#241	Protuberancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		18/05/2023	18/04/2023		T18-P8-S3-802	Mano de Obra	Arquitectura (A)	16	2023
#237	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/05/2023	22/04/2023		T18-P17-S5-1710	Mano de Obra	Arquitectura (A)	17	2023
#236	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/05/2023	22/04/2023		T18-P17-S5-1709	Mano de Obra	Arquitectura (A)	17	2023
#235	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/05/2023	22/04/2023		T18-P17-S1-1708	Mano de Obra	Arquitectura (A)	17	2023
#234	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/05/2023	22/04/2023		T18-P17-S1-1708	Mano de Obra	Arquitectura (A)	17	2023
#233	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/05/2023	22/04/2023		T18-P17-S5-1709	Fallas de material	Arquitectura (A)	17	2023
#232	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/05/2023	22/04/2023		T18-P17-S1-1707	Mano de Obra	Arquitectura (A)	17	2023
#231	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/05/2023	22/04/2023		T18-P17-S1-1707	Mano de Obra	Arquitectura (A)	17	2023
#230	Protuberancia	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		22/05/2023	22/04/2023		T18-P17-S4-1706	Mano de Obra	Arquitectura (A)	17	2023
#229	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/05/2023	22/04/2023		T18-P17-S4-1706	Mano de Obra	Arquitectura (A)	17	2023
#228	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/05/2023	22/04/2023		T18-P17-S3-1703	Mano de Obra	Arquitectura (A)	17	2023
#227	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/05/2023	22/04/2023		T18-P17-S4-1701	Mano de Obra	Arquitectura (A)	17	2023
#249	Mal acabado	Closed	Enchape	Mal acabado		25/05/2023	25/04/2023		T18-P5-S5-510	Mano de Obra	Arquitectura (A)	17	2023
#255	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		30/05/2023	29/04/2023		T18-P18-S5-1810	Mano de Obra	Arquitectura (A)	18	2023
#254	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		30/05/2023	29/04/2023		T18-P18-S1-1807	Mano de Obra	Arquitectura (A)	18	2023
#253	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		30/05/2023	29/04/2023		T18-P18-S1-1807	Mano de Obra	Arquitectura (A)	18	2023
#252	Protuberancias	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancias		30/05/2023	29/04/2023		T18-P18-S2-1805	Fallas de material	Arquitectura (A)	18	2023
#251	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		30/05/2023	29/04/2023		T18-P18-S2-1804	Mano de Obra	Arquitectura (A)	18	2023
#250	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		30/05/2023	29/04/2023		T18-P18-S4-1801	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	18	2023
#248	Dimensiones incorrectas	Closed	Solaqueo	Dimensiones incorrectas		29/05/2023	29/04/2023		T18-P9-S5-910	Mano de Obra	Arquitectura (A)	18	2023
#247	Protuberancias	Closed	Solaqueo	Protuberancias		29/05/2023	29/04/2023		T18-P9-S2-905	Mano de Obra	Arquitectura (A)	18	2023
#285	Protuberancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		3/06/2023	3/05/2023		T18-P10-S1-1007	Mano de Obra	Arquitectura (A)	18	2023
#284	Protuberancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		3/06/2023	3/05/2023		T18-P10-S4-1001	Fallas de material	Arquitectura (A)	18	2023
#283	Trabajo Inconcluso	Closed	Solaqueo	Trabajo Inconcluso		3/06/2023	3/05/2023		T18-P10-S3-1002	Mano de Obra	Arquitectura (A)	18	2023
#263	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		6/06/2023	6/05/2023		T18-P19-S5-1909	Mano de Obra	Arquitectura (A)	19	2023
#262	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		6/06/2023	6/05/2023		T18-P19-S1-1908	Fallas de material	Arquitectura (A)	19	2023
#261	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		6/06/2023	6/05/2023		T18-P19-S1-1907	Mano de Obra	Arquitectura (A)	19	2023
#260	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		6/06/2023	6/05/2023		T18-P19-S2-1905	Mano de Obra	Arquitectura (A)	19	2023
#259	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		6/06/2023	6/05/2023		T18-P19-S2-1904	Mano de Obra	Arquitectura (A)	19	2023
#258	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		6/06/2023	6/05/2023		T18-P19-S3-1903	Mano de Obra	Arquitectura (A)	19	2023
#257	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		6/06/2023	6/05/2023		T18-P19-S4-1901	Mano de Obra	Arquitectura (A)	19	2023
#256	Cajoneo	Closed	Enchape	Cajoneo		6/06/2023	6/05/2023		T18-P6-S5-609	Mano de Obra	Arquitectura (A)	19	2023
#266	Falta de recubrimiento	Closed	Acero	Falta de recubrimiento		9/06/2023	9/05/2023		T17-Platea-S3	Mano de Obra	Estructuras (E)	19	2023
#265	Trabajo inconcluso	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso		9/06/2023	9/05/2023		T17-Platea-S3	Mano de Obra	Estructuras (E)	19	2023
#264	Desplome	Closed	Encofrado	Desplome		9/06/2023	9/05/2023		T17-Platea-S3	Mano de Obra	Estructuras (E)	19	2023
#272	Desalineamiento	Closed	Tabiquería	Desalineamiento		13/06/2023	13/05/2023		T18-P13-S1-1308	Mano de Obra	Arquitectura (A)	20	2023
#271	Protuberancia	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		13/06/2023	13/05/2023		T18-P20-S1-2008	Fallas de material	Arquitectura (A)	20	2023
#270	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		13/06/2023	13/05/2023		T18-P20-S1-2007	Mano de Obra	Arquitectura (A)	20	2023
#269	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		13/06/2023	13/05/2023		T18-P20-S1-2007	Fallas de material	Arquitectura (A)	20	2023
#268	Despostillamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Despostillamiento		13/06/2023	13/05/2023		T18-P20-S2-2004	Mano de Obra	Arquitectura (A)	20	2023
#267	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		13/06/2023	13/05/2023		T18-P20-S4-2001	Mano de Obra	Arquitectura (A)	20	2023
#279	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		20/06/2023	20/05/2023		T18-AZOTEA-S5-Parapeto	Mano de Obra	Arquitectura (A)	21	2023
#278	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		20/06/2023	20/05/2023		T18-AZOTEA-S2-Parapetos	Mano de Obra	Arquitectura (A)	21	2023
#277	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		20/06/2023	20/05/2023		T18-AZOTEA-S1-Parapetos	Mano de Obra	Arquitectura (A)	21	2023
#276	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		20/06/2023	20/05/2023		T18-AZOTEA-S1-Parapetos	Mano de Obra	Arquitectura (A)	21	2023
#275	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		20/06/2023	20/05/2023		T18-AZOTEA-S4-2101	Mano de Obra	Arquitectura (A)	21	2023
#274	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		20/06/2023	20/05/2023		T18-AZOTEA-S4-2106	Mano de Obra	Arquitectura (A)	21	2023
#273	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		20/06/2023	20/05/2023		T18-AZOTEA-S5-2110	Mano de Obra	Arquitectura (A)	21	2023
#282	Trabajo inconcluso	Closed	Enchape	Trabajo Inconcluso		27/06/2023	27/05/2023		T18-P9-S4-906	Mano de Obra	Arquitectura (A)	22	2023

[redacted] TRO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#281	Trabajo Inconcluso	Closed	Enchape	Trabajo Inconcluso	[redacted]	27/06/2023	27/05/2023	[redacted]	T18-P7-S4-706	Mano de Obra	Arquitectura (A)	22	2023
#280	Cajoneo	Closed	Enchape	Cajoneo		27/06/2023	27/05/2023		T18-P7-S2-704	Mano de Obra	Arquitectura (A)	22	2023
#295	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/07/2023	2/06/2023		T17-P1-S2-106	Mano de Obra	Arquitectura (A)	23	2023
#294	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/07/2023	2/06/2023		T17-P1-S2-106	Fallas de material	Arquitectura (A)	23	2023
#293	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/07/2023	2/06/2023		T17-P1-S3-107	Fallas de material	Arquitectura (A)	23	2023
#292	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/07/2023	2/06/2023		T17-P1-S3-108	Mano de Obra	Arquitectura (A)	23	2023
#291	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/07/2023	2/06/2023		T17-P1-S3-108	Fallas de material	Arquitectura (A)	23	2023
#290	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/07/2023	2/06/2023		T17-P1-S4-101	Mano de Obra	Arquitectura (A)	23	2023
#289	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/07/2023	2/06/2023		T17-P1-S4-102	Fallas de material	Arquitectura (A)	23	2023
#288	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/07/2023	2/06/2023		T17-P1-S1-104	Fallas de material	Arquitectura (A)	23	2023
#287	Burbujas	Closed	Concreto Post vaciado	Burbujas		1/07/2023	2/06/2023		T17-P1-S1-103	Mano de Obra	Arquitectura (A)	23	2023
#286	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/07/2023	2/06/2023		T17-P1-S1-103	Fallas de material	Arquitectura (A)	23	2023
#299	Dimensiones incorrectas	Closed	Solaqueo	Dimensiones incorrectas		5/07/2023	5/06/2023		T18-P17-S1-1707	Mano de Obra	Arquitectura (A)	23	2023
#298	Dimensiones incorrectas	Closed	Solaqueo	Dimensiones incorrectas		5/07/2023	5/06/2023		T18-P17-S2-1704	Mano de Obra	Arquitectura (A)	23	2023
#297	Protuberancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		5/07/2023	5/06/2023		T18-P17-S4-1701	Fallas de material	Arquitectura (A)	23	2023
#296	Protuberancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		5/07/2023	5/06/2023		T18-P17-S4-701	Fallas de material	Arquitectura (A)	23	2023
#306	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/07/2023	10/06/2023		T17-P2-S3-208	Mano de Obra	Arquitectura (A)	24	2023
#305	Protuberancia	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		10/07/2023	10/06/2023		T17-P2-S3-207	Fallas de material	Arquitectura (A)	24	2023
#304	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/07/2023	10/06/2023		T17-P2-S2-206	Mano de Obra	Arquitectura (A)	24	2023
#303	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/07/2023	10/06/2023		T17-P2-S2-205	Mano de Obra	Arquitectura (A)	24	2023
#302	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/07/2023	10/06/2023		T17-P2-S1-203	Mano de Obra	Arquitectura (A)	24	2023
#301	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/07/2023	10/06/2023		T17-P2-S4-202	Mano de Obra	Arquitectura (A)	24	2023
#300	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/07/2023	10/06/2023		T17-P2-S4-201	Mano de Obra	Arquitectura (A)	24	2023
#313	protuberancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		17/07/2023	17/06/2023		T18-P19-S4-101	Mano de Obra	Arquitectura (A)	25	2023
#312	protuberancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		17/07/2023	17/06/2023		T18-P18-S4-1806	Mano de Obra	Arquitectura (A)	25	2023
#311	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		17/07/2023	17/06/2023		T17-P3-S1-303	Fallas de material	Arquitectura (A)	25	2023
#310	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		17/07/2023	17/06/2023		T17-P3-S4-302	Mano de Obra	Arquitectura (A)	25	2023
#309	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		17/07/2023	17/06/2023		T17-P3-S4-302	Fallas de material	Arquitectura (A)	25	2023
#308	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		17/07/2023	17/06/2023		T17-P3-S4-301	Fallas de material	Arquitectura (A)	25	2023
#307	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		17/07/2023	17/06/2023		T17-P3-S4-301	Mano de Obra	Arquitectura (A)	25	2023
#323	Desalineamiento	Closed	Solaqueo	Desalineamiento		24/07/2023	24/06/2023		T18-P20-S5-2010	Mano de Obra	Arquitectura (A)	26	2023
#322	Protuberancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		24/07/2023	24/06/2023		T18-P20-S1-2008	Mano de Obra	Arquitectura (A)	26	2023
#321	Desalineamiento	Closed	Solaqueo	Desalineamiento		24/07/2023	24/06/2023		T18-P20-S4-2001	Mano de Obra	Arquitectura (A)	26	2023
#320	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		24/07/2023	24/06/2023		T17-P4-S1-404	Fallas de material	Arquitectura (A)	26	2023
#319	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		24/07/2023	24/06/2023		T17-P4-S1-404	Fallas de material	Arquitectura (A)	26	2023
#318	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		24/07/2023	24/06/2023		T17-P4-S1-403	Fallas de material	Arquitectura (A)	26	2023
#317	desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		24/07/2023	24/06/2023		T17-P4-S4-402	Fallas de material	Arquitectura (A)	26	2023
#316	protuberancia	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		24/07/2023	24/06/2023		T17-P4-S4-402	Fallas de material	Arquitectura (A)	26	2023
#315	protuberancia	Closed	Concreto Post vaciado	Protuberancia		24/07/2023	24/06/2023		T17-P4-S4-401	Fallas de material	Arquitectura (A)	26	2023
#314	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		24/07/2023	24/06/2023		T17-P4-S4-401	Fallas de material	Arquitectura (A)	26	2023
#329	Mal acabado	Closed	Solaqueo	Desalineamiento		1/08/2023	1/07/2023		T17-P2-S1-204	Mano de Obra	Arquitectura (A)	27	2023
#328	Protuberancia	Closed	Solaqueo	Protuberancia		1/08/2023	1/07/2023		T17-P1-S4-101	Fallas de material	Arquitectura (A)	27	2023
#327	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/08/2023	1/07/2023		T17-P5-S1-504	Fallas de material	Arquitectura (A)	27	2023
#326	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/08/2023	1/07/2023		T17-P5-S1-503	Fallas de material	Arquitectura (A)	27	2023
#325	protuberancia	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/08/2023	1/07/2023		T17-P5-S4-502	Fallas de material	Arquitectura (A)	27	2023
#324	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		1/08/2023	1/07/2023		T17-P5-S4-502	Fallas de material	Arquitectura (A)	27	2023
#341	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/08/2023	8/07/2023		T17-P7-S1-704	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#340	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/08/2023	8/07/2023		T17-P7-S1-703	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#339	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/08/2023	8/07/2023		T17-P7-S1-703	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#338	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/08/2023	8/07/2023		T17-P7-S4-702	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#337	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	T17-P7-S4-702		8/08/2023	8/07/2023		T17-P7-S4-702	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#336	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/08/2023	8/07/2023		T17-P7-S4-701	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#335	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/08/2023	8/07/2023		T17-P6-S4-608	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#334	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/08/2023	8/07/2023		T17-P6-SS2-605	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#333	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/08/2023	8/07/2023		T17-P6-S2-605	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#332	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/08/2023	8/07/2023		T17-P6-S1-604	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#331	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/08/2023	8/07/2023		T17-P6-S4-601	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#330	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		8/08/2023	8/07/2023		T17-P6-S4-601	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#391	Bajo espesor de pintura	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		11/07/2023	10/07/2023		T18-P12-S1-1208			28	2023
#390	Bajo espesor de pintura	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		11/07/2023	10/07/2023		T18-P13-S1-1308	Mano de Obra	Arquitectura (A)	28	2023
#389	Bajo espesor de pintura	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		11/07/2023	10/07/2023		T18-P10-S1-1008	Mano de Obra	Arquitectura (A)	28	2023
#388	Bajo espesor de pintura	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		11/07/2023	10/07/2023		T18-P6-S1-608	Mano de Obra	Arquitectura (A)	28	2023
#369	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		24/07/2023	10/07/2023		T18-P3-S1-308	Mano de Obra	Arquitectura (A)	28	2023
#368	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		24/07/2023	10/07/2023		T18-P3-S3-302	Mano de Obra	Arquitectura (A)	28	2023
#367	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		24/07/2023	10/07/2023		T18-P2-S4-206	Mano de Obra	Arquitectura (A)	28	2023
#366	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		24/07/2023	10/07/2023		T18-P2-S3-205	Mano de Obra	Arquitectura (A)	28	2023
#346	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/08/2023	10/07/2023		T18-P8-S5-808	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#345	Mal acabado	Closed	Concreto Post vaciado	Mal acabado		10/08/2023	10/07/2023		T17-P8-S2-805	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	28	2023
#344	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/08/2023	10/07/2023		T17-P8-S2-805	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023
#343	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		10/08/2023	10/07/2023		T17-P8-S2-805	Fallas de material	Arquitectura (A)	28	2023

[redacted] TRO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#342	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento	[redacted]	10/08/2023	10/07/2023	[redacted]	T17-P8-S2-805	Mano de Obra	Arquitectura (A)	28	2023
#371	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		26/07/2023	12/07/2023		T18-P7-S1-707	Mano de Obra	Arquitectura (A)	28	2023
#370	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		26/07/2023	12/07/2023		T18-P7-S4-701	Mano de Obra	Arquitectura (A)	28	2023
#373	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		27/07/2023	13/07/2023		T18-P8-S3-803	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#372	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		27/07/2023	13/07/2023		T18-P8-S3-803	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#375	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		31/07/2023	14/07/2023		T18-P9-S2-905	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#374	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		31/07/2023	14/07/2023		T18-P9-S2-904	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#378	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		31/07/2023	15/07/2023		T18-P10-S5-1010	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#377	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		31/07/2023	15/07/2023		T18-P10-S4-1006	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#376	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		31/07/2023	15/07/2023		T18-P10-S2-1005	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#351	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/08/2023	15/07/2023		T17-P9-S2-905	Fallas de material	Arquitectura (A)	29	2023
#350	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/08/2023	15/07/2023		T17-P9-S2-905	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	29	2023
#349	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/08/2023	15/07/2023		T17-P9-S1-904	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	29	2023
#348	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/08/2023	15/07/2023		T17-P9-S4-901	Fallas de material	Arquitectura (A)	29	2023
#347	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		15/08/2023	15/07/2023		T17-P9-S4-901	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#393	Carpinteria metalica	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		18/07/2023	17/07/2023		T18-P13-S1-1307			29	2023
#392	Bajo espesor de pintura	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		18/07/2023	17/07/2023		T18-P4-S1-407	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#381	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		31/07/2023	17/07/2023		T18-P12-S1-1208	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#380	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		31/08/2023	17/07/2023		T18-P12-S2-1205	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#379	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		31/07/2023	17/07/2023		T18-P11-S3-1103	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#383	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		1/08/2023	18/07/2023		T18-P14-S4-1406	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#382	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		1/08/2023	18/07/2023		T18-P13-S3-1302	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#385	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		2/08/2023	19/07/2023		T18-P16-S5-1610	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#384	Dimensión incorrecta de junta en piso laminado	Closed	Acabados	Dimensión incorrecta		2/08/2023	19/07/2023		T18-P15-S1-1507	Mano de Obra	Arquitectura (A)	29	2023
#361	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/08/2023	22/07/2023		T17-P11-S3-1107	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	30	2023
#360	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/08/2023	22/07/2023		T17-P11-S2-1106	Mano de Obra	Arquitectura (A)	30	2023
#359	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/08/2023	22/07/2023		T17-P11-S2-1106	Fallas de material	Arquitectura (A)	30	2023
#358	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/08/2023	22/07/2023		T17-P11-S2-1105	Fallas de material	Arquitectura (A)	30	2023
#357	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/08/2023	22/07/2023		T17-P11-S4-1101	Fallas de material	Arquitectura (A)	30	2023
#356	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/08/2023	22/07/2023		T17-P10-S1-1004	Mano de Obra	Arquitectura (A)	30	2023
#355	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/08/2023	22/07/2023		T17-P10-S1-1003	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	30	2023
#354	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/08/2023	22/07/2023		T17-P10-S1-1003	Fallas de material	Arquitectura (A)	30	2023
#353	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/08/2023	22/07/2023		T17-P10-S4-1002	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	30	2023
#352	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		22/08/2023	22/07/2023		T17-P10-S4-1001	Mano de Obra	Arquitectura (A)	30	2023
#387	Desalineamiento	Closed	Solaqueo	Desalineamiento		28/08/2023	27/07/2023		T17-P4-S2-405	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	31	2023
#386	Desalineamiento	Closed	Solaqueo	Desalineamiento		28/08/2023	27/07/2023		T17-P4-S4-401	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	31	2023
#365	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		29/08/2023	29/07/2023		T17-P13-S4-1301	Fallas de material	Arquitectura (A)	31	2023
#364	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		29/08/2023	29/07/2023		T17-P13-S4-1301	Fallas de material	Arquitectura (A)	31	2023
#363	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		29/08/2023	29/07/2023		T17-P12-S4-1201	Fallas de material	Arquitectura (A)	31	2023
#362	Desalineamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		29/08/2023	29/07/2023		T17-P12-S4-1201	Mano de Obra	Arquitectura (A)	31	2023
#426	Desalineamiento en muro	Closed	Solaqueo	Trabajo inconcluso		5/09/2023	5/08/2023		T17-P7-708	Mano de Obra	Arquitectura (A)	32	2023
#425	Desalineamiento en muro	Closed	Solaqueo	Trabajo inconcluso		5/09/2023	5/08/2023		T17-P7-708	Mano de Obra	Arquitectura (A)	32	2023
#397	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		5/09/2023	5/08/2023		T17-P15-S2-1504	Fallas de material	Arquitectura (A)	32	2023
#396	Desalineamiento en esquinero	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		5/09/2023	5/08/2023		T17-P15-S3-1502	Fallas de material	Arquitectura (A)	32	2023
#395	Desalineamiento en esquinero	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		5/09/2023	5/08/2023		T17-P14-S3-1403	Fallas de material	Arquitectura (A)	32	2023
#394	Desalineamiento en losa	Closed	Concreto Post vaciado	Desalinemiento		5/09/2023	5/08/2023		T17-P14-S3-1402	Fallas de material	Arquitectura (A)	32	2023
#403	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		12/09/2023	12/08/2023		T17-P16-S2-1605	Fallas de material	Arquitectura (A)	33	2023
#402	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		12/09/2023	12/08/2023		T17-P16-S2-1605	Fallas de material	Arquitectura (A)	33	2023
#401	Desalineamiento en esquina	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		12/09/2023	12/08/2023		T17-P16-S4-1601			33	2023
#400	Desalineamiento en esquina	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		12/09/2023	12/08/2023		T17-P16-S4-1601	Fallas de material	Arquitectura (A)	33	2023
#399	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		12/09/2023	12/08/2023		T17-P16-S2-1604	Fallas de material	Arquitectura (A)	33	2023
#398	Desalineamiento en esquina	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		12/09/2023	12/08/2023		T17-P16-S3-1603	Fallas de material	Arquitectura (A)	33	2023
#411	Desalineamiento en esquina	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		19/09/2023	19/08/2023		T17-P17-S2-1704	Fallas de material	Arquitectura (A)	34	2023
#410	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		19/09/2023	19/08/2023		T17-P17-S3-1703	Fallas de material	Arquitectura (A)	34	2023
#409	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		19/09/2023	19/08/2023		T17-P17-S2-1703	Fallas de material	Arquitectura (A)	34	2023
#408	Desalineamiento en esquina	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		19/09/2023	19/08/2023		T17-P17-S1-1708	Fallas de material	Arquitectura (A)	34	2023
#407	Desalineamiento en losa	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		19/09/2023	19/08/2023		T17-P17-S1-1708	Fallas de material	Arquitectura (A)	34	2023
#406	Desalineamiento en esquina	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		19/09/2023	19/08/2023		T17-P17-S1-1708	Fallas de material	Arquitectura (A)	34	2023
#405	Desalineamiento en esquina	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		19/09/2023	19/08/2023		T17-P17-S4-1706	Fallas de material	Arquitectura (A)	34	2023
#404	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		19/09/2023	19/08/2023		T17-P17-S3-1705	Fallas de material	Arquitectura (A)	34	2023
#432	Quiñe	Closed	Tabiquería	Mal acabado		9/09/2023	26/08/2023		T17-P10-S2-1005	Mano de Obra	Arquitectura (A)	35	2023
#431	Fisura	Closed	Tabiquería	Mal acabado		9/09/2023	26/08/2023		T17-P10-S3-1008	Mano de Obra	Arquitectura (A)	35	2023
#428	Desalineamiento en muro	Closed	Solaqueo	Trabajo inconcluso		26/09/2023	26/08/2023		T17-P10-1003	Mano de Obra	Arquitectura (A)	35	2023
#427	Desalineamiento en muro	Closed	Solaqueo	Trabajo inconcluso		26/09/2023	26/08/2023		T17-P10-1004	Mano de Obra	Arquitectura (A)	35	2023
#424	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		26/09/2023	26/08/2023		T17-P18-S4-1801	Fallas de material	Arquitectura (A)	35	2023
#415	Desalineamiento es esquina	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		26/09/2023	26/08/2023		T17-P18-S4-1801	Fallas de material	Arquitectura (A)	35	2023
#414	Desalineamiento en esquina	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		26/09/2023	26/08/2023		T17-P18-S4-1801	Fallas de material	Arquitectura (A)	35	2023
#413	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		26/09/2023	26/08/2023		T17-P18-S2-1804	Fallas de material	Arquitectura (A)	35	2023
#412	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		26/09/2023	26/08/2023		T17-P18-S3-1803	Fallas de material	Arquitectura (A)	35	2023
#430	Falta mortero en tabiquería	Closed	Tabiquería	Trabajo inconcluso		2/10/2023	2/09/2023		T17-P3-Vestíbulo previo	Mano de Obra	Arquitectura (A)	36	2023

[redacted] RIO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#429	No hay espacio para cortafuego	Closed	Concreto Post vaciado	Trabajo inconcluso	[redacted]	2/10/2023	2/09/2023	[redacted]	T17-P3-S2-304	Mano de Obra	Arquitectura (A)	36	2023
#423	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		2/10/2023	2/09/2023		T17-P19-S2-1905	Fallas de material	Arquitectura (A)	36	2023
#422	Desalineamiento en esquina	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		2/10/2023	2/09/2023		T17-P19-S1-1908	Fallas de material	Arquitectura (A)	36	2023
#421	Desalineamiento en losa	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		2/10/2023	2/09/2023		T17-P19-S1-1908	Fallas de material	Arquitectura (A)	36	2023
#420	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		2/10/2023	2/09/2023		T17-P19-S4-1906	Fallas de material	Arquitectura (A)	36	2023
#419	Desalineamiento en losa	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		2/10/2023	2/09/2023		T17-P19-S2-1905	Fallas de material	Arquitectura (A)	36	2023
#418	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		2/10/2023	2/09/2023		T17-P19-S2-1905	Fallas de material	Arquitectura (A)	36	2023
#417	Desalineamiento en esquina	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		2/10/2023	2/09/2023		T17-P19-S2-1905	Fallas de material	Arquitectura (A)	36	2023
#453	Fisura en tabiquería	Closed	Tabiquería	Fisura		23/09/2023	9/09/2023		T17-P8-S4-801	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	37	2023
#452	Fisura en tabiquería	Closed	Tabiquería	Fisura		23/09/2023	9/09/2023		T17-P8-S1-803	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	37	2023
#451	Desalineamiento en muro	Closed	Solaqueo	Falta amolar		9/10/2023	9/09/2023		T17-P11-1104	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	37	2023
#450	Desalineamiento en muro	Closed	Solaqueo	Desalineamiento en zona de tuberías		9/10/2023	9/09/2023		T17-P11-1104	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#449	Trabajo inconcluso	Closed	Solaqueo	Falta resane		9/10/2023	9/09/2023		T17-P11-1107	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	37	2023
#448	Desalineamiento en losa	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-P20-S1-2007	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#447	Segregación en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Segregación		9/10/2023	9/09/2023		T17-P20-S1-2007	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#446	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-P20-S1-2007	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#445	Segregación en Escalera	Closed	Concreto Post vaciado	Segregación		9/10/2023	9/09/2023		T17-P20-S1-2007	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#444	Desalineamiento esquinero	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-P20-S4-2006	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#443	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-P20-S4-2006	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#442	Quiñe en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Quiñe		9/10/2023	9/09/2023		T17-P20-S2-2005	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#441	Desalineamiento en esquinero	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-P20-S2-2005	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#440	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-P20-S3-2002	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#439	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-P20-S2-2004	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#438	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-P20-S2-2004	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#437	desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-AZOTEA- S1 Y S4	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#436	desalineamiento en parapeto	Closed	Concreto Post vaciado	desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-AZOTEA- S4-parapeto	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#435	desalineamiento en muro de Ascensor	Closed	Concreto Post vaciado	desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-AZOTEA-Muro de Ascensor	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#434	Desalineamiento en muro	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-AZOTEA-S2 YS3	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#433	Desalineamiento en losa	Closed	Concreto Post vaciado	Desalineamiento		9/10/2023	9/09/2023		T17-AZOTEA S2 y S3	Fallas de material	Arquitectura (A)	37	2023
#483	Fisura en pintura de parapeto	Closed	Acabados	Fisura		28/09/2023	14/09/2023		T18-P2-206	Error en procedimiento	Acabados (D)	38	2023
#482	Acabados	Closed	Acabados	Quiñe en hoja de puerta		28/09/2023	14/09/2023		T18-P2-206	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#480	Falta fragua	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		28/09/2023	14/09/2023		T18-P2-203	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#479	Óxido en bisagra con desprendimiento del [illegible]	Closed	Acabados	Óxido		28/09/2023	14/09/2023		T18-P2-203	Fallas de material	Acabados (D)	38	2023
#478	Mal acabado en pintura	Closed	Acabados	Mal acabado		28/09/2023	14/09/2023		T18-P2-209	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#477	Mancha de pegamento	Closed	Acabados	Mancha		28/09/2023	14/09/2023		T18-P2-209	Error en procedimiento	Acabados (D)	38	2023
#476	Falta instalar enchape	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		28/09/2023	14/09/2023		T18-P2-208	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#475	Falta fijar hoja fija en mamparas	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		28/09/2023	14/09/2023		T18-P2-207	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#473	Papel mural dañado	Closed	Acabados	Mal acabado		28/09/2023	14/09/2023		T18-P2-207-DP	Error en procedimiento	Acabados (D)	38	2023
#471	Papel mural dañado	Closed	Acabados	Mal acabado		28/09/2023	14/09/2023		T18- P2-207	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#460	Exceso de separación entre tanque de inodoro y muro - Prueba final de [illegible]	Closed	Instalaciones y pruebas	Mal acabado		28/09/2023	14/09/2023		T18-P2-205	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	38	2023
#459	Filtración en cocina lavadero record- Prueba final de [illegible]	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		28/09/2023	14/09/2023		T18-P2-201	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	38	2023
#458	Tanque de inodoro chueco-Prueba final de agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso		28/09/2023	14/09/2023		T18-P2-206	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	38	2023
#517	Mal acabado en siliconeado de tapajunta	Closed	Acabados	Mal acabado		29/09/2023	15/09/2023		T18-P5-501	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#516	Mal acabado en resane de muro en la zona de [illegible]	Closed	Acabados	Mal acabado		29/09/2023	15/09/2023		T18-P5-507	Error en procedimiento	Acabados (D)	38	2023
#515	Falta siliconear mampara	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-406	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#514	Falta siliconear mampara	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-404	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#512	Mancha de pintura en cerámico	Closed	Acabados	Mancha		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-408	Observación común	Acabados (D)	38	2023
#511	Manchas en pintura	Closed	Acabados	Mancha		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-405	Observación común	Acabados (D)	38	2023
#510	Quiñe en cerámico de cocina	Closed	Acabados	Quiñe		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-407	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#509	Mal acabado de instalación de papel mural	Closed	Acabados	Mal acabado		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-402	Observación común	Acabados (D)	38	2023
#508	Falta instalar placa	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-407	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#507	Quiñe en mueble de baño	Closed	Acabados	Quiñe		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-402	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#506	Mancha en papel mural	Closed	Acabados	Mancha		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-406	Observación común	Acabados (D)	38	2023
#505	Mancha en pintura en puerta	Closed	Acabados	Mancha		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-406	Observación común	Acabados (D)	38	2023
#504	Diferentes tonalidades en pintura	Closed	Acabados	Mal acabado		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-308	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#503	Trampa de lavadero floja	Closed	Acabados	Falla en instalación		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-401	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#502	Falta resanar muro en encuentro con tubería	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-308	Error en procedimiento	Acabados (D)	38	2023
#501	Falta cortar alambre con óxido en muro	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-307	Error en procedimiento	Acabados (D)	38	2023
#500	Sonido en bisagra al abrir puerta de mueble de BV	Closed	Acabados	Falla en instalación		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-307	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#499	Luz entre piezas en mueble de baño	Closed	Acabados	Falla en instalación		29/09/2023	15/09/2023		T18-P6-306	Error en procedimiento	Acabados (D)	38	2023
#498	Descuadre de puerta que impide abrir la puerta con [illegible]	Closed	Acabados	Falla en instalación		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-306	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#497	Falta acabado en fachada	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-304	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#496	Manchas en pintura	Closed	Acabados	Mancha		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-304	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#495	Mal acabado en siliconeado de mampara	Closed	Acabados	Mal acabado		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-304	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#494	Falta retirar protector de canopla de grifería	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-303	Error en procedimiento	Acabados (D)	38	2023
#493	Falta siliconear mampara	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		29/09/2023	15/09/2023		T18-P2-201	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#492	Mal acabado en pintura	Closed	Acabados	Mal acabado		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-301	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#491	Mal acabado en pintura	Closed	Acabados	Mal acabado		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-301	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#490	Falta acabado de pintura en fachada	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-301	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#489	Rodón levantado	Closed	Acabados	Falla en instalación		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-301	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023

[redacted] TRO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#488	Falta instalar detector de humo	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso	[redacted]	29/09/2023	15/09/2023	[redacted]	T18-P3-301	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#487	Reductor de presión malogrado	Closed	Acabados	Material defectuoso		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-301	Fallas de material	Acabados (D)	38	2023
#486	Falta instalación de luz estroboscopica	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-301	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#469	Filtración en inodoro- Prueba final de agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-401	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	38	2023
#468	Filtración en inodoro- Prueba final de agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-410	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	38	2023
#467	Filtración en cocina lavadero record- Prueba final de agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		29/09/2023	15/09/2023		T18-P4-401	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	38	2023
#466	Filtración en cocina lavadero record- Prueba final de agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-309	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	38	2023
#465	Filtración en cocina lavadero record- Prueba final de agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-307	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	38	2023
#464	Filtración por el extractor de BP- Prueba final de agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-304	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	38	2023
#463	Filtración en tanque de inodoro- Prueba final de agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-306	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	38	2023
#462	Filtración en cocina lavadero record- Prueba final de agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		29/09/2023	15/09/2023		T18-P3-306	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	38	2023
#530	Falta resanar y pintar muro en encuentro con tabique	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		30/09/2023	16/09/2023		T18-P6-602	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#529	Cajoneo en enchape	Closed	Acabados	Cajoneo		30/09/2023	16/09/2023		T18-P6-609	Error en procedimiento	Acabados (D)	38	2023
#528	Manchas de pintura en rodon	Closed	Acabados	Mancha		30/09/2023	16/09/2023		T18-P6-605	Observación común	Acabados (D)	38	2023
#527	Manchas pintura en mueble de cocina	Closed	Acabados	Mancha		30/09/2023	16/09/2023		T18-P6-609	Observación común	Acabados (D)	38	2023
#526	Quiñe en pintura en muro	Closed	Acabados	Quiñe		30/09/2023	16/09/2023		T18-P6-609	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#525	Quiñe en piso laminado	Closed	Acabados	Quiñe		30/09/2023	16/09/2023		T18-P6-609	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#523	Falta siliconear espacio entre rodón y muro	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		30/09/2023	16/09/2023		T18-P6-610	Error en procedimiento	Acabados (D)	38	2023
#522	Quiñe en cerámica	Closed	Acabados	Quiñe		30/09/2023	16/09/2023		T18-P6-607	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#521	Falta ajustar bisagra de mueble de cocina	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		30/09/2023	16/09/2023		T18-P6-607	Error en procedimiento	Acabados (D)	38	2023
#520	Mal corte de papel mural en encuentro con marco de puerta	Closed	Acabados	Mal acabado		30/09/2023	16/09/2023		T18-P5-502	Error en procedimiento	Acabados (D)	38	2023
#519	Mancha en pintura	Closed	Acabados	Mancha		30/09/2023	16/09/2023		T18-P5-510	Observación común	Acabados (D)	38	2023
#518	Quiñe en cerámico	Closed	Acabados	Quiñe		30/09/2023	16/09/2023		T18-P5-509	Mano de Obra	Acabados (D)	38	2023
#455	Desalineamiento	Closed	Tabiquería	Desalineamiento		30/09/2023	16/09/2023		T17-P11-S3-1108	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	38	2023
#454	Fisura en tabiquería	Closed	Tabiquería	Fisura		30/09/2023	16/09/2023		T17-P11-S1-1103	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	38	2023
#550	Mal acabado en siliconeado de ventana	Closed	Acabados	Mal acabado		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-710	Error en procedimiento	Acabados (D)	39	2023
#549	Limpieza de pegamento en piso laminado	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-709	Error en procedimiento	Acabados (D)	39	2023
#548	Quiñe y oxido en perfil de ventana, parte exterior	Closed	Acabados	Quiñe y óxido		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-709	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#547	Quiñe en cerámica	Closed	Acabados	Quiñe		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-709	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#546	Papel mural rasgado	Closed	Acabados	Mal acabado		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-708	Error en procedimiento	Acabados (D)	39	2023
#545	Mucha separación entre rodón y muro	Closed	Acabados	Separación de rodon		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-708	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#544	Falta resane y pintar en punto de agua	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-707	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#543	Exceso de luz entre marco y hoja de puerta	Closed	Acabados	Falla en instalación		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-707	Error en procedimiento	Acabados (D)	39	2023
#542	Ruido en extractor por suciedad	Closed	Acabados	Suciedad		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-708	Observación común	Acabados (D)	39	2023
#541	Falta limpieza de pegamento en piso laminado	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-707	Error en procedimiento	Acabados (D)	39	2023
#539	Tapajunta levantada	Closed	Acabados	Mal acabado		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-707	Error en procedimiento	Acabados (D)	39	2023
#537	Falta cortar cinta de teflón	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-702	Error en procedimiento	Acabados (D)	39	2023
#536	Falta topepuerta para evitar golpe de la hoja	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-702	Error en procedimiento	Acabados (D)	39	2023
#535	Ruido en extractor por suciedad	Closed	Acabados	Suciedad		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-706	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#534	Quiñe en enchape	Closed	Acabados	Quiñe		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-705	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#533	Funcionamiento defectuoso de mampara	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-705	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#532	Falta instalar inodoro	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-704	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#531	Falta colocar silicona en encuentro de muro y perfil de mampara	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		6/10/2023	22/09/2023		T18-P7-701	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#524	Quiñe en piso laminado	Closed	Acabados	Quiñe		30/09/2023	23/09/2023		T18-P6-610	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#457	Junta de enchape fuera de ubicación	Closed	Enchape	Mal acabado		9/09/2023	23/09/2023		T17-P5-AC	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	39	2023
#557	Falta siliconeado de extractor	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		11/10/2023	27/09/2023		T18-P8-807	Error en procedimiento	Acabados (D)	39	2023
#556	Quiñe en puerta en el encuentro con bisagras	Closed	Acabados	Quiñe		11/10/2023	27/09/2023		T18-P8-809	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#554	Manchas de pintura en perfil de ventanas	Closed	Acabados	Mancha		11/10/2023	27/09/2023		T18-p8-809	Observación común	Acabados (D)	39	2023
#553	Tapa de inodoro chueca	Closed	Acabados	Falla en instalación		11/10/2023	27/09/2023		T18-P8-808	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#552	Rayon en hoja de de vidrio de la ventana	Closed	Acabados	Rayadura		11/10/2023	27/09/2023		T18-P8-810	Mano de Obra	Acabados (D)	39	2023
#551	No asegura cerradura de dormitorio	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		11/10/2023	27/09/2023		T18-P8-810	Fallas de material	Acabados (D)	39	2023
#484	Quiñe en cerámico	Closed	Acabados	Quiñe		28/09/2023	28/09/2023		T18-P2-206	Mano de Obra	Acabados (D)	40	2023
#481	Mal acabado en pintura por falta de topepuerta	Closed	Acabados	Mal acabado		14/09/2023	28/09/2023		T18-P2-204	Mano de Obra	Acabados (D)	40	2023
#474	Lavadero inclinado	Closed	Acabados	Desnvivel		14/09/2023	28/09/2023		T18-P2-207	Error en procedimiento	Acabados (D)	40	2023
#472	Puerta con golpe	Closed	Acabados	Quiñe		14/09/2023	28/09/2023		T18-P2-207	Error en procedimiento	Acabados (D)	40	2023
#461	Filtración en cocina lavadero record- Prueba final de agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		14/09/2023	28/09/2023		T18-P2-207	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	40	2023
#513	Diferentes tonalidades en pintura	Closed	Acabados	Mal acabado		29/09/2023	29/09/2023		T18-P4-404	Mano de Obra	Acabados (D)	40	2023
#485	Mal corte de papel mural (apariencia de rasgado)	Closed	Acabados	Mal acabado		15/09/2023	29/09/2023		T18-P3-301	Mano de Obra	Acabados (D)	40	2023
#591	Tapajunta levantada	Closed	Acabados	Mal acabado		17/10/2023	3/10/2023		T18-P8-806	Error en procedimiento	Acabados (D)	40	2023
#590	Quiñe en tapajunta	Closed	Acabados	Quiñe		17/10/2023	3/10/2023		T18-P8-803	Error en procedimiento	Acabados (D)	40	2023
#589	Papel mural roto	Closed	Acabados	Mal acabado		17/10/2023	3/10/2023		T18-P8-803	Mano de Obra	Acabados (D)	40	2023
#588	Tapajunta rota	Closed	Acabados	Mal acabado		17/10/2023	3/10/2023		T18-P8-801	Mano de Obra	Acabados (D)	40	2023
#636	Falta limpieza de pegamento	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-908	Error en procedimiento	Acabados (D)	43	2023
#635	Falta borrar puntos de AF y AC en grifería de cocina	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-907	Mano de Obra	Acabados (D)	43	2023
#634	Piso laminado levantado en esquinas	Closed	Acabados	Material defectuoso		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-906	Fallas de material	Acabados (D)	43	2023
#633	Papel mural despegado	Closed	Acabados	Despegado		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-903	Mano de Obra	Acabados (D)	43	2023
#632	Falta instalar cerámico	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-903	Mano de Obra	Acabados (D)	43	2023
#631	Falta resane en salida de tubería	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-901	Mano de Obra	Acabados (D)	43	2023
#630	Mal acabado de resane en salida de llaves de AC	Closed	Acabados	Mal acabado		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-906	Error en procedimiento	Acabados (D)	43	2023
#629	Mal acabado de sello en puerta	Closed	Acabados	Mal acabado		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-902	Error en procedimiento	Acabados (D)	43	2023

[redacted] RO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#628	Mal acabado de pintura exterior	Closed	Acabados	Mal acabado	[redacted]	3/11/2023	20/10/2023	[redacted]	T18-P9-902	Mano de Obra	Acabados (D)	43	2023
#627	Pin sobresaliendo en bisagra	Closed	Acabados	Mal acabado		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-903	Error en procedimiento	Acabados (D)	43	2023
#626	Pintura en perfil de ventana-lavanderia	Closed	Acabados	Manchas		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-903	Error en procedimiento	Acabados (D)	43	2023
#625	Error en instalación de luminaria-Pilotaje	Closed	Instalaciones y pruebas	Error en instalación		3/11/2023	20/10/2023		T18-P11-1107	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	43	2023
#624	Suciedad en extractor-Pilotaje	Closed	Instalaciones y pruebas	Suciedad		3/11/2023	20/10/2023		T18-P12-1209	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	43	2023
#623	Falta instalar placa-Pilotaje	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso		3/11/2023	20/10/2023		T18-P13-1309	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	43	2023
#622	Botón de interruptor con rayadura-Pilotaje	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura		3/11/2023	20/10/2023		T18-P5-507	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	43	2023
#621	Dado de tomacorriente sobresalido-Pilotaje	Closed	Instalaciones y pruebas	Mal acabado		3/11/2023	20/10/2023		T18-P3-306	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	43	2023
#620	Filtración en lavanderia-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		3/11/2023	20/10/2023		T18-P13-1309	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	43	2023
#619	Filtracion en trampa de lavatorio de cocina-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		3/11/2023	20/10/2023		T18-P14-1407	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	43	2023
#618	Falta instalar ducha y extractor en BP-Prueba	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso		3/11/2023	20/10/2023		T18-P13-1303	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	43	2023
#617	Accesorio de grifería malogrado-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Material defectuoso		3/11/2023	20/10/2023		T18-P13-1301	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	43	2023
#616	Suciedad en inodoro - Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Suciedad		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-908	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	43	2023
#615	Filtración en ducha BP-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-901	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	43	2023
#614	Filtracion en trampa de cocina-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-905		Instalaciones (MEP)	43	2023
#613	Falta resane para nacer la conexión de tubería-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso		3/11/2023	20/10/2023		T18-P9-902	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	43	2023
#572	Error en instalación de luminaria-Pilotaje	Closed	Instalaciones y pruebas	Error en instalación		3/11/2023	20/10/2023		T18-P7-709	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	43	2023
#645	Filtracion en lavadero de cocina-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		3/11/2023	27/10/2023		T18-P19-1902	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	44	2023
#644	Falta instalar ducha - Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso		3/11/2023	27/10/2023		T18-P1-104	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	44	2023
#643	Falta ajustes en accesorios de tanque de inodoro-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso		3/11/2023	27/10/2023		T18-P1-102	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	44	2023
#642	Filtracion en trampa de lavadero de cocina-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		3/11/2023	27/10/2023		T18-P18-1804	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	44	2023
#641	Filtración en inodoro en BP-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		3/11/2023	27/10/2023		T18-P1-108	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	44	2023
#640	Tubería sobresalido en BV-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Falla en instalación		3/11/2023	27/10/2023		T18-P1-104	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	44	2023
#639	Falta sumidero en cocina-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso		3/11/2023	27/10/2023		T18-P1-104	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	44	2023
#638	Falta instalación de inodoro en BP-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso		3/11/2023	27/10/2023		T18-P1-103	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	44	2023
#637	Filtración en inodoro en BV-Prueba Final de Agua	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtración		3/11/2023	27/10/2023		T18-P1-101	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	44	2023
#709	Tapajunta despintada	Closed	Acabados	Desgaste		6/11/2023	31/10/2023		T18-P12-1209	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#708	Quiñe en marco de puerta en D2	Closed	Acabados	Quiñe		6/11/2023	31/10/2023		T18-P12-1209	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#707	Papel mural despegado en cocina	Closed	Acabados	Despegado		6/11/2023	31/10/2023		T18-P12-1209	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#706	Manchas en pintura en techo de BP	Closed	Acabados	Mancha		6/11/2023	31/10/2023		T18-P12-1210	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#704	Mancha en hoja de puerta DP	Closed	Acabados	Mancha		6/11/2023	31/10/2023		T18-P12-1207	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#703	Exceso de separación entre piezas de laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		6/11/2023	31/10/2023		T18-P12-1207	Fallas de material	Acabados (D)	44	2023
#702	Mal acabado en siliconeado de mampara	Closed	Acabados	Mal acabado		6/11/2023	31/10/2023		T18-P12-1207	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#701	Falta siliconear	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		6/11/2023	31/10/2023		T18-P12-1205	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#700	Mal acabado en siliconeado de mampara	Closed	Acabados	Mal acabado		6/11/2023	31/10/2023		T18-P12-1201	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#699	Falta retirar cinta en baranda	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		6/11/2023	31/10/2023		T18-P12-1206	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#698	Falta escarchado en sala	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		6/11/2023	31/10/2023		T18-P12-1203	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#697	Cerradura de cocina	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		6/11/2023	31/10/2023		T18-P11-1102	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#696	Seguro de mampara trabada	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		6/11/2023	31/10/2023		T18-P11-1102	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#695	Protuberancias en cerámico en BV	Closed	Acabados	Protuberancia		6/11/2023	31/10/2023		T18-P11-1102	Fallas de material	Acabados (D)	44	2023
#694	Quiñe en marco y hoja de puerta de D3	Closed	Acabados	Quiñe		6/11/2023	31/10/2023		T18-P11-1106	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#691	Papel mural despegado en D3	Closed	Acabados	Despegado		6/11/2023	31/10/2023		T18-P10-1006	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#690	Papel mural quiñado en Estar	Closed	Acabados	Quiñe		6/11/2023	31/10/2023		T18-P10-1005	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#689	Seguro de mampara no cierra	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		6/11/2023	31/10/2023		T18-P10-1005	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#688	Óxido en cajas de gas	Closed	Acabados	Óxido		6/11/2023	31/10/2023		T18-P10-1005	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#687	Falta sello en extractor de BV	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		6/11/2023	31/10/2023		T18-P10-1006	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#686	Bisagra floja en mueble de BV	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		6/11/2023	31/10/2023		T18-P10-1001	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#685	Quiñe en cerámico en lavanderia	Closed	Acabados	Quiñe		6/11/2023	31/10/2023		T18-P10-1008	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#684	Fisura en pintura en Balcón	Closed	Acabados	Fisura		6/11/2023	31/10/2023		T18-P10-1008	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#683	Sonido inusual en extractor en BV	Closed	Acabados	Suciedad		6/11/2023	31/10/2023		T18-P10-1008	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#682	Mancha en papel mural en Sala	Closed	Acabados	Mancha		6/11/2023	31/10/2023		T18-P10-1010	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#779	Quiñe en cerámico de cocina	Closed	Acabados	Quiñe		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1609	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#778	Separacion de Rodón y muro en D2	Closed	Acabados	Separacion de Rodón		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1608	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#777	Mal acabado en pintura de marco de puerta	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1610	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#776	Quiñe en parapeto de cocina	Closed	Acabados	Quiñe		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1610	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#775	Mancha en texturado en DP	Closed	Acabados	Mancha		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1607	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#774	Cerradura no asegura al cerrar la puerta en DP	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1601	Fallas de material	Acabados (D)	44	2023
#773	Óxido en lavatorio de cocina	Closed	Acabados	Óxido		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1601	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#772	Papel rasgado en D2, D3 y Sala	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1606	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#771	Quiñe en tapa de sumidero	Closed	Acabados	Quiñe		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1606	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#770	Papel mural quiñado en DP	Closed	Acabados	Quiñe		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1606	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#769	Fisura en parapeto de cocina	Closed	Acabados	Fisura		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1606	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#768	Rayones en enchape de cocina	Closed	Acabados	Rayadura		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1602	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#767	Mal acabado en resane de papel mural en sala	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1605	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#766	Falta Siliconear ventana en D2	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1605	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#765	Tapajunta desgastada en D2	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1605	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#764	Mal acabado en sellado entre enchape y perfil de	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1605	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#763	Fisura en bruña de parapeto en cocina	Closed	Acabados	Fisura		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1605	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#762	Falta Siliconear mampara en balcón	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1604	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#761	Enchape quiñado en lavanderia	Closed	Acabados	Quiñe		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1604	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023

[redacted] RIO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#760	Fisura en muro en ingreso al Dpto	Closed	Acabados	Fisura	[redacted]	8/11/2023	1/11/2023	[redacted]	T18-P16-1603	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#759	Papel mural reasgado en sala	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P16-1603	Error en procedimiento	Acabados (D)	44	2023
#758	Papel mural despegado en Estar	Closed	Acabados	Despegado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1507	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#757	Papel mural rasgado y despegado en D3 y pasillo	Closed	Acabados	Despegado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1508	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#756	Falta completar sello en enchape en BV	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1510	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#755	Falta lijar y pintar muro en BV	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1510	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#754	Quiñe en papel mural en Sala	Closed	Acabados	Quiñe		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1509	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#753	Marco de puerta de BP rayado	Closed	Acabados	Rayadura		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1509	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#752	Falta resane al redeor de la llave de agua caliente en BV	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1509	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#751	Mal acabado en escarchado en techo de la sala	Closed	Acabados	mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1501	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#750	Quiñe en muro en BV	Closed	Acabados	Quiñe		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1501	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#749	Falta perno de bisagra	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1506	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#748	Falta resanar techo en balcón	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1506	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#747	Papel mural despegado en D2	Closed	Acabados	Despegado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1506	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#746	Resane marco de puerta en interior de BV - Revisión UI	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1506	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#745	Quiñe en cerámico en BV - Revisión UI	Closed	Acabados	Quiñe		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1502	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#744	Mal sellado alrededor de lavatorio de BV - Revisión UI	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1502	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#743	Manchas en pinto de muro en balcón - Revisión UI	Closed	Acabados	Mancha		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1502	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#742	Protuberancia en muro en BV - Revisión UI	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1505	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#741	Separación de piso laminado en DP	Closed	Acabados	Separación de piso laminado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1505	Fallas de material	Acabados (D)	44	2023
#740	Quiñe en enchape de BP - Revisión UI	Closed	Acabados	Quiñe		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1505	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#739	Zona sin pintar en parapeto de cocina - Revisión UI	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1503	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#738	Quiñe en cerámico de bp - Revisión UI	Closed	Acabados	Quiñe		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1503	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#737	Hongo en papel mural - Revisión UI	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P15-1503	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#736	Mal acabado en instalación de pieza de	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1407	Fallas de material	Acabados (D)	44	2023
#735	Pintura veteada en pintura de puerta principal	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1407	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#734	Pin de bisagra levantada en puerta principal	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1407	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#733	Manchas en bisagra de puerta principal	Closed	Acabados	Mancha		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1410	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#732	Falta limpieza de pegamento en piso	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1408	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#731	Manchas en papel mural en sala	Closed	Acabados	Mancha		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1403	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#730	Exceso de separación entre rodón y papel mural	Closed	Acabados	Separación de rodon		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1404	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#729	Mal acabado en siliconeado de ventana en	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1404	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#728	Mal acabado en pintura exterior en pinto ventanda	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1405	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#727	Cerradura no funciona en D2	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1402	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#726	Mal acabado en pintura de peurta en D3	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1402	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#725	Cemento pulido blanqueado en balcón	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1402	Fallas de material	Acabados (D)	44	2023
#724	Falta retirar plástico en perfil de mampara	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1402	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#723	Seguro de mampara no funciona correctamente	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1406	Fallas de material	Acabados (D)	44	2023
#722	Papel mural despegado en D2	Closed	Acabados	Despegado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1406	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#721	Falta fraguar enchape en balcón	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1406	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#720	Puerta hundida en parte inferior en Cocina	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P14-1401	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#719	Falta resane en salida de tubería BP	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P13-1308	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#718	Papel mural despegado	Closed	Acabados	Despegado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P13-1308	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#717	Seguro de mampara trabada	Closed	Acabados	Mal acabado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P13-1310	Fallas de material	Acabados (D)	44	2023
#716	Exceso de separación entre piezas de laminado	Closed	Acabados	Separación de piso laminado		8/11/2023	1/11/2023		T18-P13-1307	Fallas de material	Acabados (D)	44	2023
#715	Quiñe en marco de puerta	Closed	Acabados	Quiñe		8/11/2023	1/11/2023		T18-P13-1301	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#714	Seguro de mampara trabada	Closed	Acabados	Mal acabdo		8/11/2023	1/11/2023		T18-P13-1301	Fallas de material	Acabados (D)	44	2023
#713	Quiñe en hoja de puerta principal	Closed	Acabados	Quiñe		8/11/2023	1/11/2023		T18-P13-1306	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#712	Seguro de mampara no cierra	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P13-1302	Fallas de material	Acabados (D)	44	2023
#711	Falta ajustar pin de bisagra de puerta de BP	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		8/11/2023	1/11/2023		T18-P13-1304	Mano de Obra	Acabados (D)	44	2023
#710	Mancha de pintura en papel mural en Sala	Closed	Acabados	Mancha		8/11/2023	1/11/2023		T18-P13-1304	Observación común	Acabados (D)	44	2023
#833	Cerradura no asegura al cerrar en DP	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1909	Fallas de material	Acabados (D)	45	2023
#832	Quiñes en cerámico en lavandería	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1908	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#831	Tapajuntas levantadas en el Dpto	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1910	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#830	Quiñe de cerámico en cocina	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1910	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#829	Quiñe cerámico BV	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1907	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#828	Falta sellar encuentro entre enchape y perfil de	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1907	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#827	Mueble descuadrado en BV	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1906	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#826	Quiñes en cerámicos de cocina	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1906	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#825	Falta resane, pintura y siliconeado, balcón	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1901	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#824	Quiñe en papel mural en DP	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1901	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#823	Falta pintura exterior	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1904	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#822	Manchas en rodones en sala	Closed	Acabados	Mancha		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1903	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#821	Papel mural despegado en D2	Closed	Acabados	Despegado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1903	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#820	Puerta hinchada en parte baja en D3	Closed	Acabados	Material defectuoso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1902	Fallas de material	Acabados (D)	45	2023
#819	Quiñe en cerámico en cocina	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1903	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#818	Puerta desfasada en BV	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1902	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#817	Mejorar acabado de fragua en bv	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1902	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#816	Quiñe laminado en sala	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1902	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#815	Quiñe cerámico en cocina	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1902	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023

[redacted] RO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#814	Fisura en escarchado en techo DP	Closed	Acabados	Fisura	[redacted]	9/11/2023	2/11/2023	[redacted]	T18-P19-1905	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#813	Papel mural rasgado en DP	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1905	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#812	Falta siliconeado en puerta de BV	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P19-1905	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#811	No hay electricidad en el Dpto	Closed	Acabados	Otros relativo al proceso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1804	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#810	Papel mural rasgado en DP	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1801	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#809	Falta resane en salida de tubo debajo de mueble de BV	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1803	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#808	Cerradura de puerta interior no asegura en BP	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1803	Fallas de material	Acabados (D)	45	2023
#807	Mal acabado de pintura en cocina	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1805	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#806	Quiñe en cerámico en BP	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1802	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#805	Papel mural sin resanar en D2	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1809	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#804	Tapa de inodoro floja en BV	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1809	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#803	Mal maquillaje de papel mural en D3	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1808	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#802	Cemento pulido desgastado en balcón	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1808	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#801	Sonido inusual de extractor en baños	Closed	Acabados	Suciedad		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1810	Fallas de material	Acabados (D)	45	2023
#800	Suciedad en barandas	Closed	Acabados	Suciedad		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1810	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#799	Quiñe en cerámico en BP	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1806	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#798	Sonido inusual de extractor en BP	Closed	Acabados	Suciedad		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1806	Fallas de material	Acabados (D)	45	2023
#797	Retirar cinta de Baranda en balcón	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P18-1806	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#796	Mal acabado de pintura en BP	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1709	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#795	Quiñe en cerradura en D3	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1708	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#794	Falta retirar cinta de tuberia en BV	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1708	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#793	Fisura en bruña de parapeto en lavanderia	Closed	Acabados	Fisura		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1708	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#792	Quiñe en cerámico en lavanderia	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1710	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#791	Falta masillar alrededor de llave general de cocina	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1710	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#790	Falta siliconeado en encuentro con papel mural en Entrar	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1707	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#789	Retirar plástico de perfil de mampara	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1707	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#788	Mal siliconeado en ventana en cocina	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1705	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#787	Falta limpieza en lavadero de cocina record	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1704	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#786	Tonalidad amarillenta en pintura de BP	Closed	Acabados	Mancha		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1704	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#785	Quiñe y falta de fragua en cerámico	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1702	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#784	Mal acabado de pintura en cocina	Closed	Acabados	Mal acabado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1702	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#783	Papel mural quiñado en DP	Closed	Acabados	Quiñe		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1706	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#782	Papel mural despegado en sala	Closed	Acabados	Despegado		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1706	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#781	Mancha en Tapajunta	Closed	Acabados	Mancha		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1706	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#780	Mancha en papel mural en sala	Closed	Acabados	Mancha		9/11/2023	2/11/2023		T18-P17-1701	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#858	Mal acabado en retoque de puerta	Closed	Acabados	Mal acabado		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2109	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#857	Papel despegado en el muro aledaño a la escalera de dupler	Closed	Acabados	Despegado		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2109	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#856	Papel mural despegado	Closed	Acabados	Despegado		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2108	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#855	Falta limpieza en extractor	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2008	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#854	Falta resanar y pintar en parapeto de terraza	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2104	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#853	Falta resanar y sellar mampara en balcón	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2004	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#852	Faltan tapaciegas en terraza	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2103	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#851	Mal fraguado de enchape en baño	Closed	Acabados	Mal acabado		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2103	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#850	Falta siliconear encuentro de baranda con papel mural en Entrar	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2103	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#849	Falta siliconear elementos en el departamento	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2003	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#848	Papel mural despegado en D2 y DP	Closed	Acabados	Despegado		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2003	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#847	Falta resane en contrapaso de escalera de dupler	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2105	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#846	Falta sikaflex en junta en terraza	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2102	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#845	Mal acabado de siliconeado en contrapaso de escalera	Closed	Acabados	Mal acabado		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2102	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#844	Extractor descuadrado y sin siliconeado	Closed	Acabados	Mal acabado		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2002	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#843	Quiñe y desgaste en tapajuntas	Closed	Acabados	Quiñe		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2107	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#842	Fisura en muro de cocina	Closed	Acabados	Fisura		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2007	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#841	Quiñe en papel mural y rodón	Closed	Acabados	Quiñe		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2110	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#840	Fisura en muro de balcón	Closed	Acabados	Fisura		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2010	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#839	Mal acabado en pintura en terraza	Closed	Acabados	Mal acabado		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2106	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#838	Falta limpieza en luminaria exterior	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2106	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#837	Mal acabado de texturado en muro divisorio de Balcón - cocina	Closed	Acabados	Mal acabado		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2006	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#836	Tapajunta fisurada	Closed	Acabados	Fisura		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2101	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#835	Mal resane de papel mural	Closed	Acabados	Mal acabado		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2001	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#834	Quiñe en papel mural que recubre contrazocalo	Closed	Acabados	Quiñe		10/11/2023	3/11/2023		T18-Duplex-2101	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#868	Falta llaves termomagnéticas en tablero general	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		11/11/2023	4/11/2023		T18-P1-102	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#867	Mal acabado de pintura en cocina	Closed	Acabados	Mal acabado		11/11/2023	4/11/2023		T18-P1-106	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#866	Falta sello entre mueble y lavatorio de cocina	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		11/11/2023	4/11/2023		T18-P1-107	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#865	No funciona extractor de aire	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		11/11/2023	4/11/2023		T18-P1-106	Fallas de material	Acabados (D)	45	2023
#864	Falta instalar luminaria en Balcon	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		11/11/2023	4/11/2023		T18-P1-106	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#863	Papel mural despegado en sala	Closed	Acabados	Despegado		11/11/2023	4/11/2023		T18-P1-106	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#862	Falta una pasada de pintura en muro de BP	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		11/11/2023	4/11/2023		T18-P1-104	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#861	Falta instalar contrafrontal	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		11/11/2023	4/11/2023		T18-P1-104	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023
#860	Pintura despegada en muro de BP	Closed	Acabados	Mal acabado		11/11/2023	4/11/2023		T18-P1-104	Error en procedimiento	Acabados (D)	45	2023
#859	Falta resane de muro en BV	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		11/11/2023	4/11/2023		T18-P1-104	Mano de Obra	Acabados (D)	45	2023

[redacted] RO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#705	Seguro de mampara no cierra- Revisión UI	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso	[redacted]	11/11/2023	6/11/2023	[redacted]	T18-P12-1210	Fallas de material	Acabados (D)	45	2023
#896	Falta sello sobre puerta de emergencia	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		18/11/2023	16/11/2023		P20-AC	Mano de Obra	Acabados (D)	47	2023
#895	Sin sello gabinete de Ascensor	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		18/11/2023	16/11/2023		P20-AC	Mano de Obra	Acabados (D)	47	2023
#894	Falta sellar	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		18/11/2023	16/11/2023		P20-AC	Mano de Obra	Acabados (D)	47	2023
#893	Falta sellar rejilla	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		18/11/2023	16/11/2023		P20-AC	Mano de Obra	Acabados (D)	47	2023
#892	Funcionamiento defectuoso del Sensor de Movimiento	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		18/11/2023	16/11/2023		P11-AC	Fallas de material	Acabados (D)	47	2023
#891	Quiñe en Gabinete contra incendio	Closed	Acabados	Quiñe		18/11/2023	16/11/2023		P10-AC	Error en procedimiento	Acabados (D)	47	2023
#890	No se puede cerrar tablero	Closed	Acabados	Mal acabado		18/11/2023	16/11/2023		P6-AC	Mano de Obra	Acabados (D)	47	2023
#889	Luminaria de emergencia rota	Closed	Acabados	Material roto		18/11/2023	16/11/2023		P1-AC	Error en procedimiento	Acabados (D)	47	2023
#915	Mal acabado en fragua de BV	Closed	Enchape	Mal acabado		5/12/2023	28/11/2023		T17-P14-1404	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	48	2023
#914	Mal acabado en fragua de BV	Closed	Enchape	Mal acabado		5/12/2023	28/11/2023		T17-P11-1103	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	48	2023
#1017	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P14-1404	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#988	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P6-610	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#987	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P6-609	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#986	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P6-607	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#985	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P6-605	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#984	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P6-604	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#983	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P6-602	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#982	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P5-510	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#981	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P5-507	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#980	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P5-506	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#979	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P5-503	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#978	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P5-501	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#977	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P4-408	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#976	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P4-406	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#975	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P4-401	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#974	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P3-309	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#973	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P3-307	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#972	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P3-305	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#971	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P3-304	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#970	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P3-303	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#969	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P3-302	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#968	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P2-210	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#967	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P2-208	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#966	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P2-206	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#965	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P2-201	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#964	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P1-108	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#963	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P1-107	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#962	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P1-105	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#961	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P1-103	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#960	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P1-102	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#959	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	4/12/2023		T18-P1-101	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1016	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P14-1402	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1015	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P13-1309	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1014	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P13-1307	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1013	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P13-1305	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1012	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P13-1301	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1011	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P12-1206	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1010	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P12-1203	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1009	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P12-1202	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1008	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P11-1110	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1007	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P11-1108	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1006	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P11-1106	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1005	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P11-1104	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1004	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P11-1103	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1003	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P11-1101	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1002	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P10-1009	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1001	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P10-1004	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1000	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P10-1001	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#999	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P9-910	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#998	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P9-909	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#997	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P9-907	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#996	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P9-905	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#995	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P9-902	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#994	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P8-808	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#993	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P8-806	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#992	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P8-804	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#991	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P8-803	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#990	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P8-801	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#989	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	5/12/2023		T18-P7-705	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023

[redacted] RO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#925	Depostillamiento en tabiquería	Closed	Tabiquería	Despostillamiento	[redacted]	19/12/2023	5/12/2023	[redacted]	T17-P20-S1-2003	Mano de Obra	Arquitectura (A)	49	2023
#924	Desalineamiento de tabiquería	Closed	Tabiquería	Desalineamiento		19/12/2023	5/12/2023		T17-AZOTEA-S4-2002	Mano de Obra	Arquitectura (A)	49	2023
#923	Falta solaqueo en muro de tabiquería	Closed	Tabiquería	Trabajo inconcluso		19/12/2023	5/12/2023		T17-AZOTEA-S2-2004	Mano de Obra	Arquitectura (A)	49	2023
#922	Despostillamiento de mortero de tabiquería	Closed	Tabiquería	Despostillamiento		19/12/2023	5/12/2023		T17-AZOTEA-S2-2004	Mano de Obra	Arquitectura (A)	49	2023
#921	Quiñe en tabiquería	Closed	Tabiquería	Quiñes		19/12/2023	5/12/2023		T17-AZOTEA-S2-2005	Observación común	Arquitectura (A)	49	2023
#920	Quiñe en fragua de tabiquería	Closed	Tabiquería	Quiñe		19/12/2023	5/12/2023		T17-AZOTEA-S3-2007	Mano de Obra	Arquitectura (A)	49	2023
#1048	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P20-2009	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1047	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P20-2008	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1046	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P20-2007	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1045	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P20-2005	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1044	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P20-2004	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1043	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P20-2002	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1042	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P20-2001	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1041	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P19-1910	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1040	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P19-1908	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1039	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P19-1906	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1038	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P19-1905	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1037	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P19-1903	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1036	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P19-1902	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1035	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P18-1809	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1034	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P18-1807	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1033	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P18-1806	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1032	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P18-1803	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1031	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P17-1710	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1030	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P17-1707	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1029	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P17-1702	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1028	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P17-1701	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1027	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P16-1608	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1026	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P16-1606	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1025	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P16-1604	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1024	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P15-1509	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1023	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P15-1505	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1022	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P15-1503	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1021	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P15-1502	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1020	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P14-1408	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1019	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P14-1407	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#1018	Separación entre piezas de piso laminado	Closed	Acabados	Material defectuoso		8/12/2023	6/12/2023		T18-P14-1406	Fallas de material	Acabados (D)	49	2023
#937	Falta señalética de salida	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		13/12/2023	11/12/2023		T18-P20-AC	Error en procedimiento	Acabados (D)	50	2023
#936	Falta limpieza en Dpto	Closed	Acabados	Suciedad		13/12/2023	11/12/2023		T18-P1-103	Error en procedimiento	Acabados (D)	50	2023
#935	Fisura en muro de cerco perimétrico	Closed	Acabados	Fisura		13/12/2023	11/12/2023		T18-P1-Cerco perimétrico	Error en procedimiento	Acabados (D)	50	2023
#934	Quiñe en carpintería metálica en cerco perimétrico	Closed	Acabados	Quiñe		13/12/2023	11/12/2023		T18-P1-Cerco perimétrico	Error en procedimiento	Acabados (D)	50	2023
#931	Mejorar acabado en cemento pulido	Closed	Acabados	Mal acabado		13/12/2023	11/12/2023		T18-P1-VP	Mano de Obra	Acabados (D)	50	2023
#929	Fisura en bruña en Hall de ingreso	Closed	Acabados	Fisura		13/12/2023	11/12/2023		T18-P1-AC	Observación común	Acabados (D)	50	2023
#928	Cerámico fisurado	Closed	Acabados	Fisura		13/12/2023	11/12/2023		T18-P20-AC	Error en procedimiento	Acabados (D)	50	2023
#933	Falta limpieza en tableros exteriores	Closed	Acabados	Suciedad		11/12/2023	13/12/2023		T18-P1-Cerco perimétrico	Error en procedimiento	Acabados (D)	50	2023
#932	Manchas en contrazocalo perimetral	Closed	Acabados	Manchas		11/12/2023	13/12/2023		T18-P1-Cerco perimétrico	Error en procedimiento	Acabados (D)	50	2023
#930	Falta limpieza entuberia ACI	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		11/12/2023	13/12/2023		T18-P20-VP	Error en procedimiento	Acabados (D)	50	2023
#1067	Mal anclaje de baranda en parapeto	Closed	Carpinteria metalica	Mal anclaje		4/01/2024	29/12/2023		OE-estacionamiento	Mano de Obra	Arquitectura (A)	53	2023
#1073	Mal acabado de pintura en baranda	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		9/01/2024	4/01/2024		T17-P20-X04	Mano de Obra	Arquitectura (A)	2	2024
#1072	Mal acabado en pintura de baranda	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		9/01/2024	4/01/2024		T17-P17-X04	Mano de Obra	Arquitectura (A)	2	2024
#1071	Mal acabado de pintura en baranda	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		9/01/2024	4/01/2024		T17-P16-X04	Mano de Obra	Arquitectura (A)	2	2024
#1070	Mal acabado de pintura en baranda	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		9/01/2024	4/01/2024		T17-P15-X04	Mano de Obra	Arquitectura (A)	2	2024
#1079	Mal acabado de pintura de baranda en duplex	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		15/01/2024	9/01/2024		T17-P20-2004	Mano de Obra	Arquitectura (A)	2	2024
#1078	Mal acabado de pintura de baranda en duplex	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		15/01/2024	9/01/2024		T17-P20-2003	Mano de Obra	Arquitectura (A)	2	2024
#1077	Mal acabado en pintura de baranda en duplex	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		15/01/2024	9/01/2024		T17-20-2002	Mano de Obra	Arquitectura (A)	2	2024
#1076	Mal acabado en pintura de baranda en duplex	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		15/01/2024	9/01/2024		T17-P20-2001	Mano de Obra	Arquitectura (A)	2	2024
#1091	Placas de tomacorriente desniveladas	Closed	Instalaciones y pruebas	Desalineamiento		17/01/2024	11/01/2024		T17-P6-605	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	3	2024
#1090	Falso contacto en tablero electrico	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		17/01/2024	11/01/2024		T17-P7-707	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	3	2024
#1089	Extractor de aire no enciende	Closed	Instalaciones y pruebas	Sin energia		17/01/2024	11/01/2024		T17-P6-602	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	3	2024
#1088	Placa de tomacorriente con rayadura	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura		17/01/2024	11/01/2024		T17-P7-706	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	3	2024
#1087	Extractor de aire en baño no enciende	Closed	Instalaciones y pruebas	Sin energia		17/01/2024	11/01/2024		T17-P4-404	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	3	2024
#1086	Sonido al presionar el interruptor	Closed	Instalaciones y pruebas	Falla en instalacion		17/01/2024	11/01/2024		T17-P4-406	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	3	2024
#1085	Placa de interruptor con rayadura	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura		17/01/2024	11/01/2024		T17-P5-502	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	3	2024
#1084	Falso contacto en tablero electrico	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		17/01/2024	11/01/2024		T17-P5-502	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	3	2024
#1083	Placa de interruptor rayado	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura		17/01/2024	11/01/2024		T17-P4-406	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	3	2024
#1082	Placa de interruptor quiñado	Closed	Instalaciones y pruebas	Quiñe		17/01/2024	11/01/2024		T17-P3-306	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	3	2024
#1081	Placa de tomacorriente rayado	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura		17/01/2024	11/01/2024		T17-P4-405	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	3	2024
#1080	Dado de tomacorriente hundido	Closed	Instalaciones y pruebas	Falla en instalación		17/01/2024	11/01/2024		T17-P3-306	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	3	2024
#1126	Dado de tomacorriente con rayadura	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura		25/01/2024	18/01/2024		T17-1406-baño p	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1125	Mancha en placa de tomacorriente	Closed	Instalaciones y pruebas	Mancha		25/01/2024	18/01/2024		T17-1403-lavanderia	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024

[redacted] TRO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#1124	Tomacorriente sin energia	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso	[redacted]	25/01/2024	18/01/2024	[redacted]	T17-1301-sala de estudio	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1123	Desmanche en dado de tomacorriente	Closed	Instalaciones y pruebas	Material defectuoso		25/01/2024	18/01/2024		T17-1206-cocina	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1122	Falta instalar extractor en baño	Closed	Instalaciones y pruebas	Elemento no considerado		25/01/2024	18/01/2024		T17-1205-baño sec	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1121	Dado mal colocado en tomacorriente	Closed	Instalaciones y pruebas	Falla en instalación		25/01/2024	18/01/2024		T17-1204-Lavanderia	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1113	Mal acabado de pintura en baranda de duplex	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		25/01/2024	18/01/2024		T17-P20-2008	Mano de Obra	Arquitectura (A)	4	2024
#1112	Mal acabado de pintura en baranda de duplex	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		25/01/2024	18/01/2024		T17-P20-2007	Mano de Obra	Arquitectura (A)	4	2024
#1111	Quiñe en baranda de duplex	Closed	Carpinteria metalica	Quiñe		25/01/2024	18/01/2024		T17-P20-2006	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2024
#1110	Mal acabado de pintura en baranda de duplex	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		25/01/2024	18/01/2024		T17-20-2005	Mano de Obra	Arquitectura (A)	4	2024
#1145	Filtracion en empalme de tubo de abasto con ducha	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-408-BS	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1144	Rejilla de sumidero mal instalado en ducha	Closed	Instalaciones y pruebas	Desnivel		26/01/2024	19/01/2024			Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1143	Tapa de inodoro quiñado	Closed	Instalaciones y pruebas	Quiñe		26/01/2024	19/01/2024		T17-403-BP	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1142	Falta instalar griferia	Closed	Instalaciones y pruebas	Elemento no considerado		26/01/2024	19/01/2024		T17-401-cocina	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1141	Griferia de cocina mal instalada	Closed	Instalaciones y pruebas	Falla de instalacion		26/01/2024	19/01/2024		T17-307-Cocina	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1140	Filtracion en trampa de lavarropas	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-305-lavanderia	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1139	Filtracion en union de ducha a tuberia de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-304-Baño P	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1138	Filtracion en trampa de lavarropas	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-304-Lavanceria	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1137	Filtracion en union de ducha a tuberia de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-303-Baño P	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1136	Filtracion en union de ducha a tuberia de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-303-Baño S	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1135	Filtracion en union de ducha a tuberia de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-302-Baño S	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1134	Filtracion en filtro de grifo de lavanderia	Closed	Instalaciones y pruebas	T17-302-lavanderia		26/01/2024	19/01/2024		T17-302-lavanderia	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1133	Filtracion en union de ducha a tuberia de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-301-Baño S	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1132	Filtracion en trampa de griferia en cocina	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-301-Cocina	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1131	Falta instalar griferia	Closed	Instalaciones y pruebas	Elemento no considerado		26/01/2024	19/01/2024		T17-208-Cocina	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1130	Filtracion en union de ducha a tuberia de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-206-Baño S	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1129	Filtracion en union de ducha a tuberia de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-205-Baño P	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1128	Filtracion en union de ducha a tuberia de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-201-Baño P	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1127	Filtracion en union de ducha a tuberia de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		26/01/2024	19/01/2024		T17-201-Baño S	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1151	Grumos de pintura en cinta inferior de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		27/01/2024	20/01/2024		T17-P17-1702	Mano de Obra	Arquitectura (A)	4	2024
#1150	Grumos de pintura en pasamano de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		27/01/2024	20/01/2024		T17-P14-1402	Mano de Obra	Arquitectura (A)	4	2024
#1149	Quiñe en pasamano de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Quiñe		27/01/2024	20/01/2024		T17-P11-1102	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2024
#1148	Grumos de pintura en cinta inferior de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		27/01/2024	20/01/2024		T17-P7-702	Mano de Obra	Arquitectura (A)	4	2024
#1147	Quiñes en pasamanos	Closed	Carpinteria metalica	Quiñe		27/01/2024	20/01/2024		T17-P5-502	Fallas de material	Arquitectura (A)	4	2024
#1146	Grumos de pintura en pasamano	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		27/01/2024	20/01/2024		T17-P4-402	Mano de Obra	Arquitectura (A)	4	2024
#1207	Incorrecta colocacion de perno en bisagra	Closed	Acabados	Falla en instalacion		5/02/2024	22/01/2024		T17-207-dormitorios	Error en procedimiento	Acabados (D)	4	2024
#1206	Papel mural despegado	Closed	Acabados	Despegado		5/02/2024	22/01/2024		T17-207-sala	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1205	Puerta con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		5/02/2024	22/01/2024		T17-207-cocina	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1204	Hoja de puerta pandeada	Closed	Acabados	Material defectuoso		5/02/2024	22/01/2024		T17-206-Baño P	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1203	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		5/02/2024	22/01/2024		T17-206-cocina	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1202	Piso laminado con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		5/02/2024	22/01/2024		T17-206-sala	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1201	Mal fraguado en enchape de baños	Closed	Acabados	Mal acabado		5/02/2024	22/01/2024		T17-205-Baños	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1200	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		5/02/2024	22/01/2024		T17-205-Dormitorios	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1199	Enchape quiñado	Closed	Acabados	Quiñe		5/02/2024	22/01/2024		T17-205-baño S	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1198	Mal acabado de pintura en muros interiores	Closed	Acabados	Mal acabado		5/02/2024	22/01/2024		T17-204-Cocina	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1197	Papel mural despegado	Closed	Acabados	Despegado		5/02/2024	22/01/2024		T17-204-dormitorio p	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1196	Desnivel en puertas de mueble en baño	Closed	Acabados	Desnivel		5/02/2024	22/01/2024		T17-204-baño s	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1195	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		5/02/2024	22/01/2024		T17-203-dormitorios	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1194	Rodon con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		5/02/2024	22/01/2024		T17-203-dormitorio	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1193	Manijas de puerta con mancha de pintura	Closed	Acabados	Mancha		5/02/2024	22/01/2024		T17-203-baños	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1192	Diferente tonalidad de fragua	Closed	Acabados	Mal acabado		5/02/2024	22/01/2024		T17-202-cocina	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1191	Enchape quiñado	Closed	Acabados	Quiñe		5/02/2024	22/01/2024		T17-202-Baño S	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1188	Enchape quiñado	Closed	Acabados	Quiñe		5/02/2024	22/01/2024		T17-P2-201	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1187	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		5/02/2024	22/01/2024		T17-P2-201	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1219	Mal funcionamiento en apertura de puerta	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		6/02/2024	23/01/2024		T17-307-baño p	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1218	Mal acabado de fragua en enchape de baños	Closed	Acabados	Mal acabado		6/02/2024	23/01/2024		T17-307-baños	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1217	Mal acabado de papel mural	Closed	Acabados	Mal acabado		6/02/2024	23/01/2024		T17-306-Sala y dormitorio	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1216	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		6/02/2024	23/01/2024		T17-305-dormitorio	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1215	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		6/02/2024	23/01/2024		T17-304-Baños	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1214	Piso laminado con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		6/02/2024	23/01/2024		T17-304-Sala	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1213	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		6/02/2024	23/01/2024		T17-303-baños	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1212	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		6/02/2024	23/01/2024		T17-303-Sala y dormitorio	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1211	Mal acabado de pintura en muros interiores	Closed	Acabados	Mal acabado		6/02/2024	23/01/2024		T17-302-baño y cocina	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1210	Papel mural despegado	Closed	Acabados	Despegado		6/02/2024	23/01/2024		T17-302-Dormitorio	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1209	Piso laminado con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		6/02/2024	23/01/2024		T17-301-sala	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1208	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		6/02/2024	23/01/2024		T17-301-Cocina	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1228	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		7/02/2024	24/01/2024		T17-406-sala y dormitorios	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1227	Echape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		7/02/2024	24/01/2024		T17-406-cocina	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1226	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		7/02/2024	24/01/2024		T17-404-baño S	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1225	Rodon con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		7/02/2024	24/01/2024		T17-405-Sala	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1224	Bisagras manchadas	Closed	Acabados	Mancha		7/02/2024	24/01/2024		T17-403-baño y dormitorios	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024
#1223	Mal acabado de pintura en canto de enchape	Closed	Acabados	Mal acabado		7/02/2024	24/01/2024		T17-403-cocina	Mano de Obra	Acabados (D)	4	2024

[redacted] RO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#1222	Tapa de tanque de inodoro con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe	[redacted]	7/02/2024	24/01/2024	[redacted]	T17-402-baño s	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1221	Bisagras manchadas	Closed	Acabados	Mancha		7/02/2024	24/01/2024		T17-401-dormitorio y baño	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1220	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		7/02/2024	24/01/2024		T17-401-baño y cocina	Fallas de material	Acabados (D)	4	2024
#1160	Filtracion en tubo de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		31/01/2024	24/01/2024		T17-P7-707	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1159	Llave de grifo no cierra completamente	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		31/01/2024	24/01/2024		T17-705-Lavanderia	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1158	Filtracion en union de tubo de abasto y ducha	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		31/01/2024	24/01/2024		T17-604-Lavanderia	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1157	Filtracion en trampa	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		31/01/2024	24/01/2024		T17-604-Lavanderia	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1156	Filtracion en trampa	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		31/01/2024	24/01/2024		T17-603-Cocina	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1155	Filtracion en union de tubo de abasto y ducha	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		31/01/2024	24/01/2024		T17-508-Baño P	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1154	Baja presion de agua en griferia	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		31/01/2024	24/01/2024		T17-505-Baños	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1153	Baja presion de agua en griferia	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		31/01/2024	24/01/2024		T17-505-Cocina	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	4	2024
#1168	Extractor de baño no enciende	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		1/02/2024	25/01/2024		T17-801-BS	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1167	Ruido en extractor de baño	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		1/02/2024	25/01/2024		T17-1706-BP	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1166	Dado de tomarriente con rayadura	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura		1/02/2024	25/01/2024		T17-1707-cocina	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1165	Dados de tomacorriente con rayadura	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura		1/02/2024	25/01/2024		T17-1702-Sala	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1164	Dado de tomacorriente desalineado	Closed	Instalaciones y pruebas	Desalineamiento		1/02/2024	25/01/2024		T17-1606-sala	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1163	Dado de tomacorriente con quiñe	Closed	Instalaciones y pruebas	Quiñe		1/02/2024	25/01/2024		T17-1605-cocina	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1162	Dado de interruptor con quiñe	Closed	Instalaciones y pruebas	Quiñe		1/02/2024	25/01/2024		T17-1505-Dormitorio	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1161	Placa de tomacorrientes con puntos negros en [redacted]	Closed	Instalaciones y pruebas	Material defectuoso		1/02/2024	25/01/2024		T17-1503-lavanderia	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1239	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		8/02/2024	26/01/2024		T17-507-baño	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1238	Rodon con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		8/02/2024	26/01/2024		T17-507-sala	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1237	Mal acabado de pintura en canto de enchape	Closed	Acabados	Mal acabado		8/02/2024	26/01/2024		T17-506-cocina	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1236	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		8/02/2024	26/01/2024		T17-506-dormitorio y sala	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1235	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		8/02/2024	26/01/2024		T17-505-dormitorios	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1234	Desnivel de puerta de mueble de lavamanos	Closed	Acabados	Desnivel		8/02/2024	26/01/2024		T17-505-baño S	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1233	Fisura en techo de baño	Closed	Acabados	Fisura		8/02/2024	26/01/2024		T17-503-baño P	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1232	Piso laminado con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		8/02/2024	26/01/2024		T17-503-dormitorios	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1231	Mal acabado de pintura en marco de puerta	Closed	Acabados	Mal acabado		8/02/2024	26/01/2024		T17-502-baño P	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1230	Mal fraguado de enchape en baños	Closed	Acabados	Mal acabado		8/02/2024	26/01/2024		T17-501-baños	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1229	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		8/02/2024	26/01/2024		T17-501-cocina	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1186	Filtracion en trampa de cocina	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		2/02/2024	26/01/2024		T17-1005-cocina	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1185	Falta instalar trampa en lavanderia	Closed	Instalaciones y pruebas	Elemento no considerado		2/02/2024	26/01/2024		T17-1003-lavanderia	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1184	Falta instalar trampa en lavanderia	Closed	Instalaciones y pruebas	Elemento no considerado		2/02/2024	26/01/2024		T17-1002-lavanderia	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	5	2024
#1183	Filtracion en trampa de cocina	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		2/02/2024	26/01/2024		T17-1002-cocina	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1182	Filtracion tubo de abasto cocina	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		2/02/2024	26/01/2024		T17-908-cocina	Mano de Obra	Arquitectura (A)	5	2024
#1181	Llave de grifo no cierra completamente	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		2/02/2024	26/01/2024		T17-P9-908	Mano de Obra	Arquitectura (A)	5	2024
#1180	Filtracion en canopla de ducha	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		2/02/2024	26/01/2024		T17-903-baño s	Mano de Obra	Arquitectura (A)	5	2024
#1179	Filtro de griferia defectuoso	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		2/02/2024	26/01/2024		T17-806-cocina	Fallas de material	Arquitectura (A)	5	2024
#1178	Filtracion en trampa de cocina	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		2/02/2024	26/01/2024		T17-805-Cocina	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1177	Filtracion en empalme de ducha con tuberia de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		2/02/2024	26/01/2024		T17-804-Baño P	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	5	2024
#1260	Incorrecta ubicacion de perno en bisagra	Closed	Acabados	Falla en procedimiento		9/02/2024	29/01/2024		T17-707-cocina	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1259	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		9/02/2024	29/01/2024		T17-706- dormitorios	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1258	Bisagras con manchas de pintura	Closed	Acabados	Mancha		9/02/2024	29/01/2024		T17-706-dormitorio y baño	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1257	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		9/02/2024	29/01/2024		T17-704-baño S y P	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1256	Mal recorte de escarchado con muro	Closed	Acabados	Mal acabado		9/02/2024	29/01/2024		T17-702-sala y dormitorios	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1255	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		9/02/2024	29/01/2024		T17-702-baño s y p	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1254	Mal acabado de pintura en marco de puerta	Closed	Acabados	Mal acabado		9/02/2024	29/01/2024		T17-701-baño s	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1253	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		9/02/2024	29/01/2024		T17-607-dormitorio y sala	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1252	Mal acabado de pintura en muros interiores	Closed	Acabados	Mal acabado		9/02/2024	29/01/2024		T17-607-cocina	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1251	Mancha de oxido en canopla de grifo de [redacted]	Closed	Acabados	Oxido		9/02/2024	29/01/2024		T17-606-lavanderia	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1250	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		9/02/2024	29/01/2024		T17-606-dormitorio	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1249	Mal recorte de escarchado con muro	Closed	Acabados	Mal acabado		9/02/2024	29/01/2024		T17-605-dormitorios	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1248	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		9/02/2024	29/01/2024		T17-605-cocina	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1247	Mal fraguado en enchape	Closed	Acabados	Mal acabado		9/02/2024	29/01/2024		T17-604-baño y cocina	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1246	Mal acabado de pintura en marcos de puerta	Closed	Acabados	Mal acabado		9/02/2024	29/01/2024		T17-604-dormitorios	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1245	Desnivel en puerta de mueble de lavamanos	Closed	Acabados	Desnivel		9/02/2024	29/01/2024		T17-603-baño S	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1244	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		9/02/2024	29/01/2024		T17-603-sala	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1243	Diferente tonalidad de fragua	Closed	Acabados	Mal acabado		9/02/2024	29/01/2024		T17-602-cocina	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1242	Marco de puerta con quiñes	Closed	Acabados	Quiñe		9/02/2024	29/01/2024		T17-602-Baño P	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1241	Mal funcionamiento en apertura de puerta	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		9/02/2024	29/01/2024		T17-601-dormitorio	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1240	Mal acabado de pintura en canto de puerta	Closed	Acabados	Mal acabado		9/02/2024	29/01/2024		T17-601-dormitorio	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1190	Tablero electrico con rayadura	Closed	Acabados	Rayadura		5/02/2024	29/01/2024		T17-202-cocina	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1176	Mal acabado de pintura en balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		5/02/2024	29/01/2024		T17-P3-301	Mano de Obra	Arquitectura (A)	5	2024
#1175	Mal acabado de pintura en balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		5/02/2024	29/01/2024		T17-P6-601	Mano de Obra	Arquitectura (A)	5	2024
#1174	Rayadura de carp. metalica en balcon	Closed	Carpinteria metalica	Rayadura		5/02/2024	29/01/2024		T17-P9-901	Fallas de material	Arquitectura (A)	5	2024
#1173	Mal acabado de pintura en balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		5/02/2024	29/01/2024		T17-P10-1001	Mano de Obra	Arquitectura (A)	5	2024
#1172	Quiñe en carp. metalica de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Quiñe		5/02/2024	29/01/2024		T17-P13-1301	Fallas de material	Arquitectura (A)	5	2024
#1171	Mal acabado de pintura en balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		5/02/2024	29/01/2024		T17-P16-1601	Mano de Obra	Arquitectura (A)	5	2024
#1170	Rayadura de carp. metalica en balcon	Closed	Carpinteria metalica	Rayadura		5/02/2024	29/01/2024		T17-P18-1801	Fallas de material	Arquitectura (A)	5	2024
#1169	Grumos de pintura en pasamano de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		5/02/2024	29/01/2024		T17-P20-2001	Mano de Obra	Arquitectura (A)	5	2024

[redacted] RO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#1266	Papel mural despegado	Closed	Acabados	Despegado	[redacted]	13/02/2024	30/01/2024	[redacted]	T17-805-sala	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1265	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		13/02/2024	30/01/2024		T17-803-baño s	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1264	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		13/02/2024	30/01/2024		T17-802-dormitorios	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1263	Mal acabado de pintura en puerta	Closed	Acabados	Mal acabado		13/02/2024	30/01/2024		T17-802-dormitorio p	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1262	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		13/02/2024	30/01/2024		T17-801-baño p	Fallas de material	Acabados (D)	5	2024
#1261	Desnivel en puerta de mueble de lavamano en baño	Closed	Acabados	Desnivel		13/02/2024	30/01/2024		T17-801-baño s	Mano de Obra	Acabados (D)	5	2024
#1277	Filtracion trampa en lavanderia	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		12/02/2024	5/02/2024		T17-1307-lavanderia	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1276	Filtracion de trampa en lavanderia	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		12/02/2024	5/02/2024		T17-1301-lavanderia	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1275	Filtracion de trampa en lavanderia	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		12/02/2024	5/02/2024		T17-1204-lavanderia	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1274	Filtracion en empalme de ducha con tubo de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		12/02/2024	5/02/2024		T17-1201-BS	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1273	Filtracion de trampa en lavanderia	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		12/02/2024	5/02/2024		T17-1201-lavanderia	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1272	Filtracion de trampa cocina	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		12/02/2024	5/02/2024		T17-1201-cocina	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1271	Filtracion en empalme de ducha con tubo de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		12/02/2024	5/02/2024		T17-1108-BP	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1270	Filtracion en empalme de ducha con tubo de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		12/02/2024	5/02/2024		T17-1102-BP	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1269	Filtracion en empalme de ducha con tubo de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		12/02/2024	5/02/2024		T17-1101-BP	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1311	Esquinas de balcon con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		20/02/2024	6/02/2024		T17-1205-Balcon	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1310	Enchape con quiñes	Closed	Acabados	Quiñe		20/02/2024	6/02/2024		T17-P12-1207-cocina	Mano de Obra	Acabados (D)	6	2024
#1309	Marco de puerta con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		20/02/2024	6/02/2024		T17-P12-1202-Dormitorio P	Mano de Obra	Acabados (D)	6	2024
#1308	Enchape con quiñes	Closed	Acabados	Quiñe		20/02/2024	6/02/2024		T17-P12-1202-cocina	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1307	Mal recorte de papel mural en sala	Closed	Acabados	Mal acabado		20/02/2024	6/02/2024		T17-P12-1202	Mano de Obra	Acabados (D)	6	2024
#1306	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		20/02/2024	6/02/2024		T17-1201-baño s	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1305	Mala colocacion de sello en lavarropa	Closed	Acabados	Mal acabado		20/02/2024	6/02/2024		T17-P11-1106	Mano de Obra	Acabados (D)	6	2024
#1304	Desnivel de puerta de mueble de baño	Closed	Acabados	Desnivel		20/02/2024	6/02/2024		T17-P11-1105	Mano de Obra	Acabados (D)	6	2024
#1303	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		20/02/2024	6/02/2024		T17-P11-1103	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1302	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		20/02/2024	6/02/2024		T17-P11-1101	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1293	Bisagras manchadas con pintura	Closed	Acabados	Mancha		21/02/2024	6/02/2024		T17-1005-baños y dormitorios	Mano de Obra	Acabados (D)	6	2024
#1292	Punto de oxido en techo	Closed	Acabados	Oxido		21/02/2024	6/02/2024		T17-1002-dormitorio s	Error en procedimiento	Acabados (D)	6	2024
#1291	Mal acabado de pintura en puertas interiores	Closed	Acabados	Mal acabado		21/02/2024	6/02/2024		T17-1001-baños y dormitorios	Mano de Obra	Acabados (D)	6	2024
#1290	Enchape con quiñes	Closed	Acabados	Quiñe		20/02/2024	6/02/2024		T17-907-cocina	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1289	Mampara no cierra correctamente	Closed	Acabados	Funcionamiento defectuoso		20/02/2024	6/02/2024		T17-906-balcon	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1288	Fisura en parapeto de lavanderia	Closed	Acabados	Fisura		20/02/2024	6/02/2024		T17-906-lavanderia	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1287	Aristas de balcon con quñe	Closed	Acabados	Quiñe		20/02/2024	6/02/2024		T17-904-balcon	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1286	Enchapes con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		20/02/2024	6/02/2024		T17-904-cocina y baños	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1285	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		20/02/2024	6/02/2024		T17-902-cocina	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1284	Mal acabado de pintura en puerta principal	Closed	Acabados	Mal acabado		20/02/2024	6/02/2024		T17-901-sala	Mano de Obra	Acabados (D)	6	2024
#1283	Filtracion en trampa de lavanderia	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		13/02/2024	6/02/2024		T17-1601-lavanderia	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1282	Filtracion en trampa de lavanderia	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		13/02/2024	6/02/2024		T17-1506-lavanderia	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1281	Filtracion en trampa de cocina	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		13/02/2024	6/02/2024		T17-1505-cocina	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1280	Filtro de grifo defectuoso	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		13/02/2024	6/02/2024		T17-1408-BP	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1279	Falla en filtro de grifo	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		13/02/2024	6/02/2024		T17-1405-cocina	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1278	Filtracion en empalme de ducha con tubo de abasto	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		13/02/2024	6/02/2024		T17-1403-BP	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1322	Filtro de griferia defectuoso	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		14/02/2024	7/02/2024		T17-1908-cocina	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1321	Filtracion de trampa	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		14/02/2024	7/02/2024		T17-1805-cocina	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1320	Filtro de griferia defectuoso	Closed	Instalaciones y pruebas	Funcionamiento defectuoso		14/02/2024	7/02/2024		T17-1804-BP	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1319	Filtracion en canopla de ducha	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		14/02/2024	7/02/2024		T17-1705-BP	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	6	2024
#1318	Esquinas de balcon con quiñes	Closed	Acabados	Quiñe		21/02/2024	7/02/2024		T17-1305-Balcon	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1317	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		21/02/2024	7/02/2024		T17-1305-sala	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1316	Desnivel de puerta de mueble de baño	Closed	Acabados	Desnivel		21/02/2024	7/02/2024		T17-1303-BS	Mano de Obra	Acabados (D)	6	2024
#1315	Mal acabado en fragua de enchape	Closed	Acabados	Mal acabado		21/02/2024	7/02/2024		T17-1302-baño P	Mano de Obra	Acabados (D)	6	2024
#1314	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		21/02/2024	7/02/2024		T17-1302-BS	Mano de Obra	Acabados (D)	6	2024
#1313	Piso laminado con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		21/02/2024	7/02/2024		T17-1302-sala	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1312	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		21/02/2024	7/02/2024		T17-1301-Dormitorios	Fallas de material	Acabados (D)	6	2024
#1300	Mal acabado de pintura en carp. metalica de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		14/02/2024	7/02/2024		T17-P5-508	Mano de Obra	Arquitectura (A)	6	2024
#1299	Mal acabado de pintura en carp. metalica de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		14/02/2024	7/02/2024		T17-P8-808	Mano de Obra	Arquitectura (A)	6	2024
#1298	Mal acabado de pintura en carp. metalica de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		14/02/2024	7/02/2024		T17-P11-1108	Mano de Obra	Arquitectura (A)	6	2024
#1297	Mal acabado de pintura en carp. metalica de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		14/02/2024	7/02/2024		T17-P13-1308	Mano de Obra	Arquitectura (A)	6	2024
#1296	Mal acabado de pintura en carp. metalica de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		14/02/2024	7/02/2024		T14-P14-1408	Mano de Obra	Arquitectura (A)	6	2024
#1295	Mal acabado de pintura en carp. metalica de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		14/02/2024	7/02/2024		T17-P15-1508	Mano de Obra	Arquitectura (A)	6	2024
#1294	Mal acabado de pintura en carp. metalica de balcon	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		14/02/2024	7/02/2024		T17-P19-1908	Mano de Obra	Arquitectura (A)	6	2024
#1327	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		23/02/2024	9/02/2024		T17-1407-COCINA	Fallas de material	Acabados (D)	7	2024
#1326	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		23/02/2024	9/02/2024		T17-1405-Sala	Fallas de material	Acabados (D)	7	2024
#1325	Esquina de balcon con quiñes	Closed	Acabados	Quiñe		23/02/2024	9/02/2024		T17-1404-balcon	Fallas de material	Acabados (D)	7	2024
#1324	Mal recorte de papel mural	Closed	Acabados	Mal acabado		23/02/2024	9/02/2024		T17-1402-DP	Mano de Obra	Acabados (D)	7	2024
#1323	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		23/02/2024	9/02/2024		T17-P14-1401-sala	Fallas de material	Acabados (D)	7	2024
#1332	Mal acabado de pintura en baranda de torre	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		17/02/2024	10/02/2024		T17-P2-escaleras	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2024
#1331	Mal acabado de pintura en baranda de torre	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		17/02/2024	10/02/2024		T17-P5-escaleras	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2024
#1330	Mal acabado de pintura en baranda de torre	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		17/02/2024	10/02/2024		T17-P8-Escaleras	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2024
#1329	Mal acabado de pintura en baranda de torre	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		17/02/2024	10/02/2024		T17-P13-escaleras	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2024
#1328	Mal acabado en baranda de escalera en torre	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		17/02/2024	10/02/2024		T17-P18-escaleras	Mano de Obra	Arquitectura (A)	7	2024
#1337	Tomacorriente con rayadura	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura		20/02/2024	13/02/2024		T17-1908-DP	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	7	2024

[redacted] RO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#1336	Tomacorriente con rayadura	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura	[redacted]	20/02/2024	13/02/2024	[redacted]	T17-1808-cocina	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	7	2024
#1335	Tomacorriente con quiñes	Closed	Instalaciones y pruebas	Quiñe		20/02/2024	13/02/2024		T17-1708-DS	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	7	2024
#1334	Falta instalar luminaria en cocina	Closed	Instalaciones y pruebas	Elemento no considerado		20/02/2024	13/02/2024		T17-1408-BS y BP	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	7	2024
#1333	Falta instalar luminaria en cocina	Closed	Instalaciones y pruebas	Elemento no considerado		20/02/2024	13/02/2024		T17-1408-cocina	Error en procedimiento	Instalaciones (MEP)	7	2024
#1352	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		21/02/2024	14/02/2024		T17-1607-Sala	Fallas de material	Acabados (D)	7	2024
#1351	Quiñe en arista de balcon	Closed	Acabados	Quiñe		21/02/2024	14/02/2024		T17-1606-balcon	Mano de Obra	Acabados (D)	7	2024
#1350	Quiñe en puerta de mueble de cocina	Closed	Acabados	Quiñe		21/02/2024	14/02/2024		T17-1606-cocina	Fallas de material	Acabados (D)	7	2024
#1349	Papel mural despegado	Closed	Acabados	Despegado		21/02/2024	14/02/2024		T17-1605-sala	Mano de Obra	Acabados (D)	7	2024
#1348	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		21/02/2024	14/02/2024		T17-1605-Sala	Fallas de material	Acabados (D)	7	2024
#1347	Mal acabado de fragua en enchape de muro	Closed	Acabados	Mal acabado		21/02/2024	14/02/2024		T17-1604-cocina	Mano de Obra	Acabados (D)	7	2024
#1346	Mal acabado de pintura en muro de balcon	Closed	Acabados	Mal acabado		21/02/2024	14/02/2024		T17-1602-balcon	Mano de Obra	Acabados (D)	7	2024
#1345	Mal recorte de papel mural	Closed	Acabados	Mal aca		21/02/2024	14/02/2024		T17-1601-DP	Mano de Obra	Acabados (D)	7	2024
#1344	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		21/02/2024	14/02/2024		T17-1507-DP	Fallas de material	Acabados (D)	7	2024
#1343	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		21/02/2024	14/02/2024		T17-1506-DS	Fallas de material	Acabados (D)	7	2024
#1342	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		21/02/2024	14/02/2024		T17-1504-BP	Fallas de material	Acabados (D)	7	2024
#1341	Papel mural despegado en dormitorio	Closed	Acabados	Despegado		21/02/2024	14/02/2024		T17-1502-DP	Mano de Obra	Acabados (D)	7	2024
#1340	Mal acabado en sello de lavarropas	Closed	Acabados	Mal acabado		21/02/2024	14/02/2024		T17-1502-lavanderia	Mano de Obra	Acabados (D)	7	2024
#1339	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		21/02/2024	14/02/2024		T17-1501-BP	Fallas de material	Acabados (D)	7	2024
#1338	Desnivel de mueble de lavamanos	Closed	Acabados	Desnivel		21/02/2024	14/02/2024		T17-1501-BS	Mano de Obra	Acabados (D)	7	2024
#1359	Mal acabado de pintura en reja de cerco perimetrico	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		22/02/2024	15/02/2024		T17-104-Cerco perim	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2024
#1358	Mal acabado de pintura en reja de cerco perimetrico	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		22/02/2024	15/02/2024		T17-105-Cercp perim	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2024
#1357	Mal acabado de pintura en reja de cerco perimetrico	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		22/02/2024	15/02/2024		T17-106-cerco perim	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2024
#1356	Mal acabado de pintura en rejilla de patio de dpto	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		22/02/2024	15/02/2024		T17-P1-entre 104 y 103	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2024
#1355	Mal acabado de pintura en rejilla de patio de dpto	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		22/02/2024	15/02/2024		T17-P1-entre 105 y 104	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2024
#1354	Rejilla de separacion de dpto doblada	Closed	Carpinteria metalica	Desalineamiento		22/02/2024	15/02/2024		T17-P1-entre 105 y 104	Fallas de material	Arquitectura (A)	8	2024
#1353	Mal acabado de pintura en rejilla de patio de dpto	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		22/02/2024	15/02/2024		T17-P1-entre 106 y 105	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2024
#1362	Filtracion de trampa en lavanderia	Closed	Instalaciones y pruebas	Filtracion		23/02/2024	16/02/2024		T17-2008-lavanderia	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	8	2024
#1361	Falta filtro en griferia de cocina	Closed	Instalaciones y pruebas	Elemento no considerado		23/02/2024	16/02/2024		T17-2005-cocina	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	8	2024
#1360	Tubo de abasto mal instalado	Closed	Instalaciones y pruebas	Falla de instalacion		23/02/2024	16/02/2024		T17-2003-Baño 2do nivel	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	8	2024
#1365	Mal acabado de pintura en proteccion de rejilla de	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		26/02/2024	19/02/2024		T17-P1-107-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2024
#1364	Mal acabado de pintura en proteccion de rejilla de	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		26/02/2024	19/02/2024		T17-P1-108-DS	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2024
#1363	Falta anclaje en rejilla protectora de ventana	Closed	Carpinteria metalica	Ausencia de accesorio		26/02/2024	19/02/2024		T17-P1-108	Error en procedimiento	Arquitectura (A)	8	2024
#1373	Mal acabado de pintura en muro lateral de balcon	Closed	Acabados	Mal acabado		27/02/2024	20/02/2024		T17-P17-1706-balcon	Mano de Obra	Acabados (D)	8	2024
#1372	Enchape con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		27/02/2024	20/02/2024		T17-1705-BS	Fallas de material	Acabados (D)	8	2024
#1371	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		27/02/2024	20/02/2024		T17-1704-DS	Fallas de material	Acabados (D)	8	2024
#1369	Mal acabado de pintura en proteccion de rejilla de	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		27/02/2024	20/02/2024		T17-P1-102-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2024
#1368	Mal acabado de pintura en proteccion de rejilla de	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		27/02/2024	20/02/2024		T17-P1-107-Sala	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2024
#1367	Mal acabado de pintura en proteccion de rejilla de	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		27/02/2024	20/02/2024		T17-P1-108-Dormitorios	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2024
#1366	Mal acabado de pintura en proteccion de rejilla de	Closed	Carpinteria metalica	Mal acabado		27/02/2024	20/02/2024		T17-P1-105-DP	Mano de Obra	Arquitectura (A)	8	2024
#1375	Piso laminado con quiñe	Closed	Acabados	Quiñe		28/02/2024	21/02/2024		T17-1805-DS	Fallas de material	Acabados (D)	8	2024
#1374	Desnivel de puerta de mueble de lavamanos	Closed	Acabados	Desnivel		28/02/2024	21/02/2024		T17-1801-BS	Mano de Obra	Acabados (D)	8	2024
#1383	Tapa hidrobox rota	Closed	Instalaciones y pruebas	Quiñe		29/02/2024	22/02/2024		T17-2008-terraza	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	9	2024
#1382	Tablero electrico con rayadura	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura		29/02/2024	22/02/2024		T17-2008-cocina	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	9	2024
#1381	Dado de interruptor con rayadura	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura		29/02/2024	22/02/2024		T17-2004-Sala	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	9	2024
#1380	Mala instalacion de tablero electrico	Closed	Instalaciones y pruebas	Falla en instalacion		29/02/2024	22/02/2024		T17-2003-cocina	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	9	2024
#1379	Rayadura en tomacorriente	Closed	Instalaciones y pruebas	Rayadura		29/02/2024	22/02/2024		T17-2003-sala	Fallas de material	Arquitectura (A)	9	2024
#1378	Quiñe en placa de tomacorriente	Closed	Instalaciones y pruebas	Quiñe		29/02/2024	22/02/2024		T17-2002-baño 2do nivel	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	9	2024
#1377	Quiñe en muro lateral de balcon	Closed	Acabados	Quiñe		29/02/2024	22/02/2024		T17-1904-balcon	Mano de Obra	Acabados (D)	9	2024
#1376	Papel mural despegado	Closed	Acabados	Despegado		29/02/2024	22/02/2024		T17-1907-sala	Mano de Obra	Acabados (D)	9	2024
#1388	Falta colocar pastelero en parapeto de terraza	Closed	Acabados	Trabajo inconcluso		26/02/2024	23/02/2024		T17-P20-2006-Terraza	Error en procedimiento	Acabados (D)	9	2024
#1387	Fisura en muro de balcon	Closed	Acabados	Fisura		26/02/2024	23/02/2024		T17-P20-2005-balcon	Fallas de material	Acabados (D)	9	2024
#1386	Fisura en muro de cocina	Closed	Acabados	Fisura		26/02/2024	23/02/2024		T17-P20-2002-Cocina	Fallas de material	Acabados (D)	9	2024
#1385	Enchape con quiñes	Closed	Acabados	Quiñe		26/02/2024	23/02/2024		T17-P20-2001-cocina	Fallas de material	Acabados (D)	9	2024
#1397	Cinta intumescente de puerta cortafuego	Closed	Acabados	Despegado		29/02/2024	26/02/2024		T17-P16-AC	Fallas de material	Acabados (D)	9	2024
#1395	Mal acabado en sello cortafuego de escalera de	Closed	Acabados	Mal acabado		29/02/2024	26/02/2024		T17-P12-Escalera de emergencia	Mano de Obra	Acabados (D)	9	2024
#1393	Clavo expuesto en muro	Closed	Acabados	Acero/alambre expuesto		29/02/2024	26/02/2024		T17-P15-1508-DS	Mano de Obra	Acabados (D)	9	2024
#1392	Bisagra de puerta principal descascarada	Closed	Acabados	Material defectuoso		29/02/2024	26/02/2024		T17-P16-1608-Puerta principal	Fallas de material	Acabados (D)	9	2024
#1391	Quiñe en arista de balcon	Closed	Acabados	Quiñe		29/02/2024	26/02/2024		T17-P17-1708-Balcon	Mano de Obra	Acabados (D)	9	2024
#1390	Mal acabado de pintura en marco de puerta	Closed	Acabados	Mal acabado		29/02/2024	26/02/2024		T17-P18-1808-BS	Mano de Obra	Acabados (D)	9	2024
#1389	Separacion de piso laminado	Closed	Acabados	Separacion de piso laminado		29/02/2024	26/02/2024		T17-P19-1908-DP	Fallas de material	Acabados (D)	9	2024
#1396	Manchas de pintura en vestibulo previo	Closed	Acabados	Mancha		29/02/2024	27/02/2024		T17-P18-Vestibulo previo	Mano de Obra	Acabados (D)	9	2024
#1394	Mal acabado de placaciega en muro	Closed	Acabados	Mal acabado		29/02/2024	27/02/2024		T17-P20-AC	Mano de Obra	Acabados (D)	9	2024
#1400	Luminaria no enciende	Closed	Instalaciones y pruebas	Material defectuoso		29/02/2024	28/02/2024		T17-P1-108-Sala	Fallas de material	Instalaciones (MEP)	9	2024
#1399	Falta instalar luminaria	Closed	Instalaciones y pruebas	Trabajo inconcluso		29/02/2024	28/02/2024		T17-P1-101-BS y BP	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	9	2024
#1398	Falta instalar aparatos sanitarios	Closed	Instalaciones y pruebas	T17-P1-106-BS		29/02/2024	28/02/2024		T17-P1-106-BS	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	9	2024
#1401	Falta de limpieza de caja de registro de torre 17	Closed	Instalaciones y pruebas	Obstruccion o atoro		15/03/2024	29/02/2024		Exterior de T17	Mano de Obra	Instalaciones (MEP)	10	2024
#1404	Fisuras en losa de estacionamiento	Closed	Concreto Post vaciado	Fisuras		11/03/2024	4/03/2024		OE-Estacionamiento	Fallas de material	Arquitectura (A)	10	2024
#1416	Resane de vereda y sardineles	Open	Salida No Conforme	Falta resane		23/03/2024	20/03/2024		Hu Int-Estacionamiento	Fallas de material	Acabados (D)	12	2024
#1415	Falta instalar señaletica de "Reduccion de Velocidad"	Open	Salida No Conforme	Trabajo inconcluso		23/03/2024	20/03/2024		Hu Int-Estacionamiento	Error en procedimiento	Acabados (D)	12	2024
#1414	Falta instalar señaletica de "Cuidado, estacionamiento	Open	Salida No Conforme	Trabajo inconcluso		23/03/2024	20/03/2024		Hu Int-Estacionamiento	Error en procedimiento	Acabados (D)	12	2024

[redacted] TRO DE OBSERVACIONES [redacted]

NOMBRE DEL PROYECTO:	[redacted]
GERENTE DE OBRA:	
SUB-JEFE DE GTC:	
FECHA DE ÚLTIMO REGISTRO:	2/06/2023

* Recuerda no agregar, eliminar columnas o modificar los nombres de los encabezados de tabla, si se hace esto puede causar errores, solo agregar, quitar o modificar registros.

ID	Título	[redacted]	Tipo	Descripción	Asignado a	Fecha de venc.	Fecha de Inicio	Ubicación	Detalles de la ubicación	Causa principal	Especialidad	FECHA	AÑO
#1413	Falta instalar gabinete para extintor	Open	Salida No Conforme	Trabajo inconcluso	[redacted]	23/03/2024	20/03/2024	[redacted]	Hu Int-Estacionamiento	Error en procedimiento	Acabados (D)	12	2024
#1412	Falta instalar señaletica de "Salida"	Open	Salida No Conforme	Trabajo inconcluso		23/03/2024	20/03/2024		Hu Int-Estacionamiento	Error en procedimiento	Acabados (D)	12	2024
#1411	Falta pintar "S" de Seguridad en pavimento	Open	Salida No Conforme	Trabajo inconcluso		23/03/2024	20/03/2024		Hu Int-Estacionamiento	Error en procedimiento	Acabados (D)	12	2024
#1410	Falta completar tapajunta metalica	Open	Salida No Conforme	Hu Int-Estacionamiento		23/03/2024	20/03/2024		Hu Int-Estacionamiento	Error en procedimiento	Acabados (D)	12	2024
#1409	Falta completar pintura de trafico del estacionamiento	Open	Salida No Conforme	Trabajo inconcluso		23/03/2024	20/03/2024		Hu Int-Estacionamiento	Error en procedimiento	Acabados (D)	12	2024
#1408	Falta instalar farola tipo poste en estacionamiento	Open	Salida No Conforme	Trabajo inconcluso		23/03/2024	20/03/2024		Hu Int-Estacionamiento	Error en procedimiento	Acabados (D)	12	2024
#1407	Falta pintura en pase peatonal	Open	Salida No Conforme	Trabajo inconcluso		23/03/2024	20/03/2024		Hu Int-Estacionamiento	Error en procedimiento	Acabados (D)	12	2024

4. LECCIONES APRENDIDAS

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	18/12/2017
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	CALIDAD
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Exposición de tuberías eléctricas Post vaciado.

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Recorrido incorrecto de tuberías eléctricas.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Colocar el recorrido de la tubería eléctrica por el interior de la malla de acero en los muros.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



Foto 1. Exposición de tubería



Foto 2. Tubería por el interior de muros

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

-	-
-	-
-	-

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	13/12/2017
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	CALIDAD
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	CONCRETO PREMEZCLADO		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Exceso de Exudación, demora en la fragua del concreto suministrado por Unicon. Diseño de concreto anterior [redacted]

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Exceso de aditivos en el concreto 210 kg/cm².

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Al evidenciar ciertos eventos anómalos, gestionar con Unicon y comunicación directa con los jefes de planta para prever un diseño especial para la obra dependiendo la lejanía o cercanía. Para ello, es necesario un monitoreo diario hasta que el concreto llegue a obra con la trabajabilidad, exudación y fraguado deseado en coordinación con los capataces de concreto y encofrado. Nuevo Diseño [redacted]

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



Foto 1. Exudación de concreto



Foto 2. Fraguado normal del concreto

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

-	-
-	-
-	-

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/07/2018
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	Producciòn

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Las Losas de la sala comerdor de cada piso, se ven afectadas por el encuentro del encofrado al finalizar con el escarchado de cada departamento, a pesar que se amola en zonas críticas y se le aplica 1 mano de empaste.

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Empalme de encofrado metálico.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Se procedió a reducir el amolado por medio de la aplicación de 2 manos de empaste previas al escarchado. De esta manera, se ha podido apreciar un mejor acabado.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/07/2018
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	BIENESTAR SOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Se evidencia una oportunidad al detectar que el espacio que tenemos en el comedor de la obra podemos realizar diferentes actividades con todo el personal de obra.

II. UBICACIÓN

Comedor de la obra

III. CAUSA

A raiz de realizar la actividad de bienestar social .

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Podemos aprovechar el espacio para el involucramiento de todos los colaboradores de la empresa y puedan participar todos.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

[redacted]

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/08/2018
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTARIA		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Desconocimiento por parte de algunas áreas (OT, Producción, Calidad y Ssoma) a cerca de las ordenes de cambio, solicitudes de información (Rfi`s) y propuestas de modificaciones aprobadas.

II. UBICACIÓN

Control de documentación de ingeniería


III. CAUSA

Falta de difusión constante de las ordenes de cambio, solicitudes de información (Rfi`s) y propuestas de modificaciones aprobadas.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Se decidió hacer un control de entrega de información a todas las áreas involucradas (OT, Producción, Calidad y Ssoma).

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

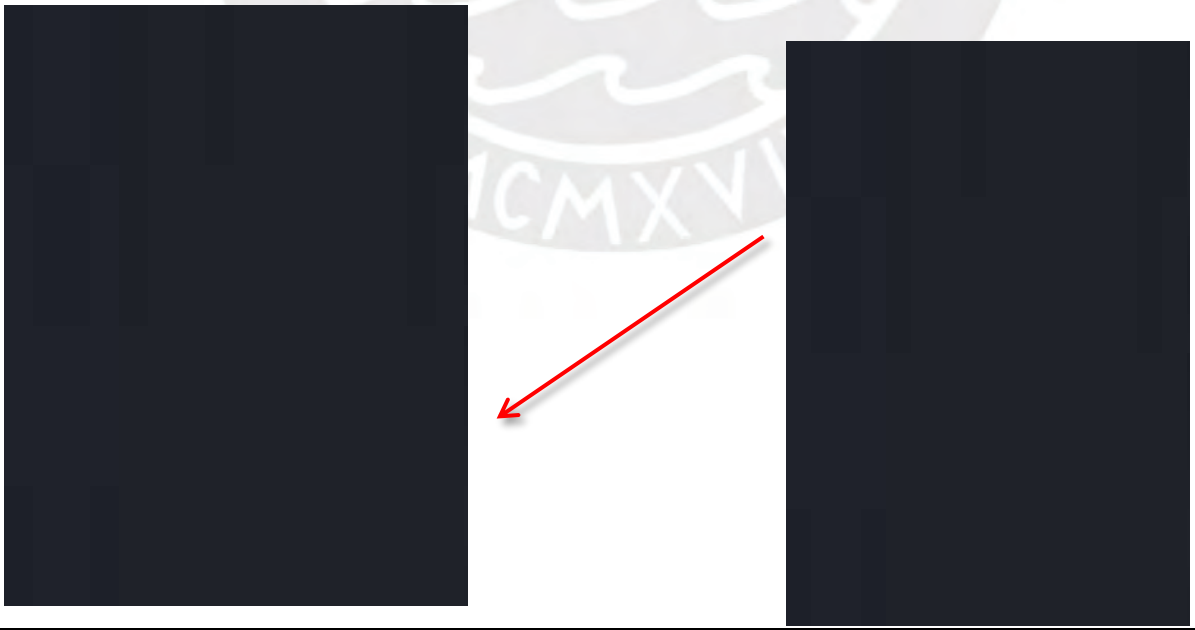
[redacted]

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

-	-
-	-
-	-

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	20/01/2018
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	CALIDAD
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Óxido en muros.

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Realizar el atortolado de forma incorrecta.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Se realizó el atortolado de hacia un costado o al interior del muro para evitar el contacto con el encofrado y generar el óxido.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:


[redacted]

Foto 1. Exposición de tubería


[redacted]

Foto 2. Tubería por el interior de muros

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

-	-
-	-
-	-

[redacted]	FORMATO **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/08/2018
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	CALIDAD
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ENCOFRADO		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Desplome en las zonas bajas en ciertos muros del pasadizo, cuartos y vanos de puertas.

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Solo se presentan alineadores en la parte alta del encofrado.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Se rconversó con Forsa el tema yse compró un tipo de alineador distinto para las zonas bajas en los muros donde ocurría el problema.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:




Foto 1. Alineador deficiente

Foto 2. Alineador adicional

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

-	-
-	-
-	-

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/08/2018
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	BIENESTAR SOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

En los vestuarios del personal obrero no se ha llevado un correcto control con el cumplimiento de la limpieza en los SS.HH.

II. UBICACIÓN

Vestuarios

III. CAUSA

En los resultados de las encuestas de satisfacción.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Se ha coordinado con un responsable que reporte al área de Bienestar Social el cumplimiento de la limpieza diaria.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

[redacted]

Breve descrición de la(s) fotografía(s)

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/08/2018
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

El personal de obra no tiene claro los trabajos y manipulacion con materiales químicos peligrosos.

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Falta de conocimiento para el manejo de productos químicos.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Se realizó una capacitación general en obra por parte de la aseguradora RIMAC sobre la manipulación de los productos químicos peligrosos.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:


[redacted]


[redacted]

Capacitación general en obra por parte de la aseguradora RIMAC

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

	FORMATO **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:

PROYECTO:		**FECHA:**	28/09/2018
ELABORADO POR:		**ÁREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	IISS / CONSTRUCCION DEL PROYECTO		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Corrección en obra luego del vaciado de concreto. Se vació el concreto del pavimento sin considerar el espacio para la colocación de la rejilla de desagüe al ingreso del Lobby Principal.

II. UBICACIÓN

Ingreso al Lobby Principal


III. CAUSA

Falta de actualización de los planos de Arquitectura del Lobby. No se compatibilizó el plano de Arquitectura con los cambios de IISS.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Realizar la compatibilización constante de planos de diferentes especialidades y entregarlas a campo.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

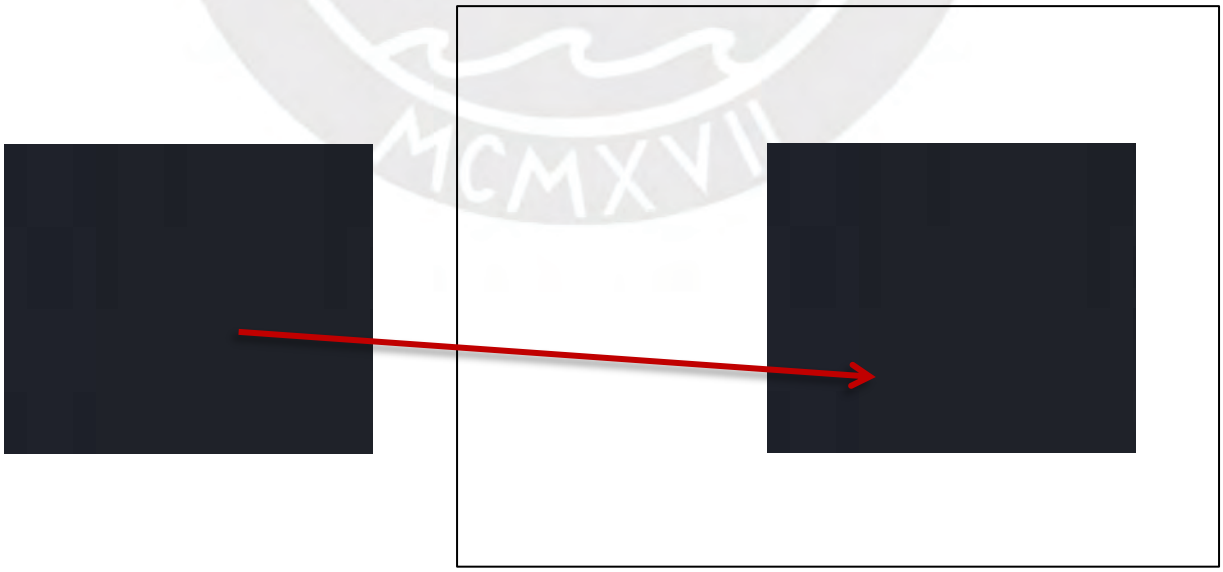

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

-	-
-	-
-	-

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	29/01/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	GESTION TOTAL DE LA CALIDAD
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	CONCRETO		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Posible filtración de agua del jardin exterior (entre torres) hacia dormitorios principales colindantes

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

junta fría que se origina entre el contreto viejo (platea) y concreto nuevo (muro), lo cual sería una zona propensa a la filtración de agua por el regadío de jardin exterior.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Colocar sikaswell en la unión de cimentación y muro ([redacted]) y viceversa. Esto con la finalidad que el agua de regadío para el jardin, no filtre hacia los domitorios del primer piso; ya que ahí no va zócalo de cemento pulido.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

[redacted]

Foto 1. Aplicación de sikaswell a junta cimentación muro

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

-	-
-	-

	FORMATO **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:

PROYECTO:		**FECHA:**	30/01/2019
ELABORADO POR:		**ÁREA:**	BIENESTAR SOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

En la encuesta brindada a los colaboradores mencionan que en la hora de aluerzo el calor pasa hacer intolerable, por lo cual solicitan que se instalen ventiladores para miticar el golpe de calor que se siente.

II. UBICACIÓN

Obra comedor.

III. CAUSA

En los resultados de las encuestas de satisfaccion.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Se ha solicitado al jefe de obra facilitarnos las ventiladoras para que estas esten instalados en el comedor en puntos estrategicos.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



Breve descrición de la(s) fotografía(s)

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	2/02/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	Producción

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

muros panceados

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

soportes de los alineadores vencidos ,el elmento ya no cumple con su funcion dentro del encofrado

se ha detectado el error ,se esta procediendo a solicitar el accesorio para solucionar el problema en las siguientes torres ,se debe considerar el cambio de pieza cada cierto tiempo para asi evitar el problema

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:


[redacted]


[redacted]

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	4/02/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Personal de campo traslada material Bro-cure (curador), hacia la [redacted] elemento de protección, dispositivo de seguridad (tapa).

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Falta de implementación de controles administrativos (mejora de procedimiento de trabajo, capacitación especifica de mejora continua).

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Se realizo una capacitación especifica dirigida al personal en general así como personal de almacén central, donde se difundió los alcances de la implementación de los dispositivos de seguridad para envases de PQP (tapa), al entregar y al uso, traslado de los mismos por todo el personal. Así mismo se procedió a implementar en el procedimiento de trabajo [redacted]. realizado el 22 de enero por j[redacted]

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

[redacted]

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

Hoja de capacitación	SI
Tomas fotográficas.	SI

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	18/07/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	GESTION TOTAL DE LA CALIDAD
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Posible ingreso de agua a los conductos de las tuberias de electricidad para estacas en obras exteriores

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Regadio constante en jardines de obras exteriores

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Colocar sikaflex en tubería por donde pasa la instalación eléctrica

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:


[redacted]


[redacted]

Foto 1: Tuberias con Sikaflex

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

-	-
-	-

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	22/07/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	Producción

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

El tipo pintura (latex) considerada para la terraza de los duplex no es la adecuada para exteriores, lo que genera erosión y moho en el acabado fnal de muros y por ende, retrabajos.

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Debido a factores climáticos, se empleará pintura óleo en zona de terrazas.

[redacted]

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

[redacted]

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/07/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	BIENESTAR SOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Oportunidad: Actualmente no contamos con personal de limpieza que se encargue especialmente de espacios como SSHH del personal obrero. Ante esta situación lo que se realiza en obra es mandar a realizar este servicio al personal que llegue tarde a obra ya sea personal de [redacted]

II. UBICACIÓN

Servicios higiénicos

III. CAUSA

Al no contar con personal de limpieza para los ambientes de los SSHH obrero.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Lo que se ah podido observar que tenemos un efecto de menos insidencia de tardanza.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

[redacted]

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/07/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ADMINISTRATIVOS		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

No se visualiza en el S10 el monto correcto de real acumulado para servicios provisionales - SC servicio consumo de agua potable.

II. UBICACIÓN

S10 Gerencia de Proyectos: Resultados en Línea, real acumulado.


III. CAUSA

No se cargó en su momento al S10 los recibos de Abril, Mayo y Junio de servicio de agua potable.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Realizar el seguimiento al área de Administración para que carguen correctamente los recibos mensualmente.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

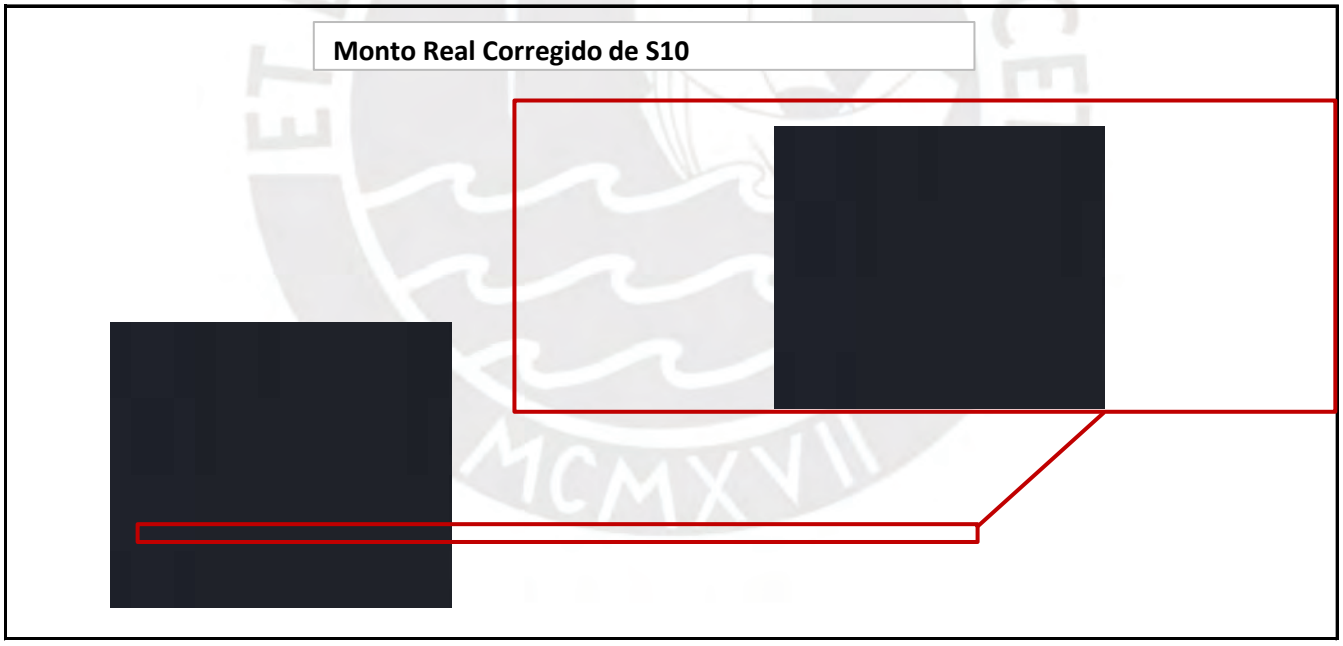

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

-	-
-	-

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	1/08/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Se evidenció en este mes de julio en los trabajos de cisterna y cimentación par[redacted] que el personal de la empresa[redacted]están utilizando herramientas de poder son oficiales y otros ayudante, si bien es cierto tienen la destreza de manejar dichas herramientas no obstante podemos contar con accidentes de trabajo por uso de estas y asi mismo la falta de una buena capacitación que acredite el buen manejo de dichas herramientas por una empresa acreditada.

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Falta de implementación de controles en el area de trabajo según los estandares de uso de herramientas de poder (mejora de procedimiento de trabajos a las personas que se encuentrean expuestas al uso de equipos y herramientas, capacitación especifica de mejora continua).

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Se llego a un acuerdo con jefatura de obra, el area de produccion y el area de equipos y mantenimiento el coordinar capacitaciones con empresas y/o proveedoras que acrediten al personal el buen manejo de equipos y herramientas de poder, asi evitando cualquier tipo de inconveniente frente a un accidente de trabajo.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

Hoja de capacitación	SI
Tomas fotográficas.	SI

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	27/08/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	Producción

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Dejar anclajes(burritos) en duplex a una altura de 20 cm.

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Se dejó a menor distancia lo que dificulta la colocación de andamios

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	27/08/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	Producción

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Platina colocada por [redacted] para la instalación de las barandas de las escaleras daña tuberías

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Debido a la colocación de dichas platinas se rompen tuberías en el proceso.

Platina colocada por [redacted] para la instalación de las barandas de las escaleras daña tuberías, por lo que se ha optado por colocarla después del vaciado pero antes de los acabados.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	27/08/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	Producción

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Empalme de Red de ACI de l[redacted], la red exterior con la interior debe tener un empalme directo que conlleve la menor cantidad de codos, para tener un mejor funcionamiento y menores pérdidas de carga por accesorios.

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

El SC de ACI, realizó el empalme fuera de tiempo, el mismo que complicó el empalme colocando muchos codos (Para evitar la caja del medidor de agua), los mismos que causan pérdidas por exceso de accesorios.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

[redacted]

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:	[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	27/08/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ALBAÑILERÍA		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Se presenta tabiquería desplomada en el vestíbulo del área común.

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Se instaló tabiquería sin el procedimiento adecuado. Además, no se realizó la liberación de dicho elemento.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Reportar una actividad o proceso terminado del área común para que el área de GTC pueda revisarlo con las tolerancias correspondientes.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



Fig 1. Tabiquería desplomada

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

-	-
-	-

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	27/08/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	Producción

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Colocación de tablero por parte de subcontrata eléctrico cuando otro proveedor tenía a cargo esta actividad.

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Revisión de alcance de subcontratista

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	29/08/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	BIENESTAR SOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Oportunidad: En las encuesta se presenciaba que los trabajadores que salian después de la hora de almuerzo no encontraban la variedad de menú que se tenía en un inicio de la atención.

II. UBICACIÓN

Comedor de obra

III. CAUSA

El personal que sale depués de la hora habitual de almuerzo no encuentra la variedad que había en un inicio de la atención, generando malestar al trabajador.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Debido a lo mencionado se ha implementado la publicación del menú de la semana, el cual el trabajador que sabe que almorzará tarde puede solicitar su elección de menú y pedir la reserva. El menú se publica semanalmente en el panel de bienestar social.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: [redacted] VERSIÓN: FECHA:

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30/08/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ACABADOS		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Existencia de diferencia entre plano acabados y planos instalaciones de gas natural.

II. UBICACIÓN

[redacted]

III. CAUSA

Se instaló cuatro (4) rejillas en las puertas montantes de los pisos superiores, cuando solo debió instalarse en el 1er nivel.

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Compatibilizar los planos de detalles con los archivos proporcionados por el proyectista de dicha especialidad.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

-	-
-	-

[redacted]	**FORMATO** **LECCIONES APRENDIDAS**	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: [redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	2/09/2019
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

I. AMENAZA U OPORTUNIDAD DETECTADA:

Se evidencio en este mes de agosto que el personal de la [redacted] y contratistas (en muchos casos) al momento del llenado del ATS, no identificaban bien los peligros y riesgos de la actividad si bien es cierto en sus trabajos tienen la destreza de realizar dichas actividades no obstante podemos contar con accidentes de trabajo por la falta de control estipulado en sus ATS, y asi mismo la falta de una buena capacitacion en el llenado de sus ATS correspondientes pueden generar un accidente.

II. UBICACIÓN

Trabajos en toda la obra.

III. CAUSA

En muchos casos la causa principal de este desviamiento es la rotacion de trabajos en sus actividades y la falta de interes y compromiso en sus trabajos, (Se menciona la rotacion, ya que por momentos estan en una actividad y lo cambian por otra, y esto hace que el trabajasor cometa errores al momento de realizar dichos ATS y lo hacen mal por el apuro).

IV. LECCIONES APRENDIDAS:

Se llego a un acuerdo con jefatura de obra, el area de produccion que se realice una capacitacion incluida el taller al personal en general del buen llenado de sus ATS, asi evitando cualquier tipo de inconveniente y evitar un accidente de trabajo por falta de control administrativo.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



VI. OTROS ADJUNTOS (nombre los documentos que se están adjuntado):

Hoja de capacitación	SI
Tomas fotográficas.	SI

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	19 octubre 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?


Personal de quien sufrió caída al mismo nivel, ingresó a una zona que no estaba adecuadamente señalizada.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se mejoró la señalización en zona de descarga de materiales

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Toda zona de descarga deberá quedar restringida



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	SETIEMBRE
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ACBADOS / DAÑO EN CABLES ELECTRICOS POR LIJADO DE EMPASTE		

¿QUÉ PASÓ?

Se encontró varios cables cortados en tomacorrientes de cocina de los [redacted] en [redacted]. Esto ocurrió deido a que cuando intalaron el cableado en los departamentos dejaron estas orejas de cables sobresaliendo de la caja; por ello cuando se ingresó a lijar con maquina el empaste nose percataron de los cables de tal forma que con la fuerza de la maquina pelaron los cables y los dañaron.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

se convocó a una reunión de emergencia con las cuadrillas involucradas para hacer el análisis de lo sucedido ([redacted]). En esta reunión se asumió responsabilidad por ambas partes de las contratas y se acordó que se realizará el cambio del cable de los [redacted] pisos superiores no debía ocurrir esta misma observación

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Proteger las mechas del cable instalados en las cajas eléctricas, dejando estos cables por dentro de las cajas (no sobresalidos) para evitar daños de los trabajos que se hagan en el acabado de pintura. Implementar esta lección en los PETS [redacted] correspondientes a los trabajos de instalaciones eléctricas en edificios.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30/09/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ADMINISTRACION		

¿QUÉ PASÓ?

En [redacted], el proceso de envío de RFI a los proyectistas se ha simplificado, sin embargo los proyectistas demoran en responderlos debido a la cantidad de información .

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se ha solucionado el tiempo de demora de respuestas mediante el cambio en la redacción de los RFIs, así como el adjunto de PDFs de los planos, brindando la propuesta para solicitar validación directamente (Sí o No).

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió que la redacción de los RFIs debe ser consistente y resumida, así como gráfica. Esto con el objetivo de no saturar de información al proyectista y así pueda responder rápidamente las solicitudes.

No aplica Foto

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30/09/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		

¿QUÉ PASÓ?

Se identificó vulnerabilidad hacia los vecinos y transeuntes de la avenida [redacted] en el sector del SUM ya que la altura de la eficación fueron 3 pisos, la cual se pudo observar que podría generar proyecciones de materiales en esos lugares.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

A raíz de esta identificación, se coordinó con el área de producción y el gerente de obra instalar parantes que nos sirvan como protección anticaídas de materiales y encapsular toda la estructura. Así se evita algún evento no deseado.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió que debe haber una rápida y oportuna intervención para hacer medidas preventivas en estos procesos con un uso efectivo y rápido del personal a cargo para el logro del control de riesgo.

FOTOS



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30/09/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	BIENESTAR SOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	EJECUCIÓN		

¿QUÉ PASÓ?

Se ha observado que la concesionaria utiliza un espacio del comedor para el cobro del almuerzo, en el cual esta generando desorden en la cola.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se coordino con la concesionaria la implementación de un mueble en la misma fila de la entrega del almuerzo e identificación de las zonas.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Establecer las ubicaciones de los espacios de la concesionaria para un mejor distribución del almuerzo, deberemos de supervisar las actividades del funcionamiento de la concesionaria.

ANTES



DESPUES



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30/09/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	PRODUCCIÓN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	N.A.		

¿QUÉ PASÓ?

Se detecto patologías en concreto de exudación excesiva desde tercer mixer hasta el penúltimo mixer por bajo contenido de finos en la mezcla generando consumo de horas hombres para el acabado de la losa.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se hizo la comunicación inmediata con planta cuando se tenia regleado la losa del tercer mixer y se pudo hacer el ajuste en la mezcla del ultimo mixer; dado que el resto de unidades ya estaban en tránsito o cargadas.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se debe tener comunicación inmediata con el área de planta [redacted] para poder reportar de forma oportunas las patologías del concreto que pueda presentar durante el vaciado. Estas comunicaciones deben tener evidencia fotográfica y por videos para el planta pueda detectar las posibles causas que generen estas patologías.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30/10/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		

¿QUÉ PASÓ?

Se identificó, en el proceso de encofrado, varios desviamientos en el proceso, como el orden y limpieza en las áreas, el desencofrado de los EQL, dejando puntales sueltos en la escuadra, puntales sueltos en varias areas de forma vertical pudiendo tener el riesgo de caída .

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

A raiz de esta identificación se coordinó con el área de producción y el gerente de obra contar con una capacitación con los tecnicos [redacted] para poder fortalezer el conocimiento del proceso del encofrado.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

El aprendizaje llevado en este proceso tiene como objetivo evitar un accidente en el proceso de encofrado. La rápida y oportuna intervención de la capacitación del técnico de [redacted] tiene la medida preventiva en estos procesos del personal a cargo y se logró el objetivo del control de estos riesgos.

FOTOS


[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	OCTUBRE
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	PRODUCCIÓN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ESTRUCTURA / CONTROL DE APLOME EN LAVANDERIAS		

¿QUÉ PASÓ?

Desplome en muros de lavandería, conlleva a tener problemas en la instalación de muebles amazonas.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se está aplomando y apuntalando zona de lavandería para poder controlar dicho elemento en esa zona, para no tener problemas a futuro en la instalación del amazonas.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Asegurar el alineamiento y aplome en zonas donde van aparatos sanitarios o muebles para no generar observaciones durante la partida de acabados. Evitando rellenado con silicona o sobrecostos

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	OCTUBRE
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ESTRUCTURA / FALTA DE ADHERENCIA DE DESMOLDANTE EN ENCOFRADO		

¿QUÉ PASÓ?

Consistencia liquida del desmoldante [redacted] lo cual generaba que al aplicar el desmoldante este no se adhiera al encofrado generando desperdicio de material y mal acabado en el post vaciado.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se convocó al proveedo[redacted]" para hacer una inspección en campo, donde evidenciaron la consistencia liquida del encodrado [redacted]; por ello nos propusieron un producto similar con mejor consistencia que fue[redacted]. Con este producto se evidenció una mejor adherencia del desmoldante al encofrado, brindando un mejor desencorfrado de muros.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Ante la observación de algun material durante la ejecución de trabajos, convocar a una reunión en campo al proveedor para la evaluación de su productor; con el fin que puedan proponer las soluciones del caso.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	OCTUBRE
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	GESTION / ADMINISTRACION		

¿QUÉ PASÓ?

El movimiento de Tierras de la [redacted] cambiado el alcance de la entrega [redacted] debido a que Inmobiliaria mudará su [redacted] allí. Esto ha originado cambios rápidos en Arquitectura, Acabados e Instalaciones sin la presencia de planos de diseño.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Esto se ha solucionado con coordinaciones diarias y rápidas entre Inmobiliaria, Producción, OT y los subcontratistas para la ejecución precisa de los cambios así como la optimización de los recursos.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió que en este tipo de modificaciones en el alcance a contratiempo de entrega, las coordinaciones entre los actores deben ser en cada momento para evitar problemas de equipamiento e implementación debido a la rapidez del proceso.

No aplica

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30/10/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	BIENESTAR SOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	EJECUCIÓN		

¿QUÉ PASÓ?

Se ha observado que en el horario del almuerzo en la zona del ingreso al comedor, los obreros no mantiene el distanciamiento según el plan covid.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se coordino con SSOMA para señalizar el piso con circulos.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se mejoro la distribución al ingreso del comedor y con el apoyo de las concesionarias deben ser ordenadas por ellas.
Supervisar al momento del horario del almuerzo



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	NOVIEMBRE
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	PRODUCCIÓN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ACABADOS / CHAPAS PUERTAS PRINCIPALES		

¿QUÉ PASÓ?

Falta de orificios perpendicular a la manija para poder instalar la chapa en puertas. Se encontró u total de 153 chapas observadas que requieren de cambio por parte del proveedor

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se reportó la observación al área de procura para que haga el reclamo al proveedor. Además se hizo una revisión de todo el lote para seleccionar las manijas que solo presentaban 2 perforaciones.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Para chapas de puertas principales se debe revisar que las perforaciones 4 perforaciones o en caso solo tenga 2 perforaciones, estas deben estar ubicadas perpendicularmente a la manija.


[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30/11/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	BIENESTAR SOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	EJECUCIÓN		

¿QUÉ PASÓ?

El comedor se llenaba en la hora del almuerzo y se generaba cola de espera.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se armo un horario actualizado integrando a las contratas y cuadrillas, cumpliendo el aforo.
Se informo el nuevo horario a los capataces, a los grupos de Whatssap y se pego en zonas estrategicas los horarios según cuadrilla.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se mejoro el control con los horarios y cumpliendo con el aforo del comedor.
Cada mes se debe de actualizar.

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	NOVIEMBRE
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ESTRUCTURA / DESPLOME EN EQL		

¿QUÉ PASÓ?

Desplome en parte superior de muros (EQL) de sala con balcones

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se coloco tensores en parte superior de muro (EQL) con el fin de asegurar el aplome en las salas

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Complementar el aseguramiento del encofrado con accesorios (tensores) para asegurar el aplome en las placas.



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30/11/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		

¿QUÉ PASÓ?

El dia de hoy a las 15:00 pm, realizando el proceso de excavacion, la excavadora de la empresa transporte [redacted] momento de realizar el perfilado de banqueta, el operador no se percata de la existencia del cable de media tension y lo corta, causando el corte de energia electrica en el proyecto y todo el perimetro de la obra, se tomaron las siguientes medidas de control. Se paralizo las actividades en la zona, se señalizo el area afectada, tambien se reporto a luz del sur para la inspeccion y reposicion de la energia.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

A raiz del accidente, se tomo acciones rapidamente llamando a luz del sur para desconectar la llave de la barra afectada y poder tener energia a la obra y a los predios colindantes. luego se reparo dichos cables de media tension con la empresa [redacted] Tambien se reindujo a los involucrados en el area de trabajo. Tambien se dio solucion convocando a una reunion con el personal involucrado y el contratista para mejorar el proceso y entregar el plano de interferencia de redes y difundirlo.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

El aprendizaje llevado en este proceso tiene como objetivo evitar un accidente en el proceso de excavacion masiva la cual nos alerta en uno de los peligros en este proceso es las interferencias de redes al momento de excavar la cual se controla con los planos de interferencia en campo y difundido a todo el personal involucrado.

FOTOS


[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30/12/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		

¿QUÉ PASÓ?

A raiz de los incidentes sin tiempo perdido ocurridos en el mes de diciembre (Golpe por caida de material en la misma vertical, dolencias en la espalda y atrapamiento por caida de material por mal manejo de carga), Se realizó las siguientes actividades preventivas.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

A raiz de los accidentes ocurridos el mes de diciembre, se tomo las siguientes acciones rápidamente para evitar la ocurrencia: (Caida de material por trabajos en la misma vertical) y (mala maniobra de posturas disergonomicas) Se realizó las siguientes capacitaciones in situ con los carpinteros tocando el tema sobre los trabajos en la misma vertical y se continuó con los ejercicios de calentamiento antes de los trabajos. El accidente de atrapamiento por caida de material por mala maniobra de carga, se solucionó reforzando con una capacitacion sobre levantamiento correcto de carga con materiales pesados,también se conto con la campaña de seguridad por parte de la gerencia.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

El aprendizaje llevado en este proceso tiene como objetivo evitar un accidente en el proceso de encofrado y carga de materiales la cual nos alerta en uno de los peligros en este proceso es las interferencias o trabajos en la misma vertical, tema de ergonomia y manipulacion de carga de materiales.

FOTOS



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	DICIEMBRE
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	PRODUCCIÓN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ACABADOS / PISO LAMINADO		

¿QUÉ PASÓ?

El almacenamiento del piso laminado dentro de los departamentos de la torre estaban en contacto directo con la losa que podría verse afectado en caso de algún suceso.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se reportó la observación y se colocaron parihuelas como base para mantener el material en un nivel más elevado.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

El piso laminado debe de colocarse sobre una plataforma para evitar que tenga contacto con el agua en caso de algún accidente. Asimismo, debe de forrarse para protegerlo de rayaduras o que le caiga algún material que pueda dañarlo.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/12/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	BIENESTAR SOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	EJECUCIÓN		

¿QUÉ PASÓ?

Se ha observado que el concesionario presentaba los cubiertos sin proteccion ni servilletas.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se converso con el personal y se coordino que estos debian estar puestos con servilletas y de protección en bolsas de marciano.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Mejoramos la limpieza y orden para entregar al personal los cubiertos.

ANTES



DESPUES



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	DICIEMBRE
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ESTRUCTURA / CAIDAS ABRUPTAS DE SLUMP DURANTE EL VACIADO		

¿QUÉ PASÓ?

Al inicio del vaciado se tenía un slump dentro de la tolerancia (6-4 "); sin embargo en el transcurso del mismo se tenia caidas abruptas del slump llegando a los 2".

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se propuso usar agua fría en la dosificacioón de la mezcla [redacted] para poder evitar caídas de slump abruptas por el incremento de temperatura en los ultimos días del mes de diciembre.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Mantener comunicación constante con el jefe de planta con el fin de encontrar soluciones alternas a las patologias (uso de agua fría) que pueda presentar el concreto.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	DICIEMBRE
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	GESTION DOCUMENTARIA		

¿QUÉ PASÓ?

Se va a realizar la construcción del ascensor para el Lobby 1 en una zona con altas interferencias de Instalaciones de redes ya entregadas a la junta de propietarios.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se ha hecho una compatibilización de los planos y se ha hecho reuniones con el área de Producción, Inmobiliaria y los subcontratistas para coordinar las acciones a realizar y así evitar inconvenientes al inicio de la obra.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió que la gestión en la entrega de información a Producción no debe limitarse a sólo entregar los planos sino a un proceso de reuniones con los actores involucrados (Producción, Inmobiliaria y subcontratistas) para lograr una mejor comunicación y la agilización de los procesos.

No aplica

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	21 abril 2023
ELABORADO POR:		**AREA:**	BSOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?

El filtro de agua se encontraba ubicado en el cual habia mucha demora en llevarlos a los puntos de hidrtación.


¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se trasladó el filtro a la primera planta para que sea mas accecible y rapido de poder llevar a los puntos de hidratación.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Los filtros de agua tienen que estar ubicados en zonas accesibles a todos.
Por otro lado la cantidad de filtros debe ser minimo de 2, cuando pasa de 50 trabajadores.





[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/05/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	PRODUCCIÓN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	N.A.		

¿QUÉ PASÓ?

Se observo que en la partida de albañilería, en el amolado de venas en concreto seco, tenemos mucho desgaste de equipos y polvillo en el ambiente.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se procede a realizar el amolado de las venas, despues del desencofrado cuando aún el concreto esta fresco para evitar desgaste de equipo y reducir el polvillo en ambiente.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Que se puede evitar esos casos en dicha actividad sin generar mayor desgaste de equipos y reducir el polvillo.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	MAYO
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	CONCRETO POST VACIADO		

¿QUÉ PASÓ?

Presencia de desalineamiento y desplome en algunos muros y derrames de puertas - ventanas

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se optó por usar puntales, postes o topes de maderas en ambientes y derrames de puertas y ventanas/ mamparas para asegurar el encofrado y evitar los desalineamientos y desplomes

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Implementar mas accesorios en encofrado de ser necesario para asegurar el producto.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/05/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	BIENESTAR SOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?

En horarios de almuerzo, los obreros de la cuadrilla de encofrados eran los últimos en almorzar y casi siempre no habia opciones de elegir su comida. Las opciones que trae la concesionaria son 03. Esto incomodaba mucho al personal y generaba una inconformidad en el servicio.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se coordino con la concesionaria que para la cuadrilla de los encofradores se le trajera sus opciones a parte para que siempre se mantenga hasta el final del servicio o en todo caso al momento que ellos lleguen a consumir sus alimentos.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Tener en cuenta las diferentes realidades y horarios que tienen los colaboradores esto con el objetivo de que si presentan una dificultad brindarle todo el soporte o ayuda.



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/05/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ADMINISTRACION		

¿QUÉ PASÓ?

Oleada de Covid 19 provocó que el área de OT y BIM hagan trabajo remoto.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se dispuso que el área BIM entregue los planos con la firma digital para que el equipo de obra pueda imprimirlos. De esta manera se puede agilizar procesos y evitar que la ausencia del área en obra pueda ser un impedimento para la realización de las tareas.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió que se puede trabajar de manera remota implementando nuevos procedimientos como la firma digital para la entrega de planos a obra.

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/05/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		

¿QUÉ PASÓ?

Se observa que los trabajadores en muchos casos, en los trabajos con equipos electricos, escriben en su ATS como un control la revisión, mirar, que este en buenas condiciones el equipo sin sustento objetivo.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se programó la entrega de un cheklist de equipos para cada personal que retire del almacen y asi sustentar de forma objetiva y fisica los controles del uso adecuado de los equipos electricos y sumar la cinta del color del mes.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

El aprendizaje llevado en este proceso tiene como objetivo evitar un accidente causado por equipos electricos en mal estado.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/07/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	PRODUCCIÓN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	N.A.		

¿QUÉ PASÓ?

Desalineamiento de 02 cm en los parapetos , a pesar de respetar el plano de modulación y aseguramiento

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se procedió a colocar un tubo alineador adicional , con la finalidad de tener un mejor alineamiento y evitar retrabajos y desviaciones

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Que se puede evitar un reproceso en la rectificación de muros invirtiendo horas hombre en el picado, amolado o tarrajeo.



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/07/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	BIENESTAR SOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	EJECUCIÓN		

¿QUÉ PASÓ?

Los descansos médicos entregados por los trabajadores no estaban siendo bien canalizados dado que se estaban entregando directamente al capataz de la obra. Y esto no se trasladaban a las áreas pertinentes como administración quien pasa la asistencia de los trabajadores a capital humano.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se tuvo una reunión con los encargados de cuadrillas que si bien es cierto el trabajador les tienen que informar su ausencia laboral es responsabilidad del trabajador reenviar esa información al administrador de la obra.
Adicional a ello en las charlas se reforzo sobre como se debe de entregar un descanso medico y cuáles son los canales.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

La importancia que tienen que saber los trabajadores sobre los canales de información. Para que esto no les perjudique en su asistencia diario.

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	JULIO
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ENCOFRADO / DESPLOME EN GARGANTA DE ESCALERA		

¿QUÉ PASÓ?

Desde [redacted] se ha detectado desplome en la garganta de la escalera (primera iamgen), lo cual se evidencia cuando tiene las barandas instaladas dado que la abertura de las mismas se va reduciendo por el desplome.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se optó por colocar una poste adicional para reforzar y asegurar el aplome en la garganta de la ecalera tal como se aprecia en la segunda foto.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Durante la liberación de encofrado, se debe hacer la liberación de aplome de los verticales de la escalera por mas pequeño que sea el tramo, dado que puede alterar los acabados finales. Además se debe considerar este aseguramiento adicional del [redacted]en adelante.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/07/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		

¿QUÉ PASÓ?

El evento no deseado que ocurrió en el mes de julio fue en el área de carpintería (Esguinse rodilla izquierda pateando en la base del puntal para ajustar el apuntalamiento del techo).

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

A raíz de este incidente, se coordinó con el área de producción, como control, realizar una capacitación con el personal de [redacted]situ a los carpinteros para evitar el desviamientoo en su proceso que podrían terminar en un posible accidente.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió que un correcto proceso de enseñanza, capacitación y aprendizaje puede evitar un accidente causado por los desviamientos de un determinado proceso de construcción.

FOTOS



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	JULIO
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Gestión Documentaria		

¿QUÉ PASÓ?

El contratista de Ascensores [redacted] entregó, para aprobación, unos planos de ascensores de las [redacted] con un diseño y características distintas a lo que siempre se solicita desde etapas anteriores.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se realizó una revisión de los planos para verificar los cambios ocurridos para alertar al proveedor que el diseño de los ascensores debe ser el mismo que la etapa anterior. Al final, el contratista corrigió sus planos para poder ser validados.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió que siempre debe haber una previa verificación de los planos de equipamiento (ascensores) por más que las dimensiones y los requerimientos de las ascensores para Torre no hayan cambiado anteriormente. Esto se deba hacer siempre como una medida de precaución.

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/08/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		

¿QUÉ PASÓ?

El evento no deseado que ocurrio en el mes de Agosto fue en el area de taller de acero (Golpe en la boca con el martillo).

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

A raiz de este incidente se coordino con la contratista [redacted] area de produccion solicitar el (cambio de proceso en la habilitacion de acero), ya que para poner un tope se colocan clavos y esto fue lo que genero el accidente y la mala maniobra del trabajador (uso mal el martillo golpea de abajo hacia arriba) tambien se sugierio cambiar de tablon y contar con un accesorio graduable (prensa) prisionado al tablon y asi evitar que ocurra algun accidente de este tipo.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

El aprendizaje llevado en este proceso tiene como objetivo evitar un accidente causado por los desviamientos de sus actos (mal uso de la herramienta, utilizar tablones desgastado y no contar con un proceso mas seguro al momento del habilitado de acero.

FOTOS

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/08/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	BIENESTAR SOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	EJECUCIÓN		

¿QUÉ PASÓ?

Se ha percibido que en los últimos días que se ha realizado las campañas de vacunación, nuestros colaboradores se han ausentado al día siguiente de la vacuna aduciendo que tenían malestar corporal por lo que les complicaba presentarse a sus labores. Esta ocurrencia sucedía los días lunes dado que se vacunaban el fin de semana. Y esto se convertia en un problema dado que no presentaban justificación por su ausencia.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

En las charlas de las mañanas, se ha informado al trabajador que toda ausencia laboral tiene que ser justificada. Además, su vacunación debe ser en la fecha programada. Esto con el fin de evitar las ausencias los días de inicio de semana.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Que ante acontecimientos como estos, debemos pautar todos los inconvenientes que podría suscitarse e informar al trabajador cómo es el proceso y que cosas no debe realizarse.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/08/2021
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	PRODUCCIÓN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	N.A.		

¿QUÉ PASÓ?

Desalineamiento superiores en frisos de encuentro de sectores, ocasionando que el encofrado de losa no entre y este se levante , no respetando la altura libre y se este picando y llenando con mezcla

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

SE procedio a revisar todo el alineamiento por la parte superior y entregarlo con un ancho de 14.7cm , ya que con el empuje y fuerza de concreto llegaria a 15cm según los planos solicitados

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Que se puede evitar un reproceso en la rectificación de medidas , dejado metido el encofrado 3mm , el cual nos peude asegurar que no patee mas de la medida y no gastar HH en picas y resanar.



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	AGOSTO
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ENCOFRADO / REVISIÓN CONJUNTA PRODUCCIÓN - CALIDAD DE POST VACIADO Y ENCOFRADO		

¿QUÉ PASÓ?

Debido a las constantes observaciones de desalineamiento, desplome y discontinuidades en la revisión de concreto post vaciado por falta de comunicación sobre reporte de observaciones entre áreas.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se optó por hacer la revisión de encofrado y concreto post vaciado de forma conjunta Producción-Calidad luego del desencofrado del sector para que ellos evidencien cuales son los errores repetitivos y que medidas se pueden tomar para controlar estas observaciones . Se planteo hacer la revisión de a las 10 am para poder mostrar las observaciones a los encofradores y que ellos sean participes de estas revisiones.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Implementar revisiones conjuntamente con el área de producción en partidas criticas como estructura, encofrado y concreto post vaciado para tener un mejor control de observaciones.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	AGOSTO
ELABORADO POR:	[redacted]	**ÁREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?

No se tenían detalles de los ganchos de izaje así como el sobrerecorrido del ascensor puesto que [redacted] pide que se debe firmar el contrato para poder brindar los planos de fabricación. Sin embargo, según los alcances de la entrega, el ascensor se colocará aún en la [redacted]

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se programó una reunión con [redacted] para que se brinden soluciones y alcances técnicos básicos para poder finalizar el diseño del sobrerecorrido del ascensor sin necesidad de tener que firmar el contrato para la fabricación e instalación del ascensor.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió que, en la etapa de diseño, se debe pedir a los proyectistas que los diseños de las cabinas de ascensores deben realizarse en coordinación con el fabricante para evitar problemas posteriores en construcción.

No aplica

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	1 septiembre 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	ADMIN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Administracion		

¿QUÉ PASÓ?

Que se encontro los materiales sin señalización y en desorden y a la vez obstruyendo los accesos hacia el Almacen.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se coordino con el personal de Subcontrata que debe tener mas ordenado y limpio el material que maneja.
Señalizar y cercar el area de acopio

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Que debemos tener nuestros accesos libres y señalizados para cualquier situacion que se presenta.

Y supervisar constantemente que las subcontratas cumplan con el orden y la limpieza de sus areas de acopio de materiales.


[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	2 septiembre 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ACABADOS		

¿QUÉ PASÓ?

Durante la revision previa de UI, se noto una gran cantidad de protuberancias bajo el papel mural, conllevando a un retraso significativo durante el levantamiento de observaciones de UI, retrasando la liberacion de dicha actividad.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

La revision previa del trabajo finalizado en papel mural, mucho antes de la revision oficial de UI, redujo de manera significativa el tiempo de espera en lo referente al levantamiento de observaciones (asi como los posibles daños originados por el levantamiento de los mismos)

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendio que la posible instauracion de un nuevo protocolo de papel mural ayudaria a disminuir la cantidad de observaciones registradas durante la revision de UI, asi como reducir el daño colateral ocasionado al levantar las mismas

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	3 octubre 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	ADMIN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Administración		

¿QUÉ PASÓ?


Personal que tenia descanso medico se apersono a obra para trabajar.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se le retiro al personal de obra para que pueda cumplir con su descanso indicado por el medico tratante.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Que se debe cumplir con lo indicado respecto a la atencion medica y monitorear al personal para una recuperacion satisfactoria



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	8 agosto 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	PROCESO		

¿QUÉ PASÓ?

Se identifico que durante el vaciado el ultimo ambiente en el sector a vaciar, no fraguaba lo que ocaciono que retrase el tiempo de desencofrado y el resto del tren de trabajo.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se requirio tener comunicación diaria hacia planta para que se ajuste el diseño de acuerdo al tiempo de fragua que se detecto en obra y de ser necesario ajustar solo las ultimas unidades de concreto premezclado.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Durante el inicio de torre, donde inicia la curva de aprendizaje, mantener informado a planta de concreto con los slump requeridos y los reportes visuales de concreto postvaciado previo al desencofrado para poder tomar las acciones correctivas en el diseño de mezcla





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	16 diciembre 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?

Se había identificado que el personal de carpintería realizaba trabajos sin usar correctamente u omitir el uso de algunos implementos de seguridad (barbiquejo, lentes de seguridad, linea de anclaje, etc)

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se sensibilizó al personal de carpintería sobre la importancia del uso correcto de EPPS como parte del cuidado de la integridad durante la ejecución de la obra.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Ningún peligro puede ser subestimado porque cuando el trabajador interacciona con estos, queda expuesto pudiendo resultar afectado.





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		FECHA:	
ELABORADO POR:		AREA:	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?

Exístian demoras en las coordinaciones entre la C (proyectista de IIEE) para la aprobación de la solicitud de los medidores para la lo cual originaba demoras en el cronograma de OE.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Si bien estas coordinaciones estaban fuera del alcance del área de Operaciones, para poder agilizar los tiempos se elaboraron los planos de los medidores con las medidas convencionales de los nichos para poder detectar las incompatibilidades y requerimientos de material a tiempo.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Que LDS tiene unas medidas estandarizadas de nichos de medidores, y éstas pueden considerarse dentro del diseño previamente antes de la ejecución en obra. Con esto se puede trabajar con antelación.

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	FECHA:	31 enero 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	AREA:	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?

Bolsas de cemento estaban en contacto directo con el terreno natural y podría verse afectado en caso de algún suceso.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se reportó la observación y se colocaron parihuelas como base para mantener el material en un nivel más elevado.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Las bolsas de concreto debe de colocarse sobre una plataforma para evitar que tenga contacto con el agua.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	FECHA:	1 enero 2022
ELABORADO POR:		AREA:	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?

Se identifico en los muros de contencion de los Estacionamientos en [redacted] en el momento de colocar el recubrimiento previo al cierre de el encofrado, se colocaron dados de concreto de 4 cm, lo cual hacia que se caigan en el proceso de encofrado dejando sin recubrimiento a la estructura.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se coordino con produccion para retirar todos los tacos de 4cm y reemplazarlos por rondanas que son las asignadas para muros, evitan que con el encofrado no se caigan y tampoco al momento del vaciado

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se debe colocar rondanas en donde se vaya a encofrar de forma vertical y los tacos solo para usos donde el encofrado sea horizontal.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	FECHA:	1 enero 2022
ELABORADO POR:		AREA:	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?

Se reportaban observaciones repetitivas en mismos ambientes y del mismo tipo en la revisión de Concreto Post-Vaciado.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se hace un registro en planos A3 sobre las observaciones encontradas en post-vaciado por pisos, los cuales se les entrega a los encofradores en charlas semanales para que puedan tener una visualización gráfica del reporte de observaciones por ambientes.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

En partidas de alto impacto en observaciones se debe generar una retroalimentación de las observaciones mas relevantes y repetitivas por medio de capacitaciones o charlas al personal involucrado. Esto nos permitirá tener propuestas de mejoras con el mismo personal de campo para el control de estas observaciones.





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	FECHA:	1 febrero 2022
ELABORADO POR:		AREA:	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?

Se convocó al proveedor de encofrado para debatir sobre las observaciones presentadas en las torres (esquineros revirados), donde ellos propusieron usar alineadores de escuadra para controlar el revirado de esquineros en el vaciado.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se evidenció desalineamientos en esquineros en la partida de acabados por falta de alineamiento de esquinas en post vaciado

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Hacer llegar las observaciones reincidentes al proveedor para que se generen las alternativas de soluciones a estas observaciones, sea por procedimiento, accesorios,etc.

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	FECHA:	1 febrero 2022
ELABORADO POR:		AREA:	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?

Se coordino con produccion para retirar los tramos de tuberia que no cumplan con el recubrimiento requerido y pasar la tuberia por donde corresponde, es decir entre la primera y la segunda malla de la losa.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se identifico en la losa de los Estacionamientos del sotano 02 que la instalacion electrica para tomacorrientes iba por encima de la segunda malla en una losa de h=0.20 m lo cual le dejaba de recubrimiento a la estructura 5 mm.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se debe respetar el recubrimiento de una estructura armada, en este caso una losa debido a que la malla superior trabaja como refuerzo por temperatura, donde la capa superficial de no contar con el debido recubrimiento tiende a fisurarse.

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	FECHA:	28 febrero 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	AREA:	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?


Se observo al personal de encofrado de la empresa [redacted] que estaban desviandose del proceso de armado de andamios colocandole plataformas del encofrado, tambien se observo que estaban utilizando elementos del andamio para encofrar, se observo la mala practica del armado de plataforma del ducto del pit del ascensor.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se tuvo que retomar acciones para el control del armado de encofrado [redacted] y evitar algun evento no deseado (accidentes de trabajo): Capacitacion en la obra con todo el personal de [redacted] por parte de la empresa [redacted] del sistema de verticales de encofrado.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

El aprendizaje llevado en este proceso tiene como objetivo evitar accidentes por parte de los trabajdores en el mal uso del encofrado.

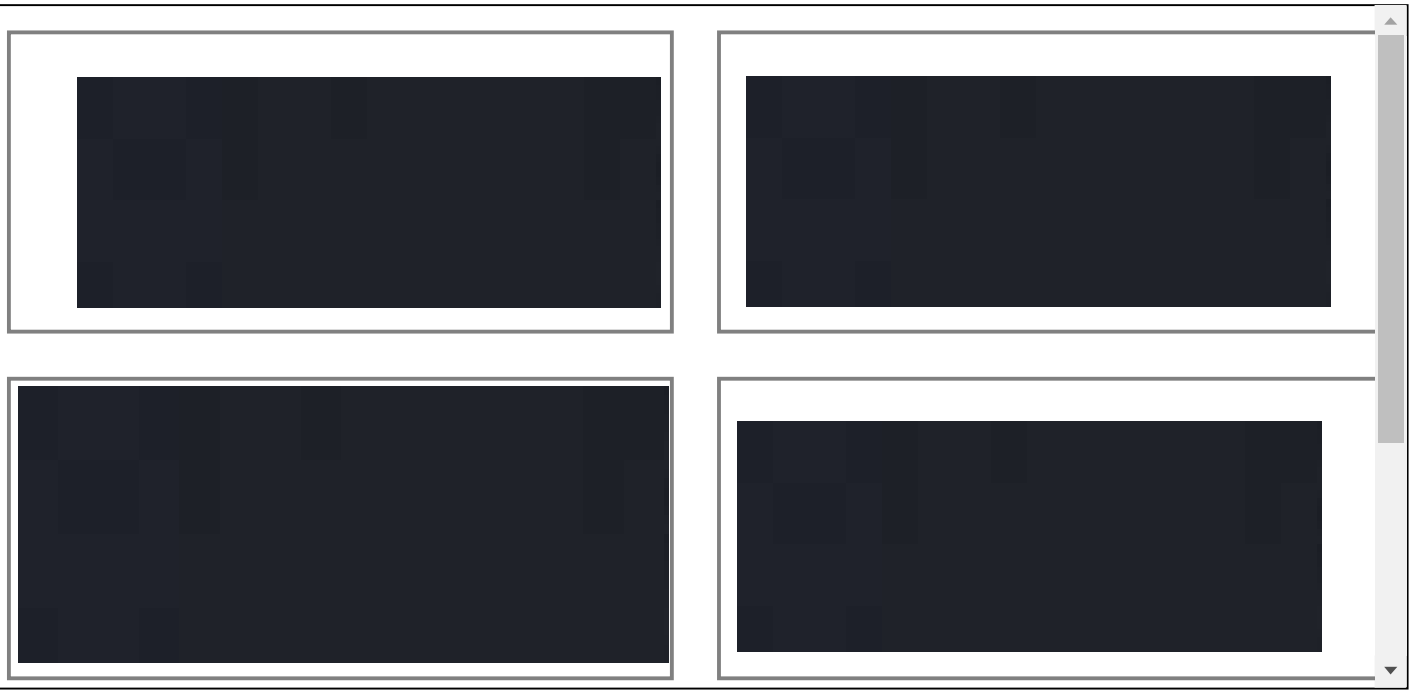

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	FECHA:	28 febrero 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	AREA:	BSOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Bienestar Social		

¿QUÉ PASÓ?

Se observaba falta de limpieza en mesas y pisos en comedores, las concesionarias no llegaban a cumplir.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se realizo una Programación de limpieza en comedor para que cumplas las conccesionarias y evitgar problemas a futuro.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

A mejorar la supervición de la limpieza de comedores con las concesionarias.





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		FECHA:	28/02/2022
ELABORADO POR:		AREA:	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Redes Exteriores		

¿QUÉ PASÓ?

Se detecto la incompatibilidad del pozo a tierra con la red de alimentación de Ocasionando primero; que se tenga que reubicar la posición del pozo a tierra a 1.5metros por el requerimiento y segundo el sobrecosto con el Sc para la ejecución de este adicional. Ocasionando el impacto de plazo y costo .

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se replanteo la ubicación de 01 pozo a tierra, generando una nueva reprogramación y adicional para que no tengas estas interferencias.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

La compatibilizacion con el proveedores finales gestionados por inmobiliaria con el fin de evitar y minimizar las incompatibilidades y restricciones para la habilitación de los servicios definitivos . Así evitar atrasos, impactos de plazo y sobrecostos.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	28/02/2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	[redacted]		

¿QUÉ PASÓ?

El proyectista de Estructuras, [redacted] posterior a la culminación de la GI, informa que hay muros de sótanos que se deben reforzar debido a la colocación de la Torre Grúa y la posterior construcción de losas al finalizar el desmontaje de la T.G.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se coordinó con [redacted] una solución para reforzar estos muros de sótano y se entregó la solución a [redacted] para su validación.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió que se debe compartir e informar al proyectista de Estructuras acerca del layout de obra y las etapas de construcción para que puedan diseñar sus estructuras acorde a las necesidades del proceso de construcción, aparte del diseño final.

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	28/02/2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Acabados exteriores		

¿QUÉ PASÓ?

En etapas anteriores, se dejaba empotrado el intercomunicador en el tótem de ingreso . Ocasionando que se tenga reclamos porque se escucha demasiado eco en las llamadas hacia los dptos. Generando inconvenientes y demasiadas solicitudes de atención.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Para el tótem de la y en consulta con el especialista , para evitar el eco solo se dejo una caja rectangular empotrada en el tótem para el cableado y el intercomunicador quedara adosado encima del terrazo, siendo adicionado este equipo con su protector de lluvia para evitar problemas de humedad .

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Realizar las consultas al especialista , con la finalidad de evitar posibles reclamos a futuro y darles las mejores soluciones dentro de obra.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	28 febrero 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	HABILITADO DE ACERO		

¿QUÉ PASÓ?

No se protegió el acero.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se reportó la observación y se procedió a proteger el material (acero).

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se debería proteger el material (acero) para evitar que tenga contacto con el agua o se contamine.

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31/03/2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	EQUIPAMIENTO		

¿QUÉ PASÓ?

Si bien aún no se cierra el contrato para los ascensores de los sótanos de [redacted] debido a las etapas constructivas, se está construyendo solo el casco y vaciando los muros del ascensor. Generalmente, el equipador de ascensor no brinda su plano de detalle antes de la firma del contrato. Y como no se cuenta con los planos de detalle del sobrerecorrido del ascensor, aún no se puede terminar de vaciar la última parte.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se conversó con [redacted] para que nos puedan brindar los planos de detalles de ascensor antes que se pueda firmar el contrato para la adquisición e instalación del ascensor.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió que se debe conversar con el proveedor para la adquisición de los planos del ascensor antes de la firma del contrato y así evitar inconvenientes.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	31/03/2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Pintura de acabados		

¿QUÉ PASÓ?

Se observaron que los tubos de las duchas se encontraron rayados después del proceso de acabado de pintura en los baños aún cuando se protegen de la pintura y manchas. Si bien no altera la funcionalidad del aparato, el acabado de este se ve afectado.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se acordó con la subcontrata de instalación de aparatos que las duchas son colocadas una vez se haya finalizado con el acabado de pintura de los baños.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Los aparatos están expuestos a daños por lo que se deben de colocar después de todas las actividades que puedan afectarlos directamente.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	FECHA:	6 abril 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	AREA:	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	PLATEA DE CIMENTACIÓN		

¿QUÉ PASÓ?

Cable eléctrico expuesto

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se enterró el cble eléctrico

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se debe proteger los cables eléctricos para evitar futuros accidentes.





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		FECHA:	7 abril 2022
ELABORADO POR:		AREA:	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	INSTALACIONES		

¿QUÉ PASÓ?

Se solicitó un inspección de emergencia al proveedor, para hacer la revisión de los vastagos instalados. En la reunión se identificó que se tuvo una error en la isntalación de estos vastagos, dado que no se ajustaban previo a la instalación.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Filtración en vastago de llaves de paso en cocinas y baños, durante pruebas finales de agua.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Cuando se tiene un cambio de material en obra, se debe solicitar oportunamente capacitacion por parte del proveedor a la cuadrilla encargada de la instalación; con el fin de explicar los procesos y recomendaciones para la instalación del nuevo material.





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	22/04/2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Enchape / Acabados		

¿QUÉ PASÓ?

Se ejecutó la garantia de instalación, dado que se llegó a la conclusion de que era un error en procedimiento. La contrata hizo los cambios de piezas correspondientes

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?


Cajoneo y desprendimiento de ceramico previo a la entrega de departamentos.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Solicitar capacitaciones sobre procedimientos de instalación de materiales previo al inicio de actividades; además se debe solicitar al contratista los certificados de capacitación de los operarios que ingresen a obra.







LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	25/04/2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ENCOFRADO / ESTRUCTURA		

¿QUÉ PASÓ?

Se mapean las observaciones de post vaciado en planos, donde se identifican las fallas por ambientes, con el fin de presentar estos planos a los encofrados para analizar las causas y buscar soluciones para contribuir con su curva de aprendizaje y puedan ir corigiendo su trabajo.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se suelen presentar mayor numero de observaciones en los primeros pisos del casco debido a la mano de obra.Esto se debe a que durante el arranque de un frente puede haber personal nuevo y adaptacion del personal al trabajo. Por ello es que se tienen mayor numero de observaciones por falla en mano de obra.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

En partidas de alto impacto en observaciones se debe generar una retroalimentación de las observaciones más relevantes y repetitivas por medio de capacitaciones o charlas al personal involucrado. Esto nos permitirá tener propuestas de mejoras con el mismo personal de campo para el control de estas observaciones.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	29/04/2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	BSOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	[redacted]		

¿QUÉ PASÓ?


EN EL COMEDOR AL MOMENTO DE DEJAR LAS BANDEJAS CON SERVICIOS SUCIOS , SE OBSERVABA EL DESORDEN EEN EL SEPARADOR LA CUAL COLOCABAN ENCIMA DE UNO.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

SE DIVIDIO LOS ESPACIOS, PARA QUE EL PERSONAL COLOQUE SUS SERVICIOS SUCIOS.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

CONCIENTIZAR AL PERSONAL SOBRE EL ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEL COMEDOR



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30/04/2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	GESTION DOCUMENTARIA		

¿QUÉ PASÓ?

Las demoras en la Instalación del suministro de C[redacted] para la entrega de las torres provocó la demora en la entrega de partidas de veredas e instalación de grass.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se realizó gestiones para que [redacted] haga su ingreso a tiempo antes que esto pueda comprometer la fecha de entrega.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se debe coordinar con la Gerencia de Proyecto que el ingreso de [redacted] se dé con semanas de anticipación para no tener problemas con los cronogramas y las partidas.

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	30/04/2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	OBRAS EXTERIORES		

¿QUÉ PASÓ?


Se evidencio que estuvo cayendo particulas de cemento a los autos de los vecinos por el lado del lobby 01 que generaban los trabajos de vaciado, albañileria y pintado de muro en el exterior.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se coordino con el Gerente de obra y las areas de produccion y ssoma para instalar una proteccion (malla rashell) que proteja toda la torre del sector del muro ciego y asi evitar que caiga particulas de las actividades que generen estos riesgos de proyeciones.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Prevenir los riesgos de particulas que generan las actividades de fachada de la torre que pueden dañar a terceros.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		FECHA:	02/05/2022
ELABORADO POR:		AREA:	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?

Exhudación de concreto en el vaciado.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se reportó a en el momento de la exhudación e hizo una visita, el cual verificaron y nos comentaron que ajustarán el diseño para que no vuelva a ocurrir.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

El concreto con alto contenido en cemento presenta una menor exudación que otros que tengan escasez de él. Los aditivos aireantes disminuyen la exudación mediante la formación de pequeñas burbujas que actúan como finos.





[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	6 mayo 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ACERO / ESTRUCTURA		

¿QUÉ PASÓ?


Se debe colocar los alineadores para los aceros superiores por fuera del muro para que en esta se pueda colocar los tacos de 5 cm con el fin que este refuerzo pueda quedar a las 7.5-8 cm que requiere

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se esta usando tacos de 5 cm para dar el recubrimiendo al acero superior en losas; sin embargo el acero queda a una altura de 6 - 6.5 cm; cuando debe estar a una altura de 7.5-8 cm.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se debe controlar la altura de los refuerzos superiores para controlar las fisuras en post vaciado con el apoyo de los alineadores de acero y tacos de losa.

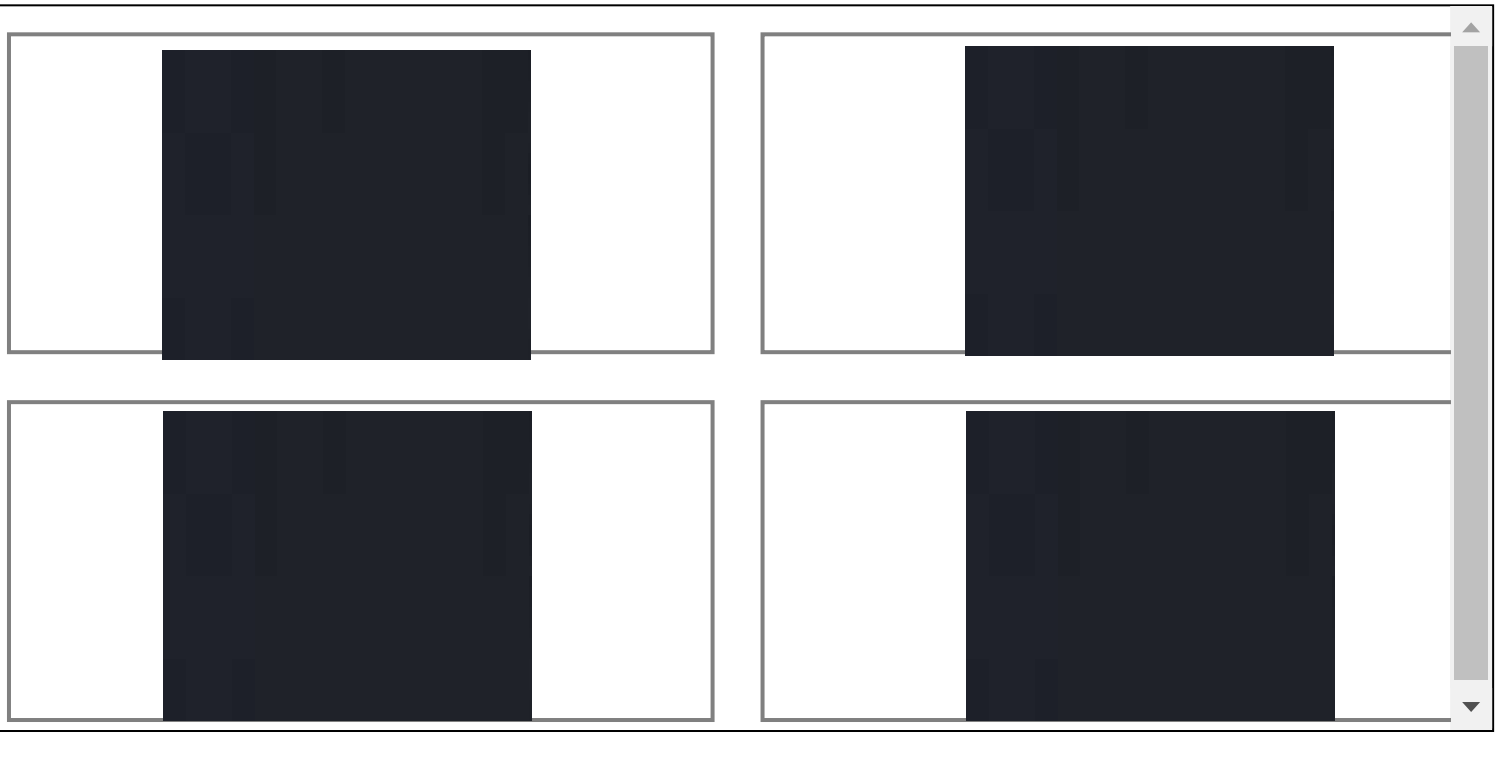
[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	06/05/2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	PINTURA / ACABADOS		

¿QUÉ PASÓ?

e presentó desprendimiento de printura de empaste en escaleras de emergencia por falla en la ejecución de procedimiento de la partida de pintura. Se llegó a detectar que un personal no capacitado (ayudante) fue asignado a realizar esta actividad donde usó yeso de cerámico en vez de usar yeso de construcción. Lo cual produjo este desprendimiento.


¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Esta observación se hizo llegar a la subcontrata para que tenga mayor control del personal que asigna a realizar las labores y darle los materiales correspondientes

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Tener un mejor control del personal subcontratista para que sea el adecuado a las actividades que se les asignan


[redacted]


[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		FECHA:	11 mayo 2022
ELABORADO POR:		AREA:	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?


Debido a una observación que se tenía sobre la separación del tanque del nuevo Compact 2.0 al muro (2 cm) se tuvo que buscar una propuesta de mejora para poder corregir esa observación durante el procedo de ejecución del casco; dado a que ya se iba a iniciar con la instalación de las baterías y montantes de desagüe. Lo cual conllevó a aplazar el inicio de esa partida unos días hasta tener las validaciones correspondientes.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se tuvo que generar una propuesta para poder encajar la bateria de desague de tal forma que el tanque del inodoro quede pegado a la placa durant la ejecucion del proyecto. Esto generó algunos dias de retraso para el inicio de la colocacion de baterias de desague en baños y cocinas.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Previo a la estandarización de algún material nuevo o cambio, se deben probar en campo para no generar impactos en las obras cuando ya están estandarizados. Además estas muestras ayudarían a evidenciar si habrían modificaciones en el procedimiento constructivo o no.

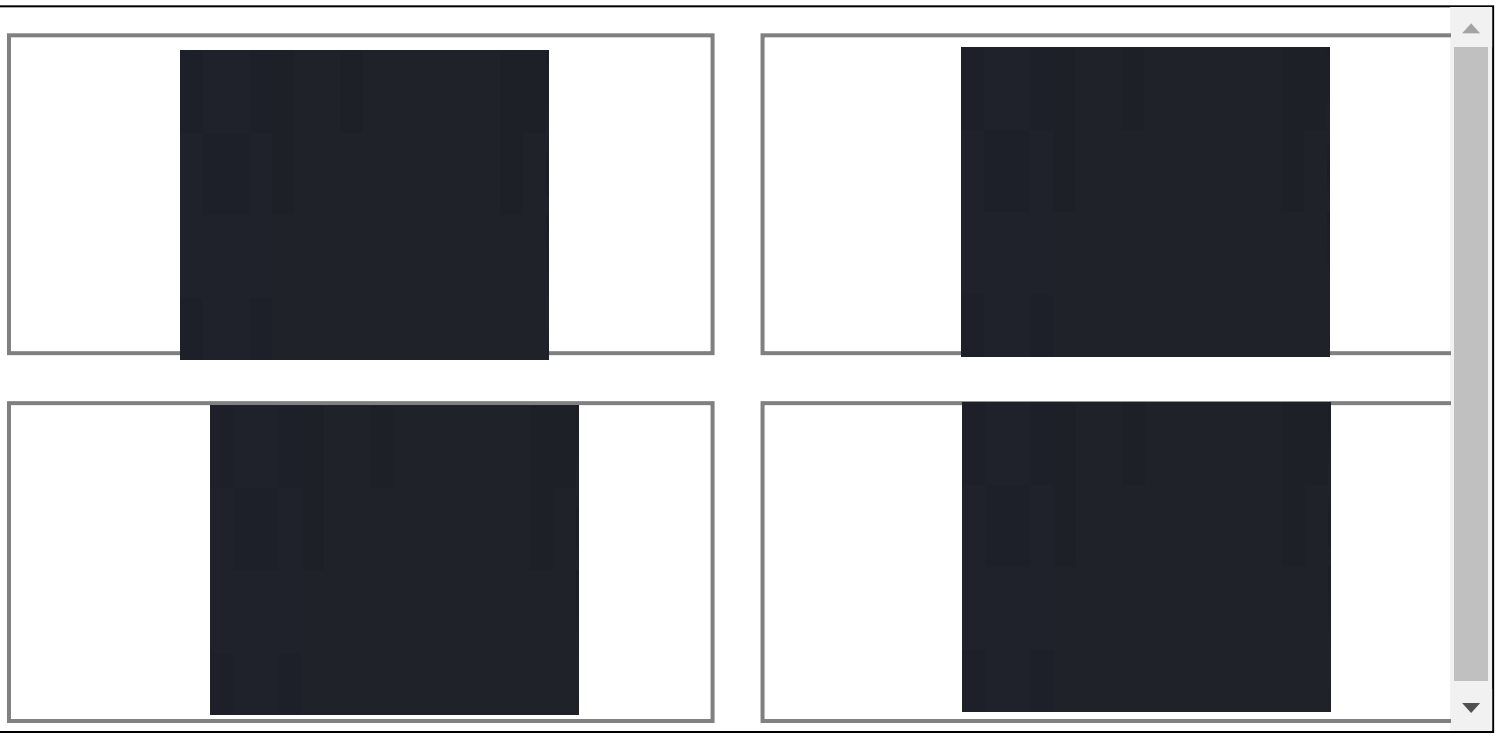

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31 mayo 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	GESTION DOCUMENTARIA		

¿QUÉ PASÓ?

Se le ha dado los planos de [redacted]a para la elaboración del contrato de servidumbre. Sin embargo no se detectaba interferencias con sótanos y edificios.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Con la gerencia de proyectos se está cerrando el contrato de [redacted] mediante modelos en [redacted] donde se puede observar las interferencias a ser mostradas al equipo de [redacted]

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se debe otorgar toda la información necesaria a los EPS para evitar contratiempos e incertidumbre en el cierre de los contratos.

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	31 mayo 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	BSOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?


Falta de mesas en el comedor de la

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se armo mesas y sillas con parihuelas de madera que no utilizaba producción.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Reutilizar material que se tiene en obra con el favor de cuidar el medio ambiente.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	31 mayo 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	FACHADA BALCONES		

¿QUÉ PASÓ?

Al realizar el acabado de pintura de fachada, se observa que hay rebabas de pegamento en los bordes de los balcones. Esto por una mala limpieza del pegamento al momento de hacer el enchapado de los balcones.


¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?


Se hizo la limpieza con el personal de fachada a esta zona de trabajo. Se volvió a capacitar al personal de enchape para recordar que la limpieza está dentro del procedimiento de esta actividad.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

En la revisión de estos trabajos, se debe de revisar que se cumpla con la limpieza dado que al momento de limpiar estas rebabas se pueden malograr las barandas y el mismo enchape.







LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	31 mayo 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Obras Exteriores		

¿QUÉ PASÓ?


Por los constantes desviamientos sobre el uso de herramientas de poder en varias actividades con los trabajadores.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se programo con el area de produccion y equipos la retroalimentacion sobre el uso correcto de herramientas de poder con la empresa [redacted] todo los trabajadores que utilizan el equipo

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Prevenir los riesgos de particulas, riesgo electrico y cortes que generan las actividades de uso de herramientas de poder que pueden dañar a los trabajadores.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		FECHA:	3 junio 2022
ELABORADO POR:		AREA:	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?


Se detecto que el afirmado que seria utilizado de relleno en la platea de l presentaba demasiadas piedras, conllevando a que cuando se realice la prueba de compactación se tengas observaciones en la prueba de densidad.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se propuso la aplicación la segregación del afirmado o decantación de forma cónica , generando que todo el material grueso por la gravedad y peso sea separado a los extremos y estos sean retirados por el personal de movimiento de tierra. Así se tendría un mejor material para el relleno de la platea y evitar así deficiencias en las pruebas de densidad.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Solicitar una curva granulométrica del material que será utilizado en el relleno, y en si se presentara el caso de que el afirmado presente demasiadas piedras aplicar el método de la segregación cónica para mejorar el material.

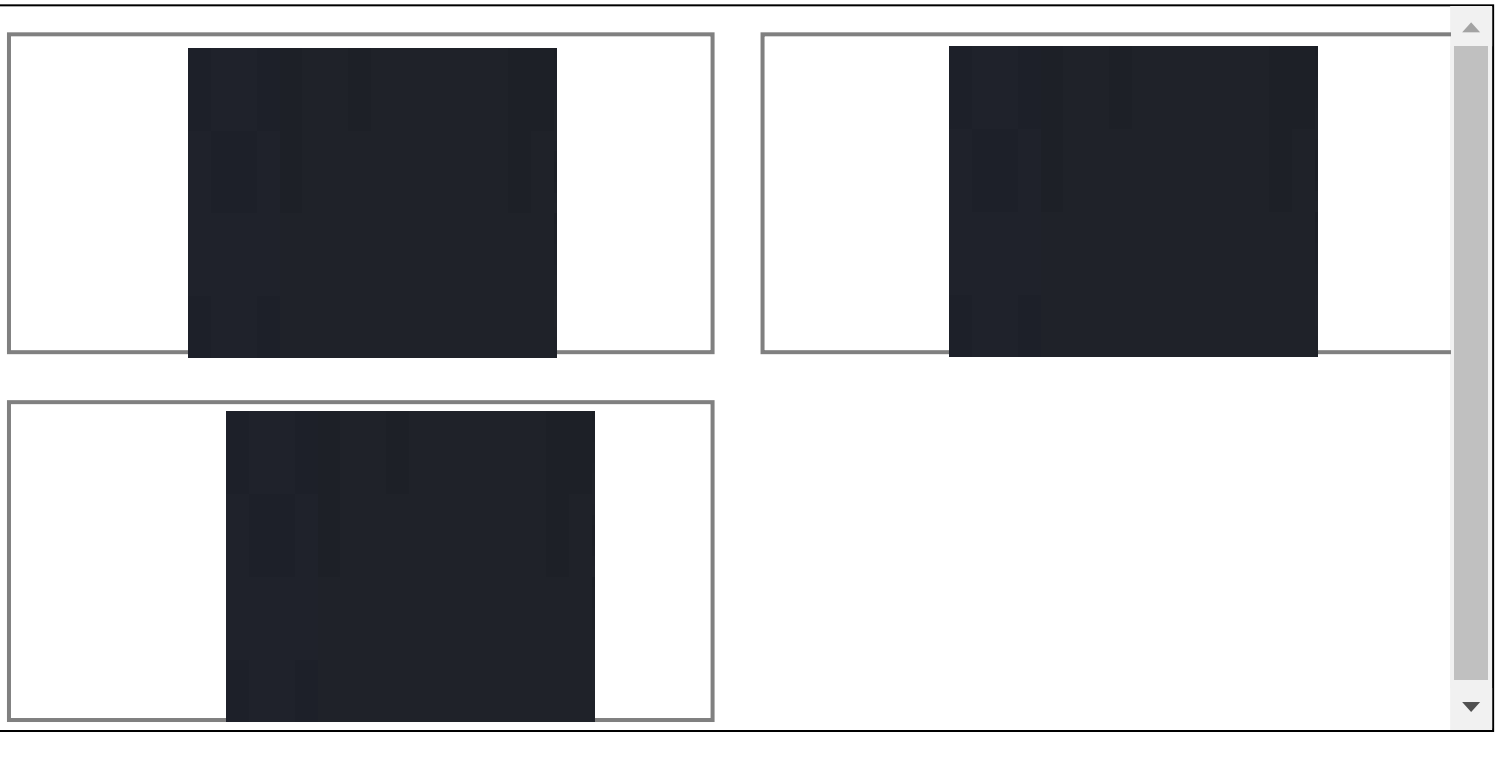

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	14 junio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	ADMIN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?


SE COORDINO CON EL PERSONAL PARA QUE REALICEN SU INGRESO Y DE INGRESO RECIBAN SU CHARLA, PERO UNA DESCORDINACION DE PRODUCCION Y SEGURIDAD NO PERMITIO PODER BRINDARLE LA CHARLA DE PERSONAL NUEVO A LA HORA ASIGNADA. YA QUE POR ESCACES DE PERSONAL DE LA PARTE DE SEGURIDAD SSOMA NO SE DABAN A BASTO.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

SE ACORDO REALIZAR CHARLAS ARA NUEVOS INGRESO (INDUCCION) LOS DIAS LUNES - MIERCOLES - VIERNES
DE ESTA MANERA PODER UNIFORMISAR AL PERSONAL.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

EL REORDENAMIENTO DE LOS DIAS DE RECEPCION DE CHARLA Y DE GESTION DE INGRESOS PARA MANTENER TODO EN CONTROL EN OBRA.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	14 junio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	INSTALACIONES		

¿QUÉ PASÓ?

Se esta dejando abierto los buzones sin realizar el vaciado de las tapas y se deja pendiente el acabado de enchape en esa zona, con el fin de poder tener un mejor inspección de la limpieza de los buzones al culminar las pruebas de agua. Culminada las pruebas de agua y limpeza en buzones se procederá con el vaciado de las tapas y acabado de enchape.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?


Se modificó el acabado de los buzones de desagüe del 1er piso en áreas comunes, ahora se colocan registros de 6". Por ello, se tenia menor visibilidad para hacer el registro o inspección de limpieza en los buzones, lo cual podría generar que se queden particulas o residuos de obra debido a la poca visibilidad que se puede tener desde el registro.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Para la verificación de limpieza en buzones se debe tener ventanas amplias para poder hacer las inspecciones y retiro de residuos de obra.







LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	22 junio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	ADMIN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ADMINISTRACION - RRHH		

¿QUÉ PASÓ?


LA ENTREGA DOCUMENTARIA DEL PERSONAL OBRERO SE SUELE RECIBIR EN PUERTA PORQUE AL INGRESAR A OBRA ESTARIA EN UN PELIGRO POR ELLO SE RECIBE UNICAMENTE EN PUERTA. Y E PERSONAL DEMORA EN ENTREGAR LA DOC. YA QUE EN MUCHOS DE LOS CASO NO REALIZAN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS YA QUE NO SABEN COMO Y YA QUE LOS DOC. NO PUEDEN TENER ENMENDADURAS DEBEN TRAER OTRAS HOJAS NUEVAMENTE.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

SE COORDINO REALIZAR UN PEQUEÑO ESPACIO AL INGRESO QUE LE PERMITA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SIN INCONVENIENTES REVISANDO UN POSIBLE EJEMPLAR EN IMAGENER QUE COMO ADMINISTRACION PODEMOS COLOCAR TIPO PANEL

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

VER LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS DEL PERSONAL PARA QUE SE AGILICE EL CUELLA DE BOTELLA EXISTENTE.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	30 junio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Enchape		

¿QUÉ PASÓ?

Al realizar la revisión de los departamentos, se encontraron varios cerámicos cajoneados en las partes cercanas a las montantes de drywall de la cocina y lavandería.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se procedió a retirar las piezas observadas, limpiar la zona descubierta para el retiro de los excedentes de pegamento, masilla y empaste encontrado.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Antes de que ingrese el enchape, se debe de realizar asegurar que los muros deben de estar libres de masilla y empaste pues muro y el empaste pues esto impide la adherencia del pegamento con la superficie del muro y el cerámico, produciendo cajoneo.







LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	30 junio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:			

¿QUÉ PASÓ?

Este mes hubo una diferencia en el margen estimado al termino de EQUIPOS debido a que no se habia considrado que el área de equipos crea sus propios pedidos de materiales y los sacan de almacén.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se revisó a detalle todos los pedidos creados por el área de equipos y se hizo una lista de los que aun no han salido de almacén y que se usarán proximamente para un mayor control.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Desde ahora se va a prenguntar al area de EQUIPOS el stock de materiales que tienen en almacén previo a cierre de torre y previo a presupuesto de torre, además de aquellos repuestos y materiales que se deban considerar para compra.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	30 junio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Estructura		

¿QUÉ PASÓ?


Se detecto en la platea de la tubería de Gas y la tubería de IIEE no tenían ningún tipo de separación entre ellas, conllevando a que en un mantenimiento puedan afectar a ambas .


¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se propuso la separación de 1 a 2" entre ellas , para que exista la distancia prudente y se pueda dar algún mantenimiento mas adelante sin afectar a la tubería cercana

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió que al dejar la distancia entre las tuberías de gas y tubería de IIEE, se podría garantizar el espacio oportuno y prudente para un mantenimiento a futuro y evitar dejar inhabilitado alguna de ellas por la cercanía existente.





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	30 junio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	BSOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	BIENESTAR SOCIAL		

¿QUÉ PASÓ?

Se evidencio casilleros en mal estado, personal nuevo que ingresaba no tenian casilleros ya que los trabajadores antiguos utilizaban mas de dos casilleros la cual no se veia una equidad.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se compro casilleros e implemento la identificación con sus nombres y apellidos de cada trabajador dividiendolos por cuadrillas.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Mejorar el clima laboral, identificar sus pertenencias y el orden del vestuario.





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	30 junio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Acero en edificaciones		

¿QUÉ PASÓ?

A raiz de los trabajos repetitivos del personal de acero en colocar los sunchos y utilizar malas posturas, el trabajador sufrio una dorsalgia y lumbalgia.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se programo con el area de produccion una capacitacion con un especialista sobre temas ergonomicos, tambien pausas activas y para reforzar difusion de afiches ergonomicos para las buenas posturas al momento de trabajar.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Prevenir los riesgos ergonomicos que suele ocacionar al trabajador al momento de utilizar malas posturas y dañar su integridad.



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	4 julio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTION:	ALMACEN		

¿QUÉ PASÓ?

No existe un control del envio de certicados de los proveedores de materiales por parte de administracion - GTC.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se solicita de forma constante los certificados de materiales a administracion para ir recopilando dicha informacion el cual se archiva de forma digital.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Incluir en el proceso de facturacion un item que exija la entrega oportuna de certificados el cual va estar relacionado la factura y guia del material que debemos reportar.

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	23 julio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?


Un personal de s bajaba las esacaleras, sin ver sus pasos, porque tenía ambas manos y su vista en el celular. Lo que ocasionó que al dar un mal paso se doblara el tobillo izquierdo y deslizace varios peldaños

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se sensibilizó al personal, a raíz del último accidente, sobre la importancia de los tres puntos de apoyo en el uso de escaleras y prohibición del uso de teléfonos celulares Asimismo, se reforzó mediante la colocación de señalización

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

El uso de elementos celulares u otros dispositivos durante la realización de trabajos, de cualquier tipo, generan distracción, siendo un potencial causal de accidente.

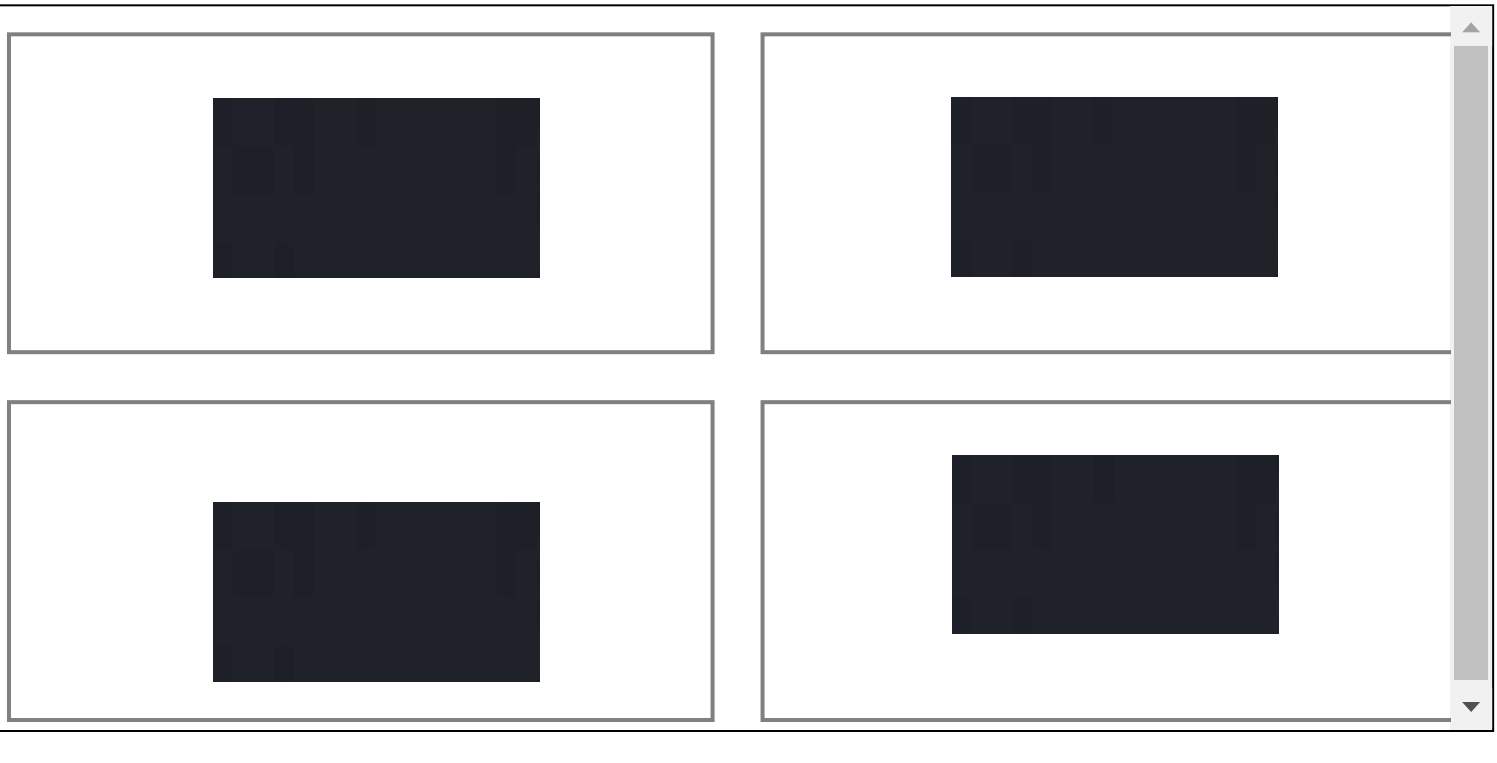

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	23 julio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?

Desde la segunda quincena de julio hasta el final del mes, se habían reportado hasta cinco casos positivos de covid, incluyendo personal de staff y obrero.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se realizan campañas de sensibilización frente al covid, reforzando las meoddas de seguridad y la importancia de contar, según grupo etareo, con la segunda dosis de refuerzo

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

No se pueden minimizar las medidas de bioseguriad.
Concientizar permanentemente mediante charlas, campañas y seguimiento, al personal





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	26 octubre 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?

Cables energizados cruzaban el camino. Había riesgo de posible electrocución

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se retiraron los cables en la zona de tránsito peatonal y se realizó un rastrillado

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Los cables deben ir enterrados o a una altura no menor de dos metros



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	27 julio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	BSOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	BIENESTAR SOCIAL		

¿QUÉ PASÓ?

Los SSHH y Vestuarios se hallaba sucio , con masarillas tiradas, residuos de basuras entre otros, que reflejaban actitudes negativos y desorden.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se realizo una Programación de, Limpieza en el cual cada sub contratista o cuadrilla esta encargado de ejecutarla.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendio a sensibilizar al personal y mejorar su educacion social.





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	27 diciembre 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?

Estando en la segunda semana del mes, se observa que algunas herramientas no cuentan con la inspección correspondiente.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se dinfundió en charlas de seguridad mayor participación por porte de los capataces hacia su personal en la inspección de herramientas manuuales y equipos de poder empleados en obra

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió que los capataces y/o lideres de grupo deben estar más involucrados en los procesos de inspección y sensibilización en temas de seguridad





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	28 julio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	INSTALACIONES		

¿QUÉ PASÓ?

Durante la realizacion de las pruebas finales de agua, se observo el problema que la capacidad de trabajo de las montantes no proporcionaban un caudal suficiente de agua, generando una falta de presion suficientes para la realizacion de las pruebas a realizar.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se coordino con el encargado de [redacted]i para su visita a obra con el fin de realizar la correspondiente inspeccion del tableros y su correcto funcionaiento.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Previos a las pruebas de presion , se debe verificar la capacidad operatiba para verificar una presion adecuada durante la realizacion de las pruebas realizadas.







[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	29 agosto 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	BSOCIAL
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	BIENESTAR SOCIAL		

¿QUÉ PASÓ?

Se encontraba el comedor sucio , mesas con polvo y residuos de basura.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se realizo una programacion de limpieza con cada concesionaria.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Mejorar en el saneamiento del comedor, involucrar mas al personal del comedor.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	FECHA:	30 julio 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	AREA:	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	drywall		

¿QUÉ PASÓ?

En cerramientos de drywall , [redacted] se hizo cortes cuadrados de 19 cm x 18 cm; sin embargo por el cambio de modelo de extractor no se tiene puntos de sujeción en las esquinas del drywall.


¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se hizo un emplantillado con las mismas medidas con la variación de no cortar 2 esquinas para dejar puntos de sujeción en el mismo drywall (ver imagen adjunta). Con esta modificación en el vano de extractor en drywall, se tiene puntos de anclaje para el equipo, sin la necesidad de agregar accesorios en el vano.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Modificar los cortes de vanos acorde a los nuevos modelos de equipos para acondicionar la estructura según lo requiera el equipo.







LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	30 julio 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Pintura de Area Comun		

¿QUÉ PASÓ?


En la partida de acabados finos en áreas comunes [redacted] se tuvo una falta de acabado de pintura en garganta de escalera por instalación de barandas.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se propuso dar acabado de empaste y primera mano de latex en las gargantas de escalera previo a la instalación de barandas en [redacted]

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Adelantar actividades que van a presentar interferencias en los acabados con el fin de asegurar el completo acabado en las estructuras. Como la colocación de empaste y pintura en las gargantas de escalera previo a la instalación de barandas.

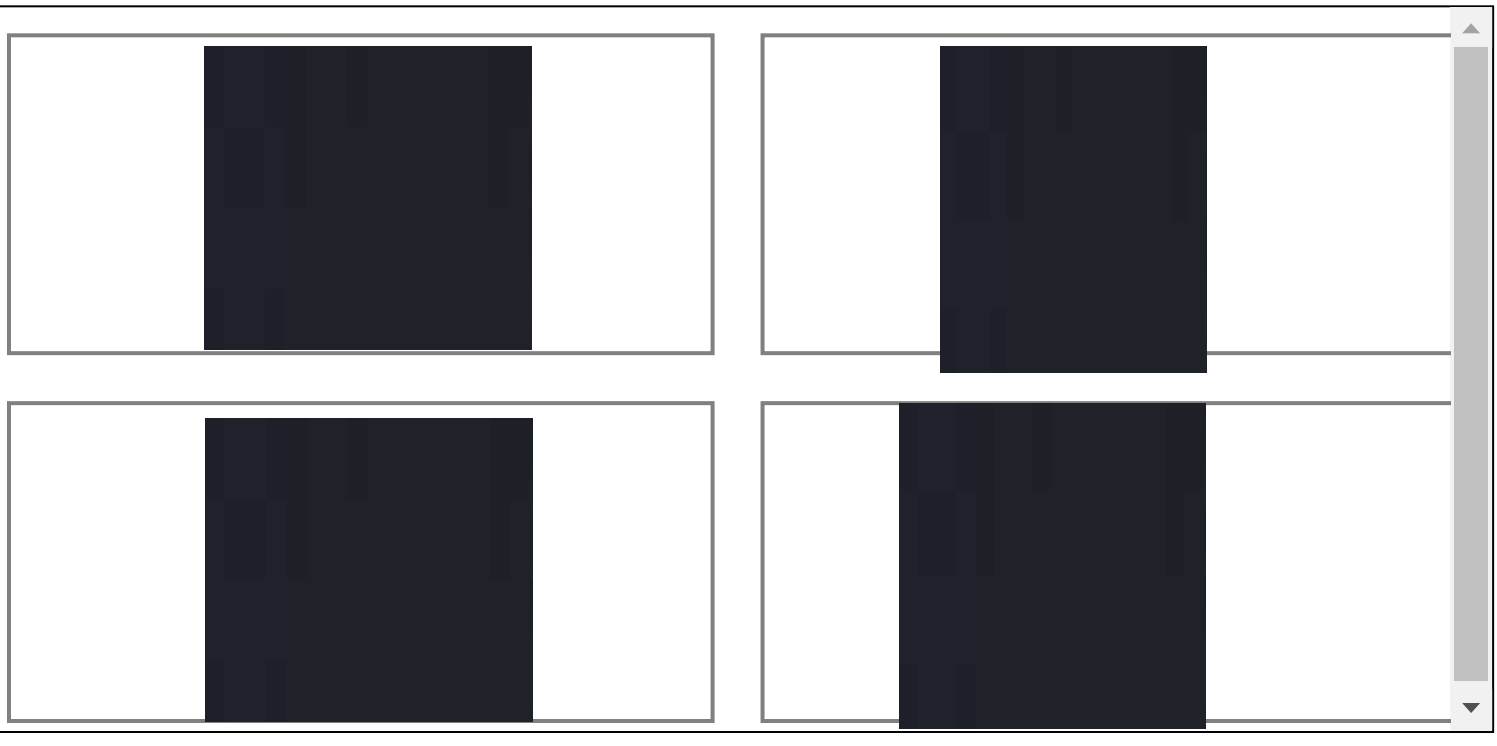

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		FECHA:	30 septiembre 2022
ELABORADO POR:		AREA:	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	EQUIPAMIENTO		

¿QUÉ PASÓ?

Se evidenció que el cable de la terma no llega al tomacorrientes más cercano destinado a su alimentación.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se propuso que el proveedor haga el cambio de cable respectivo para evitar perder la garantía del equipo.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Realizar la correcta compatibilizacion de planos con los equipos que se van a instalar para poder verificar su funcionalidad.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	30 septiembre 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?

Un carpintero que transitaba por la plataforma del andamio trepante, pisa el elemento estructural y se dobla el tobillo izquierdo, generándolse un esguince.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Los estrucutrales de los andamios trepantes se pintan de color naranaja para que estén refrenciados y puedan ser visalziados durante eñ tránsito a través de las mismas

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Los elementos estructurales, a pesar de formar parte del propio andamio colgante, es mejor que estén referenciados. Así se evitará que el trabajador pise y pueda sufrir alguna lesión





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30 septiembre 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	GTC
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	DISEÑO		

¿QUÉ PASÓ?

Se identifico que la longitud del cable de la terma era insuficiente para conectarse en el tomacorriente de lavanderia.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Sole propuso modificar la longitud del cable, sin perdida de garantia para que cumpla la funcion de conectar la terma al tomacorriente.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se debe realizar compatibilizacion del funcionamiento de equipos y aparatos, con el fin de evitar dichas fallas. Asi mismo, se debe incluir las normas y especificaciones de los proveedores en dichas compatibilizaciones. Se debe realizar la revision de UI incluyendo la revision del cable de terma.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		FECHA:	30 septiembre 2022
ELABORADO POR:		AREA:	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Acabados		

¿QUÉ PASÓ?


En entregas de departamentos se tiene constantemente observaciones sobre caracoles caidos o rotos.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se propuso adicionar una arandela en el perso que sujeta el gancho con la base del caracol con el fin de reforzar el agarre entre ambos accesorios para evitar que ambos se separen cuando se aseguren las ventanas. Se conversó con la contrata para validar la propuesta y asumiera el costo de esta arandela, a la cual se dio la conformidad por parte de AGV.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Ante constantes observaciones se deben hacer las consnultas corresondientes al proveedor involucrado, con el fin de buscar soluciones para mitigar estas observaciones de propetarios y reducir las cifras en entrega.

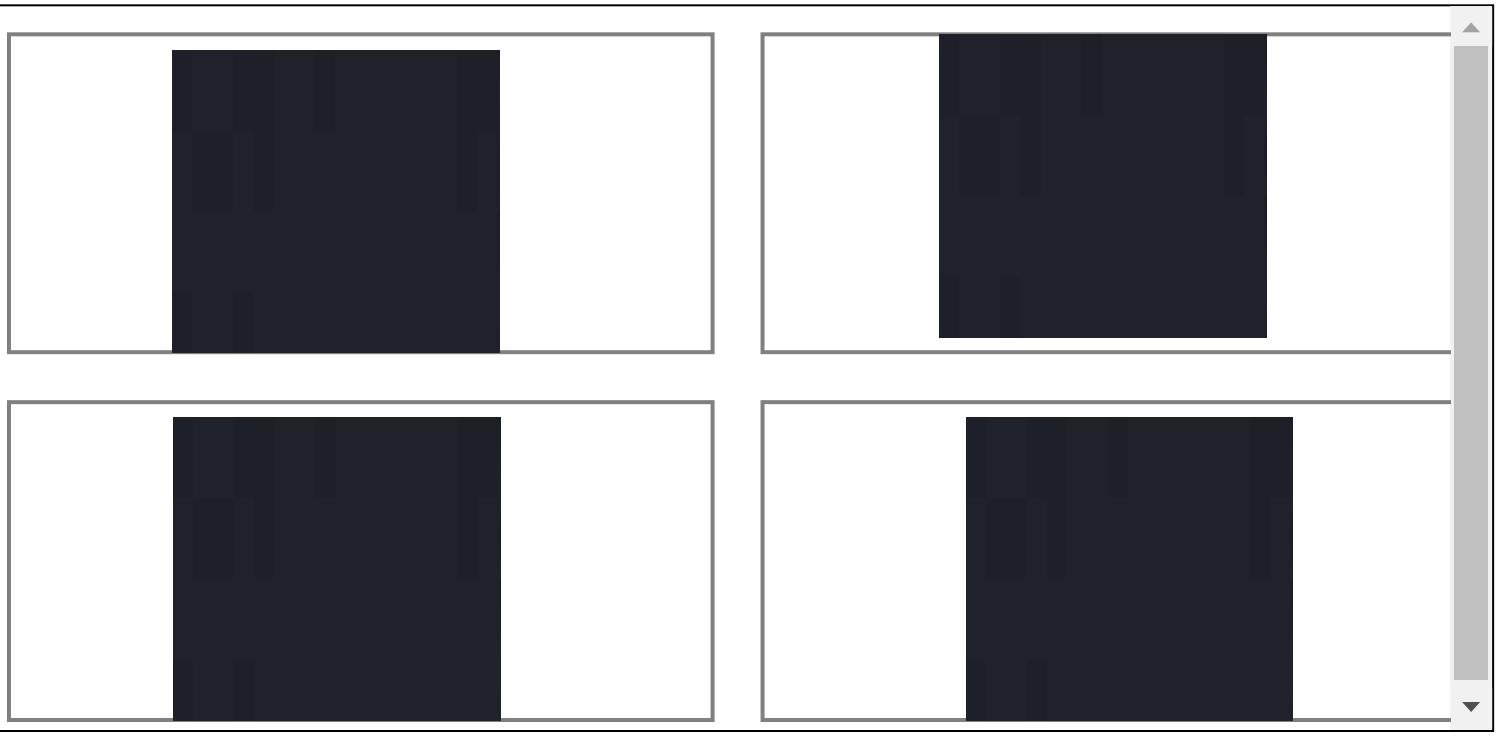

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	30 septiembre 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?

Los protectores auditivos tipo copa de la marca Steel Pro, no generam una buena protección: se salen de la base que los une al casco, no genera el hermetismo suficiente, se rompen con el tiempo

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se realizó prueba con nueva marca de protector audttivo al personal de carpintería y albañilería, obteniéndose respuesta favorable frente al riesgo generado por el ruido

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Evaluar continuamente el estado y la calidad de los equipos de protección personal a fin de asegurar la protección permanenente del trabajador.
Solicitar al proveedor capacitaciones sobre el correcto uso de los EPPS (cudidado, almacenamiento, uso)





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30 septiembre 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?

Se observa el uso inadecuado de los lentes de seguridad, colocándoselos por debajo de los ojos, exponiéndolos al contacto directo con el polvo, proyección de partículas o al contacto directo con los dedos.


¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se realizó la campaña sobre "Higiene visual", que consiste en concientizar al personal, a través de información gráfica y difusión de casos de accidentes reales a la vista, la importancia del cuidado de los ojos, desde el punto de vista higiénico y desde la realización de los trabajos profesionales

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

La difusión de inormación en higiene visual es importante para generar conciencia en el personal y promover el correcto uso de los lentes, caretas o sobre lentes, según sus necesidades.


[redacted]


[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	30 noviembre 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?


El personal de durante el proceso de soldadura eléctrica para la instalación de barandas, no retiro los cartones que las protegian, provocando el contacto de chispas con este material, lo que se convirtió en una amago de incendio.


¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se realizó un simulacro y entrenamiento de amago de incendio para que el personal se encuentre preparado para actuar ante este tipo de emergencias

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Todo material combustible o inflamable debe ser retirado del reciento cuando se realizan trabajos en caliente, por el riesgo de incendio o explosión.





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	31 agosto 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?


Más de la tercera parte de la cuadrilla de carpintería de es personal nuevo, incluyendo al capatáz. Además se detectó fallas en las perforaciones del sistema de encofrado (desde fábrica), lo que obligó a tener un oficial de carpintería de en el proceso de desencofrado, quedando expuesto al riesgo de la falta de experiencia del proceso de su contraparte de.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se difundió la causa raíz del evento y se sensiblizó al personal de obra sobre la importancia de la coordinación y planificación, previa al desarrollo del los trabajos

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

El personal ingresante de carpintería, al igual que su capataz, requieren capactiación y sensibilización constante, que les permitan adaparse oportuna y eficazmente, al proceso constructivo.

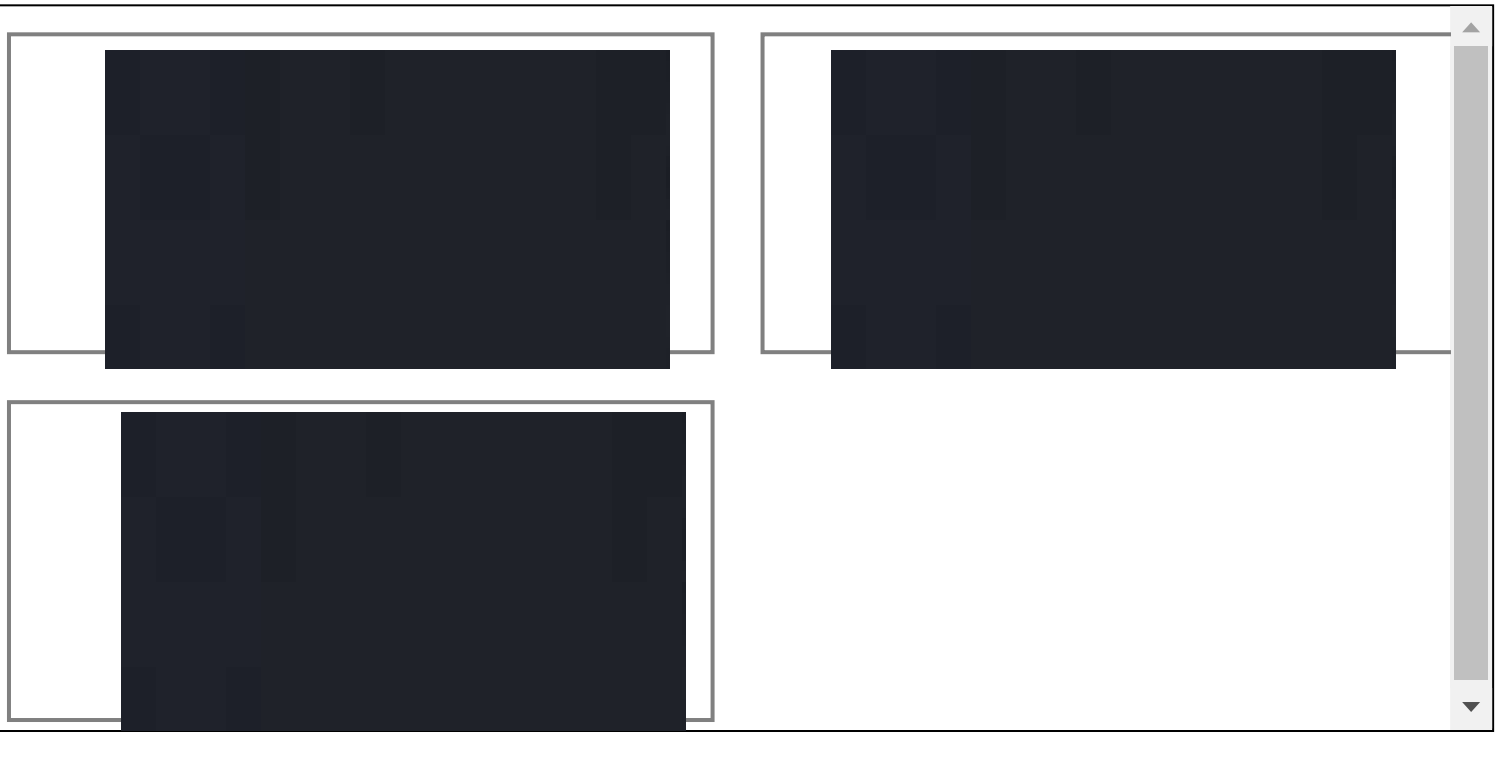

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	31 agosto 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?

La falta de orden y limípieza durante el desarrollo de los trabajos de encofrado y desencofrado, durante el tren de avance y la premura en la entrega del sector por el ingreso del personal de albañilería, obligó a avanzar de manera acelerada, provocando el accidente.


¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se sensibilizó al personal de carpintería de sobre la importancia del orden y la limpieza durante el desarrollo de los trabajos en el tren de avance.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Que el orden y la limpieza, además de tener los materiales de trabajo correctamente clasificados, permite que el trabajo sea mas eficaz y productivo, reduciendo la posibilidad de tener que correr en el proceso, minimizando la probabilidad de eventos no deseados.





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	31 agosto 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	DACI		

¿QUÉ PASÓ?

Debido incompatibilización en plano al ubicar los tableros de intercomunicadores y DACI en piso 1. Estos tableros interferían con la apertura de puerta cortafuego de tablero de SSGG; por ello no se podían instalar estos tableros hasta tener la medida exacta de la apertura de puerta.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se tuvo que replantear la ubicación de estos tableros para que encajen en el espacio libre que se tenía. Por ello se tuvo que reubicar la caja para la estación manual y la caja de pase del tablero DACI.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Compatibilizar planos DACI con planos de arquitectura para verificar las interferencias que se pueda tener al instalar los tableros. Además se definió un estándar de ubicación de tablero DACI e intercomunicadores para futuras torres propuesta por la subcontrata especialista.



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31 agosto 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	encofrado		

¿QUÉ PASÓ?


Se observa en el post vaciado de las placas de la [redacted] piso 1 s1-s2-s3-s4, muros desalineados.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se implemento en el encofrado, la colocación de más rieles tipo H en las placas, según las observaciones y mas de lo señalado en los planos del encofrado Forsa.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Adicionar mas accesorios de lo que indica en la modulación de los planos de Forsa, con el fin de asegurar el alineamiento.

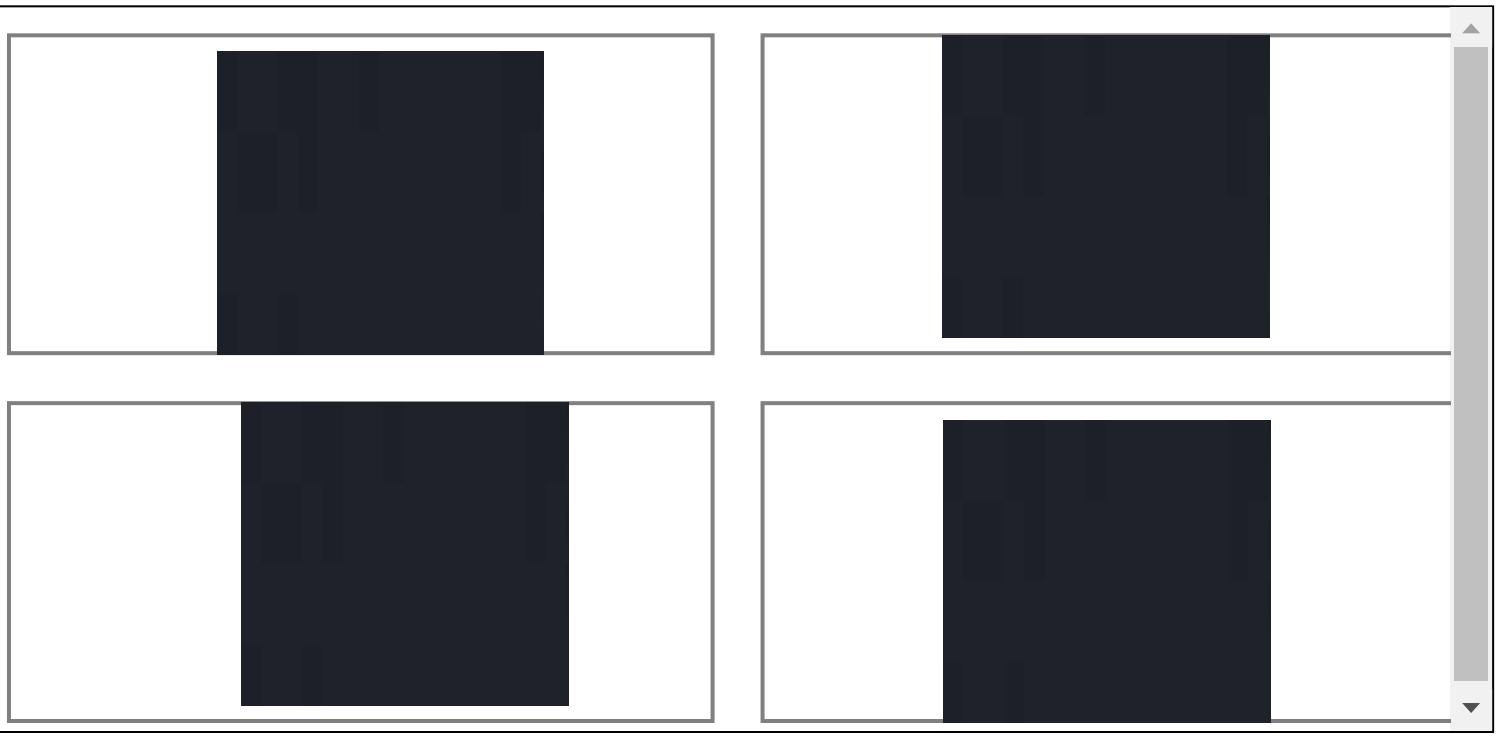

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	31 agosto 2022
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?

El día 5 de agosto, el personal de limpieza, [redacted] durante su ingreso al lo vestioderes para proceder a vestirse, previo al inicio de su jornada de trabajo, sufrió una picadura de araña, miientras se colocaba su polo.

La afectada comunicó casi 8 horas después lo ocurrido al área de SSOMA

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se realizó una inspección inopinada de vestuarios de hombres y mujeres. para determinar las condiciones en las que el personal se viste o se asea, durante el uso de las instalaciones sanitarias

Se capacitó al personal de obra sobre el correcto flujo de comunicación en caso de accidentes y/o emergencias.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se requiere al menos un programa de desinfección semestral y realizar inspecciones perióicas inopinadas por bienestar social y complementariamente por el comité de seguridad y salud en el trabajo del proyecto.

El personal no comunica oportunamente los caso de accidentes y/o emergencias, malestares.

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	31 octubre 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	EQUIPAMIENTO		

¿QUÉ PASÓ?


Se compró los equipos de terma para la pero el cable de energia no llega al punto.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se ha hecho una compatibilización y se ha visto implementar cambiar el cable con el mismo proveedor

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Para las proximas torres se ha visto cambiar de proveedor para evitar la implementación adicional de los cables.



LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	31 octubre 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Acabados		

¿QUÉ PASÓ?


Interferencia de tuberia de desague con mueble taylor y falta de refuerzo en mueble

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se reunió al proveedor en obra para validar la modifcaciones y consultar sobre el reforzamiento del mueble, debido a que el modelo no tiene escuadras para asegurar las piezas en la parte superior. Con ello se validó mover la pieza inferior trasera del mueble 7.5 cm para que no interfiera con la tuberia de desagüe; adicional a ello se valido colocar escuadras en la parte superior del mueble para garantizar la sujeción del mueble dado a que se iba a retirar una de las piezas de sujeción al muro por a interferencia con la tuberia de desagüe.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Hacer muestras de los cambios de productos en campo para analizar interferencias en la instalación y proponer soluciones.

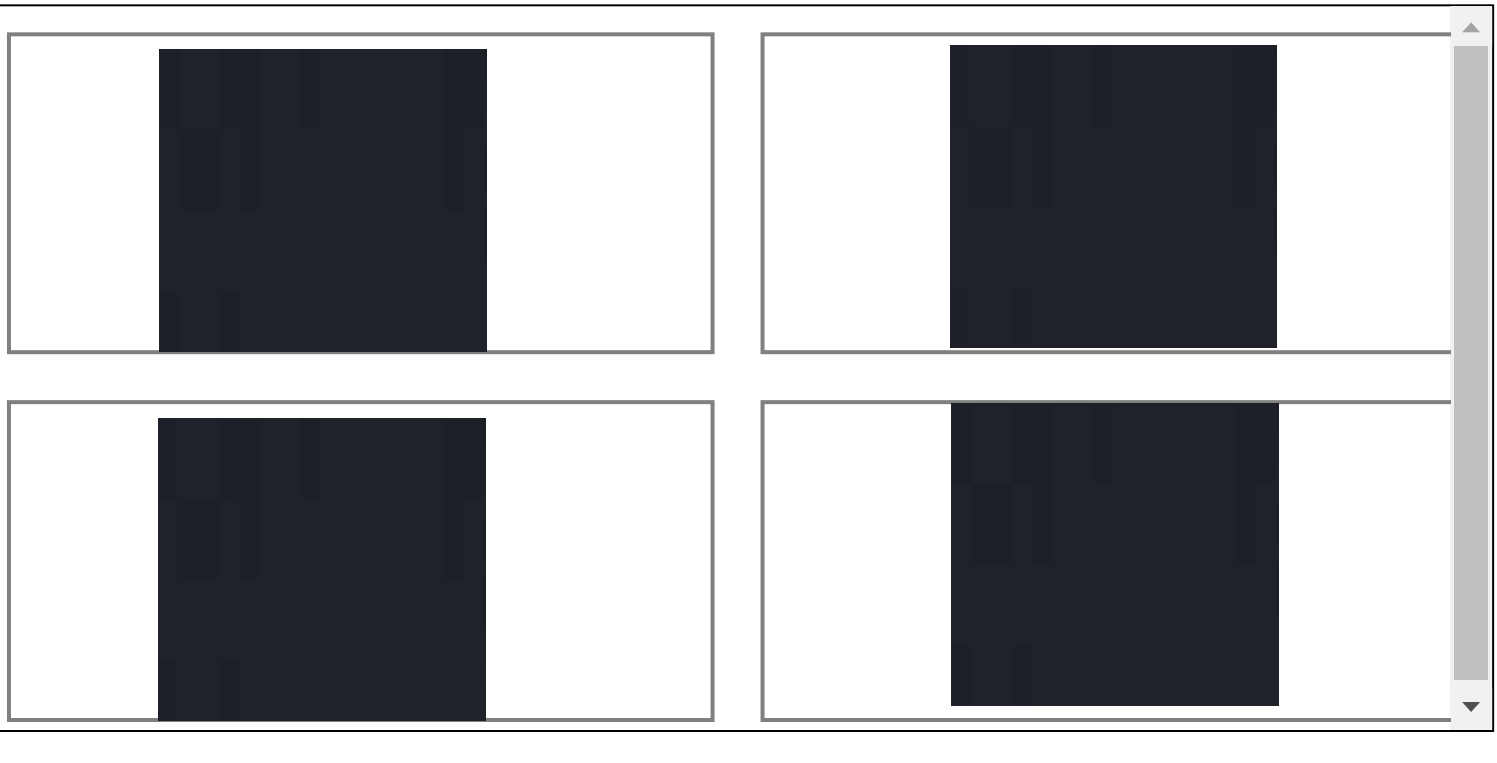

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	31 octubre 2022
ELABORADO POR:		**AREA:**	OT
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ACABADOS		

¿QUÉ PASÓ?


Se observa que no hubo una buen trabajo de resane en los puntos oiginando un mla acabado en la pinrutra

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se ha indicado al personal mayor cuidado con la zona para evitar retrabajos

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Preveer el mejoramiento del acabado durante el solaqueo de las salidas de instalaciones



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	5 mayo 2023
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	LECCIÓN APRENDIDA 3		

¿QUÉ PASÓ?

Al inicio de cada mes se realiza las inspecciones de herramientas manuales y eléctricas, sin embargo a mitad y fin de mes se encontraban herramientas sin cinta del mes o con cintas de inspecciones pasadas.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se procedió a entregar un check list de inspección de herramientas manuales y eléctricas a cargo de los capataces.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Toda herramienta tiene que ser inspeccionada al inciar el mes con la cinta de color correspondiente. Esta inspección deberá mantenerse durante todo el mes, obteniendo como resultado herramientas en buen estado debidamente inspeccionadas

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	5 mayo 2023
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Lección aprendida 2		

¿QUÉ PASÓ?

Se identificó que el punto de anclaje de linea de vida se realizaba a través de un puntal.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se procedió a corregir el anclaje de linea de vida ya sea en columnas, pases de muro y rejillas de ventilación.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se deberá anclar la linea de vida a una estructura de concreto, puesto que es fijo y de mayor resistencia a diferencia de un puntal.





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	7 marzo 2023
ELABORADO POR:		**AREA:**	PRODUCCION
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ACABADOS		

¿QUÉ PASÓ?


SE REPLICÓ DE ETAPAS ANTERIORES LA COLOCACION SARDINELES EN MONTANTES SANITARIAS DE BAÑOS EN TODOS LOS NIVELES (MONTANTES CON DUCTOS EN LOSA)

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

SE CAMBIARON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA CONSIDERANDO TABIQUERIA DE DRYWALL DE PISO A TECHO, DEL MISMO MODO SE ACTUALIZÓ EL CUADRO DE ACABADOS NOGALES.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

ACTUALIZAR Y REVISAR EL CUADRO DE ACABADOS DE LO ESPECIFICADO EN EL ESTANDAR DE ACABADOS VERSION 3 PARA UNA EDIFICACION DE MI VIVIENDA TOP.



[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	23 febrero 2023
ELABORADO POR:		**AREA:**	ADMIN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	Administracion de Obra		

¿QUÉ PASÓ?

Se encontraron cables eléctricos y conexiones que obstruían el pase a las personas, también se identificó que estaban expuestas y mantenían el contacto eléctrico y faltaban desconectar pudiendo ocasionar algún accidente. Esto fue encontrado en el [redacted]

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Buscamos al personal responsable, para desconectar los cables eléctricos y conexiones. generando la solución inmediata y realizado el respectivo aviso al área de SSOMA, para tomar las medidas previsoria.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se aprendió, que cuando terminemos una actividad debemos desconectar los cables y dejarlos en un lugar donde no pueda ser un peligro, manteniendo el orden y limpieza que se sigue bajo protocolo. Asimismo se me volvió a Re inducir a los obreros a verificar que todos los materiales y herramientas con las que se emplea el trabajo diario deben ser revisados al inicio de su labor, también se generó una charla y mención en las charlas que se le brinda al inicio de cada día.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	25 enero 2023
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	ADMIN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ADMINISTRACION DE OBRA		

¿QUÉ PASÓ?

DADO QUE LA [redacted]SE ESTA CONSTRUYENDO AL COSTADO DEL SUM DONDE SE ENCUENTRAN IMPLEMENTADAS LAS OFICINAS DE OBRA, SE TIENE LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS EN LA ESCALERA DE INGRESO PERO VISTA LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA TORRE, SE HA VISTO LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA REUBICACIÓN QUE CUBRA ESPACIOS Y/O PUNTOS CIEGOS DE INGRESO Y CIRCULACIÓN QUE PERMITAN CUBRIR CUALQUIER IMPREVISTO PRESENTAD, PARA CUBRIR LA REVISIÓN DEBIDA EN EL CCTV.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

SE PROGRAMO CAMBIO DE LA UBICACIÓN DE LA CÁMARA CON LA SUBCONTRATA PARA SU NUEVA REUBICACIÓN

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

REALIZAR PERIÓDICAMENTE UNA REVISIÓN DE LAS CÁMARAS Y SUS PUNTOS ESTRATÉGICOS, TENIENDO MAPEADO TODOS LOS PUNTOS EN OBRA PERMITIDOS PARA SU DESPLAZAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y MATERIALES.

[redacted]

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	27 marzo 2023
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	ADMIN
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	ADMINISTRACION DE OBRA		

¿QUÉ PASÓ?

En la inspección realizada rutinariamente, encontramos mal apilamiento de cajas de PAVCO, cuando deben estar apiladas encima de un pallets para evitar daños a los productos.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se le informo rápidamente a personal SSOMA y de Producción para hacer acción correctiva.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Hacer inspecciones con mas frecuencia y seguimiento al personal subcontrata cuando apila la carga en sus pequeños almacenes.

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

[redacted]

PROYECTO:	[redacted]	**FECHA:**	30 enero 2023
ELABORADO POR:	[redacted]	**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?

Se identifió que el personal de albañileria se encontraba trabajando en el [redacted], cometiendo actos inseguros a causa de una escalera no habilitada por el área de SSOMA y producción.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se realizó una parada de seguridad con el personal de albañilería por realizar actos inseguros al trabajar con una escalera no habilitada por SSOMA u omitir el uso de arnés de seguridad para realizar trabajos en alturta.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

El exceso de confianza provoca que el peligro sea subestimado, afectando la integridad física del traajador. Se implementó dentro del procedimiento de trabajo de albañilería el uso de tarjetas color rojo (no habilitado) y verde (habilitado) para el uso de escaleras portátiles u andamios.

[redacted]

LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	31 enero 2023
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		

¿QUÉ PASÓ?

A partir de la fecha cada ingresante de la categoría ayudante será identificado con una cinta de color azul que indica su categoría (ayudante) y su fecha de ingreso.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

A raiz del accidente ocurrido el 28 de enero, se identificó que el personal nuevo, principalmente ayudantes, no estaban identificado como tales.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Los trabajadores nuevos de menor experiencia y categoría requieren un seguimiento por parte de las áreas de producción y seguridad a fin de facilitar el progreso y la integración del trabajador a sus actividades





LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:		**FECHA:**	3 abril 2023
ELABORADO POR:		**AREA:**	SSOMA
PARTIDA/PROCESO DE GESTIÓN:	SSOMA		

¿QUÉ PASÓ?

Se procedió a corregir el anclaje de linea de vida ya sea en columnas, pases de muro y rejillas de ventilación.

¿CÓMO SE SOLUCIONÓ?

Se identificó que el punto de anclaje de linea de vida se realizaba a través de un puntal.

¿QUÉ SE APRENDIÓ?

Se deberá anclar la linea de vida a una estructura de concreto, puesto que es fijo y de mayor resistencia a diferencia de un puntal.

