Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Nombres de los recursos
0	**PROYECTO SANTA CLARA**	**mié 16/05/12**	**sáb 06/04/13**	**281 días**	
1	Edificio I,J	sáb 22/12/12	sáb 22/12/12	0 días	
2	Edificio G,H	sáb 22/12/12	sáb 22/12/12	0 días	
3	Edificio D,E,F	sáb 23/02/13	sáb 23/02/13	0 días	
4	Edifcios A,B,C	sáb 06/04/13	sáb 06/04/13	0 días	
5	**Edificio J - I**	**mié 16/05/12**	**lun 12/11/12**	**156 días**	
6	Movimiento de tierras	mié 16/05/12	mié 06/06/12	18 días	
7	**Estructuras**	**jue 07/06/12**	**vie 17/08/12**	**62 días**	
8	Cimentacion	jue 07/06/12	mié 20/06/12	12 días	
9	Piso 1	jue 21/06/12	vie 29/06/12	8 días	
10	Piso 2	jue 28/06/12	vie 06/07/12	8 días	
11	Piso 3	jue 05/07/12	vie 13/07/12	8 días	
12	Piso 4	jue 12/07/12	vie 20/07/12	8 días	
13	Piso 5	jue 19/07/12	vie 27/07/12	8 días	
14	Piso 6	jue 26/07/12	vie 03/08/12	8 días	
15	Piso 7	jue 02/08/12	vie 10/08/12	8 días	
16	Piso 8	jue 09/08/12	vie 17/08/12	8 días	
17	**Arquitectura y acabados**	**mar 31/07/12**	**lun 12/11/12**	**92 días**	
18	Piso 2	mar 31/07/12	mié 19/09/12	45 días	
19	Piso 3	lun 06/08/12	mar 25/09/12	45 días	
20	Piso 4	lun 13/08/12	mar 02/10/12	45 días	
21	Piso 5	lun 20/08/12	mar 09/10/12	45 días	
22	Piso 6	lun 27/08/12	mar 16/10/12	45 días	
23	Piso 7	lun 03/09/12	mié 24/10/12	45 días	
24	Piso 8	mié 12/09/12	jue 01/11/12	45 días	
25	Piso 1	sáb 22/09/12	lun 12/11/12	45 días	
26	**Edificio G-H-K**	**mar 10/07/12**	**sáb 22/12/12**	**145 días**	
27	Movimiento de tierras	mar 10/07/12	lun 30/07/12	18 días	
28	**Estructuras**	**mar 31/07/12**	**lun 29/10/12**	**80 días**	
29	Cimentacion	mar 31/07/12	lun 13/08/12	12 días	
30	Piso 1	sáb 18/08/12	lun 27/08/12	8 días	
31	Piso 2	mar 28/08/12	mar 04/09/12	8 días	
32	Piso 3	mié 05/09/12	jue 13/09/12	8 días	
33	Piso 4	vie 14/09/12	sáb 22/09/12	8 días	
34	Piso 5	lun 24/09/12	mar 02/10/12	8 días	
35	Piso 6	mié 03/10/12	jue 11/10/12	8 días	
36	Piso 7	vie 12/10/12	sáb 20/10/12	8 días	
37	Piso 8	lun 22/10/12	lun 29/10/12	8 días	
38	**Arquitectura y acabados**	**jue 13/09/12**	**sáb 22/12/12**	**88 días**	
39	Piso 2	jue 13/09/12	vie 02/11/12	45 días	
40	Piso 3	jue 27/09/12	vie 16/11/12	45 días	
41	Piso 4	jue 04/10/12	vie 23/11/12	45 días	
42	Piso 5	jue 11/10/12	vie 30/11/12	45 días	
43	Piso 6	jue 18/10/12	vie 07/12/12	45 días	
44	Piso 7	jue 25/10/12	vie 14/12/12	45 días	
45	Piso 8	lun 29/10/12	mié 19/12/12	45 días	
46	Piso 1	jue 01/11/12	sáb 22/12/12	45 días	
47	**Edificio D-E-F**	**lun 13/08/12**	**sáb 23/02/13**	**170 días**	
48	Movimiento de tierras	lun 13/08/12	sáb 01/09/12	18 días	
49	**Estructuras**	**lun 03/09/12**	**mié 12/12/12**	**88 días**	
50	Cimentacion	lun 03/09/12	sáb 15/09/12	12 días	
51	Piso 1	lun 01/10/12	mar 09/10/12	8 días	
52	Piso 2	mié 10/10/12	jue 18/10/12	8 días	
53	Piso 3	vie 19/10/12	sáb 27/10/12	8 días	
54	Piso 4	dom 28/10/12	lun 05/11/12	8 días	
55	Piso 5	mar 06/11/12	mié 14/11/12	8 días	
56	Piso 6	jue 15/11/12	vie 23/11/12	8 días	
57	Piso 7	sáb 24/11/12	lun 03/12/12	8 días	
58	Piso 8	mar 04/12/12	mié 12/12/12	8 días	
59	**Arquitectura y acabados**	**lun 19/11/12**	**sáb 23/02/13**	**84 días**	
60	Piso 2	lun 19/11/12	mié 09/01/13	45 días	
61	Piso 3	jue 22/11/12	sáb 12/01/13	45 días	
62	Piso 4	jue 29/11/12	sáb 19/01/13	45 días	
63	Piso 5	jue 06/12/12	sáb 26/01/13	45 días	
64	Piso 6	jue 13/12/12	sáb 02/02/13	45 días	
65	Piso 7	jue 20/12/12	sáb 09/02/13	45 días	
66	Piso 8	jue 27/12/12	sáb 16/02/13	45 días	
67	Piso 1	jue 03/01/13	sáb 23/02/13	45 días	
68	**Edificio A-B-C**	**mié 17/10/12**	**sáb 06/04/13**	**149 días**	
69	Movimiento de tierras	mié 17/10/12	lun 05/11/12	18 días	
70	**Estructuras**	**mar 06/11/12**	**lun 11/02/13**	**84 días**	
71	Cimentacion	mar 06/11/12	mié 28/11/12	20 días	
72	Piso 1	jue 29/11/12	vie 07/12/12	8 días	
73	Piso 2	sáb 08/12/12	lun 17/12/12	8 días	
74	Piso 3	mar 18/12/12	mié 26/12/12	8 días	
75	Piso 4	jue 27/12/12	vie 04/01/13	8 días	
76	Piso 5	sáb 05/01/13	lun 14/01/13	8 días	
77	Piso 6	mar 15/01/13	mié 23/01/13	8 días	
78	Piso 7	jue 24/01/13	vie 01/02/13	8 días	
79	Piso 8	sáb 02/02/13	lun 11/02/13	8 días	
80	**Arquitectura y acabados**	**jue 27/12/12**	**sáb 06/04/13**	**87 días**	
81	Piso 2	jue 27/12/12	sáb 16/02/13	45 días	
82	Piso 3	jue 03/01/13	sáb 23/02/13	45 días	
83	Piso 4	jue 10/01/13	sáb 02/03/13	45 días	
84	Piso 5	jue 17/01/13	sáb 09/03/13	45 días	
85	Piso 6	jue 24/01/13	sáb 16/03/13	45 días	
86	Piso 7	jue 31/01/13	sáb 23/03/13	45 días	
87	Piso 8	jue 07/02/13	sáb 30/03/13	45 días	
88	Piso 1	jue 14/02/13	sáb 06/04/13	45 días	

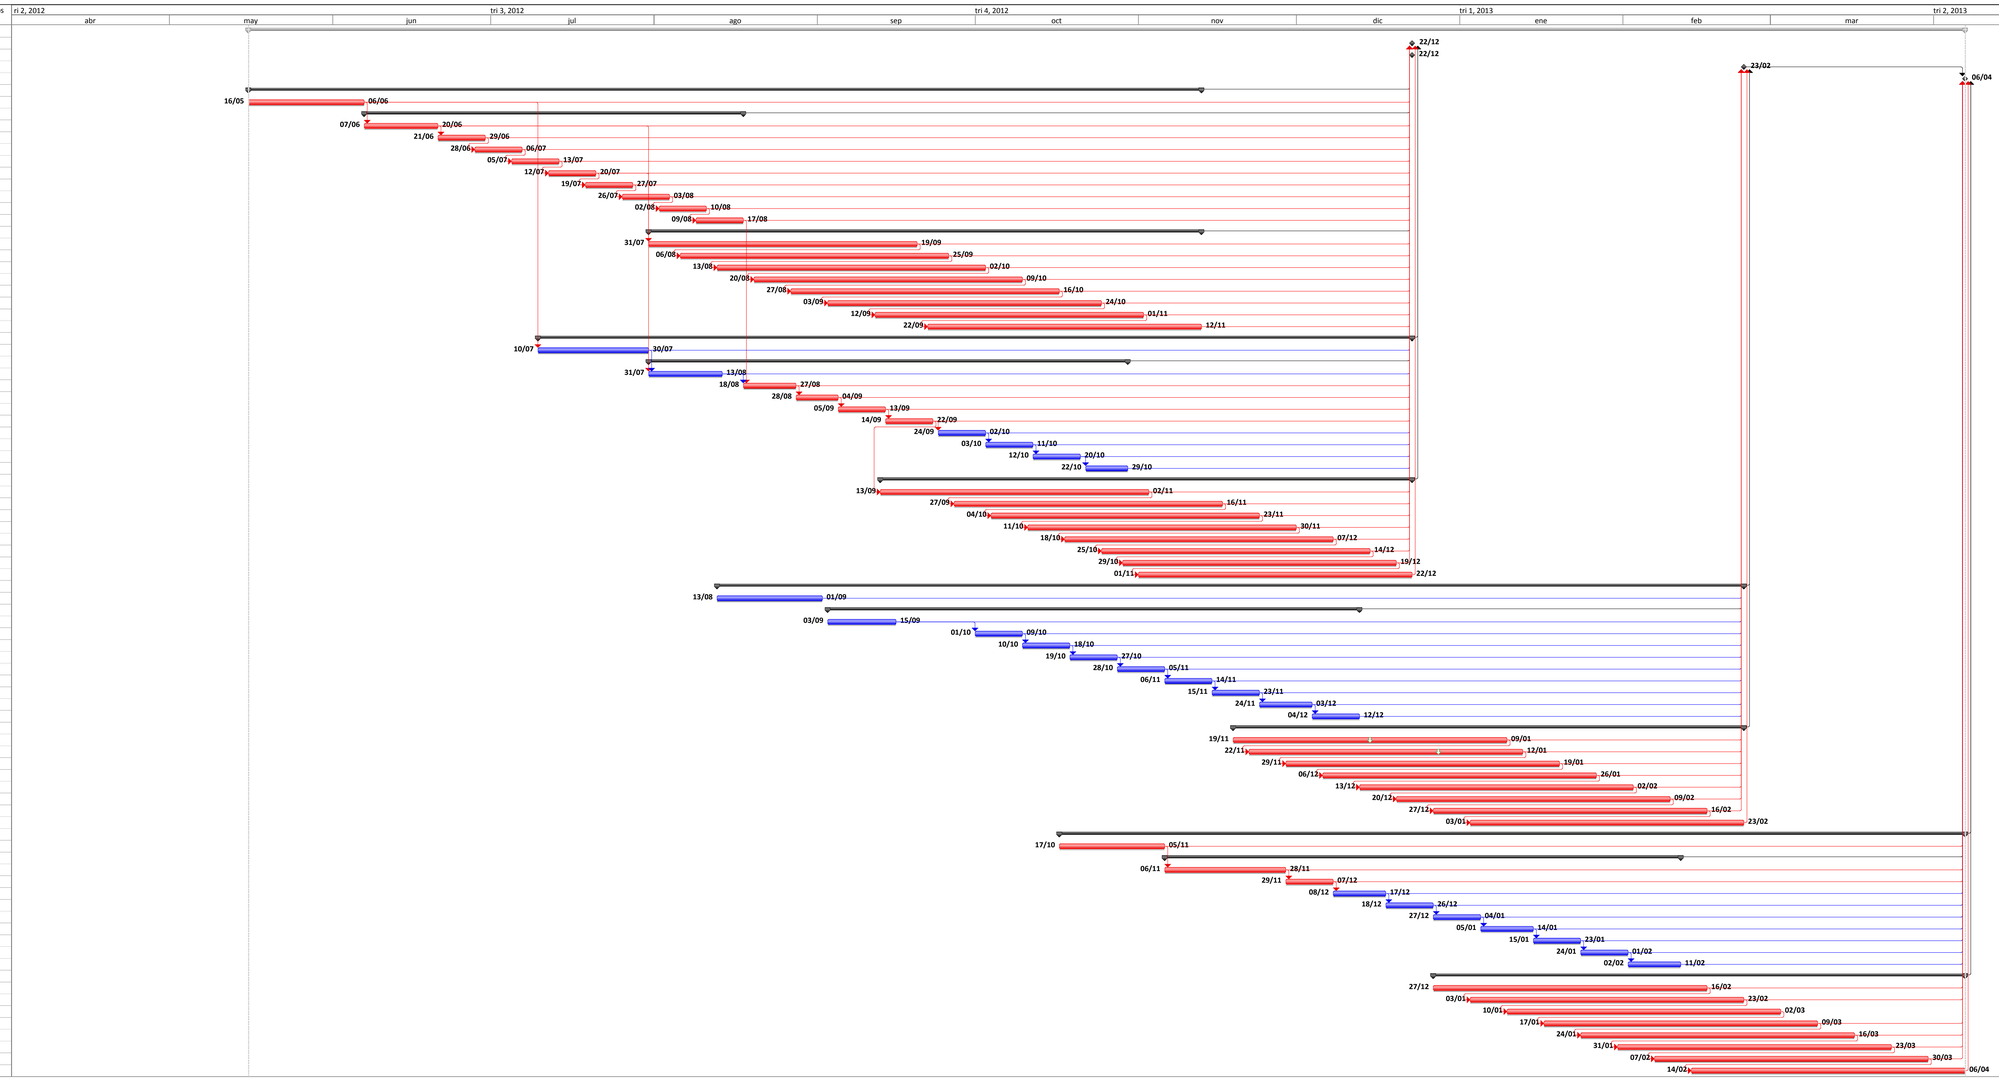

Proyecto: PROYECTO SANTA CLAF
Fecha: jue 02/10/14

aTarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Fecha límite
